



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

Página 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01164

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01066	24/08/2023

Fecha de Expedición: 24/08/2023

Documento de Identidad:	901.195.803-2
Nombre:	CONSORCIO IC

Concepto de este Egreso

Factura Nro.FE-5 Primer desembolso, desde el 29 de junio al 18 de agosto del 2023.

Contrato Nro. 138-2023.

Mejoramiento de la vía terciaria Minutas - La Milagrosa del Municipio de Granada - Antioquia.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211 Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021053130022 Mejoramiento de la infraestructura vial Granada	112.944.722,96
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET90 - CCPET MUNICIPIO DE GRANADA	90020802 Última doceava SGP	112.944.722,96

Total de la Presente Orden

112.944.722,96

Total Retenciones

18.059.861,21

Total a Pagar

94.884.861,75

Valor en letras:

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_granada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA EUGENIA GOMEZ GIRALDO, el día: jueves, 24 de agosto de 2023 siendo las: 15:39:19



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA

Página 2 de: 2

Nit: 890.983.728

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
41380300074-6	Propósito General	transf1164	94.884.861,75

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampita Pro-Cultura	0,60	677.668
Estamp Pro-Cultura	0,10	112.945
Estamp.Pro-Cultura	0,20	225.889
Estam.Procultura	0,10	112.945
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	3.162.452
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	1.355.337
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	1.129.447
Fondo de Seguridad 5%	5,00	5.647.236
I.C.Contratista de construcción, cons...	0,99	1.118.153
Contratos Obra Pública Const Urba	2,80	2.258.894
Tasa pro Deporte y Recreación Acdo N° 14/2020	1,60	1.807.116
Tasa pro Deporte y Recreación Acdo N° 14/2020	0,40	451.778

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.



MUNICIPIO DE GRANADA SIN : SANDRA IMELDA MESA RAMIREZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0746**

MUNICIPIO DE GRANADA

Monto a debitar \$
94.884.861,75**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

******7348**Monto a acreditar \$
94.884.861,75**Monto \$**
94.884.861,75**Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 1164
de
factura:Codigo_Egreso: 310-Libre
Inversion

BPIN: 3102320202005

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

Página 1 de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 01066

Fecha de Expedición: 24/08/2023

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

00336

20/06/2023

Documento de Identidad: 901.195.803-2

Nombre: CONSORCIO IC

Por Concepto de:

Factura Nro.FE-5 Primer desembolso, desde el 29 de junio al 18 de agosto del 2023.
Contrato Nro. 138-2023.
Mejoramiento de la vía terciaria Minitas - La Milagrosa del Municipio de Granada - Antioquia.

Rubro	Rubro	Valor Rubro ¹
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211 Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021053130022 Mejoramiento de la infraestructura vial Granada	112.944.722,96
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET90 - CCPET MUNICIPIO DE GRANADA	90020802 Última doceava SGP	112.944.722,96

Valor en letras:

CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA

Página 2 de: 2

Nit: 890.983.728

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	677.868
Estamp. Pro-Cultura	0,10	112.945
Estamp Pro-Cultura	0,20	225.889
Estam Pro cultura	0,10	112.945
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	3.162.452
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	1.355.337
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	1.129.447
Fondo de Seguridad 5%	5,00	5.647.236
I.C.Contratista de construcción, cons...	0,99	1.118.153
Contratos Obra Pública Const Urba	2,00	2.258.894
Tasa pro Deporte y Recreación Acdo N° 14/2020	1,60	1.807.116
Tasa pro Deporte y Recreación Acdo N° 14/2020	0,40	451.779

Total de la Presente Orden

112.944.722,96

Total Retenciones

18.059.861,21

Total a Pagar

94.884.861,75

Ordenador

Tesorerero

Firma del Interesado Nit / C.C.



CIUDAD Y FECHA: Granada, 18 de agosto de 2023

PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)

Nombre: GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
Cargo: SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia: SECRETARÍA DE HACIENDA

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre: JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Cargo: Secretario de obras públicas
Dependencia: Secretaria de obras públicas

Nombre o razón social del beneficiario: CONSORCIO IC /
Documento de Identidad: 901.195.803-2 /

ARTÍCULO PRESUPUESTAL

DETALLE

2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

297 /

FECHA:

30/04/2023 /

No COMPROMISO PRESUPUESTAL

336 /

FECHA:

20/06/2023 /

VALOR A PAGAR:

(\$ 112.944.722,96) Ciento doce millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintios pesos con noventa y seis centavos /

CONCEPTO:

Acta de avance 1 al contrato de obra N° 138 de 2023 cuyo objeto "Mejoramiento de la vía terciaria Minutas-la Milagrosa del municipio de Granada Antioquia".

PERÍODO DE PAGO:

Del 29 de junio al 18 de agosto de 2023

ANEXOS:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN


REVISADO
NIT 899.980.728-1
Firma de quien revisa


Firma de quien recibe

24-8-2023
Fecha DD/MM/AAAA

CIUDAD Y FECHA: Granada, 18 de agosto de 2023

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA: CONSORCIO IC

CÉDULA O NIT: 901.195.803-2

Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	138-2023	PORCENTAJE(%) EJECUTADO:	73.92%
-------------	----------	--------------------------	--------

OBJETO: Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-la Milagrosa del municipio de Granada Antioquia

PERÍODO DEL CONTRATO Del 29 de junio al 28 de agosto de 2023

PERÍODO CERTIFICADO: Del 29 de junio al 18 de agosto de 2023

CUOTA No 1

LUGAR DE EJECUCIÓN: Alcaldía Municipal - Granada Antioquia

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
Disponibilidad Presupuestal
Estudio Previo
Solicitud de Compromiso
Compromiso Presupuestal
Propuesta de Trabajo
Hoja de Vida y Anexos
Fotocopia de la cédula
RUT
Certificado Procuraduría
Certificado Contraloría
Certificado Antecedentes Judiciales
Declaración de Bienes y Rentas
Paz y Salvo

Pólizas
Autoaprobatorio Garantía
Contrato
Acta de inicio
Informe/acta de avance o ejecución
Informe de supervisión
Copia pago Seguridad Social
Cuenta de cobro
Factura
Otro si
Acta de suspensión
Acta de reinicio
Acta de terminación
Acta de liquidación

X
X
X
X

firma Interventor y/o Supervisor

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA

Nombre Interventor y/o Supervisor



Rionegro, 16 de agosto de 2023

Ingeniero
Luis Carlos Villarreal
Consortio IC

I-331- 2023

Ref. Diseño de mezcla de concreto hidráulico de 21.0 MPa.

Con la presente le hago entrega del informe preliminar para el diseño de concreto hidráulico correspondiente a la resistencias especificada de 21.0 MPa, cuyo destino es la preparación de concreto hidráulico para la obra "Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario".

Cabe anotar que este diseño es aplicable para las siguientes estructuras.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Asentamiento	
	máximo	mínimo
Cimentaciones, columnas, vigas, losas y elementos que no requieren una fluidez superior a 3".	3"	2"

El sitio donde se vaya a aplicar este diseño se deja a criterio del ente contratante y bajo su responsabilidad, es de resaltar que los requerimientos del diseño están consignados en este documento.

Nuestros diseños están concedidos para asentamientos máximos de 3".

Al laboratorio llegaron muestras referenciadas así:

- Arena aluvial limpia y suelta de color gris. Origen del material. Acopio en Obra.
- Grava aluvial parcialmente trituradas de color gris. Origen Acopio en Obra.
- El ente contratante facilito un saco de cemento de referencia Argos Uso general gris en presentación de 50.0 kg.



En los siguientes cuadros presentamos los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados sobre dichos materiales y la dosificación correspondiente a la mezcla; igualmente adjuntamos seis (6) folios con dichos resultados y un cuadro en el texto de este informe con el resultado de las resistencias medidas a 3 Y 7 días de edad, con sus respectivas resistencias probables a 28 días. Cuando se cumpla la edad de falla de los cilindros de 28 días, se estará actualizando esta información y de ser necesario podrían variar las dosificaciones con él objeto de optimizar el diseño o hacer los ajustes necesarios para garantizar la resistencia del diseño.

De presentarse una variación en los agregados o condiciones iniciales de las necesidades del contratante se deberá notificar a esta oficina para tomar las medidas necesarias, ya sea la ejecución de otro diseño o variación en la dosificación de este informe.

Para cada edad se tomaron tres (3) cilindros normales de concreto.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

Sobre la preparación de las mezclas realizadas con los materiales suministrados por el cliente nuestra empresa concluye lo siguiente:

- **Para el Agregado Fino se encontró que el material esta muy en los extremos del rango granulometría estipulada en la norma INVIAS-2013 Art 630-13.**
- **Para el agregado grueso suministrado se encontró que la granulometría cumple con los requerimientos estipulados en las Especificaciones Invias para Concretos Art. 630-13. Aunque este esta muy próximo al rango inferior**
- **Dadas las condiones encontradas se puede presentar un consumo mayor a lo esperado.**
- No se debe variar la relación agua/cemento.
- No se debe variar la granulometría de los agregados.
- No se debe variar el asentamiento en más de 1.0 cm por exceso o defecto.
- Si se dan variaciones en las propiedades de los materiales o cambio de uno de ellos, se informara a esta oficina para los ajustes correspondientes.
- Si la mezcla se prepara en mezcladora móvil (trompo), durante el tiempo de mezclado la posición de este debe ser casi horizontal. No se permite la posición con tendencia vertical del trompo porque no genera un correcto mezclado.





- La mezcla producida debe conservar la misma consistencia en todas las descargas.

Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

Att.

DUVAN AMIR RUITA SANCHEZ

CC 98 567 516 de Envigado Antioquia.

Matrícula Profesional N° 05207111551 Ant.

Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia

Especialista en Mecánica de suelos y Cimentaciones.

Universidad FAFTT.

ANA MILENA ESCOBAR MEJÍA

Representante Legal

RAER Ingeniería S.A.S.

EDIER LEONARDO MIELES G.

ENCARGADO DE LABORATORIO



MEZCLA DE 21.0 MPa (210 kgf/cm²)

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO POR MÉTODO DEL COMITÉ 211 DEL ACI

Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario

F'C= 210

Kg/cm2

Modificar Celdas Amarillas

AGREGADO FINO				
Malla	mm	% que pasa	% Retenido	% Retenido acumulado
2"	50.800	100.00	0.00	0.00
1 1/2"	38.100	100.00	0.00	0.00
1"	25.400	100.00	0.00	0.00
3/4"	19.050	100.00	0.00	0.00
1/2"	12.700	100.00	0.00	0.00
3/8"	9.525	100.00	0.00	0.00
Nº 4	4.750	87.14	12.86	12.86
Nº 8	2.360	69.05	18.09	30.95
Nº 16	1.180	51.76	17.29	48.24
Nº 30	0.600	37.60	14.16	62.40
Nº 50	0.300	24.42	13.18	75.58
Nº 100	0.150	12.77	11.65	87.23
Nº 200	0.074	6.51	6.26	93.49
Recipiente			6.51	100.00

AGREGADO GRUESO				
Malla	mm	% que pasa	% Retenido	% Retenido acumulado
3"	76.2	100.00	0.00	0.00
2 1/2"	63.5	100.00	0.00	0.00
2"	50.8	100.00	0.00	0.00
1 1/2"	38.1	100.00	0.00	0.00
1"	25.4	100.00	0.00	0.00
3/4"	19.1	81.71	18.29	18.29
1/2"	12.7	17.76	63.95	82.24
3/8"	9.5	1.70	16.06	98.30
Nº 4	4.8	0.31	1.39	99.69
Nº 8	2.4	0.30	0.01	99.70
Nº 16	1.2	0.30	0.00	99.70
Nº 30	0.6	0.29	0.01	99.71
Nº 50	0.3	0.28	0.01	99.72
Nº 100	0.2	0.28	0.00	99.72
Nº 200	0.1	0.27	0.01	99.73
Recipiente			0.27	100.00

Descripción	A. Fino	A. Grueso
P. Unitario suelto seco	1453.00 Kg/m3	1535.00 Kg/m3
P. Unitario Compactado seco	1572.00 Kg/m3	1701.00 Kg/m3
P. Especifico Masa seca	2.76 gr/cm3	2.75 gr/cm3
Contenido de Humedad	0.60 %	0.42 %
% de Absorción	0.31 %	1.64 %
Modulo de fineza	3.39	
Tamaño Máximo nominal		3/4"

Fm-Resistencia prom.	
Fc	Fcr
< 210	Fc + 71.38
210 a 350	Fc + 84.64
> 350	10.2(1.10Fc + 5.0)

peso de bolsa de cemento (Kg) 50.00 según la marca
 Masa unitaria suelta del cemento Kg/m3 1056.00 ARGIS USO GENERAL
 Contenido Total de aire : 2.0 % (Tabla 3.a de contenido de aire atrapado)
 Volumen unitario de agua de mezclado: 195 Lts/m3 (Tabla 2. de Volumen unitario de agua ACI)
 Peso Especifico del cemento : 3.1 gr/cm3 (Propiedad física del cemento)
 Relación agua cemento 0.40 (Tabla 4.a y 4.b por resistencia y durabilidad)
 Factor Cemento 488.96 Kg/m3 = 9.78 bolsas/m3
 Cantidad de Agregado Grueso 0.61 m3 (Tabla Nº 6 Volumen de agregado grueso)

DESC.	Vol.Abs.Materiales	PESO SECO DE LOS AGREGADOS POR M3	Correccion por Humedad	Prop. Peso	VOLUMEN SUELTO DE LOS MATERIALES	Prop. En Volum.	PROPORCIÓN PARA UN SACO DE CEMENTO
Cemento	0.158 m3	488.96 kg/m3	488.96 kg/m3	1.00	0.46	1.00	50.0 kg/m3
A. Fino	0.249 m3	698.956 kg/m3	693.09 kg/m3	1.42	0.48	1.03	70.85 kg/m3
A. Grueso	0.378 m3	1038.85 kg/m3	1043.21 kg/m3	2.13	0.68	1.47	106.70 kg/m3
Agua	0.19 m3	194.96 lts/m3	205.64 lts/m3	0.42		0.42	21.03 lts/m3
Aire	0.020 m3						

DISEÑO: RAER INGENIERIA



1. CANTIDAD DE AGREGADOS POR METRO CUBICO DE MEZCLA PARA
21.0 MPa (210 kgf/cm²).

CEMENTO ARGOS USO GENERAL - KILOGRAMOS	488.96
AGUA – KILOGRAMOS O LITROS	205.64
ARENA ALUVIAL, LIMPIA Y SUELTA COLOR GRIS	693.09
GRAVA ALUVIAL PARCIALMENTE TRITURADA DE COLOR GRIS	1043.21

2. DOSIFICACIÓN PARA 50.0 Kg DE CEMENTO (1 bulto).

CEMENTO ARGOS USO GENERAL – KILOGRAMOS	50.0
AGUA – KILOGRAMOS O LITROS	21.03
ARENA ALUVIAL, LIMPIA Y SUELTA COLOR GRIS	70.85
GRAVA ALUVIAL PARCIALMENTE TRITURADA DE COLOR GRIS	106.70

3. PROPORCIONES DE LA MEZCLA DE CONCRETO PARA EL DISEÑO PROPUESTO EN ESTE DOCUMENTO.

MATERIAL	VOLUMEN	PESO
CEMENTO	1	1
AGUA / CEMENTO	0.42	
ARENA	1.03	1.42
GRAVA	1.47	2.13

4. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO (21.0 Mpa).

Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto

I.N.V. E - 410 y N.T.C - 673

OBRA:		Placa huella vereda La Milagrosa municipio Granada y Santuario															
CLIENTE:		Consortio IC															
FECHA:		12 de agosto de 2023				RESPONSABLE:		Ingeniero Luis Carlos Villareal									
Referencia	Numero Interno	Localización	Fecha		Edad (días)	Proporcion de mezcla	Asentamiento (cm)	Carga Máxima (KN)	Medidas Prom. (cm)		Peso (gr)	Densidad (Kg/m³)	Resistencia (Kg/cm²)				Patrón de Fractura
			Vaciado	Prueba					Diámetro	Longitud			Especificada	obtenida	PROBABLE A 28 DIAS	%	
MD	1	Diseño de mezcla con materiales de Ingetierras de Colombia y cemento Argos uso general. A/C 0.42	05/08/23	08/08/23	3	1.0:1.42:2.13	8	106.9	10.2	20.6	3925	2.33	210	133.4	294.8	64%	Cuatro
MD	1		05/08/23	08/08/23	3	1.0:1.42:2.13	8	101.5	10.0	20.5	3905	2.43	210	131.8	292.0	63%	Cinco
MD	1		05/08/23	08/08/23	3	1.0:1.42:2.13	8	104.3	10.1	20.0	3830	2.39	210	132.7	293.6	63%	Cinco
MD	1		05/08/23	12/08/23	7	1.0:1.42:2.13	8	167.9	10.1	20.3	3915	2.41	210	213.7	291.5	102%	Cuatro
MD	1		05/08/23	12/08/23	7	1.0:1.42:2.13	8	163.6	10.0	20.2	4101	2.58	210	212.5	290.1	101%	Cuatro
MD	1		05/08/23	12/08/23	7	1.0:1.42:2.13	8	170.1	10.1	20.2	3990	2.47	210	216.5	294.6	103%	Cuatro
MD	1		05/08/23	02/09/23	28	1.0:1.42:2.13	8						210				
MD	1		05/08/23	02/09/23	28	1.0:1.42:2.13	8						210				
MD	1		05/08/23	02/09/23	28	1.0:1.42:2.13	8						210				

ENSAYOS DE LABORATORIO




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS

I.N.V.
E - 213

PROYECTO:	Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario	FECHA INFORME:	3/08/2023
CUENTE:	Consortio IC	LOCALIZACION:	Acopio obra
RESPONSABLE:	Ing. Luis Carlos Villarreal	ORIGEN:	Ingetierras
CONSTRATISTA:	Consortio IC	MUESTRA:	N/A
Nº INTERNO:	5667 - 5668	PROFUNDIDAD:	N/A
DESCRIPCION:	Grava parcialmente Triturada tamaño máximo 3/4" de color gris	DESTINO:	Concreto hidráulico 210

P₁ = 3910.1 P₂ = 3883.1

TAMIZ	Tamaño (mm)	Peso Retenido	% Retenido	% Retenido	% QUE
1 1/2"	37.5	0.0	0.00	0.00	100.00
1"	25	0.0	0.00	0.00	100.00
3/4"	19	198.7	5.08	5.08	94.92
1/2"	12.7	1279.3	32.72	37.80	62.20
3/8"	9.5	1133.1	28.98	66.78	33.22
Nº 4	4.75	1253.4	32.06	98.83	1.17
Nº 8	2.36	9.0	0.23	99.06	0.94
Nº 16	1.18	0.5	0.01	99.08	0.92
Nº 30	0.6	0.4	0.01	99.09	0.91
Nº 50	0.3	1.4	0.04	99.12	0.88
Nº 100	0.15	3	0.08	99.20	0.80
Nº 200	0.074	4.3	0.11	99.31	0.69

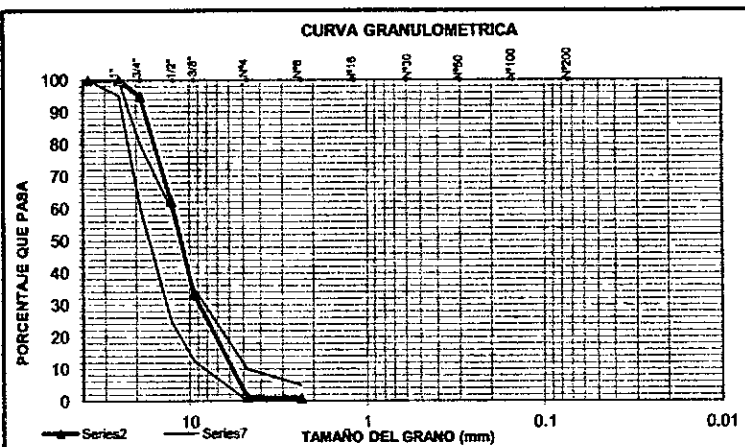

Curva Granulométrica Según Especificaciones Invias para Concretos Art. 630-13

Tamiz	1 1/2"	1"	1/2"	Nº 4	Nº 8
AG-38	100	95	25	0	0
	100	100	60	10	5

EQUIPO UTILIZADO

Balanza calibrada el 2023/01/25
Tamices estándar
Horno y herramienta menor

HUMEDAD

Nº RECIPIENTE	571
PESO MUESTRA	
HUMEDAD + TARA	1358.9
PESO MUESTRA SECA + TARA	1350.2
PESO TARA	102.3
CONTENIDO DE HUMEDAD	0.70

Versión: V1
Creación: 30/09/2019



ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS FINOS

I.N.V.
E - 213

PROYECTO: Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario

FECHA INFORME: 3/08/2023

CLIENTE: Consorcio IC

LOCALIZACION: Acopio obra

RESPONSABLE: Ing. Luis Carlos Villarreal

ORIGEN: Ingetierras

CONSTRATISTA: Consorcio IC

MUESTRA: N/A

Nº INTERNO: 5667 - 5668


PROFUNDIDAD: N/A

DESCRIPCION: Arena limpia y suelta de color gris

DESTINO: Concreto hidráulico 210

P₁= 3718 P₂= 3653.8

TAMIZ	Tamaño φ (mm)	Peso Retenido (gr)	% Retenido	% Retenido Acum.	% QUE PASA
1 1/2"	37.5	0.0	0.00	0.00	100.00
1"	25	0.0	0.00	0.00	100.00
3/4"	19	0.0	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.5	0.0	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.5	1.5	0.04	0.00	99.96
Nº 4	4.75	411.8	11.08	11.08	88.88
Nº 8	2.36	655.5	17.63	28.71	71.25
Nº 16	1.18	590.8	15.89	44.60	55.36
Nº 30	0.6	935.0	25.15	69.74	30.22
Nº 50	0.3	683.5	18.38	88.13	11.83
Nº 100	0.15	321.0	8.63	96.76	3.20
Nº 200	0.074	54.7	1.47	98.23	1.73

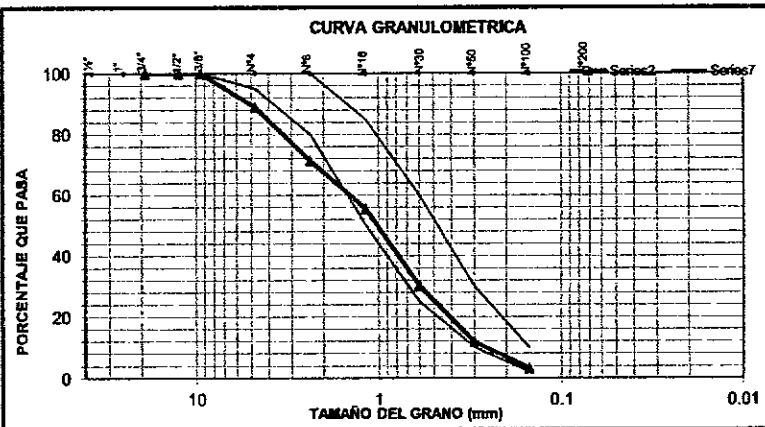

Contenido de Materia Orgánica según INV E-212 (Color)

2

Modulo de Finura (%)

3.39

Curva Granulométrica Según Especificaciones Inviás para Concretos Art. 630-13

Tamiz	3/8"	Nº 4	Nº 8	Nº 16	Nº 30	Nº 50	Nº 100	Nº 200
	100	95	80	50	25	10	2	-
	100	100	100	85	60	30	10	-

HUMEDAD	
Nº RECIPIENTE	570
PESO MUESTRA	
HUMEDAD + TARA	7489.1
PESO MUESTRA SECA	
+ TARA	7290.9
PESO TARA	230.5
CONTENIDO DE HUMEDAD	2.81

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELO Y AGREGADOS FINOS (I.N.V. E-133-13) Norma (≥ 60)			
Determinación Nº	Lectura Arena	Lectura Arcilla	Resultado
Equivalente de Arena (%) Resultado			
CONFORMIDAD			

EQUIPO UTILIZADO	
Balanza calibrada el 2023/01/25	
Tamices estándar	
Horno y herramienta menor	

Versión: V1
Creación: 30/09/2019



GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS

I.N.V.
E - 222 y 223- 13

PROYECTO: Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario

CLIENTE: Consorcio IC

FECHA INFORME 3/08/2023

RESPONSABLE: Ing. Luis Carlos Villarreal

LOCALIZACION: Acopio obra

CONSTRATISTA: Consorcio IC

ORIGEN: Ingetierras

Nº INTERNO: 5667 - 5668

DESTINO: Concreto hidráulico 210

DESCRIPCION: Arena limpia y suelta de color gris

DETERMINACION No	1	2	Promedio
A = Peso de la muestra secada al horno despues del ensayo, grs	249.22	249.25	-
B= Masa del picnometro aforado lleno de agua	359.77	375.33	
C= Masa total del picnometro aforado más la muestra y lleno de	519.93	534.12	
S= Masa de la muestra saturada y superficialmente seca	250	250	
Va= Volumen del picnometro, c.c.	250	250	-
M= Masa del frasco vacio	117.84	117.25	
Gravedad especifica Bulk Gsb= $A/(B+S-C)$	2.774	2.733	2.753
Gravedad especifica Bulk (S.S.S.) Gsb s.s.s= $S/(B+S-C)$	2.783	2.741	2.762
Gravedad especifica aparente Gsa= $A/(B+A-C)$	2.798	2.755	2.777
Absorción % = $(S-A)/(A) * 100$	0.31	0.30	0.31

DESCRIPCION: Grava parcialmente Triturada tamaño máximo 3/4" de color gris

DETERMINACION No	1	2	Promedio
A= Peso de la muestra secada al horno después del ensayo, grs	1356.1	1418.6	
B= Peso en el aire de la muestra saturada superficialmente seca,	1377.0	1443.3	
grs			
C= Peso en agua de la muestra saturada superficialmente seca,	862.8	902.7	
grs			
B - C, grs	514.2	540.6	
A - C, grs	493.3	515.9	
B - A, grs	20.9	24.7	
Gravedad especifica Bulk Gsb= $A / (B - C)$	2.637	2.624	2.631
Gravedad especifica Bulk (S.S.S) Gsb s.s.s= $B / (B - C)$	2.678	2.670	2.674
Gravedad especifica aparente Gsa= $A / (A - C)$	2.749	2.750	2.749
Absorción % = $(B - A) / A * 100$	1.54	1.74	1.64

EQUIPO UTILIZADO

Balanza electronica calibrada el 2023/01/25

Horno y herramienta menor

Picnometros de 500 ml

Versión: V1

Creacion: 30/09/2019

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437



Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blanco / Rionegro, Antioquia



PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS

I.N.V.
E - 217

PROYECTO: Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario

CLIENTE: Consorcio IC

FECHA INFORME: 3/08/2023

RESPONSABLE: Ing. Luis Carlos Villarreal

LOCALIZACION: Acopio obra

CONSTRATISTA: Consorcio IC

ORIGEN: Ingetierras

Nº INTERNO: 5667 - 5668

MUESTRA: N/A

DESCRIPCION: Arena limpia y suelta de color gris

DESTINO: Concreto hidráulico 210

AGREGADO ARENA ☒ GRAVA ☐ MIXTO ☐

PESO UNITARIO SUELTO ☒ COMPACTADO ☐

PESO UNITARIO				
DETERMINACION Nº	1	2	3	Promedio
PESO DEL MOLDE (g)	888	888	888	-
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	5700	5700	5700	-
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)	9158.8	9179.4	9170.2	-
PESO DE LA MUESTRA (g)	8270.8	8291.4	8282.2	-
PESO UNITARIO HUMEDO (g/cm³)	1.451	1.455	1.453	1.453

PROMEDIOS PESO UNITARIO	
PESO U. SUELTO HUMEDO (g/cm³)	1.453
PESO U. SUELTO SECO(g/cm³)	1.453

AGREGADO ARENA ☒ GRAVA ☐ MIXTO ☐

PESO UNITARIO SUELTO ☐ COMPACTADO ☒

PESO UNITARIO				
DETERMINACION Nº	1	2	3	Promedio
PESO DEL MOLDE (g)	888	888	888	-
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	5700	5700	5700	-
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)	9828.2	9857.5	9852.9	-
PESO DE LA MUESTRA (g)	8940.2	8969.5	8964.9	-
PESO UNITARIO HUMEDO (g/cm³)	1.568	1.574	1.573	1.572

PROMEDIOS PESO UNITARIO	
PESO U. COMPACTO HUMEDO (g/cm³)	1.572
PESO U. COMPACTADO SECO(g/cm³)	1.572

EQUIPO UTILIZADO

Balanza calibrada el 2023/01/25

Horno y herramienta menor

Molde calibrado

HUMEDAD		
PESO HUMEDO		
PESO SECO		
PESO RECIPIENTE		
% DE HUMEDAD		
PROMEDIO		

HUMEDAD		
PESO HUMEDO		
PESO SECO		
PESO RECIPIENTE		
% DE HUMEDAD		
PROMEDIO		

Versión: V1

Creacion: 30/09/2019

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437

Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia



PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS

I.N.V.
E - 217

PROYECTO: Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario

CLIENTE: Consorcio IC

FECHA INFORME: 3/08/2023

RESPONSABLE: Ing. Luis Carlos Villarreal

LOCALIZACION: Acopio obra

CONSTRATISTA: Consorcio IC

ORIGEN: Ingetierras

Nº INTERNO: 5667 - 5668

MUESTRA: N/A

DESCRIPCION: Grava parcialmente Triturada tamaño máximo 3/4" de color gris

DESTINO: Concreto hidráulico 210

AGREGADO ARENA ☐ GRAVA ☒ MIXTO ☐

PESO UNITARIO SUELTO ☒ COMPACTADO ☐

PESO UNITARIO

DETERMINACION Nº	1	2	3	Promedio
PESO DEL MOLDE (g)	888	888	888	-
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	5700	5700	5700	-
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)	9621.7	9629.4	9666.1	-
PESO DE LA MUESTRA (g)	8733.7	8741.4	8778.1	-
PESO UNITARIO HUMEDO (g/cm³)	1.532	1.534	1.540	1.535

PROMEDIOS PESO UNITARIO

PESO U. SUELTO HUMEDO (g/cm³)	1.535
PESO U. SUELTO SECO(g/cm³)	1.535

AGREGADO ARENA ☐ GRAVA ☒ MIXTO ☐

PESO UNITARIO SUELTO ☐ COMPACTADO ☒

PESO UNITARIO

DETERMINACION Nº	1	2	3	Promedio
PESO DEL MOLDE (g)	888	888	888	-
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	5700	5700	5700	-
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)	10553.4	10598.2	10594	-
PESO DE LA MUESTRA (g)	9665.4	9710.2	9706	-
PESO UNITARIO HUMEDO (g/cm³)	1.696	1.704	1.703	1.701

PROMEDIOS PESO UNITARIO

PESO U. COMPACTO HUMEDO (g/cm³)	1.701
PESO U. COMPACTADO SECO(g/cm³)	1.701

EQUIPO UTILIZADO

Balanza calibrada el 2023/01/25
Horno y herramienta menor
Molde calibrado

HUMEDAD

PESO HUMEDO		
PESO SECO		
PESO RECIPIENTE		
% DE HUMEDAD		
PROMEDIO		

HUMEDAD

PESO HUMEDO		
PESO SECO		
PESO RECIPIENTE		
% DE HUMEDAD		
PROMEDIO		

Versión:

Creación: 30/09/2019



PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS

I.N.V.
E - 217

PROYECTO: Placa huella la milagrosa Municipio Granada-Santuario

CLIENTE: Consorcio IC **FECHA INFORME:** 3/08/2023

RESPONSABLE: Ing. Luis Carlos Villarreal **LOCALIZACION:** Acopio obra

CONSTRATISTA: Consorcio IC **ORIGEN:** Argos Uso General

Nº INTERNO: 5667 - 5668 **MUESTRA:** N/A

DESCRIPCION: Cemento color gris **DESTINO:** Concreto hidráulico 210

AGREGADO CEMENTO ☒ GRAVA ☐ MIXTO ☐

PESO UNITARIO SUELTO ☒ COMPACTADO ☐

PESO UNITARIO				
DETERMINACION Nº	1	2	3	Promedio
PESO DEL MOLDE (g)	888	888	888	-
VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	5700	5700	5700	-
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)	6915	6903	6900	-
PESO DE LA MUESTRA (g)	6027	6015	6012	-
PESO UNITARIO SECO (g/cm³)	1.057	1.055	1.055	1.056

HUMEDAD		
PESO 1	-	-
PESO 2	-	-
PESO 3	-	-
% DE HUMEDAD	-	-
PROMEDIO	-	

PROMEDIOS PESO UNITARIO		EQUIPO UTILIZADO
PESO U. SUELTO SECO (g/cm³)	1.056	Balanza calibrada el 2023/01/25
PESO U. COMPACTADO SECO (g/cm³)	-	Horno y herramienta menor
		Molde calibrado
PORCENTAJE DE VACIOS		
Peso específico aparente	-	
Peso unitario del agregado	-	
Peso unitario del agua	-	
Porcentaje de vacios (%)	-	

Versión: V1
Creación: 30/09/2019



Rionegro, 17 de agosto de 2023

C-11115-2023

Ingeniero
Jose Carlos Villareal
Consortio IC
Placa Huella Vereda la Milagrosa


Informe Resultados de resistencia cilindros de concreto

Cordial saludo.

Con la presente hacemos entrega del informe con los resultados de resistencia a la compresión simple de los cilindros que se han venido ensayando para la obra
Placa Huella Vereda la Milagrosa

Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

Att


JUAN JOSÉ BUSTAMANTE HERNÁNDEZ
CC 1 035 428 771 de Copacabana Antioquia
Matricula Profesional N° 05202 332770 Ant.
I.C. Esp. Geotecnia y Estabilidad de Taludes


ANA MILENA ESCOBAR MEJIA
Representante Legal
RAER Ingeniería S.A.S.

Versión: 01

Creación: 01/2020

 info@raeringeneria.com  (574) 532 2665  312 832 5437



Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blanco / Rionegro, Antioquia



Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto

I.N.V. E - 410 y N.T.C - 673

OBRA:		Placa Huella Vereda la Milagrosa															
CLIENTE:		Consorcio IC															
FECHA:		17 de agosto de 2023					RESPONSABLE:		Jose Carlos Villareal								
Referencia	Numero Interno	Localización	Fecha		Edad (días)	Proporcion de mezcla	Asentamiento (cm)	Carga Máxima (KN)	Medidas Prom. (cm)		Peso (gr)	Densidad (Kg/m³)	Resistencia (Kg/cm²)				Patrón de Fractura
			Vaciado	Prueba					Diámetro	Longitud			Especificada	obtenida	PROBABLE A 28 DIAS	%	
HVL	1	Primer tramo 100 metros.	19/07/23	26/07/23	7	1.0:2.0:3.0	10	94,1	10,3	20,3	3843	2,27	210	115,2	180,1	55%	Cuatro
HVL	2	Primer tramo 100 metros.	19/07/23	02/08/23	14	1.0:2.0:3.0	10	151,0	10,5	30,2	2850	1,09	210	177,8	206,3	85%	Cinco
HVL	3	Primer tramo 100 metros.	19/07/23	16/08/23	28	1.0:2.0:3.0	10	172,1	10,2	20,2	3953	2,39	210	214,8	-	102%	Tres
HVL	4	Segundo tramo 100 metros.	07/08/23	14/08/23	7	1.0:2.0:3.0	NR	88,1	10,2	20,2	3793	2,30	210	109,9	174,2	52%	Cuatro
HVL	5	Segundo tramo 100 metros.	07/08/23	21/08/23	14	1.0:2.0:3.0	NR						210				
HVL	6	Segundo tramo 100 metros.	07/08/23	04/09/23	28	1.0:2.0:3.0	NR						210				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo identificado con cédula de ciudadanía 80.421.632 y Hernando Lancheros Garzón identificado con cédula de ciudadanía 79.261.553, en nuestra condición de representante legal y contador público respectivamente del Consorcio IC identificado con NIT 901.195.803-2, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la presente acta.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de agosto de 2023



Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo

Representante legal

CC 80.421.632



Hernando Lancheros Garzón

Contador público

CC 79.261.553 – T.P 43624-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

43624-T



**HERNANDO
LANCHEROS GARZON**

C.C. 79.261.553

**RESOLUCION DESCRIPCION 016 FECHA 29-06-55
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRAN COLOMBIANO**

[Signature]

REC-14-T

Comité



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.261.553**

LANCHEROS GARZON

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES


FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

03-DIC-1962

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M


SEXO

20-ABR-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00094183-M-0079261553-20081012

0004284483A 1

1410016486

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO LANCHEROS GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79261553 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 43624-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




ACTA DE AVANCE OBRA PÚBLICA

Página: 1 de 1
Código: BVS-FR-15
Versión: 02
Fecha: 17/11/2016

ACTA DE AVANCE N°1										
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 138-2023										
CONSORCIO IC										
No.	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT (\$)	VALOR TOTAL (\$)	CANT. CONTRACTUAL	VALOR TOTAL (\$)	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL (\$)
1	1.1	Excavación en material heterogéneo (para bordillos y nivelación de la subrasante)	m3	300,00	23.923,88	7.176.924,00	300,00	7.176.924,00	300,00	7.176.924,00
2	2.1	Suministro, transporte, extendido y compactación del material granular para sub-base	m3	22,50	229.461,54	5.162.884,65	22,50	5.162.884,65	22,50	5.162.884,65
2	2.2	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en rieles, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	75,94	358.538,48	27.227.052,11	52,73	18.905.733,00	52,73	18.905.733,00
2	2.3	Vaciado de concreto ciclópeo en entre rieles y sobre anchos. Resistencia del concreto 210 kg/cm2, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	71,72	219.923,38	15.773.103,22	49,80	10.952.169,38	49,80	10.952.169,38
2	2.4	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en cunetas, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento es suministrado por el municipio suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	67,50	363.307,69	24.523.269,08	43,94	15.963.739,90	43,94	15.963.739,90
2	2.5	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en vigas nostras, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento es suministrado por el municipio suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	28,22	401.538,46	11.329.407,65	16,01	6.428.630,74	16,01	6.428.630,74
2	2.6	Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo G-60, a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el acero suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	kg	8087,52	1.915,38	15.490.674,06	5977,37	11.448.934,95	5977,37	11.448.934,95
2	2.7	Cargue transporte y disposición del material resultante de la excavación y nivelaciones (incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado por el supervisor)	m3	270,00	40.153,65	10.841.539,50	270,00	10.841.539,50	270,00	10.841.539,50
SUBTOTAL						117.524.854,27		86.880.556,12		86.880.556,12
ADMINISTRACIÓN						25%	29.381.213,57	21.720.139,03		21.720.139,03
UTILIDAD						5%	5.876.242,71	4.344.027,81		4.344.027,81
TOTAL						152.782.310,55		112.944.722,96		112.944.722,96

Firma: 
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.
Contratista
Consortio IC

Firma: 
Nombre: Joaquín Emilio Zapata Ospina
Supervisor
Municipio de Granada, Antioquia

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA						Página	
						Código:	
						Versión:	
						Fecha:	
PROYECTO:		MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL					
Objeto:		"Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia"				CONTRATISTA:	
SUPERVISIÓN:		Secretaría de infraestructura y vivienda				CONSORCIO IC	
						Contrato de Obra No.	
						138 - 2023	
						Vigencia del contrato	
CAPÍTULO:			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM N°.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Excavación en material heterogéneo (para bordillos y nivelación de la subrasante)				
1	m3	1	PERIODO DEL CORTE:	DEL 17/07/2023	AL	11/08/2023	
			LOCALIZACIÓN	MEDIDAS			
			Subrasante	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD TOTAL
			Placa huella vereda la milagrosa	300,00	6,00	0,17	300,00 300,00
							300,00
Firma:			Firma:				
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.			Nombre: Joaquín Emilio Zapata Ospina				
Contratista			Supervisor				
Consortio IC			Municipio de Granada, Antioquia				

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA						Página	
						Código:	
						Versión:	
						Fecha:	
PROYECTO:		MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL					
Objeto:		"Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia"				CONTRATISTA:	
SUPERVISIÓN:		Secretaría de infraestructura y vivienda				CONSORCIO IC	
						Contrato de Obra No.	
						138 - 2023	
						Vigencia del contrato	
CAPÍTULO:			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM N°.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Suministro, transporte, extendido y compactación del material granular para sub-base				
2	m3	1	PERIODO DEL CORTE:	DEL 17/07/2023	AL	11/08/2023	
			LOCALIZACIÓN	MEDIDAS			
			sub-base granular	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD TOTAL
			Placa huella vereda la milagrosa	300,00	5,00	0,02	22,50 22,50
							22,50
Firma:			Firma:				
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.			Nombre: Joaquín Emilio Zapata Ospina				
Contratista			Supervisor				
Consortio IC			Municipio de Granada, Antioquia				

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA						Página	
						Código:	
						Versión:	
						Fecha:	
PROYECTO:		MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL					
Objeto:		"Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia"				CONTRATISTA:	
SUPERVISIÓN:		Secretaría de infraestructura y vivienda				CONSORCIO IC	
						Contrato de Obra No.	
						138 - 2023	
						Vigencia del contrato	
CAPÍTULO:			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM N°.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en rieles, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.				
3	m3	1	PERIODO DEL CORTE:	DEL 17/07/2023	AL	11/08/2023	
			LOCALIZACIÓN	MEDIDAS			
			Concretos en rieles	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD TOTAL
			Rieles	3,00	0,90	0,15	124,00 52,73
							52,73
Firma:			Firma:				
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.			Nombre: Joaquín Emilio Zapata Ospina				
Contratista			Supervisor				
Consortio IC			Municipio de Granada, Antioquia				

04/07/2023 = SE INICIAN LABORES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA UBICAR PUNTOS ESTRATÉGICOS DONDE DESCARGAR LOS MATERIALES ALMACENADOS,

* SE VERIFICAN CON LA VEREDUNA DE LA VEREDA LA VIGILANCIA LOS PUNTOS DONDE HAY QUE COBRAR LA CERCA DETENDIENDO TODO CLARO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS DONDE SE VA A CONECTAR LAS CERCA.

* SE REALIZAN LOS LABORES CON EL SIGUIENTE PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 RESIDENTE, 1 AYUDANTE DE OBRA, 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

* 10:30 AM. VEEA REVOCA SODOR PASANITA E INICIA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE PLACA HUENA EXISTENTE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30 X 5 X 0,15 = 22,5M³

* 16:00 TERMINA JORNADA LABORAL DE LA PERO PASANITA. HORAS TRABAJADAS POR LA PASANITA: 5,5 H

* TERMINA JORNADA LABORAL DEL PERSONAL A LAS 17:00 HORAS.

Luis Carlos Villanueva
RESIDENTE DE OBRA.
CONSORCIO IC.

Thonatan Noguera
SUPERVISOR ALCALDIA
DE GRANADA ANTIOQUIA

05/07/2023: 07:26 AM. SE INICIAN LABORES CON LA PASANITA REALIZANDO EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y SOBRE ANCHO DE VÍA 100 X 5 X 0,15 M EN PROMEDIO TOTAL 75 M³ DE EXCAVACIÓN APROXIMADAMENTE.

* SE LE INFORMA AL INGB. THONATAN AUXILIAR DEL INGB. JPAQUIN, QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE LA ALCALDIA EL CUAL GRUPO WILSON Y NOSOTROS CONSORCIO IC. HICIMOS UN PRESUPUESTO ESTIMADO BASADO EN LOS 300 M³ DE PLACA HUENA SE SOBRE PASA DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

* SE REALIZAN LABORES CON EL SIGUIENTE PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE DE OBRA, 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DE 7:00 AM. A 5:00 PM.

* LA PASANITA TRABAJÓ DESDE LOS 7:26 AM HASTA LAS 4:00 PM. TOTAL: 9,34 HORAS

* SE LE INFORMA AL INGB. AUXILIAR THONATAN QUE EN EL PROCESO DE EXCAVACIÓN Y SOBRE ANCHO SE EVIDENCIÓ 3 PIEDRAS GRANDES LAS CUALES NO PERMITEN CUMPLIR EN ANCHO ACORDADO DE 5 METROS DE LA VÍA. EL MANIFIESTA QUE LE INFORMARÁ AL INGB. EN CAR SOTO DE PLANTACIÓN MUNICIPAL YA QUE LAS PIEDRAS HAY QUE DEMOLERLAS Y ESA ACTIVIDAD NO ESTÁ CONTEMPLADA EN EL CONTRATO.

Luis Carlos Villanueva
RESIDENTE DE OBRA.
CONSORCIO IC.

Thonatan Noguera
SUPERVISOR ALCALDIA
DE GRANADA ANTIOQUIA

06/07/2023 : 07:30 AM. Pajalta. Pedro Contreras -
Inicia sus labores de sobre ancho y excavación
de 120 ML. VIXO, 25 = 60 M3 de excavación sobre
ancho; C C


* Se le informa por whatsapp al Ing. Jonathan
que el material granular no alcanza a cubrir los
300 metros de plaza nueva, y debido a eso la
plaza nueva quedará sobre el suelo existente.
Con esta situación o garantía de la plaza
nueva no se va a esperar. C

* En el punto cero donde inicia la plaza nueva
el ancho de la vía no cumple con lo proyectado
que son 5 m de ancho, se le informa al
Ing. Jonathan y al propietario de terreno
donde se puede hacer el sobre ancho. El señor
dijo también que se excava 2 m hacia su
terreno para dar ancho de la vía de 5 m.

* Se realizan labores con 4 personas, 2 maas
1 auxiliar, 1 UAE, 1 subviro, 1 ayudante de obra
de 07:00 AM a 5:00 PM. C


* Se reciben 8 M3 de Base Granular en la
obra a las 10:30 AM. Se descarga y se
extiende con la palaneta y ayudante obra
maestro. C


* 4:00 PM. Termina Pedro Pajalta - Totos: 8.5 Horas

CONSORCIO I.C.
PRESIDENTE DE OBRA.

Auxiliar de Infraestructura

Para la compactación del material base granular N12
este se hace con un vibracompactor llamado
Bentini compactador, este será usado hasta lograr
una compactación óptima, esta aprobación del
vibracompactor fue por el secretario de
obras públicas a través del Auxiliar de
Infraestructura.


Adicionalmente para el pedido de los
materiales se encuentra en ese proceso.
El día 05-07-2023 se diligenció la información
y se le ha enviado a la gobernación,
el día 06-07-2023 se recibió en correo
con unas observaciones, cosa que fueron
subsanadas este mismo día. El día
a la espera de una respuesta por
parte de la Gobernación se espera
tener respuesta a más tardar el día
07-07-2023 cuando se tenga una respuesta
por parte de la gobernación se le hace
saber al consorcio I.C. o al Ing. Carlos.
Esta actividad de pedir los materiales
se está realizando de manera intensa
con el fin de no tener que parar
la obra, pudiendo realizar actividades
como instalación de formateo.


CONSORCIO I.C.
PRESIDENTE DE OBRA.


Auxiliar de Infraestructura

* SE LE INFORMA AL INE JUANATAN SOBRE LAS 3 Piedras Grandes que se encuentran en el sobre ancho de la vía, y que están muy superficiales que afectan y estorban, ocasionando parte de la roca y concreto que se van a construir, se le sube a las piedras. Las piedras pero responde que las piedras quedan ahí debido a que no hay más presupuesto autorizado. El Ine Juanatan y el Ine Joaquín informan al Consorcio I.C. que se desvía con el concreto y se les haga un Borllo para salvar o evitar que el agua filtre, o rebese.


Carlos Villanueva
Consorcio I.C.
Residente de obra


Jhonatan Noreña
Auxiliar de Infraestructura

07/07/2023 = 07:00 Se Inician labores con 2 maestros, 2 Ayudante, 1 Residente de obra, 2 Auxiliares I.C., Actividades de sobre ancho y nivelación de vía.

* 08:00 = Inicia labores la retro con 300 or reanuda actividades de excavación, nivelación y sobre ancho.

* 09:48 = Se le envía mensaje por WhatsApp al Ine Jhonatan Noreña preguntando sobre el tema de los materiales, acero y cemento de la obra, el Ine da respuesta que va a consultar con el compañero Juan Noreña.

* 10:20 = Se presentan lluvias en la zona

10:56 AM = Respuesta por WhatsApp del Ine Auxiliar Jhonatan Noreña, que le dice al compañero Juan Noreña que desviación del Formito, que la Gobernación está un poco trabada con el tema pero que ya se están dando solución.

* Se presentan lluvias en la zona desde las 10:20 AM hasta las 10:50 AM.

* 11:25 AM de nuevo se presentan lluvias de 11:25 a 12:00 PM.


* 13:40 = llega Volqueta con 8 m³ de Base Gravel se recibe y se deja a 200 metros aproximado del punto de descarga debido al mal estado de la vía, se transporta con la paletita por volada.


* A las 1:00 PM finaliza labores la retro patata. Trabajo 8 horas.

* Se reanuda 90 ML x 4 x 0.20 de demolición para nueva existente. Total 72 m³.

* Se reanuda 120 x 5 x 0.10 de excavación y Replanteo de vía. Total 60 m³.

* El señor Oscar y su hermano Ute Noreña el Acopio de cambio suena de la Demarcación para su propiedad. Se le informa al Ine Jhonatan Noreña manifestando que no hay problema.


Carlos Villanueva
Residente de obra
Consorcio I.C.


Jhonatan Noreña
Auxiliar de Infraestructura

08/07/2023 = 07:00 AM. SE INICIAN labores de Replanteo de Cunetas y Nivelaciones interiores con 1 maestro, 1 ayudante de obra, 1 residente de obra y 7 Auxiliares HSE.

* El tiempo amaneció muy húmedo debido a fuertes lluvias la madrugada anterior.

* Se retomó excavación Puertillo Inicial de labores a las 07:30 AM. Continuéndose demoliciones, excavación y sobre ancho de vía punto C10.

* A las 11:48 AM. El Ing. Jonathan Noreña informa a través de WhatsApp que no puede subir a la obra debido a que se le movieron los planes con otras obras y que la semana entrante revisará visita de la obra.

* Se finalizan labores con la ferro paganta hasta las 13:30 PM. Total: 6 horas.

* A las 11:29 AM. Informa el Sr. Jelson Givardo propietario de la volquete que transporta la Basa granular que debido a problemas en la planta de trituración se cancela y no hubo suficiente producción entonces no alcanzando a cargar, quedando que el día lunes 10 de junio de 2023.

* Se finalizan labores con el personal hasta las 13:30 PM. 1 residente de obra (1 super) 1 maestro de obra, 1 ayudante, 1 Auxiliar HSE.

Carlos Villarreal Góez
Residente de obra.
Co-ordinador IIC.

Jonathan Noreña
Auxiliar de Infraestructura

09/07/2023 NO SE REALIZARON labores

10/07/2023 = 07:00 AM. SE REANCIAN labores de Transporte Interno, Extendido de 6.5 MS Base granular con 1 maestro, 1 ayudante, 1 Auxiliar HSE, 1 residente de obra. hasta las 17:00 horas.

* A las 09:20 AM. Se reciben 6.5 MS de Base granular en obra.

* En reunión con el Ing. Juan Carlos de la Alcardea se define fecha de entrega de los materiales para el día miércoles 12/07/2023. 680 Mts de cemento, y 2576 Vanillas de 3/8" x 6M.


Jonathan Noreña
Auxiliar de Infraestructura
Juis Carrizosa Villarreal Góez
Residente de obra
Co-ordinador IIC.

11/07/2023 07:00 AM. Se Inician labores de
Arreglo de Fomatorios de madera con 2 maestros
de obra, 1 Ayudante de obra, 1 Auxiliar HSG y
1 Residente de obra. — o — o —

* 07:33 AM, se recibe llamada por WhatsApp
del Sr. Juan Carlos Infante donde que el Camión
con el Acero Vanilla iba llegando a Granada.
También Informa que de las 2,679 Vanillas
han que descargar en la Bodega del Municipio
de Granada 272 Vanillas de 318" x 6 metros.

* 11:15 AM. Se recibe en obra 2,407 Vanillas
de 318" x 6 m. y 272 Vanillas de 318" x 6 m.
Número de Descarga en la Bodega de la
Alcalde de Granada. — o — o —

* El Acero se Descarga con 1 Maestro,
1 Ayudante de obra, 1 Auxiliar HSG, y 1 Residente
de obra, hasta 07:00 PM.


Carlos Villaneda 6067
Residente de obra
Consorcio Ic.


Jonathan Noreña
Auxiliar de Infraestructura

12/07/2023 Se Inician labores con 3 Ayudantes
de obra, 1 maestro, 1 Residente de obra, 1 Auxiliar
HSG, desde las 07:00 AM. hasta las 8:07 PM.
Haciendo Tránsito de 340 bultos de Cemento Pinos.
y Descargando en la obra. VEHICULO QUE DABA EL
Cemento hacia el Suroeste. Vóke Tráque.

* Se Informa al Ing. Jhonatan Noreña de la
Alcalde que el Asambleo para Armar el
Acero no está Contando Procto en los ARS de
Presupuesto Oficial de EVOI. — o — o —

* Llegaron a Tránsito 2 Ayudantes de obra
nuevos, el Sr. Sebastian YEPES, y Yurman
Girardo. de 07:00 AM. a 8:07 PM. Descargando
340 bultos de Cemento. — o —

* La Comunidad de la Vereda La Milagrosa
Organizo Combite con 8 personas de la Comunidad
para el Descarga del Acero el día 11/07/2023 -
y hoy 12/07/2023 para Descargar 680 bultos de
Cemento en la Bodega Temporal Escuela la Milagrosa.


Carlos Villaneda 6067.
Residente de obra.
Consorcio Ic.

Jonathan Noreña
Auxiliar de Infraestructura

13/07/2023 = 07:00 AM. Se Realiza Transporte Interno, con el figurado de varillas de 78 CM. Para Piles, total 560, con 3 Ayudantes de obra, 1 maestro de obra, 1 residente de obra, 1 auxiliar HSE. — o —

* Se Ajustan Formaletas de madera en existencia para tenerlas organizadas para mañana 14/07/2023, con 3 Ayudantes de obra, 1 maestro, 1 residente y 1 auxiliar HSE. — o —

* 11:29 AM. Se informa al Ing. Jonathan Noreña que la disponibilidad de cemento de 2 Rodillos en la zona no hay en el momento, pero hay uno de un Rodillo, y me autoriza en ir a comprar de un Rodillo ya que no hay disponibilidad de otro de mas capacidad. — o —

* Se instala tablonera para el Aislamiento de Formaletas de madera. — o —

* Se informa al Ing. Jonathan Noreña que el Alambre Negro no está contemplado en los Apos. Oficiales. — o — que deben ser suministrados por el municipio pero el Contralor. No lo suministra para que sea comprado.

Carlos Villanreal
Residente de obra
Consejo IC.

Jonathan Noreña
Auxiliar de Infraestructura

14/07/2023 = Se continúa con figurado de FIERE a los Estilos, Ajustamiento de Formaletas. — o —

* 09:40 AM. En Reunión con el Ing. Juan Carlos de obras públicas del municipio de Granada Amolagua. Se firma Acta de Entrega de los materiales - Cemento y Acero que ya están en obra, 680 sacos de Cemento, 2407 ACEROS de Refuerzo Diámetro 3/8" — o —

* Se Realizan labores de figurado de Estilos y Ajustamiento de Formaletas, se cubren con ACEITE quemado, con 3 Ayudantes, 1 maestro, 1 auxiliar HSE, 1 Residente de obra. — o —

* 16:15 PM. Se recibe 8 M³ de arena para concreto en obra. — o —

* 15:40 PM. Se Atiende visita en obra del Ing. Jonathan Noreña, revisando y definiendo que los Ensayos de cilindros de concreto se deben realizar en los primeros Vaciados para ver como está la dosificación de los Agregados. — o —

* 10:30 AM. En Reunión con el Ing. Jonathan Noreña se define que los siguientes puntos se activarán con el Ing. Joaquín Zapata en contra Alambre Negro, Demolicion. — o —

Carlos Villanreal
Residente de obra,
Consejo IC.

Jonathan Noreña

15/07/2023 = Se Reciben 16 M³ de Piedra Rasón
de 3 A 6" y de 6 A 12" — o — o —

* Se Reciben 8 M³ de Arena Para Concreto
y 8 M³ de Triturado 3/4" — o — o —

* Se Continúa Transporte Interno, Corte y Aligado de
Acero Para Estribos, con 2 Ayudantes de obra —

* Se Recibe Vibro Compactador de un Cilindro a
Gasolina — o — o — o —

* Se Compacta Area de 300 ML x 5 de Ancho
quedando lista para Armar Formateo. — o —

* Se Recibe una mezcladora de concreto de
2 bultos a Diesel — o — o —

* Se Curan 70 Formales de 3 x 0,15 con Aceite
quedando con 1 Ayudante — o —

* Las labores se Reciben con 3 Ayudantes,
1 maestro, 1 Auxiliar HSE y 1 Residente de
obra de 07:00 AM a 15:00 PM. — o —

* Se Arman 15 Vigas Rostros de 5 Metros

Juan Carlos Villanueva
Residente de obra
Consorcio IC.

[Signature]

16/07/2023 = 07:00 AM. Se Inician labores de
Instalación de Formateos en sitio para Fundir
con 3 Ayudantes de obra, 1 maestro, 1 Auxiliar
HSE, 1 Residente de obra. — o — o —

* 15:00 PM. Se Terminan labores de Formateo
hecho con 3 Ayudantes de obra, 1 maestro de
obra, 1 Auxiliar HSE, 1 Residente de obra. — o —

* Se cierra vía desde punto cerro hasta el
punto de la Escuela para poder Realizar
las actividades, También se le informa a las
autoridades sobre el cierre temporal de la vía.

* Se deja todo listo para mañanera, Alambres,
y Formateos listos instalados para la Fundición
de la de manifiesto. — o — o —

Juan Carlos Villanueva
Residente de obra
Consorcio IC.

[Signature]

17/07/2023 = 07:10 AM. El Sr. Víctor
de JC Aguilar de Equinos se lleva el Vibro
Compactador de un Cilindro sin novedades.

* 12:05 PM. Se Reciben 8 M³ de Triturado 3/4"
en Volquete Benalla. — o — o —

* Se Gira como Ayudante de obra el Sr. Víctor
Aguilar Velez 17/07/2023. — o — o —


* 07:00 AM: Se inicia labores de Arreglo y arreglo
Camin de Fombreros, —————

* 08:03 Se inicia Fundición de Proca de Empedrado
de $30 \times 0.90 \times 0.15$ y $30 \times 0.40 \times 0.15$. —————
Con 4 Ayudantes de obra, 1 Peón de obra,
1 Maestro de obra, 1 Auxiliar HSE, Hasta las
12:00 PM. —————

* 08:56 Puntos: 101 Placas de Empedrado de 30×0.90
 $\times 0.15$ m. y 21 Placas de Empedrado de $30 \times 0.40 \times$
0.15 m. Total: 30 ML. —————

* Se gastaron 61.5 Bultos de Cemento Arco

* Se da 61 Mts. Señalada y delimitada
con cinta de color. —————


Luis Carlos Umanzor
Presidente de obra
Comunidad Ec.

18/07/2023 = 07:30 AM. Se Reciben 360
Bultos de Cemento en 2 Camiones
con Personal de la Comunidad Ayudo
a Recargar el Cemento. —————

* 07:00 AM. Se Realizan labores de Arreglo
Asfalto para Huellas y Paralelas, Para Fundi-
ción. 19/07/2023. —————

* 14:01 PM: Se entregan al laboratorio de
Suelos RAR Análisis 200 KG de Tiltado $3/4$
200 KG de Arena, y Bulto de Cemento 100
para Diseño de mezcla 3000 PS. Se firmaron
que Resultados en 15 Días. —————

* Visita de obra

Fecha: 18/07/2023
Hora: 17:00.

Situación encontrada:
Personal en labores de figuración de acero
en franjas de rieles y conetas.
Se encuentra 30 m de placa vaciada con
2 franjas de 30×0.90 m. y 2 franjas de con-
creto ciclópeo de 30×0.40 m.
Se tiene la variante nivelada, conformada
y compactada en toda la longitud a intervenir.
Se hallan 2 rocas de gran tamaño en el
costado izquierdo en sentido ascendente,
en la cota $100 +$. No se toma aún
ninguna decisión sobre esta situación hasta
evaluar alternativas.
Se halla en la obra acopiado la mayor parte
del cemento aportado por la Gobernación y
la totalidad del acero también aportado
por la Gobernación.
La comunidad aporta un trabajador como
a la obra, en cumplimiento a lo acordado en
la socialización y para los vacíos gran-
des, apoya la comunidad con 3 o 4 albañi-
tes.

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES.

1. La piedra utilizada en el concreto ciclo por debe ser lavada de manera que quede libre de finos para que tenga mayor adherencia, dado que estamos en este rodado, proveniente de cantera.
2. La profundidad de las vigas - Reostros debe ser de 0.25 m.

[Signature]
Residente de obra
Consejo IC.

[Signature]
Supervisor
Obras Públicas

18/07/2023 07:00 Am. Se inicia Fundida de Arena y concreto 30 MTS lineales, con 1 maestro de obra, 1 residente de obra, 2 Auxiliares Hdg, 3 Auxiliares de obra, y 4 personas de Aparte de la comunidad la millabrada.

* 11:30 Am. Se reciben 8 M³ de Arena para concreto, en una Volquete sencilla.

* Se reciben 6 cementos y 1 bulto de 1/2" Hdg para muestra de concreto.

* 17:05 PM. Se hacen 6 muestras de concreto con dosificación 3 partes arena, 4 partes de triturado 3/4" y 1 bulto de cemento negro.

* Se realizan labores de Fundida con 3 Auxiliares de obra, 1 Auxiliar Hdg, 1 maestro de obra, 1 residente de obra.

* La Comunidad de la millabrada Aparte 3 personas para la Fundida.

* Se Realizan Labores con 1 maestro y 2 Auxiliares Hdg a las 08:00 PM. Fundiendo -

* Se Fundieron 23 METROS lineales de concreto X 2 = 46 MTS lineales.

* Se Fundieron 23 METROS lineales de Huellos de 190 X 2 = 46 METROS lineales.

* Se Gastaron 101 bultos de cemento negro.

[Signature]
J. Campos Villanueva
Residente de obra
Consejo IC.

[Signature]
Roratan Dorena
Auxiliar Obras Públicas

20/07/2023 09:45 AM. Se inicia Fundida con 2 Auxiliares, 1 maestro, 1 residente de obra, 2 Auxiliares Hdg.

* Se reciben 8 M³ de Arena para concreto y 8 M³ de triturado 3/4" .

* 4:03 AM. Se Finanza Fundida de 9.83 METROS lineales de Huellos X 0.90 X 2 = 17.70 M² X 0.15 M = 2.65 M³

* Se Funden 9.83 METROS lineales X 0.25 X 2 = 14.74 M² X 0.15 M = 2.22 M³

* Se Pese en 3 Ayudante, 1 Maestro y Auxiliar ASE, 1 Residente de obra, Trabajaron desde las 07:00 AM hasta las 16:00 horas. —

* Se Gastaron 32 bultos de Cemento. —

Julio Cesar Villanueva
Residente de obra.
Consejo IC.

Jonathan Noreña
Auxiliar Obras Públicas

21/07/2023 Se Realizan trabajos de Formateo de 50 metros lineales de Empedrado Ciclopeo con 1 maestro de obra, 3 Ayudantes de obra, 1 Residente de obra, y Auxiliar MSE. — de 07:00 AM hasta las 18:00 PM. —

* Se Realizan 2 viajes de material 3/4" 8 m³ cada uno. —

* Se Realizan 8 m³ de Arena y viaje. —

* Se hacen cilindros de concreto en agua para hidrantes y/o curules. —

* Se Empedra que se hizo ayer con 0.90 y 0.40 de arena ambas medidas. —

Julio Cesar Villanueva
Residente de obra
Consejo IC.

Jonathan Noreña
Auxiliar Obras Públicas

22/07/2023 Se Funden 14 Placas de Empedrado Ciclopeo de 3x0.90x0.15. —

* Se Funden 27 Placas de Empedrado Ciclopeo de 3x0.40x0.15. —

* Se Gastaron 62.5 bultos de Cemento. —

* Se Realizan trabajos con 1 maestro de obra, 3 Ayudantes de obra, 1 Residente de obra, y Auxiliar MSE, de 07:00 AM a 17:00 PM. —

* La Comunidad Apunta 6 Obieros para la Fomda. —

Julio Cesar Villanueva
Residente de obra
Consejo IC.

Jonathan Noreña
Auxiliar Obras Públicas

23/07/2023 = 07:00 AM: Se Inician trabajos de quitar Formateos de Empedrado y Organizar todo para Armar Panillas en Huella y Conchas. —

* Se trabaja hasta las 12:00 PM. con 1 maestro de obra, 1 Auxiliar MSE, 2 Ayudantes de obra. —

Julio Cesar Villanueva
Residente de obra
Consejo IC.

Jonathan Noreña
Auxiliar Obras Públicas

24/07/2023 = 07:00 AM. Se Inician labores de transporte interno, corte y fiburado de acero para estibas vigas, vigas, vigas. — 0 con 2 maestro y residente de obra, 1 auxiliar HSE, 3 Ayudante de obra. — 0 — 0 — 0

* El día de hoy se entregan 3 cilindros para reventar a los 7-14-28 días, laborado en reventada y Girsoranta. Racer. — 0 — 0 — 0

* Se recibe visita del Ing. Invarian Vazquez revisando Entendidos y Pisos ya Fundidos.

* Se Trabajaron de 07:00 AM. Hasta las 12:00

* Se Recibe 1 Ulate de Arena para concreto 8 m³. — 0 — 0 — 0

* 16:00. En Reunión en la Alcaldía con los Ingenieros Donato Zapata y Invarian Vazquez se habla de cambiar Posición 123 a 1-3-3 pero el Ing. Donato Zapata Define que la Direccion tiene que estar como se viene manteniendo 1-2-3. — 0 — 0 — 0

Juan Carlos Villanar
Residente de obra
Consejo IC.

[Handwritten signature]

25/07/2023 = Se Realizan labores de Traslado de 360 bultos de cemento en el Santuario y Deslar que del mismo en la obra, 4 Ayudantes de obra y maestro de obra, 1 Auxiliar HSE, 1 Residente de obra, de 07:00 AM. Hasta las 14:05 horas.

* De 14:05 horas se Realizaron labores de Instalación Formales, transporte interno, corte y fiburado de acero para huecos y cunetas hasta las 19:00 PM. con 4 Ayudantes, 1 Auxiliar HSE, 1 maestro de obra, 1 Residente de obra. — 0 — 0 — 0

* Se Reciben 360 bultos de cemento en el Santuario. — 0 — 0 — 0

* Se Reciben 8 m³ de triturado 3/4" en 1 Ulate de Volqueta SENA. — 0 — 0 — 0

* Inicia labores 1 Ayudante nuevo, J. G. Fuentes Garcia. — 0 — 0 — 0

* La comunidad de la Vereda la Milagrosa Apoyó para el Descargue del cemento 4 personas. — 0 — 0 — 0

Juan Carlos Villanar
Residente de obra
Consejo IC.

[Handwritten signature]

26/07/2023 = Se Presentan Fichas 11:00 AM desde las 07:05 AM. Hasta las 10:40 AM. No permitiendo realizar labores, 2 maestro, 2 Auxiliar Hse, 1 Residente de obra, 4 Ayudantes de obra, y 5 personas de la Comunidad esperando para comenzar Fundida.

* 11:03 AM. Se Inicia Fundida con 4 Ayudantes, 1 maestro, 2 Residente de obra, 1 Auxiliar Hse.

* La Comunidad Ayuda para la Fundida 2 personas.

* 7:00 PM. Finaliza Fundida con 2 maestro, 1 Auxiliar Hse, 4 Ayudantes de obra, 1 Residente de obra, y 3 personas que la Comunidad Ayuda para la Fundida.

* Se Funden 10 Cuadros de Huecos de $3 \times 0,90 \times 0,15$.

* Se Funden 10 Cuadros de Cunetas de $3 \times 0,75 \times 0,15$.

* Se Funden 5 Vigas Rostros de $5 \times 0,20 \times 0,25$.

* Se Castaron 65,5 bultos de Cemento Arbol.

* Se Inicia Dado una Cunetas y se Amalgaman con el personal de 10:35 AM. Hasta las 10:53 AM.

* Nota: Para el día de mañana 27/07/23, se Funden el resto de Huecos y Cunetas Faltantes y a las 07:00 AM hasta las 07:00 PM.

Juan Carlos Villarreal
Residente de obra
Consorcio Ic.

27/07/2023 = 07:00 AM. Se Realizan labores de Fundida de Empedrado y Huecos de 07:00 AM. Hasta las 17:00.

* Se Funden 4 Cuadros de Empedrado Ciclópeo de $3 \times 0,90 \times 0,15$.

* Se Funden 5 Cuadros de Empedrado Ciclópeo de $3 \times 0,40 \times 0,15$.

* Se Funden 6 Cuadros de Huecos de $3 \times 0,90 \times 0,15$.

* Se Funden 6 Cuadros de Cunetas de $3 \times 0,75 \times 0,15$.

* Se Funden 3 Vigas Rostros de $5 \times 0,25 \times 0,20$.

* Se Castaron 54 bultos de Cemento Arbol.

* Se Reciben 2 Volajes de material Abonado Arena y Triturado $3/4"$.

* Se Realizan las Actividades antes mencionadas con 2 maestro, 4 Ayudantes de obra, 1 Auxiliar Hse, 1 Residente de obra, de 07:00 AM hasta las 5:00 PM.

Juan Carlos Villarreal
Residente de obra
Consorcio Ic.

28/07/2023 - Se Reciben 2 Volúmenes de Abogados
1 de Araya, 1 de Invernado 34" - Total 16 m/3 -

* Se Funden 4 Cuadros de Enladrado Cúchico
de 3X0,40X0,15 - 0 0 0

* Se Gastaron 6 Bultos de Cemento Arco -

* Se Continúa con Transporte Interno, Corte y
Fletrado de Aceros para Tramo de Huevos y
Cunetas 30 metros aproximadamente -

* Notar: El Presidente de la Y.A.C. la Millabros
Informa que para mantener el combate Alado
para la Pampa solo va una persona debido
a que van para el estudio de una persona
Vecina de la Comunidad -

* Se Realizan trabajos desde las 07:00 AM.
hasta las 18:00 Horas con 1 Maestro de
obra, 5 Ayudantes de obra, 1 Residente de obra,
1 Auxiliar HSE, - 0 0 0

* Se Continúan 3 Ayudantes de Sanitización de
la Pampa AM. hasta las 16:00 Horas - 0

José Carlos Villanar
Residente de obra
Consejo Dc.

29/07/2023 - Se Funden 12 Volúmenes de
3X0,90X0,15. - 0 0 0

* Se Funden 12 Cuadros de Cunetas de
3X0,75X0,15. - 0 0 0

* Se Realiza, Fundida con 1 Maestro de
obra, 1 Auxiliar HSE, 1 Residente de obra,
8 Ayudantes de obra, - 0 0 0

* Se Funden 5 Volúmenes de 5X0,25X
0,20 - 0 0 0

* Se Gastaron 57,5 Bultos de Cemento
Arco. - 0 0 0

* Se Realizaron trabajos de 07:00 AM. hasta
las 5:00 PM. 1 maestro, 3 Ayudantes de
obra, 6 Res de Personal Trabajo hasta
las 12:00 PM. - 0 0 0

José Carlos Villanar
Residente de obra.
Consejo Dc.

30/07/2023: NO SE REALIZARON TRABAJOS.

31/07/2023: SE REALIZA FUNDIDA DE 8 PLANTAS
DE $3X0,40X0,15$.

* SE FUNDEN 8 CUADROS DE CEMENTO DE
 $3X0,45X0,15$.

* SE FUNDEN 4 VIGAS REFORZADAS DE $5X0,25X0,20$

* SE CASTORON 44 BULTOS DE CEMENTO AGR

* SE FORMATEARON 30 m² DE EMPEDRADO PARA
SE FUNDIDA LA PIA DE MANTENIMIENTO DE AGUERO
DE 2023.

* SE RECIBE 1 VIGAS DE TITULADO $3/4$ "
DE 8 M³.

* SE REALIZAN TRABAJOS DESDE LAS 09:00 AM.
HASTA 5:00 PM. CON EL APOYO DE OBRAS
Y MAESTRO DE OBRAS Y AUXILIAR M³, Y
RESIDENTE DE OBRAS.

* NOTA: EL SEÑOR ALVARO VELAZQUEZ NO TRABAJÓ
EL DIA DEL HOY 31/07/2023.

* A LAS 05:00 PM. SE RECIBE UNA CARTA DEL SUPLENTE
DEL INGENIERO CARLOS VILLANEA.

Carlos Villanea
Residente de obra
CENSAO DE

31/07/2023.

Se realiza visita a la obra.

Situación encontrada: siendo las 16:50, se encuentra en la obra, el personal, operando las actividades de encofrado para fundir concreto ciclopeo en centro y sobre-anchos. En horas de la mañana, realizaron vaciado de concreto en huecos y cuneta en un tramo.

Acción realizada:

Se encuentra una roca que impide conservar el espesor de la estructura (0.15 m), en una pequeña sección de la franja principal del ciclopeo.

Para esta situación se recomienda dejar una parte de la roca, a la vista porque el nivel no permite conservar el espesor. Y en la sección que permite mantener un espesor mínimo de 0.07 m, colocar una malla de refuerzo y utilizar en este punto una mayor densificación del concreto (1:2:2), para garantizar resistencia.

OBSERVACIONES:

1. En la nivelación de la roca, mantener y garantizar los espesores de concreto.

Superintendente
Obras Públicas
Supervisor.

01/08/2023 = 01:05 AM Se recibe visita de obra de Ing. Juan Carlos Novena, en compañía de los Ingenieros de la Gobernación de Antioquia: Jairo y Sebastián, encontrando todo normal según proceso constructivo. La Recomendación que dan es en Paisasismo en la parte lateral derecha e izquierda.

* Se recibe 1 Ulate de Jilmo 3/4" de 8 m³

* Se funden 25 Cuadros de Empedrado de 3x0.40 x 0.15 m.

* Se funden 12 Cuadros de Empedrado de 3x0.90 x 0.15 m.

* Se gastaron 55 Dulos de Cemento Atica.

* Se realizan Actividades con 8 Ayudantes de Obra, 1 Maestro de Obra, 1 Auxiliar A.S.E., 1 Residente de Obra, de 07:00 AM hasta las 05:00 PM.

* Se Formatearon 4 Cuadros de Empedrado de 3x0.90 x 0.15.

* Se Formatearon 8 Cuadros de Empedrado de 3x0.40 x 0.15.

* Se recibe 1 Ulate de Jilmo 3/4" de 8 m³ Razon de

Juan Carlos Villaverde
Residente de obra
CONCEJO DE

02/08/2023 = Se Realizan labores de 07:00 AM hasta las 5:00 PM con 1 maestro de obra, 5 Ayudantes y 1 Auxiliar HSE, 1 Peonate de obra.

* Se Ponen 18 Cuadros de Empedrado de $3 \times 0,40 \times 0,15$.

* Se Funden 9 Cuadros de Empedrado de $3 \times 0,90 \times 0,15$.

* Se Gastaron 16 Bultos de Cemento Acos.

* Se Formatearon 18 Cuadros Empedrado Ciclopeo de $3 \times 0,40 \times 0,15$.

* Se Formatearon 9 Cuadros Empedrado Ciclopeo de $3 \times 0,90 \times 0,15$.

Julio Cesar Villalba
Residente de obra
Consorcio FC

[Signature]

03/08/2023 = Se Realizan labores de Fundición con 1 maestro de obra y Residente de obra, 1 Auxiliar HSE, 8 Ayudantes de obra, entre ellos 1 de la Comunidad.

* Se Reciben 2 Ulatas de material Abreboza 8 M3 de Plástico y 8 M3 de Arena para Concreto.

* Se Funden 12 Cuadros de Empedrado Ciclopeo de $3 \times 0,40 \times 0,15$ M.

* Se Funden 6 Cuadros de Empedrado Ciclopeo de $3 \times 0,90 \times 0,15$ M.

* Se Gastaron 32,5 Bultos de Cemento Acos.

* Se Realizan labores de Transporte Interno, Corte, Fibrado, Armado y Ancho de Acero en Viga.

* 2:45 PM. En Feb. Juvenara Nureña Realiza visita de obra.

Julio Cesar Villalba
Residente de obra
Consorcio FC

[Signature]

04/08/2023 = Se Realizan labores de
07:00 AM. hasta las 6:00 PM.

* Se Realiza labores de transporte
interno, corte, flujado, colocado y amarrado
de acero, en RIGLO, y Cimentas de 5 Mts. Aproximada
de 24 Cuadros de RIGLO y 24 Cuadros
de Cimentas.

* Se labora con 1 maestro de obra,
1 residente de obra, 1 auxiliar H.S., 4
Ayudantes de obra y 5 Ayudantes de
H.S. del Sindicato de 7:00 AM.
hasta las 18:00 Hrs.

* ~~Carlos Villanueva~~
~~Residente de obra~~
~~Consorcio S.C.~~

05/08/2023 = En Ayudante de obra Jorge Luis
Puentes labora hasta las 20:00 AM.

* 07:40 AM. Se realiza FUNDIDA de RIGLO y
Cimentas con 4 Ayudantes del Sindicato, 4 Ayudantes
de obra - Consorcio S.C., 1 maestro de obra
y auxiliar H.S., 1 residente de obra y 5
Ayudantes de la comunidad de milicianos.

* Se Funden 18 Cuadros de RIGLO de 3X0.90 X
0.15 M.

* (Se Funden 18 Cuadros de Empedrado 3X0.40 X 0.15)

* Se Gastaron 117 Litros de Cemento Ancho.

* Se Funden 2 Cuadros de Empedrado 3X0.40 X 0.15

* Se Funden 18 Cuadros de Cimentas de
3X0.90 X 0.15.

NOTA: JESSÉ LUIS FUENTES TRABAJA hasta las 10:00 AM.

~~Carlos Villanueva~~
~~Residente de obra~~
~~Consorcio S.C.~~

06/08/2023 = NO SE Realizaron labores.

07/08/2023 = Se Funden 8 Cuadros de Empedrado
de 3X0.40 X 0.15 M.

* Se Funden 4 Cuadros de Empedrado de
3X0.90 X 0.15 M.

* Se Realizan labores de corte, flujado y amarrado
de acero en Vigas Ríostus.

* Se Realizan labores de 07:00 AM. hasta las
4:00 PM. con 1 maestro de obra, 1 residente de
obra, 1 auxiliar H.S., 4 Ayudantes de Sindicatos
y 2 Ayudantes del Sindicato.

* Se hacen 6 cilindros de Segundo punto de
1.00 metros de fijación. 1-2-3.
Hasta 4:00 PM.

* Se realizan labores de transporte interno
de materiales a los abederos

José Villaverde
Presidente de obra
Comunidad IC

[Signature]

08/08/2023:

* 07:00 AM. Hasta las 10:20 AM. Disponibilidad
de 4 obreros y 1 residente de obra, esperando que
llegara el vehículo y PM 158 el cual tenía que
llegar a las 07:00 AM y llegó a las 10:20
AM.

* 10:25 AM. A 11:49 AM. Se realiza traslado
de 288 sacos de cemento a los con 4 ayudantes
de obra.

* 12:35 PM. A 1:20 PM. Los Carques de 288
bultos de cemento a los en la obra, con 6
ayudantes de obra, 1 maestro de obra.

* Se reciben 188 bultos de cemento a los
en obra.

* Nota: de nuevo la comunidad quedó mal
con el Carque y rescate de los Cemento -
Ninguna persona de la comunidad hizo presencia
en la obra, el sector presidente de la
Junta de Acción Comunal de la Ureda de
militancia se le informó a los miembros de la
comunidad que ninguna persona
se le informó a los miembros de la Ureda y a los miembros de la Ureda.

* Se realizan labores de 07:00 AM hasta
las 5:00 PM.

* Se realizan labores de transporte interno
de materiales y Armado de ACEROS en vigas,
rieles y columnas. Con 8 Alcantarales de obra,
1 Maestro de obra, 1 Residente de obra,
1 Auxiliar ASE.

* Se recibe visita de obra a las 3:30 PM.
del Ing. Jonathan Noreña.

* 5:30 PM. En Ing. Jonathan Noreña, SE
reune con la Comunidad de la Ureda para
hablar y aclarar temas de porque no están
cumpliendo el trabajo de los combites para la
vacantes e ingresos de cemento.

José Villaverde
Presidente de obra
Comunidad IC

[Signature]

09/08/2023: Se funden 16 cuadros de Rieles de
3X0,90X0,15 M.

* Se funden 16 cuadros de combites de 3X0,75X0,15

* Se funden 7 vigas rieladas de 5X0,20X0,25

* Se castan 90 bultos de cemento a los

* Se realizan labores de 07:00 AM. Hasta
las 5:00 PM. Con 1 maestro de obra,

4 Ayudantes de obra Indígenas y 2 Ayudantes de obra, Indígenas - Total 8.
1 Residente de obra, 2 Auxiliares HSE

* Se Recibe 4 Urdas de Arena de 18 m³.

* 4 Personas de la Comunidad Asesores a las 07:00 AM a 5:00 PM.

J. S. Camp V. Naranjo
Residente de obra
Consejo IC

10/08/2023, Se Funden 8 Cuadros de Riego de 3x0,90x0,15 m.

* Se Funden 8 Cuadros de Concreto de 3x0,95x0,15

* Se Funden 12 Cuadros de Empedrado de 3x0,90x0,15

* Se 4 Cuadros de Empedrado de 3x0,90x0,15

* Se Funden 6 Vigas Prolong. de 5x0,20x0,25

* Se Gastosen 515 Bultos de Cemento

* Se Reanuda labor de 07:00 AM. Hasta las 11:00 PM. con 1 maestro de obra y 4 Auxiliares HSE, 2 Residentes de obra, 4 Ayudantes de obra.

* 09:00 AM. Reunion Comite de Obra con el Ing. JOAQUIN ZAPATA, Ing. JOSE GUILBERT ALCAIDE del municipio de Coronado.

J. S. Camp V. Naranjo
Residente de obra.
Consejo IC

11/08/2023: Se hacen Transporte Interno, Corte, Fibrado, Amate de ACERO EN PIELES Y CUNETAS, 26 Cuadros de PILES, 26 Cuadros de CUNETAS, 13 Vigas Prolong.

* Se Reanuda labor de Amate de ACERO con 1 maestro de obra, 2 Auxiliares HSE, 1 Residente de obra, 4 Ayudantes de obra.

* Se Hecan al laboratorio de suelo. Refor. Ingenieria, 3 cilindros vacados el dia 7/8/2023, para Follari a los 7-14-28 Dias. Follari 1-2-3-210

* Se Toman medidas para corte de obra con el Ing. Jhonatan Naveira, 195 Metros Distant de Plaza Nueva completo con Cuneta, Ciclos, solera anchos, PILES, Vigas Prolong. Asi: - 62 Cuadros de CUNETAS de 3x0,95x0,15 x 2=124 Cuadros de CONCRETO.

- Solera ancho = $124 \times 3 \times 0,90 \times 0,15 \text{ m} = 23,436 \text{ m}^3$

- Concreto = $62 \times 3 \times 0,90 \times 0,15 \text{ m} = 26,3655 \text{ m}^3$

- Placas = $3 \times 0,90 \times 0,15 \times 124 = 52,731 \text{ M}^3$

- Vigas Planta = $5 \times 0,20 \times 0,25 \times 61 = 16,0125 \text{ M}^3$

* Se trabajó de 07:00 AM. Hasta 6:30 PM.

José Carlos Villanueva Goez
Residente de obra,
Consorcio I.C.

12/08/2023. Se Funden 26 Cuadras de
Placas de $3 \times 0,90 \times 0,15$

* Se Funden 26 Cuadras de Curbetas de
 $3 \times 0,75 \times 0,15 \text{ M}$.

* Se Funden 12 Vigas Prostradas de $5 \times 0,20 \times 0,25$

* Se Gastaron 128 Bultos de Cemento Arbo.

* Se Realizaron labores de Oficio AM hasta
las 5:00 PM. Con 1 maestro de obra, 1
Residente de obra, 1 Auxiliar HSG, 14 Ayudantes
de obra, 3 Ayudantes de obra de saneamiento,
7 Polvoreros Apoyados por la Comunidad
Plan de Fomento

José Carlos Villanueva
Residente de obra,
Consorcio I.C.

Domingo 13 de Agosto de 2023.

* No se Realizaron labores.

JUNES 14/08/2023:

* Se Armaron 13 Cuadras de Formigón para
Empedrado Centro.

* Se Armaron 26 Cuadras de Formigón para
Empedrado Sobre ANCHO.

* Se Realizaron labores de Transporte Interno,
Corte, Fibrado, Armar de ACERO en Vigas Rebar
Totales 20 Vigas.

* Se Realizaron labores de Oficio AM hasta
las 5:00 PM. Con 1 maestro de obra,
1 Residente de obra, 1 Auxiliar HSG,
4 Ayudantes de obra.

* Se Recibe 8 M³ de Arena para Concreto
(Z. U. A. G.)

José Carlos Villanueva
Residente de obra,
Consorcio I.C.

15/08/2023

Visita de obra. # 15:20

Situación encontrada: personal laborando en diferentes actividades:

1. Vertido de concreto ciclópeo.
 2. Forjación de acero.
 3. Medición para vertido de concreto ciclópeo.
- Se estima un avance de obra del 66%, equivalente a 200 ml.


ACCIONES REALIZADAS:

1. Se ha recorrido por la obra en compañía del Residente de obra Ing. Luis CARLOS VILA REAL, Analizando algunas situaciones como:

1.1. En el sitio de la obra transversal ubicada de la escuela hacia arriba, se acordó en las primeras visitas, adicionar 2 tubos de concreto de 24" uno en cada extremo de la obra con el fin de acondicionar la zecaván de la vía a los 5.0 m. Para este fin, la comunidad solicitó al municipio de Granada, el préstamo de la Retro excavadora para hacer la excavación. Esto no fue posible porque no se tiene operador disponible. Se inspeccionó la zona y se concluyó que no es necesario utilizar máquina, llegando al acuerdo de realizar esta excavación manualmente y el contratista aporta la mano de obra y el material para colocar, atracar y anillar los 2 tubos.


1.2. Se observó el acabado de la placa huella y la cuneta en el sitio donde se encontraba la roca mostrando alto relieve con relación al nivel de la placa. El contratista otorgó la recomendación dada por la supervisión para superar el caso.

1.3. Llegando al punto Cero (arranque), se evidenció que aún falta una longitud de 9.0 m. aproximadamente. Se le hizo observación sobre la forma de rematar la placa-huella contra la rasante de la vía destapada.

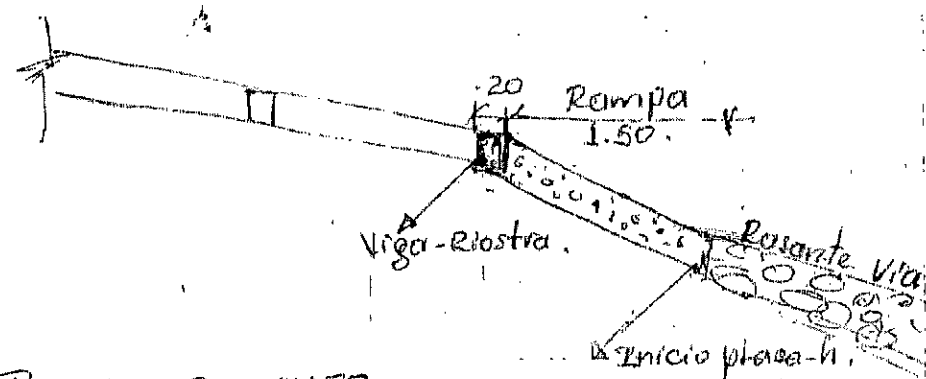

RECOMENDACIONES:

1. Recordar que los espesores de los concretos deben cumplir la especificación técnica 0.15m.
2. En la obra # 1 ubicada en el arranque o punto 0, debe vaciarse un cordón de $0.20 \times 1.40 \text{ m} \times 0.15$ de espesor con enclaves para conformar entrega de la cuneta a la obra $\rightarrow$ esto, en el borde superior de la placa y en el descole o sea en el otro extremo, descargar también la cuneta a la obra, mediante un pequeño dissipador.

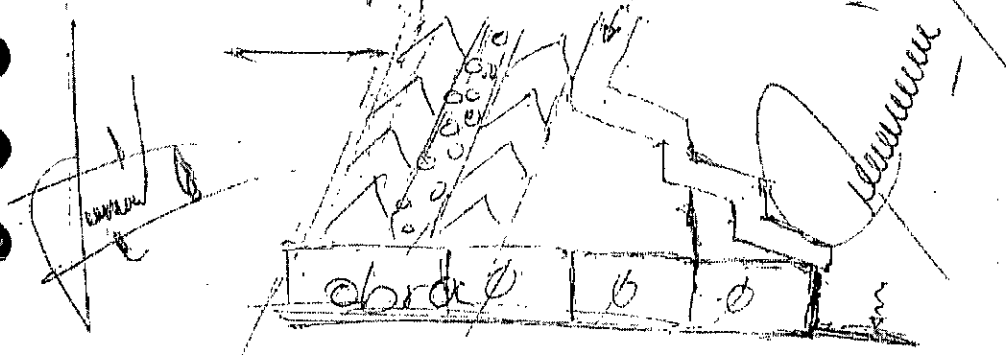

11/08/2023: Se Funden 20 Cuadras de
Empedrado. Cuidado de 3x0,40x0,15 m.


* Se Funden 19 Cuadras de Empedrado de
3x0,90x0,15 m.

* Se Reanuda labores de Fundida con
8 Ayudantes, 2 maestros de obra, 2 residentes
de obra, 1 auxiliar HSE,

* Se reanuda de inicio con hasta 19
5100 por

* 3:07 pm - Se recibe visita del FAL
Joaquín Zapata.

* Se Cuentan 147 Bultos de Cemento
Arco


Luis Carlos Villanov
Residente de obra.
Consejo Fc.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Radicado N°: 002831

Código Asunto: 5001903

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES

Fecha: 24/08/2023 Hora: 02:00

ALCALDIA MUNICIPAL NIT 901.195.803-2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 52 B 55-45 TO 7 AP 902

Firma: CONSORCIO IC Tel: (601) 7583897

Bogotá - Colombia
pdicumbre@gmail.comFactura electrónica de venta
No. FE 5

Señores Municipio de Granada, Antioquia
NIT 890.983.728-1 **Teléfono** (604) 8320549 - Ext. 000
Dirección Calle 20 No. 20 - 05 **Ciudad** Granada - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 16/08/2023, 13:46
Expedición 18/08/2023, 15:46
Vencimiento 16/08/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Total
1	Excavación en material heterogéneo (para bordillos y nivelación de la subrasante)	m3	300.00	7,176,924.00
2	Suministro, transporte, extendido y compactación del material granular para sub-base	m3	22.50	5,162,884.65
3	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en rieles, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	52.73	18,905,733.00
4	Vaciado de concreto ciclópeo en entre rieles y sobre anchos. Resistencia del concreto 210 kg/cm2, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	49.80	10,952,169.38
5	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en cunetas, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento es suministrado por el municipio suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	43.94	15,963,739.90
6	Vaciado de concreto de 210 kg/cm2 en vigas riostras, incluye suministro y transporte de los agregados para la correcta elaboración del concreto a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el cemento es suministrado por el municipio suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	m3	16.01	6,428,630.74
7	Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo G-60, a entera satisfacción de la supervisión. Nota: el acero suministrado por el municipio será transportado por el constructor desde el municipio hasta el lugar de ejecución.	kg	5,977.37	11,448,934.95
8	Cargue transporte y disposición del material resultante de la excavación y nivelaciones (incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado por el supervisor)	m3	270.00	10,841,539.50

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Ciento doce millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintidos pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 112,944,722.96

Observaciones:

CONTRATO 138 DE 2023. OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria MINITAS - LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA

DATOS BANCARIOS
 CUENTA AHORROS No. 101-964473-48
 BANCOLOMBIA
 A NOMBRE DE CONSORCIO IC.

Porcentaje de participación de los miembros:

PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE SAS - NIT 900.868.183 - 10%
 INGECIA SAS - NIT 830.506.982 - 90%

Total Bruto	86,880,556.12
Administración 25.00%	21,720,139.03
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	4,344,027.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	112,944,722.96

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 530.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica por el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización 18764044021630 aprobado en 20230207 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 73c98ac7b30f5432ce0cd66872ca0d37b29f496bcbceb7111fc59b22e859a8fdc04ad399b2f3de879003be985eb35f2a

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901195803	2	CONSORCIO IC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Vereda la milagrosa	GRANADA-ANTIOQUIA	7583897	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	105521882	9454937927	E	2023/08/02	2023/08/16	BANCO DAVIVIENDA	14	\$1,838,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC /	Aporte %	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					\$5,838,668	\$934,700			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$406,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)					\$5,838,668	\$934,700			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$406,700		\$0	\$0	
Ciudad: GRANADA Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)					\$5,838,668	\$934,700			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$406,700		\$0	\$0	
1	CC	1063624816	AVENDAÑO AYDEL	230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF04	27	\$1,044,000	\$41,800	14-23	27	\$1,044,000	\$72,700	27	\$0	\$0
2	CC	1143122223	BEHITEZ ALVARO	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF04	27	\$1,044,000	\$41,800	14-23	27	\$1,044,000	\$72,700	27	\$0	\$0
3	PT	4985885	FUENTES JORGE	230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS037	4	\$154,667	\$6,200	CCF04	4	\$154,667	\$6,200	14-23	4	\$154,667	\$10,800	4	\$0	\$0
4	CC	1041203016	GIRALDO YORMAN	230201	19	\$734,667	\$117,600	EPS002	19	\$734,667	\$29,400	CCF04	19	\$734,667	\$29,400	14-23	19	\$734,667	\$51,200	19	\$0	\$0
5	CC	71227799	VELEZ ALVARO	230301	13	\$502,667	\$80,500	EPS010	13	\$502,667	\$20,200	CCF04	13	\$502,667	\$20,200	14-23	13	\$502,667	\$35,000	13	\$0	\$0
6	CC	15667520	VILLARREAL AGUSTIN	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF04	27	\$1,044,000	\$41,800	14-23	27	\$1,044,000	\$72,700	27	\$0	\$0
7	CC	1065870641	VILLARREAL LUIS	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF04	27	\$1,044,000	\$41,800	14-23	27	\$1,044,000	\$72,700	27	\$0	\$0
8	CC	1066600199	YEPES SEBASTIAN	230201	7	\$270,667	\$43,400	EPS005	7	\$270,667	\$10,900	CCF04	7	\$270,667	\$10,900	14-23	7	\$270,667	\$18,900	7	\$0	\$0
Total Afiliados(8)					\$5,838,668	\$934,700			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$233,900			\$5,838,668	\$406,700		\$0	\$0	

i. f.

1. 2. 3. 4.

Exonerado SENA e

ICBF: 1
$$j \quad S \quad =$$

2/10/2010

46 ר.נ.ד. / מנחם / 1987



Rionegro, 14 de agosto de 2023

C-11084-2023

Ingeniero
Jose Carlos Villareal
Consortio IC
Placa Huella Vereda la Milagrosa

Informe Resultados de resistencia cilindros de concreto

Cordial saludo.

Con la presente hacemos entrega del informe con los resultados de resistencia a la compresión simple de los cilindros que se han venido ensayando para la obra
Placa Huella Vereda la Milagrosa

Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

Att

Juan José Bustamante Hernández

JUAN JOSÉ BUSTAMANTE HERNÁNDEZ
CC 1 035 428 771 de Copacabana Antioquia
Matricula Profesional N° 05202 332770 Ant.
I.C. Esp. Geotecnia y Estabilidad de Taludes

ANA MILENA ESCOBAR MEJIA
Representante Legal
RAER Ingeniería S.A.S.

Versión: 01


Creación: 01/2020



 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 1 de 15

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 1

Contrato N° 138-2023

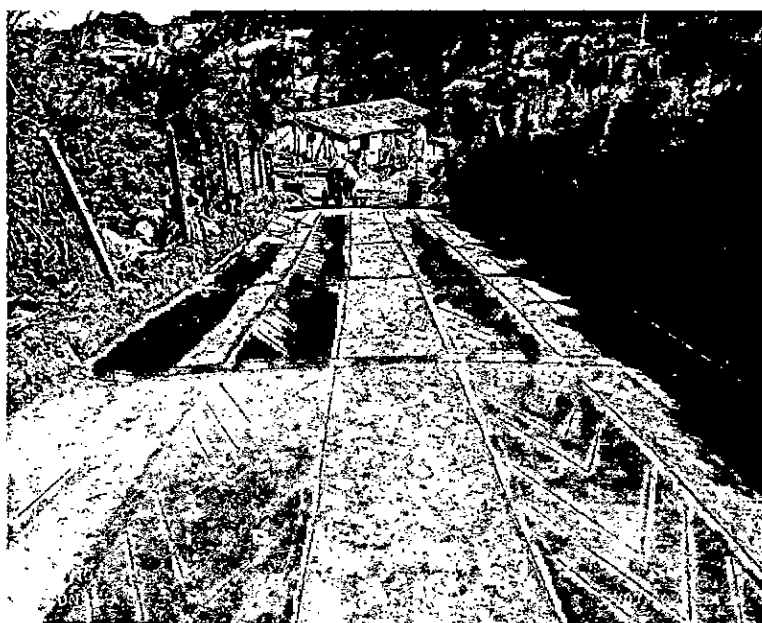

Objeto “Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia”.

Agosto de 2023

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 2 de 15

MUNICIPIO DE GRANADA	
DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	Municipio de Granada
NIT	890983728-1
DEPENDENCIA	Secretaria de obras públicas
NUMERO DE CONTRATO	138 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia".
CLASE DE CONTRATO	Contrato de obra
NIT DEL CONTRATISTA	901195803-2
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY CASTAÑO ARISTIZABAL
SUPERVISOR	Joaquín Emilio Zapata Ospina
VALOR DEL CONTRATO	\$ 152.782.356,60
VALOR ACTA N° 1	\$ 112.944.722,96
FECHA DE INICIO	29 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACION	28 de agosto de 2023

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Se da inicio a las obras el día 29 de junio de 2023, conforme lo establecido en el contrato, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MINITAS-LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA"**.

En el desarrollo de las obras, objeto del presente contrato, se realizan convites comunitarios en la vereda, La milagrosa y se ha contado con buena participación por parte de la comunidad.

Estos convites comunitarios permiten la integración de las familias en cada una de las comunidades beneficiarias con el proyecto.

Durante las visitas de seguimiento a las obras, se tiene acercamiento con la comunidad y se le invita al empoderamiento por parte de cada comunidad con las obras, para lo cual se

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 3 de 15

invita al mantenimiento de la vía periódicamente posterior a la entrega oficial, manifestando asumir dicho compromiso.

Estas jornadas han sido extenuantes por contar con equipo mecánico para preparar la mezcla del concreto, iniciando a las 7 de la mañana, hasta las 4 ó 5 de la tarde.

Con la construcción de estas obras en la vía previamente priorizada, se evidencia un gran impacto en la intervención de la misma por el relevante cambio de las condiciones físicas, lo que genera una mayor calidad de vida a las comunidades y mayor duración en el tiempo en cuanto a la movilidad se refiere.

La participación de la comunidad de la vereda, ha estado representada en mano de obra no calificada para preparar, transportar y colocar los concretos y los demás materiales indispensables en los sitios indicados por los maestros de obra quienes son los encargados de moldear, vibrar y dar los acabados finales según las especificaciones dadas por la supervisión.

El personal contratado por el contratista, tiene su horario de trabajo y se encarga entre otras actividades a mantener ordenadamente la obra y el entorno.

Las obras han sido ejecutadas satisfactoriamente, a pesar del estado del tiempo, siguiendo las especificaciones y los diseños entregados por la Secretaría de obras públicas del municipio, quien ha sido la encargada de realizar la supervisión a las obras. Para este periodo de desarrollo de las obras a informar en la primera acta de avance, podemos decir que se contó con estado del tiempo seco, permitiendo un gran rendimiento en el avance de las obras.

Para éste primer informe, se lleva registro fotográfico de las obras que se ejecutan, el cual presenta un avance del 80% aproximadamente.

Se lleva también bitácora de obra del frente de trabajo, en la cual se registra el día a día, del avance de la obra, las condiciones climatológicas, el personal asignado y los pormenores de la misma. Se registran además observaciones, recomendaciones y detalles de algunas especificaciones.

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 4 de 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. EXCAVACION EN MATERIAL HETEROGENEO.

Esta actividad consiste básicamente en la remoción del material fino y suelto que se encuentra en la rasante, hasta encontrar la capa de afirmado existente en la vía; luego se hace compactación a toda la rasante para lograr la densidad suficiente para soportar la estructura del pavimento a colocar y que garantice las cargas aplicadas a estas vías de categoría terciaria en el frente que se adelanta. El material desechado es dispuesto en lugares autorizados por la supervisión.

En ocasiones es necesario hacer intervención de algunos sitios de las vías de acceso y que no se van a intervenir con placa huella, removiendo el material saturado y colocando material de afirmado mixto de la zona con el objeto de poder avanzar con los tajos; porque acondicionando los accesos, se garantiza la provisión de los diferentes materiales en los sitios de las obras. Así se aprecia en el registro fotográfico.



2. SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR.

En el tramo intervenido se dispone material de sub-base ó base transportado de cantera debidamente legalizada y se compacta para lograr la densidad óptima para la colocación

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 5 de 15

del concreto que conforma la estructura de la placa huella. No se utiliza material del sitio de las obras por cuanto su grado de contaminación y saturación, es alto.

El proceso consiste en colocar material granular en todos los sitios de la vía que presente vacíos, se hace la respectiva nivelación conforme a la topografía del terreno, cuidando de hacer la conformación mecánica, provisionando la vía de peraltes en las curvas y bombeo en toda la longitud de la misma. Finalmente se hace el barrido del material contaminado, con máquina retro-excavadora de llantas.

Este material se retira, se acopia en sitio cerca de la obra y finalmente es transportado a las zonas de depósito previamente autorizados por propietarios de terrenos cercanos a las obras ó en su defecto son transportados y dispuestos en la escombrera municipal con la debida autorización de la empresa de servicios públicos, encargada de la administración de la misma.

Esta actividad termina con el proceso de compactación para lo cual se utiliza vibro-compactador.



Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	<p align="center">OFICIO</p>	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 6 de 15

3. VACIADO DE CONCRETO DE 210 KG/CM2 EN RIELES

El vaciado del concreto en los rieles de la placa-huella se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con la norma Invias.


En los rieles de la placa-huella, se instalan de refuerzo 6 barras de acero Nro. 3 en cada riel en sentido longitudinal espaciadas a 0,15 m y en sentido transversal barras Nro. 3 espaciadas a 0,30 m de igual manera las cunetas llevan el acero longitudinal compuesto de 5 barras Nro. 3 con barras transversales Nro. 3 espaciadas a 0.30 m.

Se construyen Vigas-Riostras cada tres (3.0) m., con una sección de 0.20 x 0.25. Esta viga está compuesta de 4 barras longitudinales Nro. 3 y flejes de 3/8" a 0.15 m (para un total de flejes por viga riostra de 33,). La longitud de cada viga-riostra, es de 5.0 m.

La dosificación del concreto está dada por la relación 1:2:3, con previo diseño de mezclas y así garantizar la resistencia del concreto. Se anexa diseño de mezcla y resultados de laboratorio de falla de cilindros.

Se hizo control en la elaboración del concreto, en su dosificación, debido a que el contratista dispone de concretadora de un saco de cemento, dando el rendimiento requerido principalmente los días en que se realizan los convites comunitarios.

Se toman muestras de concreto en cilindros con el objetivo de fallarlos con edades de 7, 14 y 28 días en el laboratorio, a efectos de establecer la resistencia del mismo.

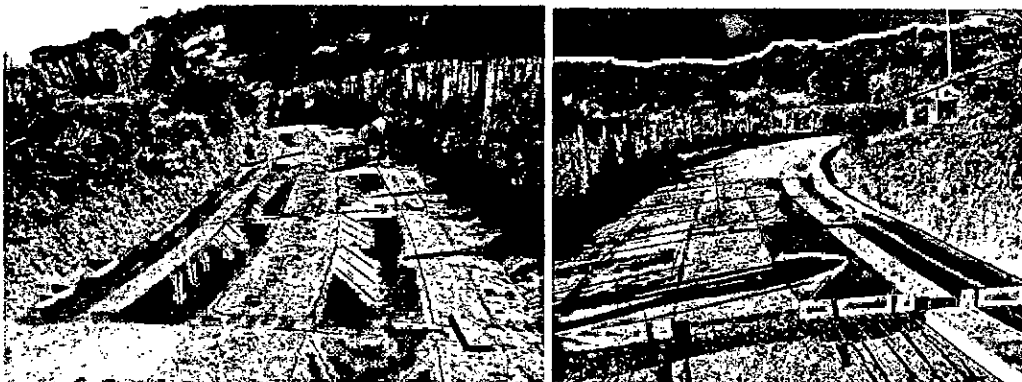

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co


Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 7 de 15

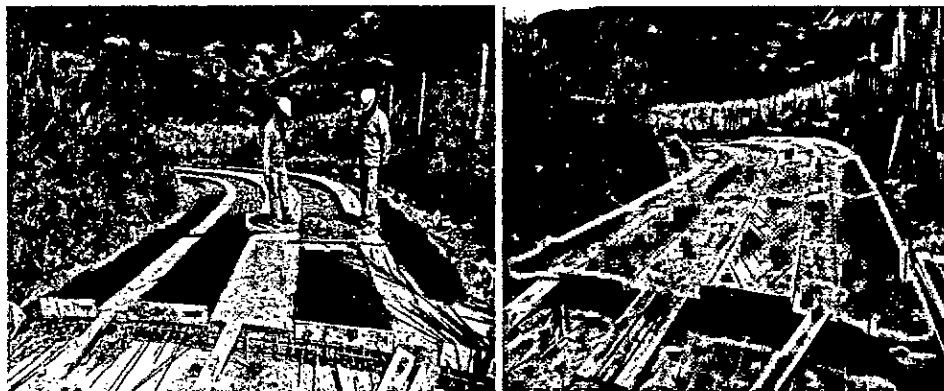

Cilindros para fallar

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 9 de 15

		Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto															
		I.N.V. E - 410 y N.T.C - 673															
OBRA:		Plaza Huella Vereda la Magdalena															
CLIENTE:		Consortio IC															
FECHA:		17 de agosto de 2023				RESPONSABLE:		Jose Carlos Villareal									
Referencia	Número Interno	Localización	Fecha		Edad (días)	Proporción de mezcla	Asenta miento (cm)	Carga Máxima (KN)	Módulos Prom. (cm)		Peso (gr)	Densidad (Kg/m³)	Resistencia (Kg/cm²)				Patrón de Fractura
			Vaciado	Prueba					Diámetro	Longitud			Especificada	obtenida	PROBABLE A 28 DIAS	%	
HVL	1	Primer tramo 100 metros.	19/07/23	26/07/23	7	1.0:2.0:3.0	10	94.1	10.3	20.3	3843	2.27	210	115.2	180.1	55%	Cuatro
HVL	2	Primer tramo 100 metros.	19/07/23	02/08/23	14	1.0:2.0:3.0	10	151.0	10.5	30.2	2850	1.00	210	177.8	206.3	85%	Cinco
HVL	3	Primer tramo 100 metros.	19/07/23	16/08/23	26	1.0:2.0:3.0	10	172.1	10.2	20.2	3953	2.39	210	214.8	-	102%	Tres
HVL	4	Segundo tramo 100 metros	07/08/23	14/08/23	7	1.0:2.0:3.0	NR	88.1	10.2	20.2	3793	2.30	210	109.9	174.2	52%	Cuatro
HVL	5	Segundo tramo 100 metros.	07/08/23	21/08/23	14	1.0:2.0:3.0	NR						210				
HVL	6	Segundo tramo 100 metros.	07/08/23	04/09/23	26	1.0:2.0:3.0	NR						210				

4. VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO EN CENTRO DE PLACA HUELLA Y EN SOBREENCHOS.

Esta actividad se realiza básicamente con personal calificado y contratado por el contratista, dado que el rendimiento es menor por la labor manual de colocación de la piedra rajón, con diámetros variables. La dosificación del concreto es la misma que para la placa-huella con espesor de 0.15 m.

Los materiales agregados para la realización de esta actividad son transportados de la cantera más próxima al sitio donde se construyen las obras (Ingetierras en el municipio de Rionegro).

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co


Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 10 de 15

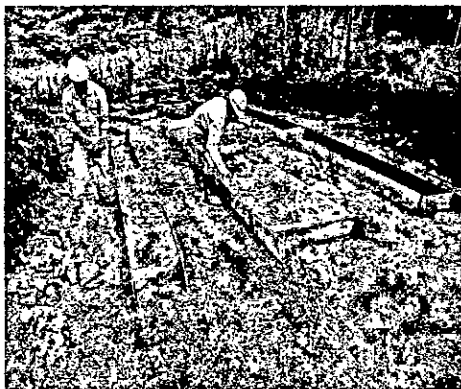

5. VACIADO DE CONCRETO DE 210 KG/CM2 EN CUNETAS

Se construye la cuneta con las especificaciones técnicas que fueron entregadas por la secretaría de infraestructura y vivienda. Se prepara la superficie de apoyo con el siguiente orden: se retira todo el material orgánico o contaminado que se encuentre a lo largo de toda la franja que se prepara para el vaciado. Se coloca una base de material de afirmado. Se compacta. Se coloca el refuerzo consistente en 5 barras de acero Nro.3 longitudinalmente y barras de acero Nro. 3 en sentido transversal con espaciamiento de 0.30 m., finalmente se hace el vaciado, se moldea y se golpea para obtener un buen acabado. Esta actividad se realiza por secciones de 3.0 m., dejando las juntas de construcción.

En la vereda la milagrosa se construye en "V" con el fin de generar una mayor sección a la vía posibilitando así el encuentro de dos vehículos con menos dificultad que se si construye con bordillo.

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co




Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



**Unidos por una
Granada Mejor**
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 11 de 15

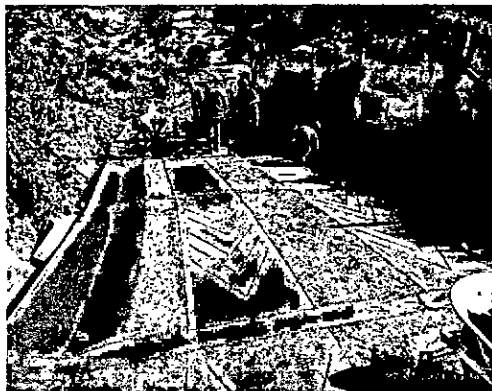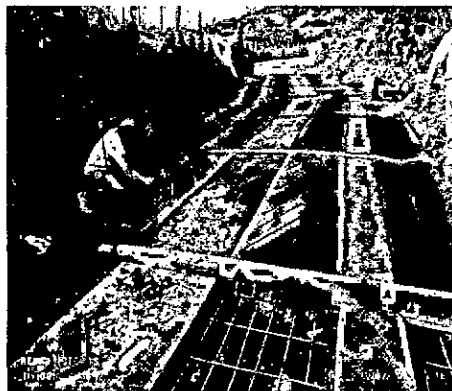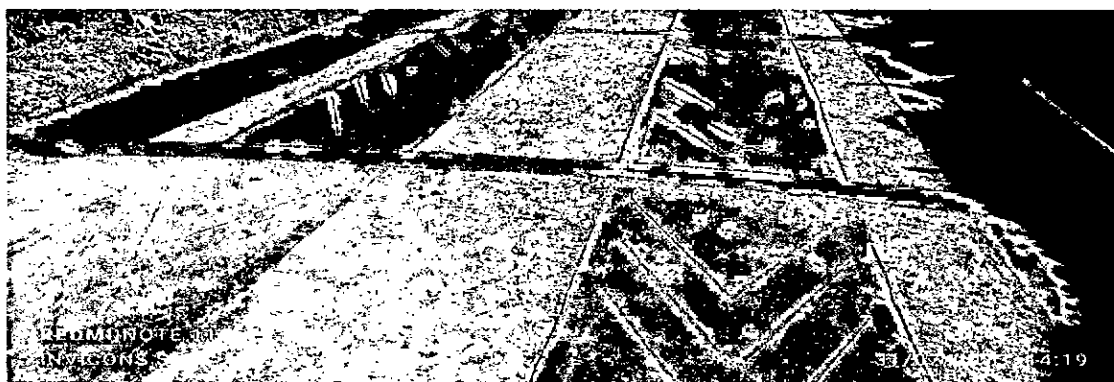

6. VACIADO DE CONCRETO DE 210 KG/CM² EN VIGAS RIOSTRAS

Esta actividad se realiza siguiendo el diseño entregado por la secretaría de infraestructura y vivienda y avalado por la secretaría física del departamento con quien se tiene el convenio interadministrativo.

*En toda la longitud de la vía a pavimentar con el sistema de placa huella, a cada 3.0 m. de distancia, se hace una excavación transversal con una sección de 0.20*0.25 m. de profundidad y 5.0 m. de ancho. Se construye la canasta de acero compuesta de 4 barras Nro. 3 y se colocan flejes de diámetro Nro. 3 a 0.15 m. de separación. Esta viga es atravesada por el acero longitudinal de los rieles. Se hace el vaciado del concreto con igual dosificación que los demás concretos.*

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co




Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 12 de 15

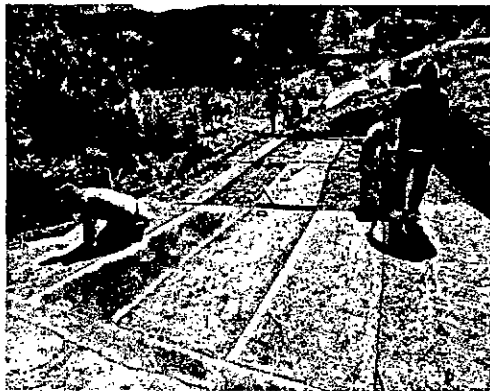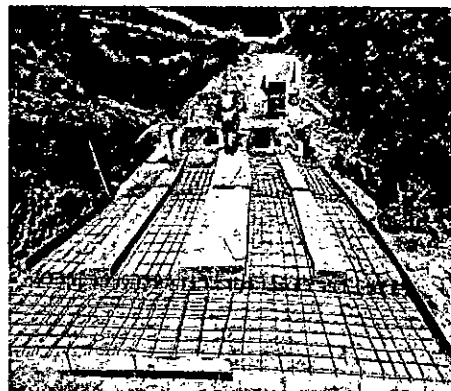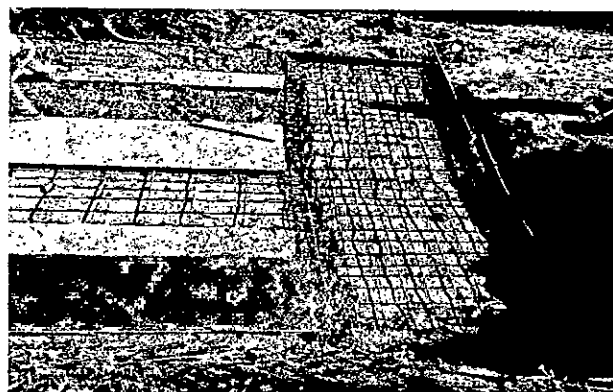

7. SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO G 60

El acero es transportado a la obra en vehículos apropiados para esta labor. Ya en obra se hace el corte, la figuración y la colocación de los elementos necesarios y para evitar que éste quede en contacto con el suelo, se apoya sobre panelas prefabricadas o naturales y durante el proceso del vaciado, se van retirando y verificando que efectivamente quede embebido en el concreto para que cumpla su función.

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co


Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	<p align="center">OFICIO</p>	<p>Código: PDO-FR-05</p>
		<p>Versión: 02</p>
		<p>Fecha: 04/01/2010</p>
		<p>Página 13 de 15</p>

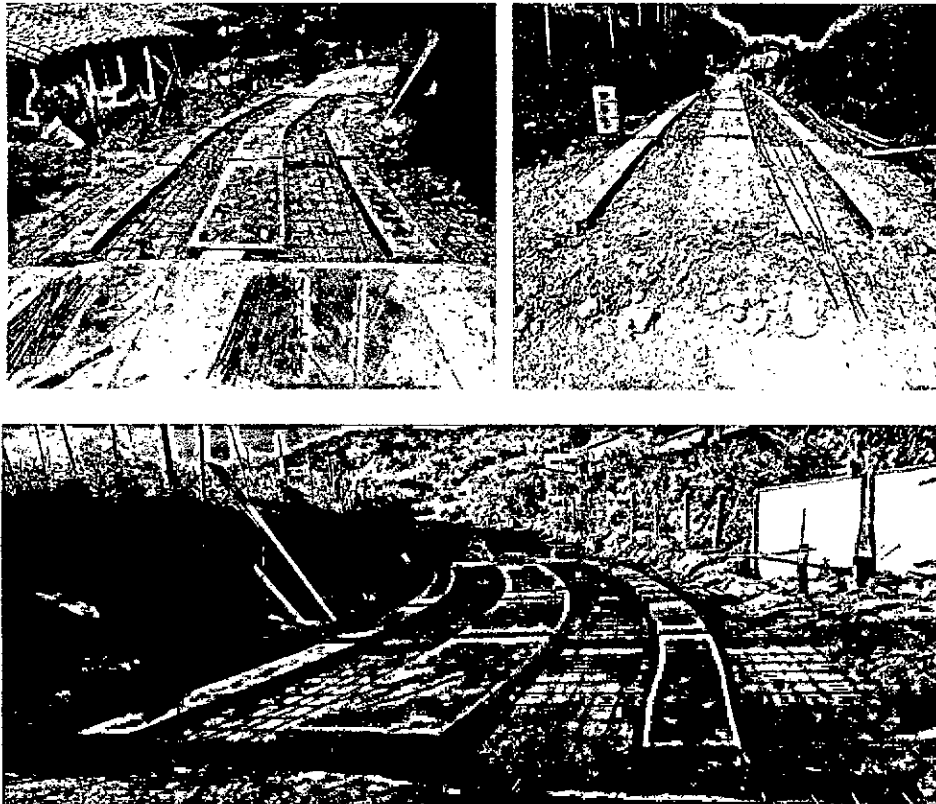

8. COMPONENTE AMBIENTAL

En el desarrollo de las obras, por parte del contratista, reiterativamente se le recuerda la responsabilidad de dotar a todos los trabajadores de todo el equipo de seguridad de acuerdo a la clase de obra pública que se ejecuta.

Se hace control y verificación sobre la afiliación de todos los trabajadores a la seguridad social.

Constantemente se recuerda sobre la limpieza que se debe observar en la obra y sus alrededores, buscando minimizar la contaminación ambiental con la mala disposición de materiales de desecho como empaques de cemento, recortes de madera y de acero y con

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 14 de 15

el material vegetal u orgánico proveniente de las excavaciones y demoliciones. Cada uno de ellos según su categoría ha sido dispuesto en los sitios indicados por la supervisión ó autorizados por los propietarios de los terrenos aledaños o cercanos al sitio donde se construyen las obras.

Se hace vigilancia sobre el modo de almacenamiento de los materiales para las obras, como son el cemento, el acero, la madera y los agregados para el concreto y el material granular para el mejoramiento de la vía.

CONVITES COMUNITARIOS

Uno de los compromisos asumidos por la comunidad beneficiaria de la obra, es la participación en la actividad de vaciados de concreto, mediante convites comunitarios.

Para el cumplimiento de dicho compromiso, la comunidad ha sido muy comprometida en la asistencia a dichos vaciados y eso ha permitido que las obras se adelanten con éxito, logrando una buena calidad de obra que hará cambiar las condiciones físicas de la vía, que hace parte de la malla vial terciaria a cargo del Municipio de Granada.



Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410




**Unidos por una
Granada Mejor**
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

CONSORCIO IC

INFORME DE OBRA N.º 1

Contrato N.º 138-2023

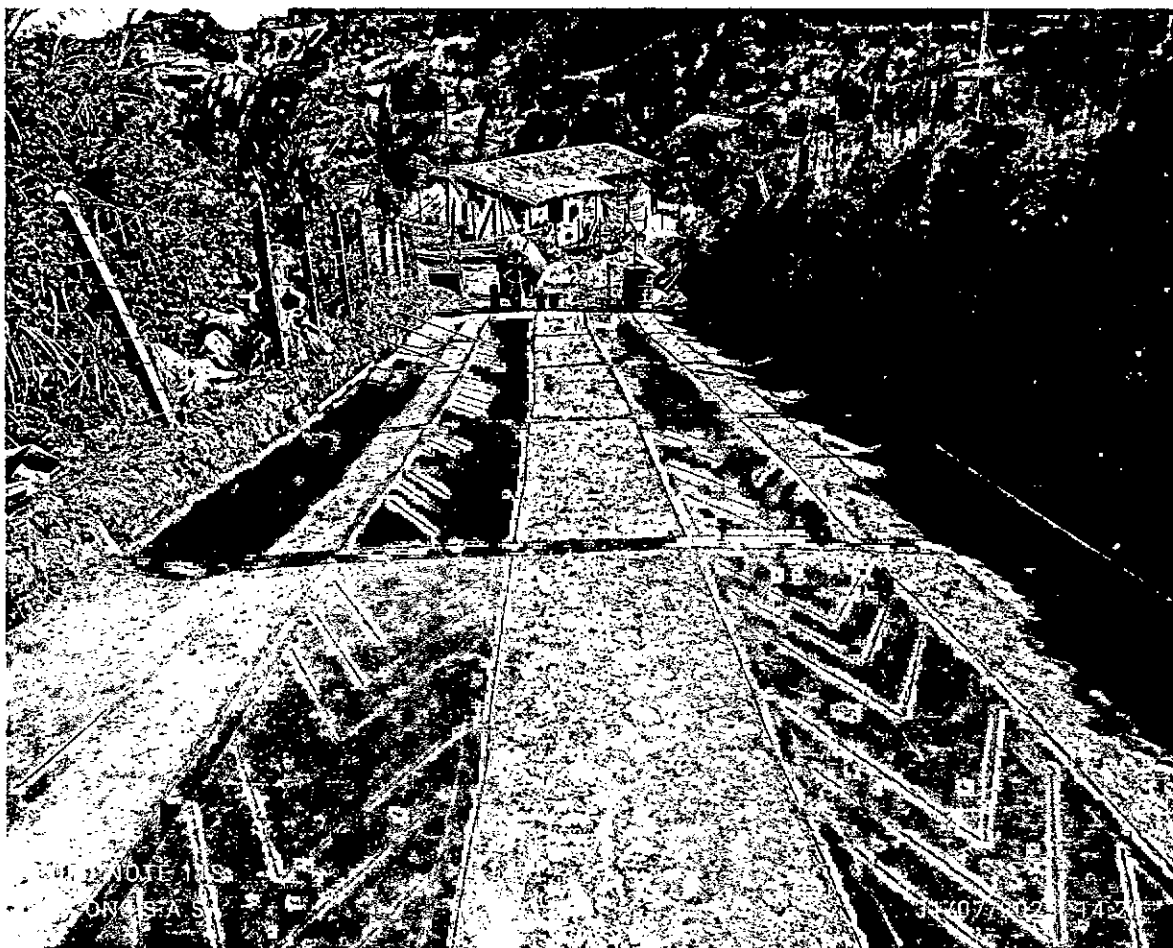

Objeto "Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia".

MUNICIPIO DE GRANADA

Agosto de 2023

MUNICIPIO DE GRANADA	
DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	Municipio de Granada
NIT	890983728-1
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Vivienda
NUMERO DE CONTRATO	138 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"Mejoramiento de la vía terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia".
CLASE DE CONTRATO	Contrato de obra
NIT	900.246.990 - 8
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY CASTAÑO ARISTIZABAL
SUPERVISOR	Joaquín Emilio Zapata Ospina
VALOR DEL CONTRATO	\$ 152.782.356,60
VALOR ACTA N° 1	\$ 112.944.722,96
FECHA DE INICIO	29 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACION	28 de agosto de 2023

CONSORCIO IC

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Se da inicio a las obras el día 29 de junio de 2023, conforme lo establecido en el contrato, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria Minitas-La Milagrosa del Municipio de Granada Antioquia"**.

En el desarrollo de las obras, objeto del presente contrato, se realizan convites comunitarios en la vereda La Milagrosa y se ha contado con buena participación por parte de la comunidad.

Estos convites comunitarios permiten la integración de las familias en cada una de las comunidades beneficiarias con el proyecto.

Durante las visitas de seguimiento a las obras, se tiene acercamiento con la comunidad y se le invita al empoderamiento por parte de cada comunidad con las obras, para lo cual se invita al mantenimiento de la vía periódicamente posterior a la entrega oficial, manifestando asumir dicho compromiso.

Estas jornadas han sido extenuantes por contar con equipo mecánico para preparar la mezcla del concreto, iniciando a las 7 de la mañana, hasta las 4 ó 5 de la tarde.

Estos convites se vienen realizando dos veces por semana y se ha tenido buena asistencia de la cual se deja evidencia. (lista de las personas convocadas).

Con la construcción de estas obras en las vías previamente priorizadas, se evidencia un gran impacto en la intervención de las mismas por el relevante cambio de las condiciones físicas, lo que genera una mayor calidad de vida a las comunidades y mayor duración en el tiempo en cuanto a la movilidad se refiere.

La participación de la comunidad de la vereda, ha estado representada en mano de obra no calificada para preparar, transportar y colocar los concretos y los demás materiales indispensables en los sitios indicados por los maestros de obra quienes son los encargados de moldear, vibrar y dar los acabados finales según las especificaciones dadas por la supervisión.

CONSORCIO IC

El personal contratado por el contratista, tiene su horario de trabajo y se encarga entre otras actividades a mantener ordenadamente la obra y el entorno.

Las obras han sido ejecutadas satisfactoriamente, a pesar del estado del tiempo, siguiendo las especificaciones y los diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura del municipio, quien ha sido la encargada de realizar la supervisión a las obras. Para este periodo de desarrollo de las obras a informar en la primera acta de avance, podemos decir que se contó con estado del tiempo seco, permitiendo un gran rendimiento en el avance de las obras.

Para éste primer informe, se lleva registro fotográfico de las obras que se ejecutan, las cuales presentan un avance cercano al 80%.

Se lleva también bitácora de obra del frente de trabajo, en la cual se registra el día a día, del avance de la obra, las condiciones climatológicas, el personal asignado y los pormenores de la misma. Se registran además observaciones, recomendaciones y detalles de algunas especificaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. EXCAVACION EN MATERIAL HETEROGENEO.

Esta actividad consiste básicamente en la remoción del material fino y suelto que se encuentra en la rasante, hasta encontrar la capa de afirmado existente en la vía; luego se hace compactación a toda la rasante para lograr la densidad suficiente para soportar la estructura del pavimento a colocar y que garantice las cargas aplicadas a estas vías de categoría terciaria en el frente que se adelanta. El material desechado es dispuesto en lugares autorizados por la supervisión.

En ocasiones es necesario hacer intervención de algunos sitios de las vías de acceso y que no se van a intervenir con placa huella, removiendo el material saturado y colocando material de afirmado mixto de la zona con el objeto de poder avanzar con los tajos; porque acondicionando los accesos, se garantiza la provisión de los diferentes materiales en los sitios de las obras. Así se aprecia en el registro fotográfico.




2. CONFORMACION, SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR SUB BASE

En los tramos que se intervienen se dispone material de sub-base ó base transportado de cantera debidamente legalizada y se compacta para lograr la densidad óptima para la colocación del concreto que conforma la estructura de la placa huella. No se utiliza material del sitio de las obras por cuanto su grado de contaminación y saturación es alto.

El proceso consiste en colocar material granular en todos los sitios de la vía que presente vacíos, se hace la respectiva nivelación conforme a la topografía del terreno, cuidando de hacer la conformación mecánica, provisionando la vía de peraltes en las curvas y bombeo en toda la longitud de la misma, finalmente se hace el barrido del material contaminado. Esta actividad se realiza con máquina retroexcavadora de llantas y manualmente.

Este material se retira, se acopia en sitio cerca de la obra y finalmente es transportado a las zonas de depósito previamente autorizados por propietarios de terrenos cercanos a las obras o en su defecto son transportados y dispuestos en la escombrera municipal con la debida autorización de la empresa de servicios públicos, encargada de la administración de la misma.

Esta actividad termina con el proceso de compactación para lo cual se utiliza un vibrcompactador de rodillo monocilindro.

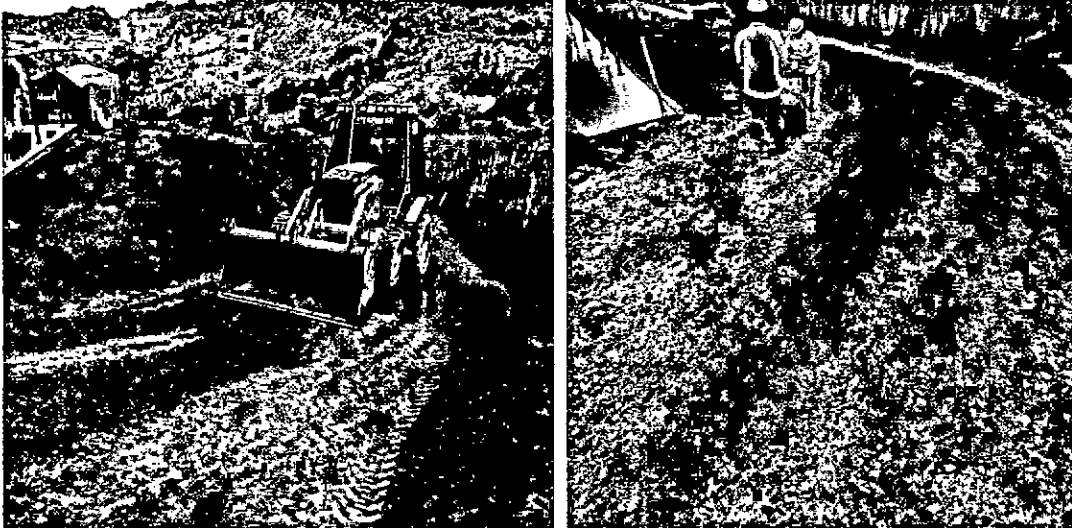

3. VACIADO DE CONCRETO DE 210 KG/CM² EN RIELES

El vaciado del concreto en los rieles de la placa-huella se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con la norma Invias.

En los rieles de la placa-huella, se instalan de refuerzo 6 barras de acero Nro. 3 en cada riel en sentido longitudinal espaciadas a 0,15 m y en sentido transversal barras Nro. 3 espaciadas a 0,30 m de igual manera las cunetas llevan el acero longitudinal compuesto de 5 barras Nro. 3 con barras transversales Nro. 3 espaciadas a 0.30 m.




Se construyen Vigas-Riostras cada tres (3.0) m., con una sección de 0.20 x 0.25. Esta viga está compuesta de 4 barras longitudinales de Nro. 3 y flejes de 3/8" a 0.15 m (para un total de flejes por viga riostra de 33.). La longitud de cada viga-riostra, es de 5.0 m.

La dosificación del concreto está dada por la relación 1:2:3. También se utiliza con alguna regularidad agregados de la zona (gravilla de río) para lo cual se hace el diseño de mezclas y así garantizar la resistencia del concreto. Pero en la mayor parte de los tramos intervenidos, se utiliza agregados de cantera.

CONSORCIO IC

Se hizo control en la elaboración del concreto, en su dosificación, debido a que el contratista dispone de concretadoras de uno y dos sacos de cemento, dando el rendimiento requerido principalmente los días en que se realizan los convites comunitarios.

Se toman muestras de concreto en cilindros con el objetivo de fallarlos con edades de 7, 14 y 28 días en el laboratorio, a efectos de establecer la resistencia del mismo.

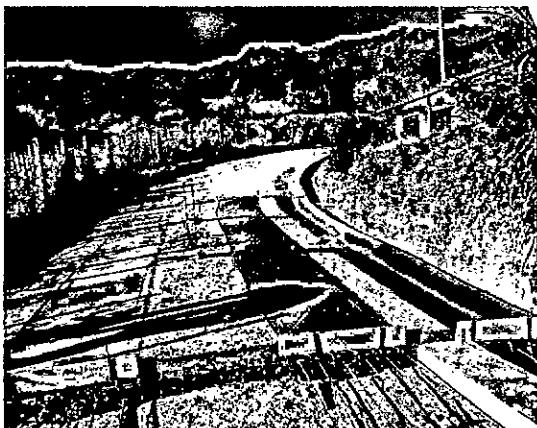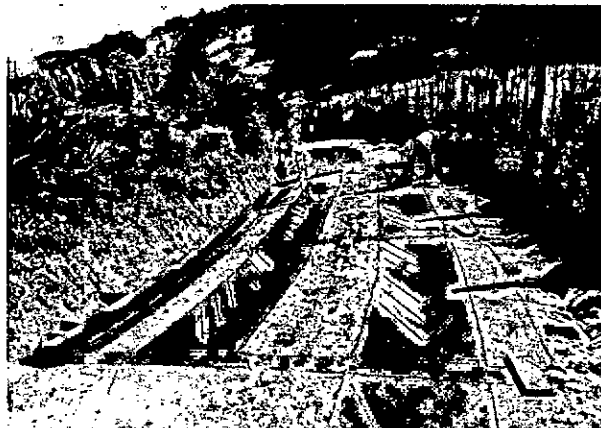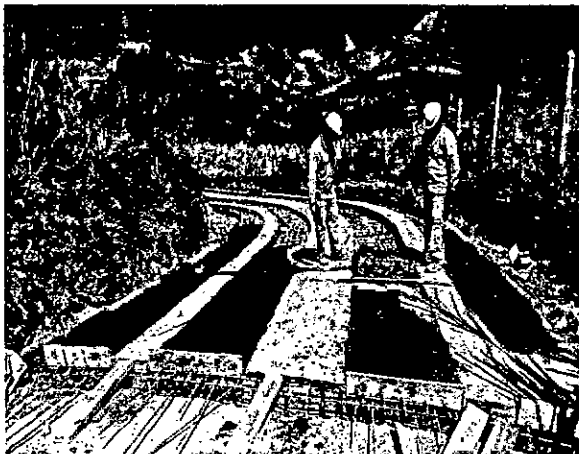


CONSORCIO IC

4. VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO EN CENTRO DE PLACA HUELLA Y EN SOBREANCHOS.

Esta actividad se realiza básicamente con personal calificado y contratado por el contratista, dado que el rendimiento es menor por la labor manual de colocación de la piedra, con diámetros variables. La dosificación del concreto es la misma que para la placa-huella con espesor de 0.15 m.


Los materiales agregados para la realización de esta actividad son transportados de la cantera más próxima al sitio donde se construyen las obras (Ingetierras en el municipio de Rionegro). Algunos de ellos son adquiridos en las playas de los ríos de la zona (canto rodado), previa consulta con la corporación ambiental de manera que no se afecte el medio ambiente ni se destruya el cauce y los meandros de los ríos y quebradas.

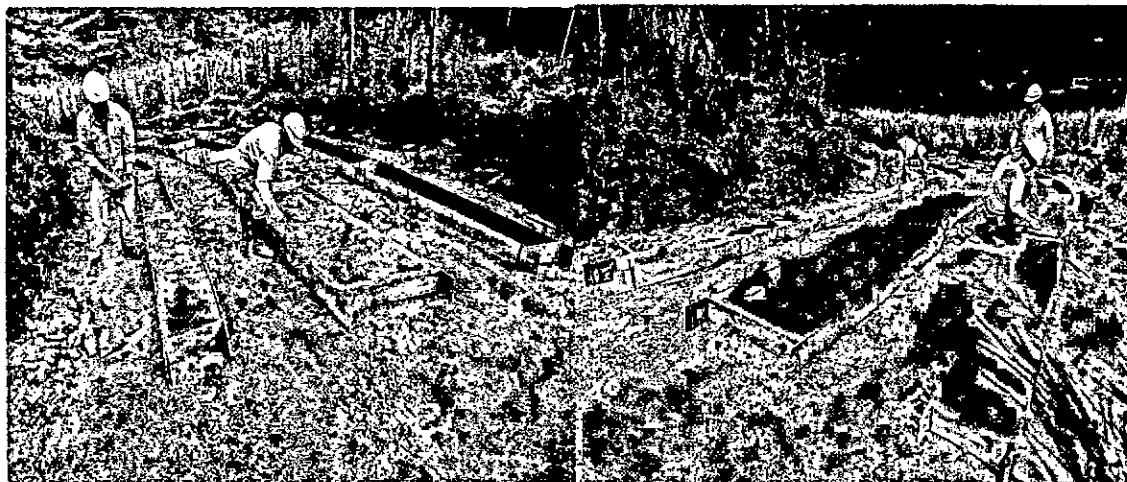

5. VACIADO DE CONCRETO DE 210 KG/CM2 EN CUNETAS

Se construye la cuneta con las especificaciones técnicas que fueron entregadas por la secretaría de infraestructura y vivienda. Se prepara la superficie de apoyo con el siguiente orden: se retira todo el material orgánico ó contaminado que se encuentre a lo largo de toda la faja que se prepara para el vaciado. Se coloca una base de material de afirmado. Se compacta. Se coloca el refuerzo consistente en 5 barras de acero Nro.3 longitudinalmente y barras de acero Nro. 3 en sentido transversal con espaciamiento de 0.30 m., finalmente se hace el vaciado, se moldea y se golpea para obtener un buen acabado. Esta actividad se realiza por secciones de 3.0 m., dejando las juntas de construcción.

En la vereda la milagrosa se construye en "V" con el fin de generar una mayor sección a la vía posibilitando así el encuentro de dos vehículos con menos dificultad que se si construye con bordillo.


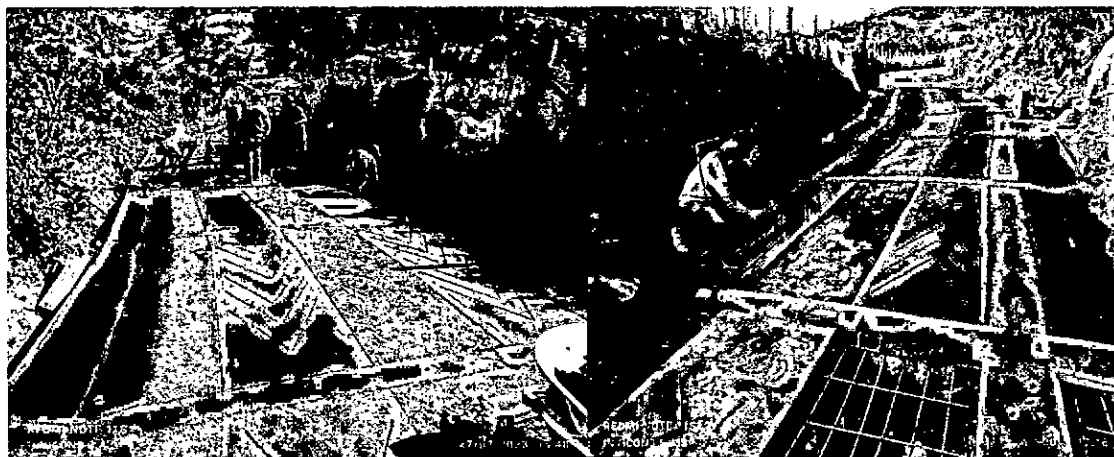


6. VACIADO DE CONCRETO DE 210 KG/CM2 EN VIGAS RIOSTRAS

Esta actividad se realiza siguiendo el diseño entregado por la secretaría de infraestructura y vivienda y avalado por la secretaría física del departamento con quien se tiene el convenio interadministrativo.

En toda la longitud de la vía a pavimentar con el sistema de placa huella, a cada 3.0 m. de distancia, se hace una excavación transversal con una sección de 0.20*0.25 m. de profundidad y 5.0 m. de ancho. Se construye la canasta de acero compuesta de 4 barras Nro. 3 y se colocan flejes de diámetro Nro. 3 a 0.15 m. de separación. Esta viga es atravesada por el acero longitudinal de los rieles. Se hace el vaciado del concreto con igual dosificación que los demas concretos.



CONSORCIO IC

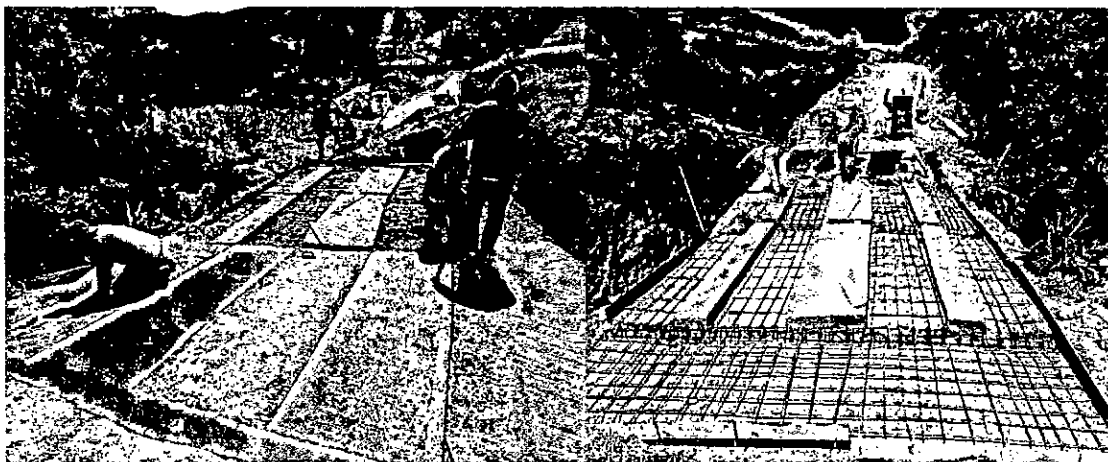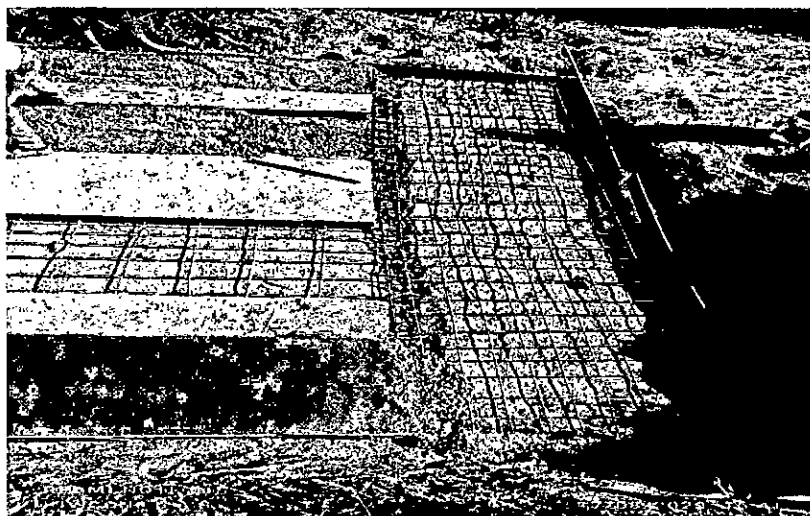

7. SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO G 60

El acero es transportado a la obra en vehículos apropiados para esta labor. Ya en obra se hace el corte, la figuración y la colocación de los elementos necesarios y para evitar que éste quede en contacto con el suelo, se apoya sobre panelas prefabricadas o naturales y durante el proceso del vaciado, se van retirando y verificando que efectivamente quede embebido en el concreto para que cumpla su función.

CONSORCIO IC

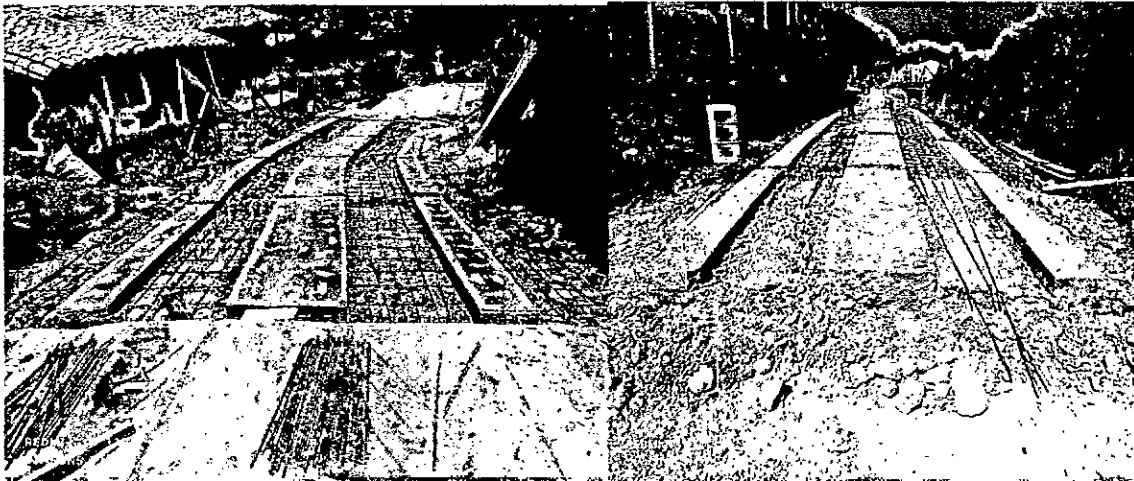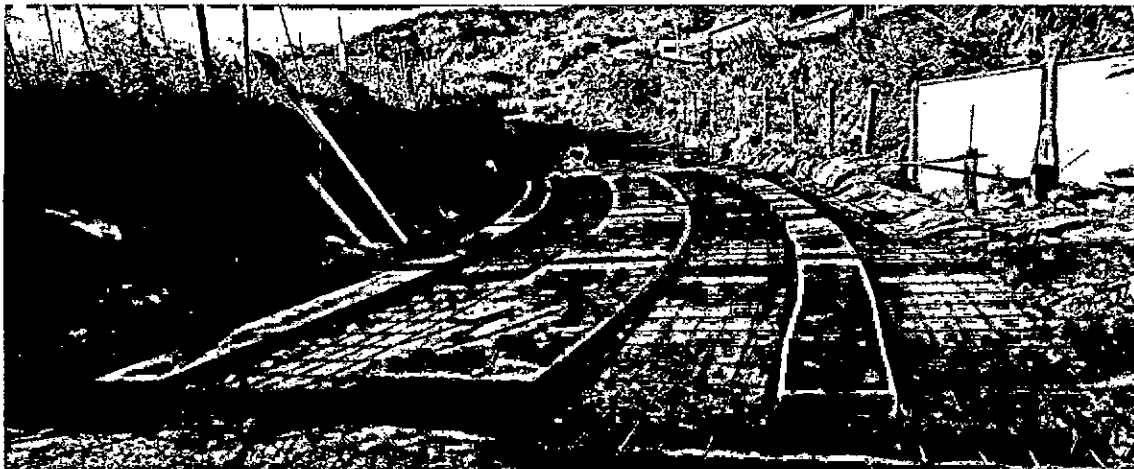

8. COMPONENTE AMBIENTAL

En el desarrollo de las obras, por parte del contratista, reiterativamente se le recuerda la responsabilidad de dotar a todos los trabajadores de todo el equipo de seguridad de acuerdo a la clase de obra pública que se ejecuta.

Se hace control y verificación sobre la afiliación de todos los trabajadores a la seguridad social.

Constantemente se recuerda sobre la limpieza que se debe observar en la obra y sus alrededores, buscando minimizar la contaminación ambiental con la mala disposición de materiales de desecho como empaques de cemento, recortes de madera y de acero y con el material vegetal u orgánico proveniente de las excavaciones y demoliciones. Cada uno de ellos


CONSORCIO IC

según su categoría han sido dispuestos en los sitios indicados por la supervisión ó autorizados por los propietarios de los terrenos aledaños o cercanos al sitio donde se construyen las obras.

Se hace vigilancia sobre el modo de almacenamiento de los materiales para las obras, como son el cemento, el acero, la madera y los agregados para el concreto y el material granular para el mejoramiento de la vía.

CONSORCIO IC

CONVITES COMUNITARIOS

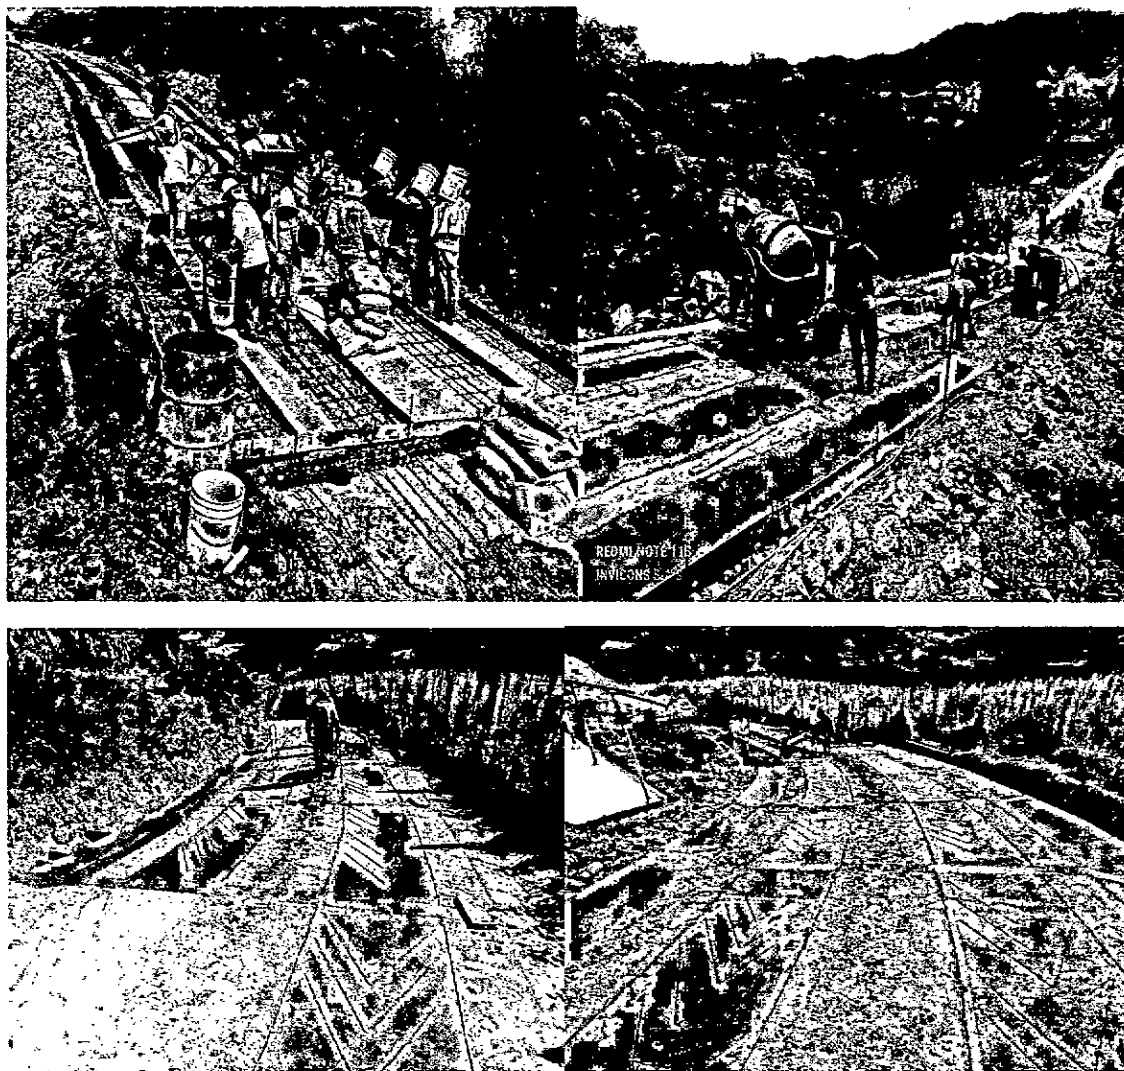

CONSORCIO IC

Anexos:

- . Acta 1
- . Seguridad social de trabajadores
- . Relación de pagos

TABLAS DE PAGOS

CONTROL DE PAGOS				
DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR PAGO	DEL PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	CANCELADO	PENDIENTE
ACTA 1	\$ 112.944.722,96	74%		
TOTAL	\$ 112.944.722,96	74%		

CONSORCIO IC

Granada, 17 de agosto de 2023



Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo

Representante

Consortio IC

