

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID-644-2024

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO SOLIDARIO		
NOMBRE DEL CONVINIENTE	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HATO CHICO	
OBJETO.	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	13/11/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO	21/11/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024	
VALOR DEL CONVENIO	\$ 57.350.000	
APORTES IDACO	\$ 55.000.000	
APORTES EN ESPECIE OAC	\$ 2.350.000	
SUPERVISOR	DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA	
PROFESIONAL DE APOYO	BECKEMBAUER FONSECA NIÑO	
DIRECTOR DE OBRA	ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO	
CARGO SUPERVISOR	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	
GARANTÍAS	SI (X)	NO ()
REQUIRIÓ AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS	SI (X)	NO ()
II. MODIFICACIONES AL CONVENIO		
SUSPENSIÓN	A PARTIR DE	HASTA
	N/A	N/A
PRÓRROGA No. 1	01/01/2025	31/01/2025
PRÓRROGA No. 2	01/02/2025	28/02/2025
ADICIÓN No. 1	N/A	
MODIFICATORIO 1	MODIFICACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA. GIROS DE LOS RECURSOS.	
CESIÓN/TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	
PLAZO FINAL DEL CONVENIO	HASTA	28/02/2025

III. CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS	
LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO HA SIDO ENTREGADO POR EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:	
DESCRIPCIÓN	TOTAL, CANTIDADES EJECUTADAS
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	9.60 M3

AFIRMADO	28.70 M3	
CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	8.51 M3	
CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	14.70 M3	
CONCRETOS, f'c =3000 psi (bases) VIGAS	2.23 M3	
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) PLACAS	18.63 M3	
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	1880.55 KG	
IV. VALOR EJECUTADO		
	RECURSOS IDACO	RECURSOS OAC
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$ 55.000.000	\$ 2.350.000

En este sentido el Dr. Danny Enrique Rico Zamora, en calidad de Supervisor del Convenio, el ingeniero BECKEMBAUER FONSECA NIÑO, en calidad de Apoyo a la Supervisión desde el componente técnico y el Señor JESÚS ANTONIO SOLANO GONZÁLEZ, en calidad de Representante Legal de LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA DE HATO CHICO del municipio de Simijaca, hacen constar que el objeto del Convenio se cumplió a cabalidad y ha sido ejecutado en su totalidad, entregado por el OAC y recibido a entera satisfacción por la supervisión, de conformidad con el siguiente:

BALANCE DEL CONVENIO.

El presupuesto del proyecto está determinado por el siguiente cuadro, donde se refleja los ítems, cantidades, valores unitarios y especificaciones contractuales vs ítems y cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, como se evidencia.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1.0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30.2	27.243,00	\$ 823.011,03	-	20,62	\$ 0,00	\$ 561.614,45	9,60	\$ 261.396,59
2.0	AFIRMADO	M3	27,4	130.472,00	\$ 3.576.237,52	1,29	-	\$ 168.308,88	\$ 0,00	28,70	\$ 3.744.546,40
3.0	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7,3	506.217,00	\$ 3.690.321,93	1,22	-	\$ 615.053,66	\$ 0,00	8,51	\$ 4.305.375,59
4.0	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,3	605.703,00	\$ 10.484.718,93	-	2,61	\$ 0,00	\$ 1.580.884,83	14,70	\$ 8.903.834,10
5.0	CONCRETOS, f'c =3000 psi (bases) VIGAS	M3	1,9	720.605,00	\$ 1.369.149,50	0,31	-	\$ 221.586,04	\$ 0,00	2,23	\$ 1.605.147,64
6.0	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) PLACAS	M3	18,6	720.605,00	\$ 13.424.871,15	-	-	\$ 0,00	\$ 0,00	18,63	\$ 13.424.871,15
7.0	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.735,6	7.846,00	\$ 13.617.277,84	144,98	-	\$ 1.137.550,70	\$ 0,00	1880,55	\$ 14.754.828,54
COSTOS DIRECTOS					47.000.000,00			2.142.499,00	2.142.499,00		47.000.000,00
ÍTEMES NO PREVISTOS											
9.0								\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.0								\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.0								\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ÍTEMES NO PREVISTOS											
TOTAL COSTOS DIRECTOS					47.000.000,00						47.000.000,00
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA					17,02%	8.000.000,00					8.000.000,00
VALOR APOORTE CONTRAPARTIDA OAC						2.350.000,00					2.350.000,00
VALOR TOTAL						57.350.000,00					57.350.000,00

En la anterior tabla, se relaciona la información técnica y presupuestal de las cantidades de obra ejecutadas de conformidad con el Anexo Técnico y las memorias de cálculo presentadas.

El recibo de los trabajos no releva al Organismo de Acción Comunal de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Convenio y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el OAC, se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el referido Convenio.

Por todo lo expuesto, los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la Entrega y Recibo Final del 100% de las actividades del Convenio, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025.

JESÚS ANTONIO SOLANO GONZÁLEZ
Representante legal del OAC

DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA
Supervisor del convenio

JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
Ing. Apoyo componente técnico

ANEXOS:

Memorias de Cálculo de las Cantidades de Obra ejecutada (Documento Excel)

Revisó y aprobó:

JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Ing. Apoyo componente técnico

IDACO
INSTITUTO DE ACCION COMUNITARIA

ACTA DE RECIBO FINAL



ACTA NO. 1

TIPO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

OBJETO:

CONVENIO No.

644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA

APOYO A LA SUPERVISION IDACO: ING. JEISON NAYIB GUTIERREZ JIMENEZ

DIRECCION DE OBRA OAC: MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO

En Simijaca, Cundinamarca, el (24) día del mes de FEBRERO del año 2025 se reunieron el Representante Legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA, el Ingeniero MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO Director de Obra y el Ingeniero JEISON NAYIB GUTIERREZ JIMENEZ Supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	ACTA DE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES ACTA No. 1			VALORES ACTA No. 1			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENT E MES	ACUMULADO O TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,60	\$ 27.243,00	\$ 261.396,59		9,60	9,60		\$ 261.396,59	\$ 261.396,59	-	\$ -
2.0	AFIRMADO	M3	28,70	\$ 130.472,00	\$ 3.744.546,40		28,70	28,70		\$ 3.744.546,40	\$ 3.744.546,40	-	\$ -
3.0	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	8,51	\$ 506.217,00	\$ 4.305.375,59		8,51	8,51		\$ 4.305.375,59	\$ 4.305.375,59	-	\$ -
4.0	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	14,70	\$ 605.703,00	\$ 8.903.834,10		14,70	14,70		\$ 8.903.834,10	\$ 8.903.834,10	-	\$ -
5.0	CONCRETOS f'c = 3000 psi (bases) VIGAS	M3	2,23	\$ 720.605,00	\$ 1.605.147,64		2,23	2,23		\$ 1.605.147,64	\$ 1.605.147,64	-	\$ -
6.0	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases) PLACAS	M3	18,63	\$ 720.605,00	\$ 13.424.871,15		18,63	18,63		\$ 13.424.871,15	\$ 13.424.871,15	-	\$ -
7.0	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.880,55	\$ 7.846,00	\$ 14.754.828,54		1.880,55	1.880,55		\$ 14.754.828,54	\$ 14.754.828,54	-	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS APOORTE IDACO					\$ 47.000.000,00					\$ 47.000.000,00	\$ 47.000.000,00		\$ -
ADMINISTRACION Y GERENCIA APOORTE IDACO					\$ 8.000.000,00					\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00		\$ -
VALOR TOTAL APOORTE IDACO					\$ 55.000.000,00					\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00		\$ -
SALDO NO EJECUTADO					\$ -					\$ -	\$ -		\$ -
VALOR APOORTE CONTRAPARTIDA OAC					\$ 2.350.000,00					\$ 2.350.000,00	\$ 2.350.000,00		\$ -
VALOR TOTAL CONVENIO					\$ 57.350.000,00					\$ 57.350.000,00	\$ 57.350.000,00		\$ -

Nota: Se anexa Acta de Cantidades de aporte de O.A.C

Firma:
Nombre: ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: JESÚS ANTONIO SOLANO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma:
Nombre: ING JEISON NAYIB GUTIERREZ JIMENEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN IDACO

<div><div><div>Gobernación de</div><div>Cundinamarca</div></div></div>		ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."											
FECHA ACTA		28 DE FEBRERO DE 2025			ACTA N°			1			
JAC		ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HATO CHICO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			APOYO A LA SUSPERSIVIÓN COMPONENTE TÉCNICO			JEISON NAYIB GUTIERREZ JIMÉNEZ			
CONVENIO N°		IDACO-CONV-SOLID 644 DE 2024									
Mediante la presente Acta JESÚS ANTONIO SOLANO GONZÁLEZ Representante Legal del ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HATO CHICO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y el ING. JEISON NAYIB GUTIERREZ JIMÉNEZ APOYO A LA SUSPERSIVIÓN COMPONENTE TÉCNICO - IDACO, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el 28 DE FEBRERO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	CONVENIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES (+)	MENORES (-)	VALORES MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1.0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30.2	27 243.00	\$ 823.011,03	-	20,62	\$ 0.00	\$ 561.614,45	9,60	\$ 261.396,59
2.0	AFIRMADO	M3	27.4	130.472.00	\$ 3.576.237,52	1.29	-	\$ 168.308,88	\$ 0.00	28,70	\$ 3.744.546,40
3.0	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7.3	506.217.00	\$ 3.690.321,93	1.22	-	\$ 615.053,66	\$ 0.00	8,51	\$ 4.305.375,59
4.0	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17.3	605.703.00	\$ 10.484.718,93	-	2,61	\$ 0.00	\$ 1.580.884,83	14,70	\$ 8.903.834,10
5.0	CONCRETOS, f'c =3000 psi (bases) VIGAS	M3	1.9	720.605.00	\$ 1.383.561,60	0,31	-	\$ 221.586,04	\$ 0.00	2,23	\$ 1.605.147,64
6.0	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) PLACAS	M3	18,6	720.605.00	\$ 13.424.871,15	-	-	\$ 0.00	\$ 0.00	18,63	\$ 13.424.871,15
7.0	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.735,57	7.846,000	\$ 13.617.277,84	144,98	-	\$ 1.137.550,70	\$ 0.00	1880,55	\$ 14.754.828,54
COSTOS DIRECTOS					47.000.000,00			2.142.499,00	2.142.499,00		47.000.000,00
ITEMS NO PREVISTOS											
9.0								\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00
10.0								\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00
11.0								\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS											
TOTAL COSTOS DIRECTOS					47.000.000,00						47.000.000,00
ADMINISTRACION Y GERENCIA					8.000.000,00						8.000.000,00
VALOR APORTA DEL OAC				17,02%	2.350.000,00						2.350.000,00
VALOR TOTAL CONVENIO					57.350.000,00						57.350.000,00
REPRESENTANTE LEGAL OAC											
Firma:  Nombre: JESÚS ANTONIO SOLANO GONZÁLEZ											
DIRECTOR DE OBRA											
Firma:  Nombre: ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO											
APOYO COMPONENTE TÉCNICO											
Firma:  Nombre: ING. JEISON NAYIB GUTIERREZ JIMÉNEZ											





CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1,0	#REF!	M3

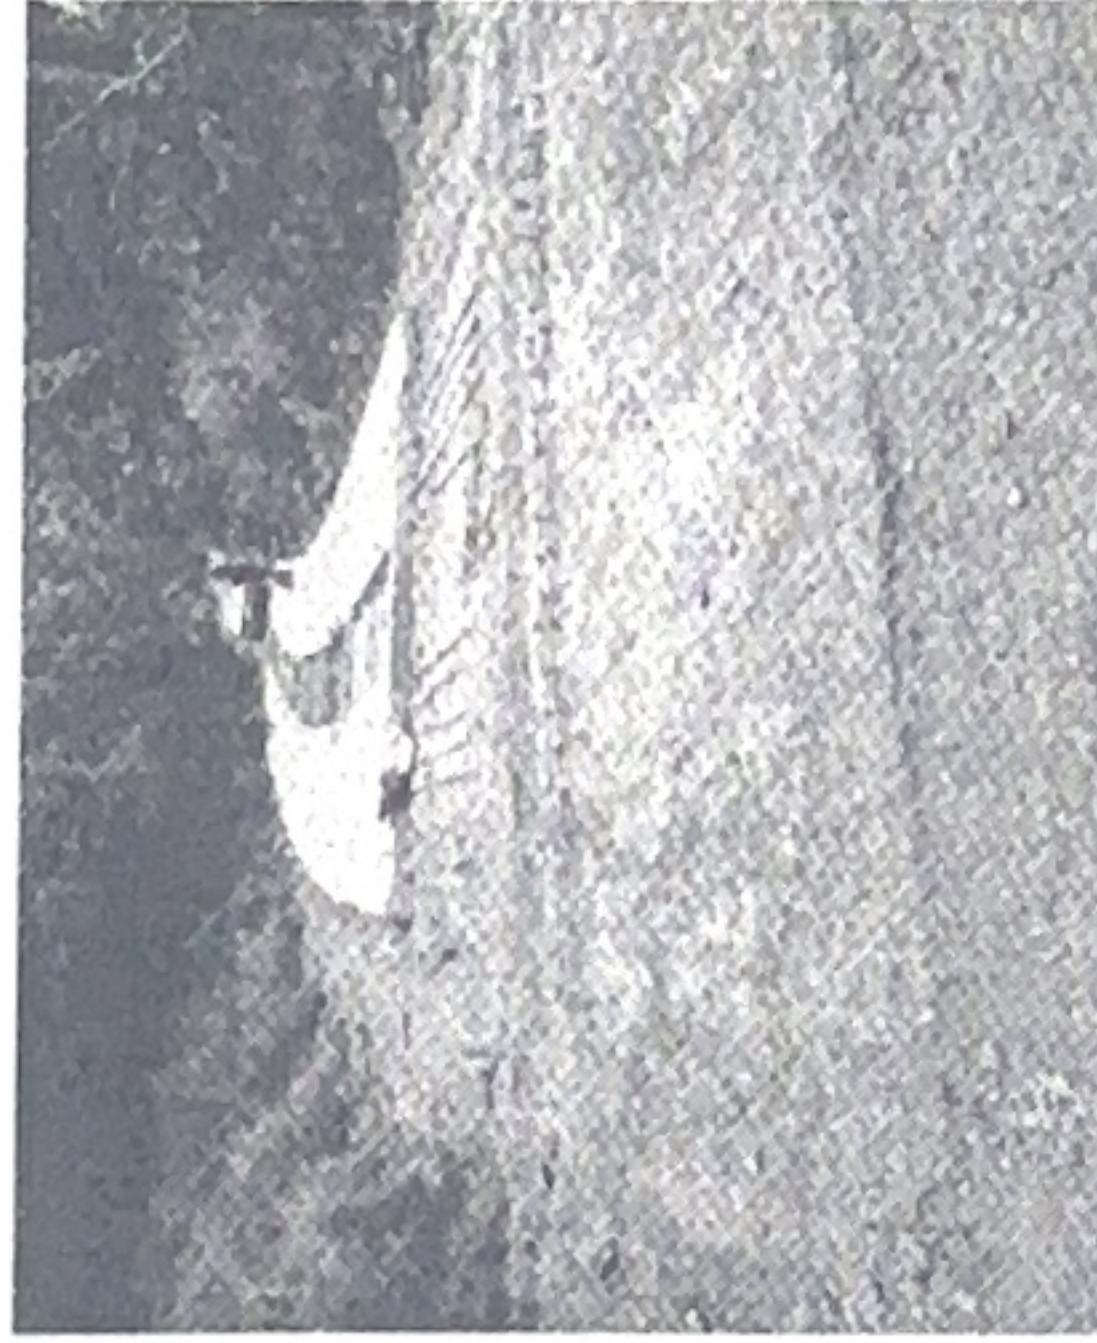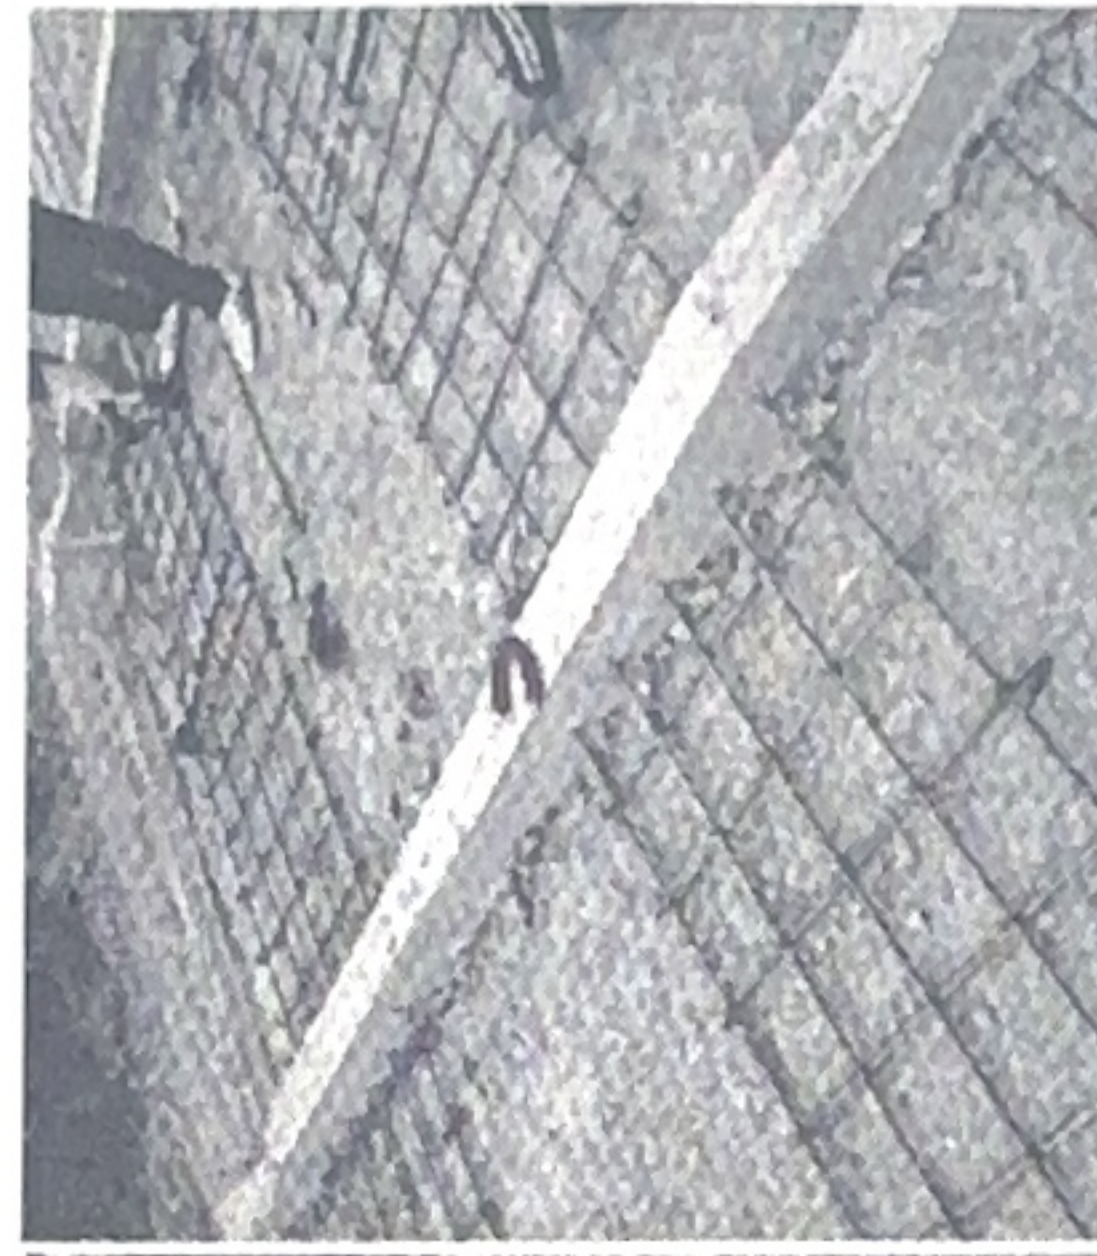

CANTIDADES DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT		TOTAL
1,0	Vigas	0,15	2,70	0,10	22		0,89
2,0	Cunetas	0,70	70,00	0,08	2		7,84
3,0	Rampa entrada	2,70	2,00	0,08	1		0,43
4,0	Rampa salida	2,70	2,00	0,08	1		0,43
							-
TOTAL EJECUTADO							9,60

Myzodactylus

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

ING. JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN



Gobernación de
Cundinamarca

IDACO


INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNITARIA
CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	#REF1	ACTIVIDAD	UNIDAD
3.0			M3

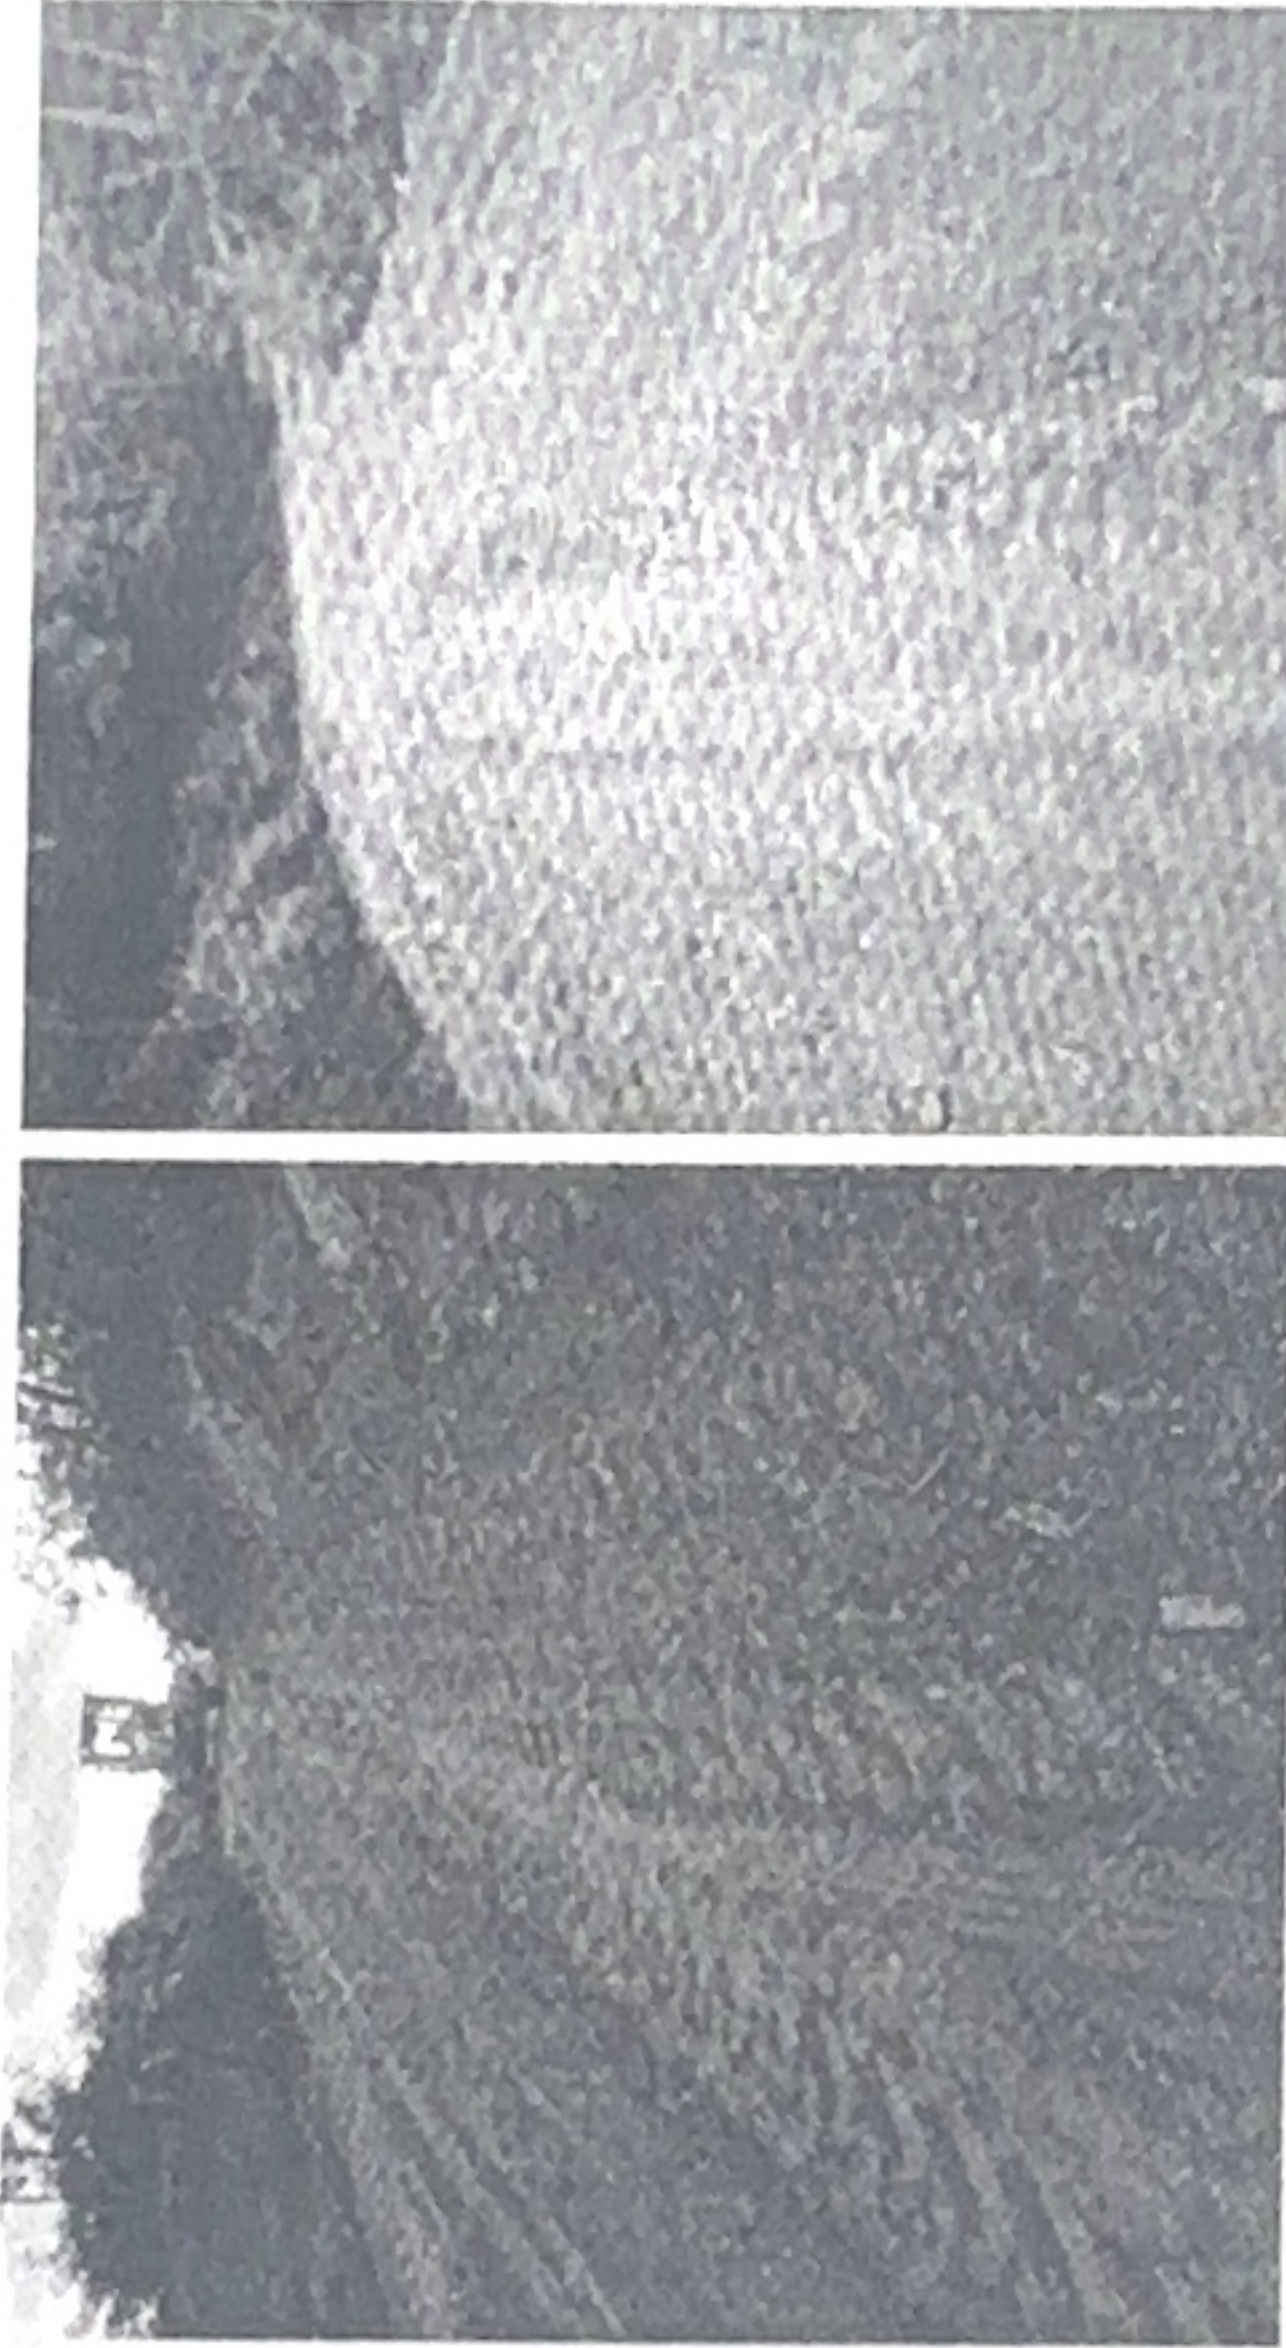

CANTIDADES DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT
1.0	AFIRMADO	4,10	70,00	0,10	1
TOTAL EJECUTADO					28,70

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

ING. JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN




CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLEA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
3,0	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3

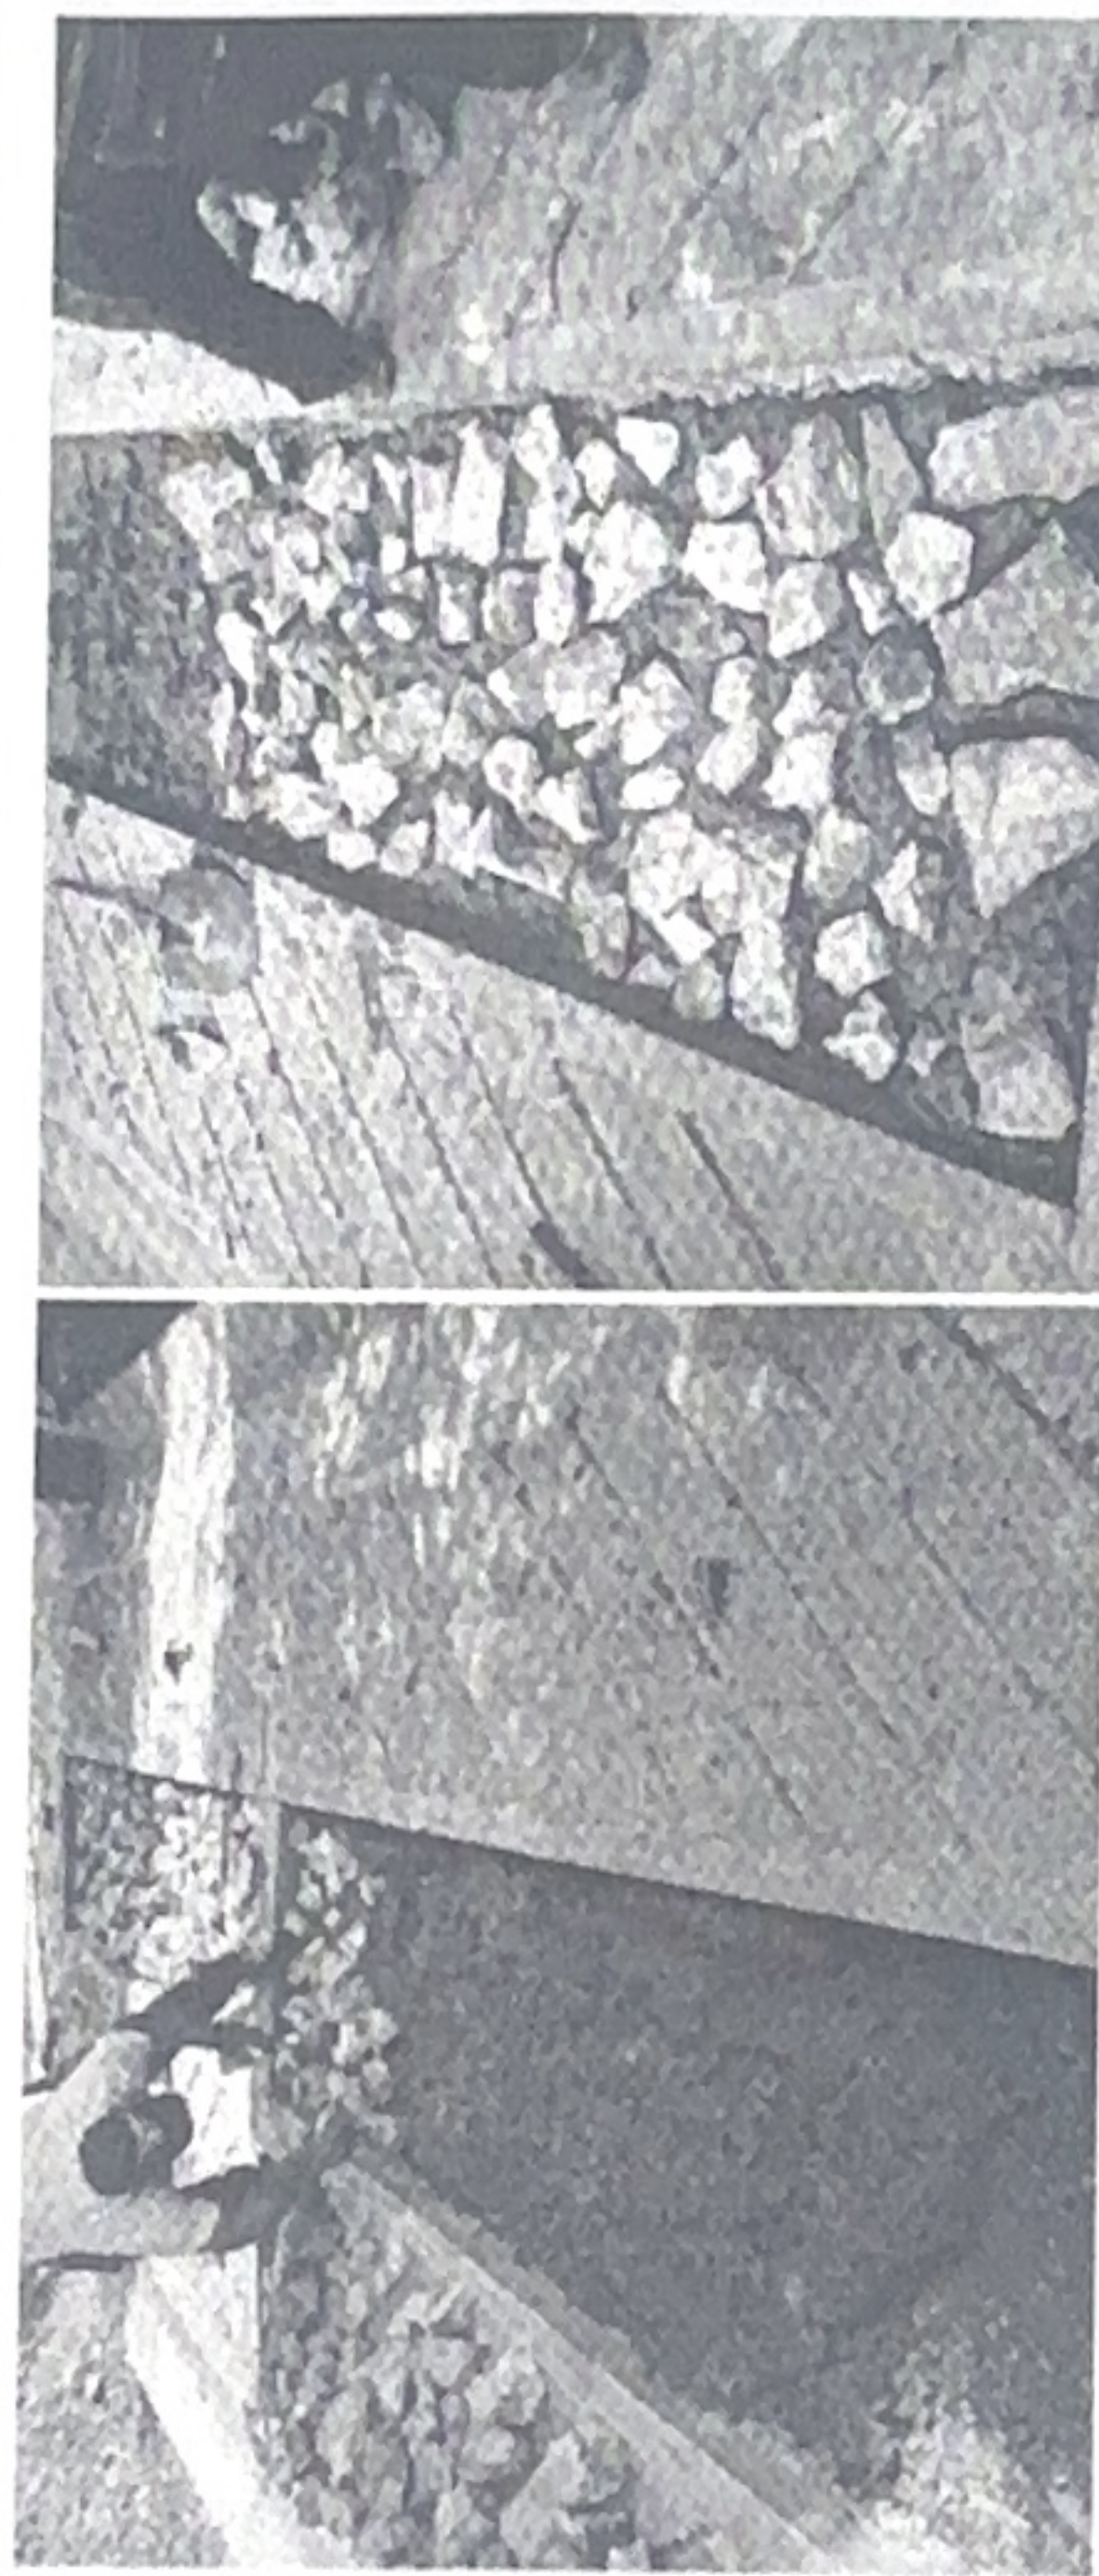[illegible]

Yagoda

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

ING. JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN



IDACO

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DE CUBA (IACH)

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4,0	CUNETETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3

[illegible]

Hayakawa

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

ING. JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN



Gobernación de
Cundinamarca

IDACO



INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNITARIA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	#REF!	ACTIVIDAD	UNIDAD
5,0			M3

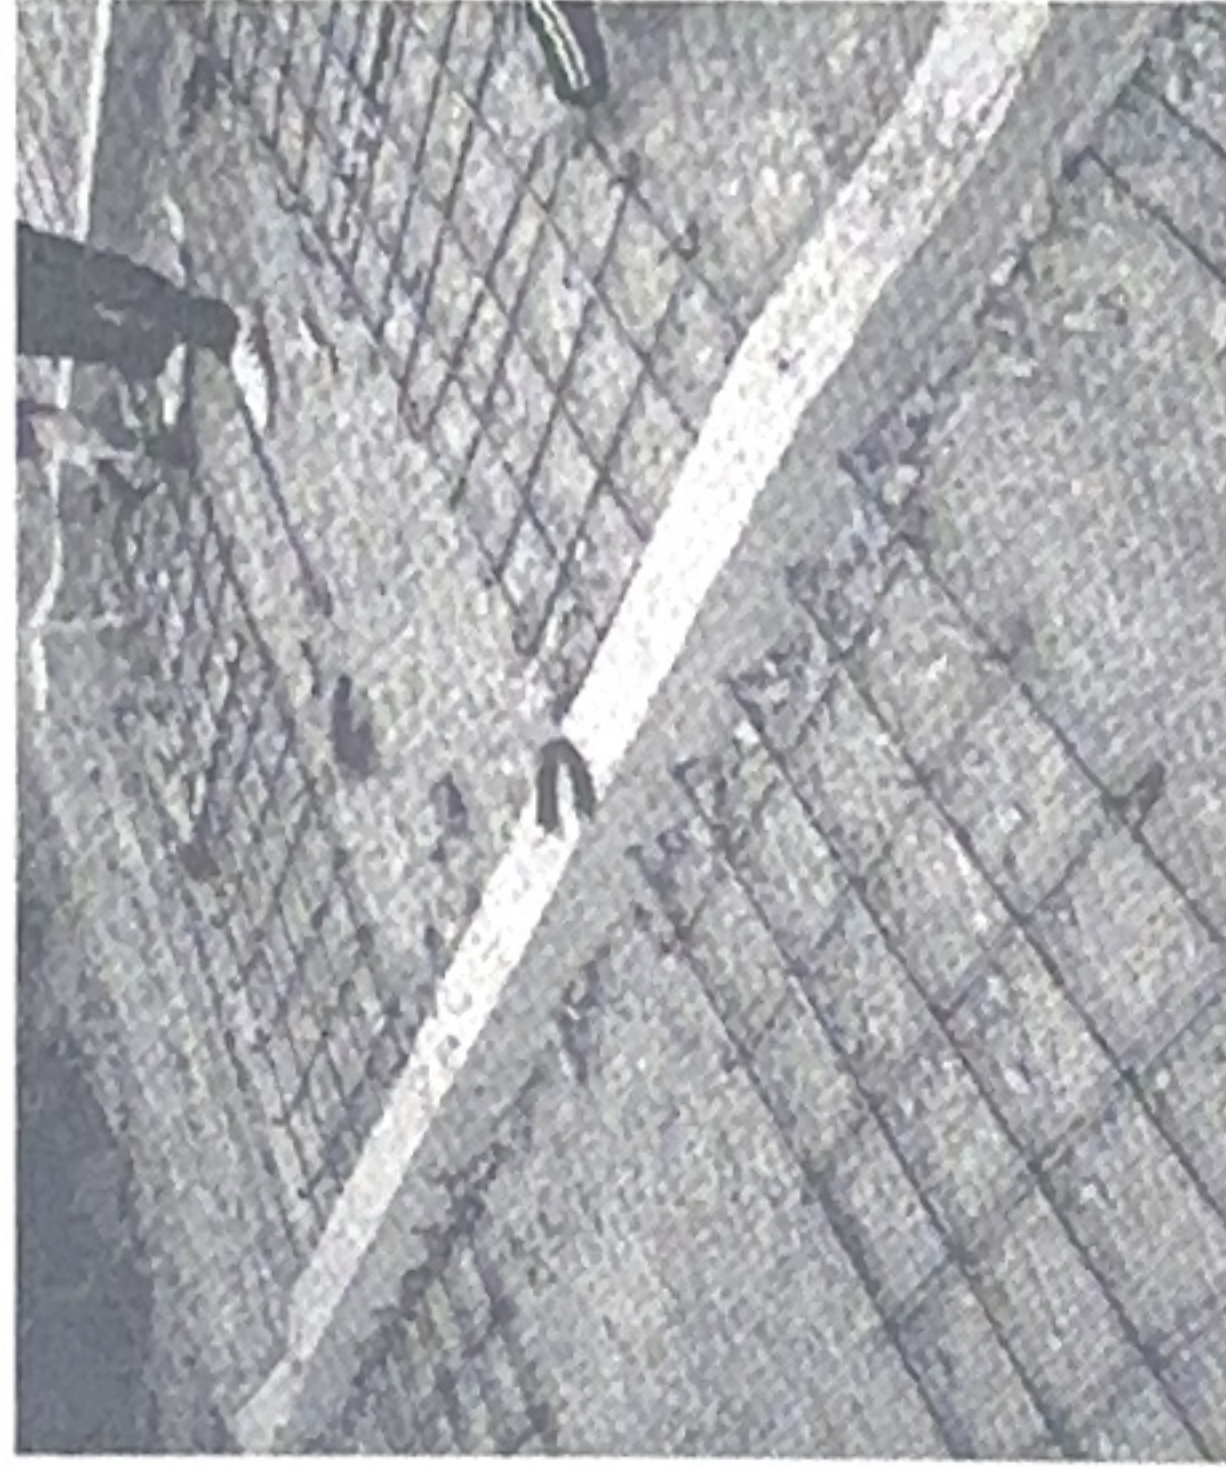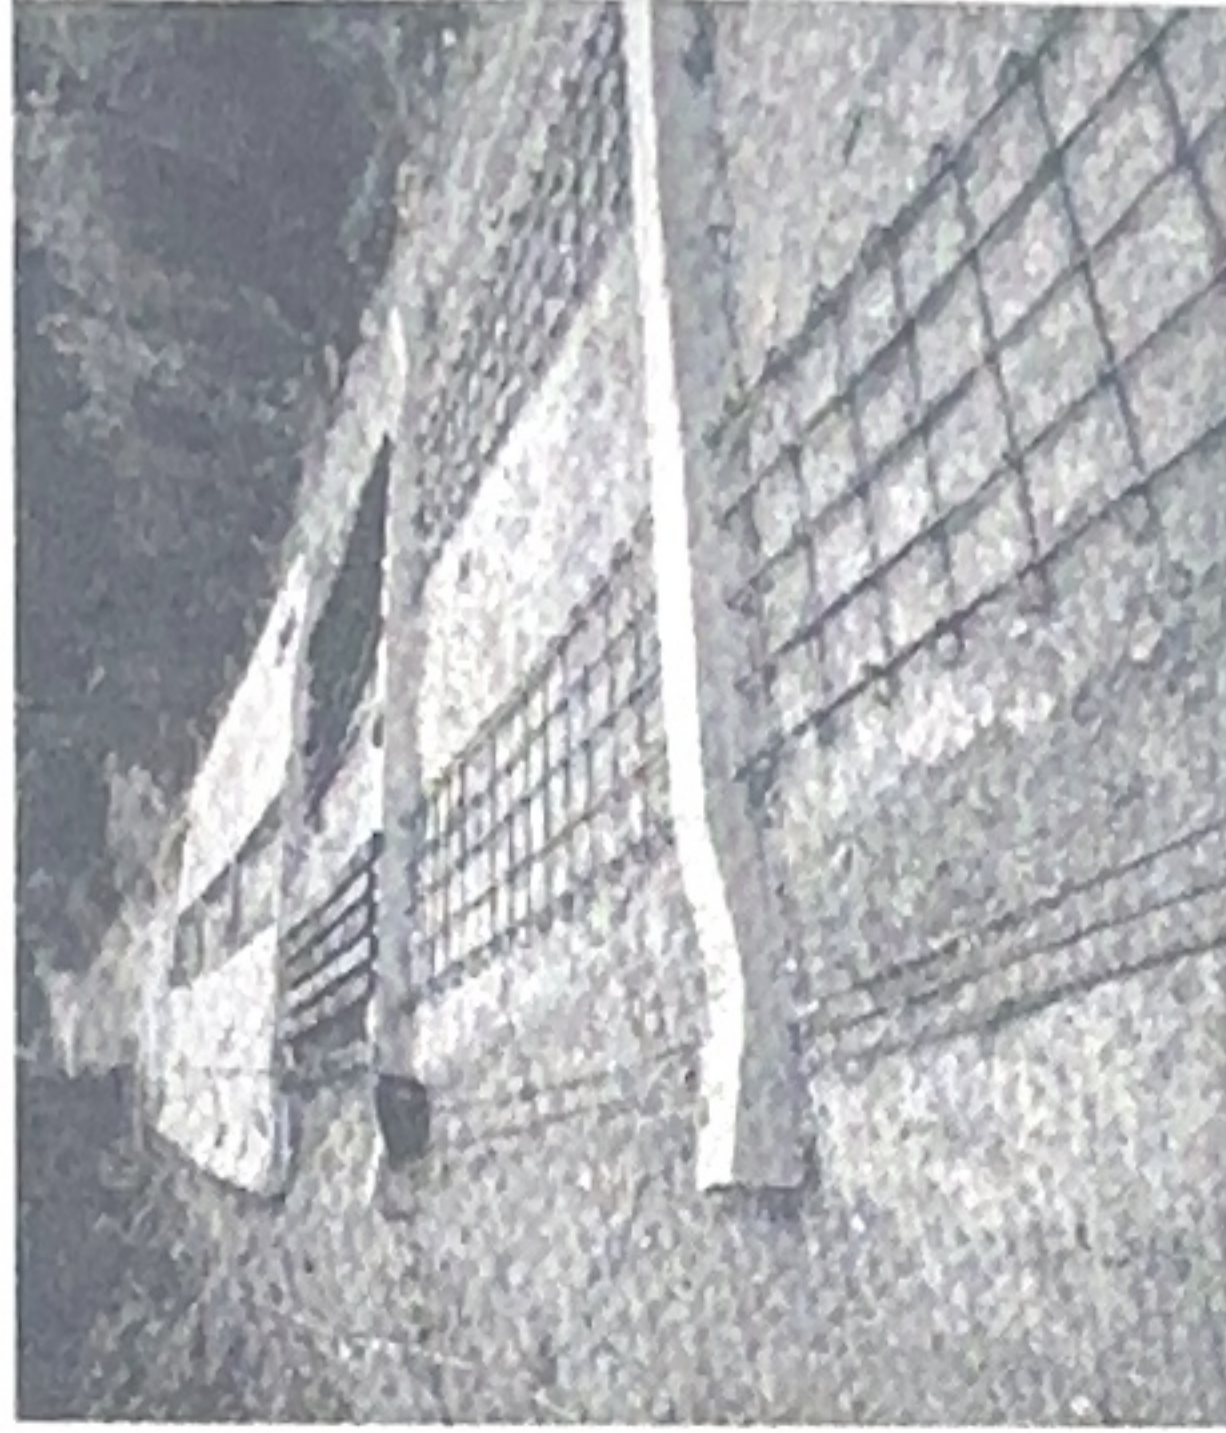

CANTIDADES DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT	TOTAL
1,0	Vigas	0,15	2,70	0,25	22	2,23
						-
						-
						-
						-
TOTAL EJECUTADO						2,23

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

ING. JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN




CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
6,0	#REF!	M3

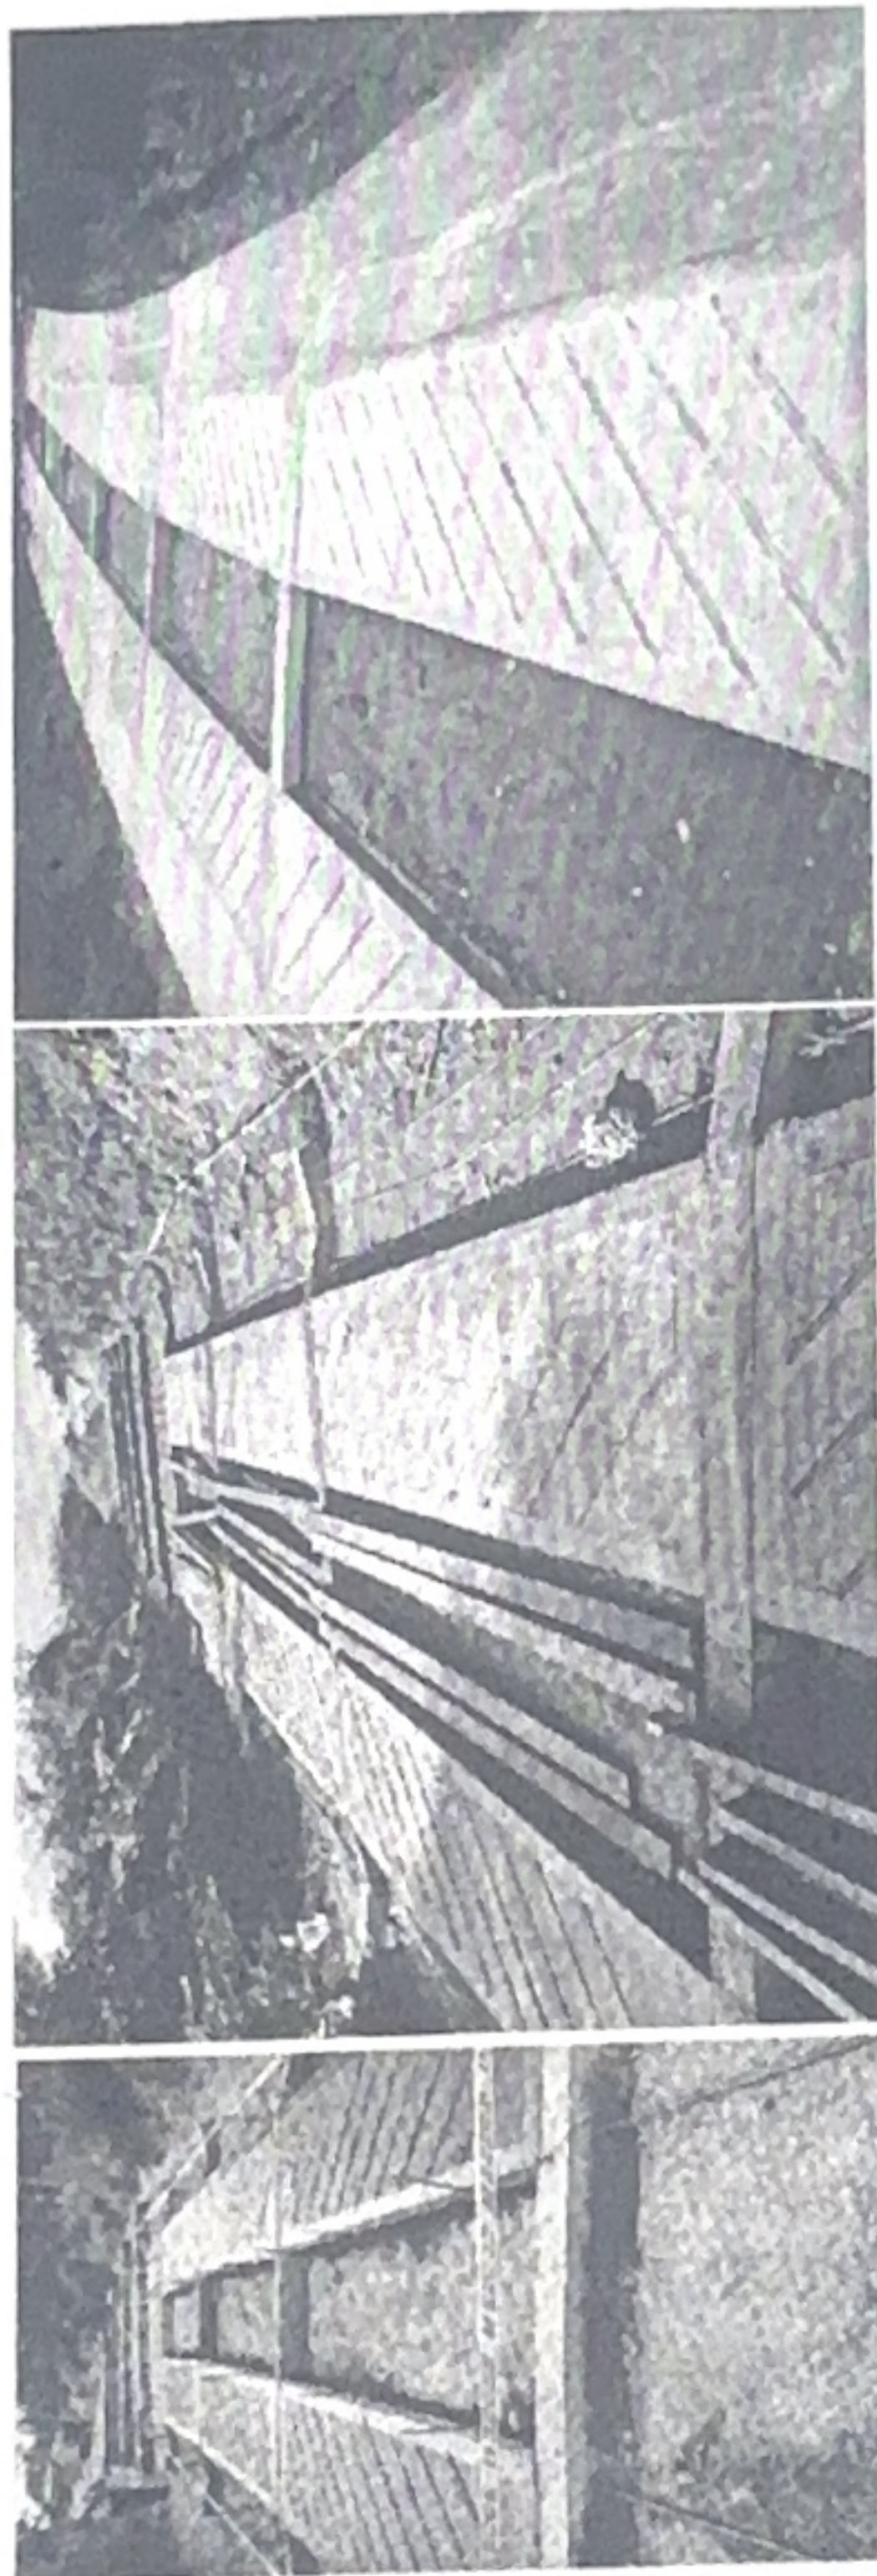

CANTIDADES DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT	TOTAL
1,0	Huellas izquierda	0,90	3,00	0,15	21	8,51
2,0	Huellas derecha	0,90	3,00	0,15	21	8,51
3,0	Rampa entrada	2,70	2,00	0,15	1	0,81
4,0	Rampa salida	2,70	2,00	0,15	1	0,81
						-
TOTAL EJECUTADO						18,63

Hayward

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

ING. JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN



Gobernación de
Cundinamarca

IDACO

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID- 644-2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA HATO CHICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CALCULO			
ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD
7.0	#REF1		kg



CANTIDADES DE OBRA						
N°	Descripción	Longitud de desarrollo	peso específico	cantidad Ø	cantidad de elementos	peso total (Kg)
	Huella izquierda					
	Losas Longitudinal #4	3.15	0.995	4	21	263.28
	Losas Transversal #4	1.00	0.995	15	21	313.43
	Huella derecha					
	Losas Longitudinal #4	3.15	0.995	4	21	263.28
	Losas Transversal #4	1.0000	0.995	15	21	313.43
	Vigas de confinamiento					
	VIGAS RIOSTRA SUPERIOR #3	3.7	0.559	1	22	45.50
	VIGAS RIOSTRA INFERIOR #3	2.6	0.559	1	22	31.97
	Vigas Flejes Transversales #3	0.20	0.559	15.00	22	36.72
	CUNETA TIPO "V"					
	Cuneta Longitudinal	3.00	0.559	8	22	295.15
	Cuneta Transversal	0.77	0.559	22	22	208.33
	RAMPAS					
	Rampa 1 Longitudinal	2	0.995	14	1	27.86
	Rampa 1 Transversal	2.7	0.995	10	1	26.87
	Rampa 2 Longitudinal	2	0.995	14	1	27.86
	Rampa 2 Transversal	2.7	0.995	10	1	26.87
	TOTAL EJECUTADO					1.890.95

Ing. Miguel Ángel Triana Buitrago

ING. MIGUEL ANGEL TRIANA BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Jerson Nayib Gutiérrez Jiménez

ING. JERSON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
