



Santiago de Cali, 30 de abril de 2021

SEGEN-AD-344-2021

Doctor

JORGE HERNÁN MESA BOTERO

Gerente General

DISPAC S.A.-ESP

Avenida Calle 26 No 69D -91 Oficina 804

Centro Empresarial Arrecife Torre 1 Av El Dorado

Bogotá D.C.

Referencia: DG-040-2020 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.”.

Asunto: Aprobación solicitud de trámite para la ampliación del plazo del Contrato DG-038-2020.

De acuerdo con el alcance del contrato de la Referencia y teniendo en cuenta la solicitud presentada por la Empresa HG Ingeniería y Construcciones SAS con su comunicación ING-020-038-013 fechada del 20 de abril de 2021 y que nos fue remitida vía correo electrónico el 28 de abril de 2021, con las siguientes consideraciones y solicitudes:

1. El Contrato DG-038-2020 “CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA” suscrito el 18 de diciembre de 2020 se encuentra vigente, y tienen plazo hasta el 30 de julio de 2021.
2. Los procesos que adelantamos junto con el Contratista de las Obras durante las labores de replanteo y socialización del proyecto conllevo a realizar una revalidación de la información incluida en el proyecto aprobado por el IPSE, situación que generó los trámites para la inclusión de 138 beneficiarios dado que la información recopilada presenta diferencias con los diseños originales.
3. Una vez validada la información permitió al Contratista de las Obras llevar a cabo los trámites para la adquisición de los equipos y materiales requeridos.
4. La Empresa HG Ingeniería y Construcciones SAS manifiesta: “Que, una vez terminado la etapa de replanteo, se procedió a realizar la compra de los materiales de importación (Paneles, Inversores, Controladores y Baterías) que tienen un tiempo estimativo de entrega de 13 semanas incluyendo los tramites de fabricación, transporte y nacionalización, es decir aproximadamente 3 meses, tiempo que

DISEÑOS – CONSULTORÍA – CONSTRUCCIÓN – INTERVENTORÍA

SEGEN INGENIERIA SAS | Carrera 33B #16 – 68 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia

Agencia: Carrera 72 Bis #7 B 27 | Tel.+57 350 4304526 | Bogotá D.C. – Colombia

gerencia@segen-ingenieria.com - segen.ingenieria@gmail.com | www.segen-ingenieria.com

comenzó a correr a partir de la primera semana del mes de abril por lo cual se estima la llegada de los equipos al puerto de Buenaventura aproximadamente el 18 de Junio de 2021."

5. Con base en lo expuesto el Contratista de las Obras solicita: "...lo cual justifica suficientemente la posibilidad de que se suscriba entre las partes un otrosí de prórroga o documento de modificación al contrato por un término de ocho (8) semanas ocho (8) semanas adicionales, contados a partir de la fecha de terminación del contrato, esto es, el 31 de Julio de 2020, ya que, con las situaciones actuales, ajenas al contratista, es inviable la ejecución del respectivo contrato en los tiempos estipulados".

Con base en lo expuesto y teniendo en cuenta los inconvenientes suscitados para corroborar los beneficiarios reales para el proyecto, siendo una premisa fundamental dentro del cumplimiento de los contratos que tenemos suscritos con DISPAC S.A.-ESP, la Interventoría brinda aprobación a la solicitud adjunta y solicita a DISPAC S.A.-ESP llevar a cabo los trámites que haya lugar para permitir el mayor plazo requerido ajustando la Cláusula Quinta del contrato DG-038-2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

De igual manera, solicitamos se lleven a cabo los trámites que haya lugar para que se ajuste nuestro contrato DG-040-2020, considerando el mayor plazo requerido para el contrato de las obras.

Cualquier información adicional que sea requerida nos la pueden dirigir a la Carrera 72 Bis #7 B 27 en la ciudad de Bogotá DC o a través de los correos electrónicos: segen.ingenieria.guaviare@gmail.com y/o segen.ingenieria@gmail.com

Cordialmente,



MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
Representante Legal

Copia: Ingeniero Hernán García Mahecha, Representante Legal, HG Ingeniería y Construcciones SAS

Anexo: Lo anunciado

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		dic	1er trimestre ene	feb	mar	2
1	INSTALACIÓN 620 SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES	237 días	vie 18/12/20	jue 30/09/21	SOLUCIONES FV 620 BENEFICIARIOS INIRIDA, GUA					
2	Contratacion de Obra	4 días	vie 18/12/20	lun 21/12/20	Contratacion de Obra	18/12	21/12			
3	Firma de contratos de interventoría y obra y legalización	4 días	vie 18/12/20	lun 21/12/20		18/12	21/12			
4	Suscripción de actas de inicio del contrato de obra e interventoría	2 días	vie 18/12/20	sáb 19/12/20		18/12	19/12			
5	Actividades de suministro y construcción de obras	223 días	dom 20/12/20	jue 16/09/21	Actividades de suministro y construcción de obr	20/12				
6	Verificación de usuarios y replanteo (Aprobados 381)	30 días	dom 20/12/20	lun 25/01/21		20/12	25/01			
7	Validacion 239 viviendas replanteo	36 días	mar 23/02/21	jue 8/04/21				23/02		
8	Aprobacion Interventoria replanteo 239 viviendas	10 días	vie 9/04/21	mar 20/04/21					9/0	
9	Desarrollo del componente social	21 días	sáb 27/02/21	mié 24/03/21				27/02	24/	
10	Ordenes de compra de materiales y equipos importados	0 días	mié 14/04/21	mié 14/04/21						
11	Ordenes de compra de materiales y equipos nacionales	0 días	sáb 24/04/21	sáb 24/04/21						
12	Transporte de Materiales y Equipos	38 días	vie 30/04/21	jue 17/06/21						
13	Recibo de materiales bodega San Jose del Guaviare Guainia (Postes, cables, internas y material menor)	0 días	vie 30/04/21	vie 30/04/21						

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea



Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	1er trimestre ene	feb	mar	2
14	Transporte Fluvial de materiales (Bodega San Jose del Guaviare - Bodega Inirida)	0 días	mié 12/05/21	mié 12/05/21					
15	Recibo de equipos importados	0 días	mié 26/05/21	mié 26/05/21					
16	Trámites de nacionalización de equipos importados	5 días	jue 27/05/21	mar 1/06/21					
17	Transporte de equipos a bodega ensamble de gabinetes	2 días	mié 2/06/21	jue 3/06/21					
18	Recibo de Gabinetes y módulos FV en bodega San Jose del Guaviare Guainia (Postes, cables, internas y material menor)	0 días	sáb 5/06/21	sáb 5/06/21					
19	Recibo de Gabinetes y módulos FV (Bodega San Jose del Guaviare - Bodega Inirida)	0 días	jue 17/06/21	jue 17/06/21					
20	Construcción de Soluciones	103 días	jue 13/05/21	jue 16/09/21					Cor
21	Construccion cimentación en concreto para mastil	70 días	jue 13/05/21	vie 6/08/21					
22	Instalacion internas + SPT	70 días	jue 13/05/21	vie 6/08/21					
23	Instalación Mastil + Módulos FV	70 días	vie 18/06/21	vie 10/09/21					
24	Instalación acometida aerea	70 días	vie 18/06/21	vie 10/09/21					

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea



Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	1er trimestre ene	feb	mar	2
25	Instalación Gabinete gestión de energia	70 días	vie 18/06/21	vie 10/09/21					
26	Pruebas, energización y puesta en servicio y capacitación de usuarios	70 días	jue 24/06/21	jue 16/09/21					
27	Actividades de recibo y Terminación del contrato de Material eléctrico	82 días	jue 24/06/21	jue 30/09/21					Actividades de
28	Acta de recibo de obras de la interventoría al contratista	7 días	vie 17/09/21	vie 24/09/21					
29	Acta de recibo y entrega de inventarios entre el IPSE y DISPAC	5 días	vie 24/09/21	mié 29/09/21					
30	Acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría	6 días	vie 24/09/21	jue 30/09/21					
31	Gestión de entrega de infraestructura al Operador de AOM - EMELCE S.A. E.S.P.	49 días	jue 24/06/21	lun 23/08/21					
32	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios a EMELCE S.A. E.S.P. para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	20 días	lun 23/08/21	mar 14/09/21					
33	Revisión, ajuste, validación y entrega a EMELCE S.A. E.S.P. del esquema de sostenibilidad	20 días	mié 8/09/21	jue 30/09/21					
34	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	20 días	mié 8/09/21	jue 30/09/21					

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea




Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

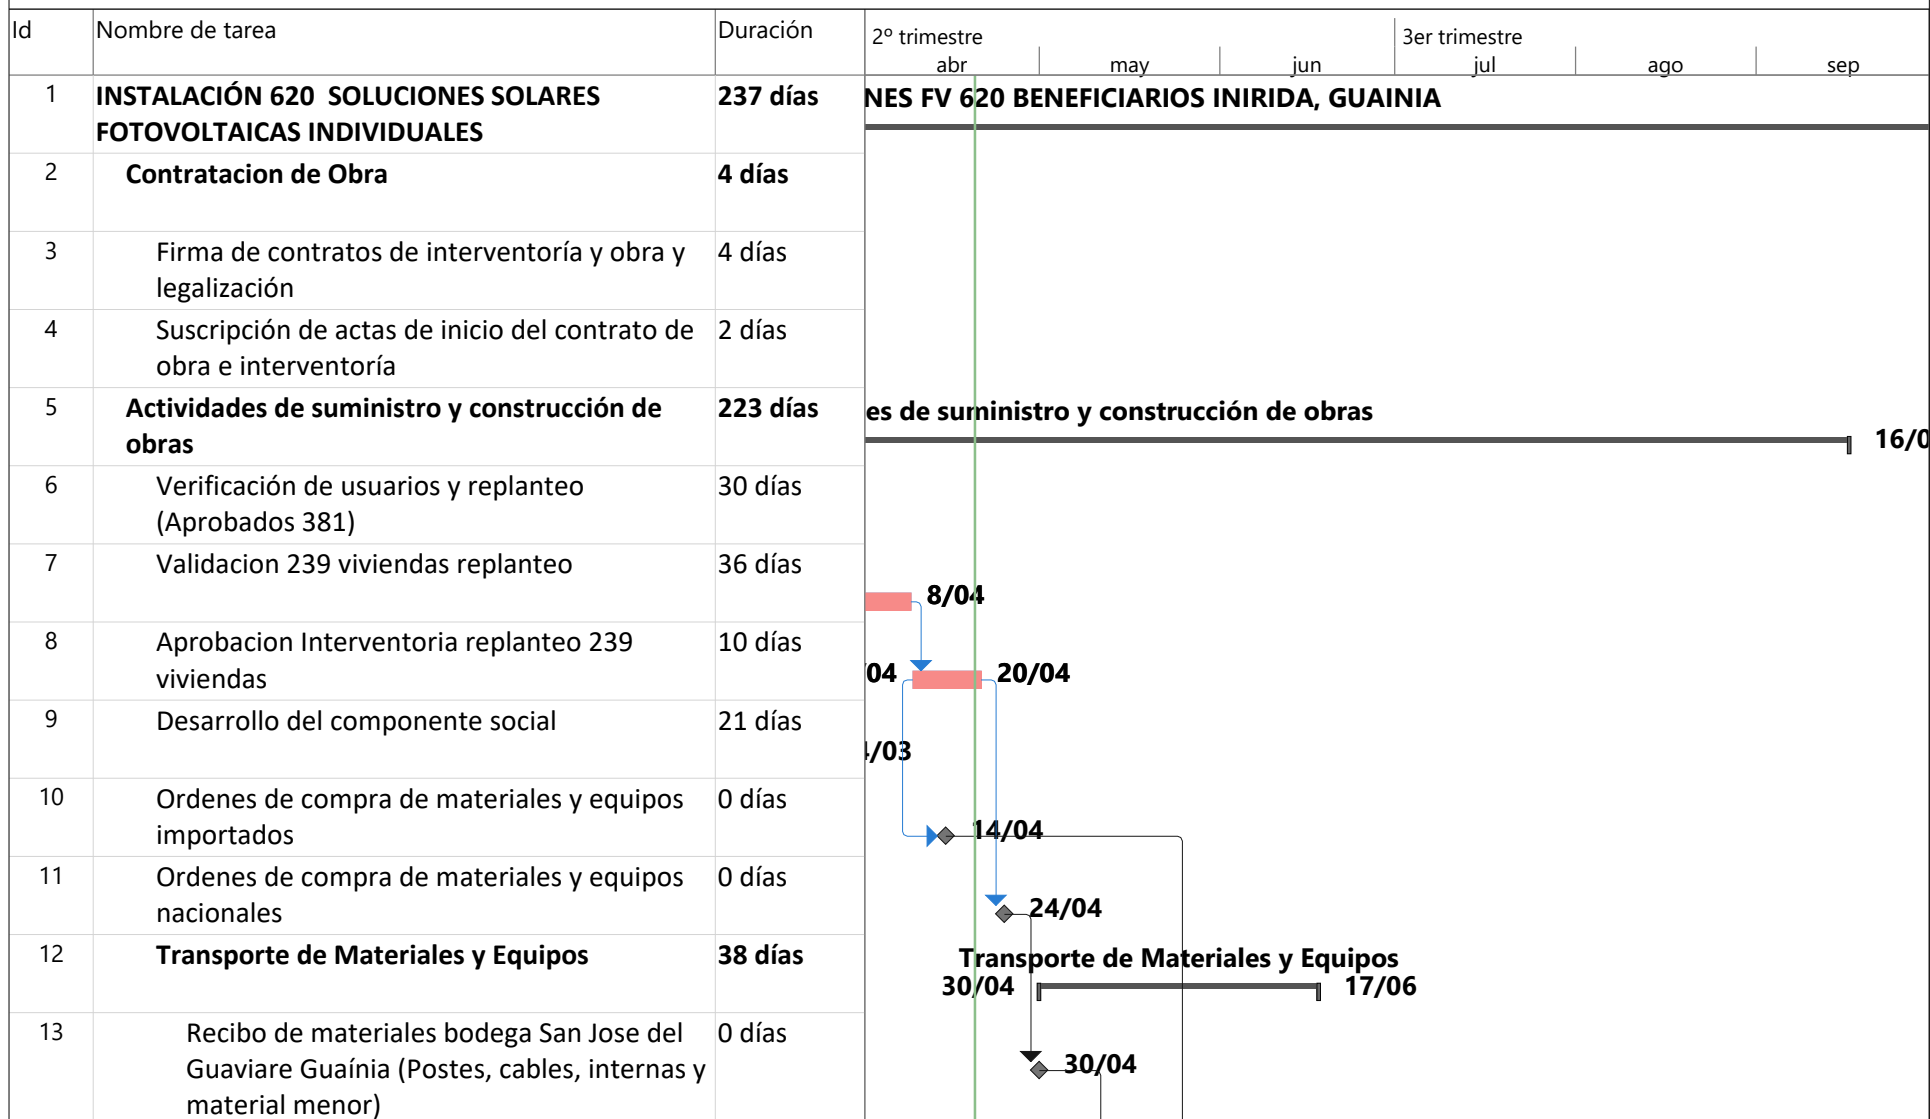

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica

Tarea



Hito

Tarea resumen




Resumen del proyecto

Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

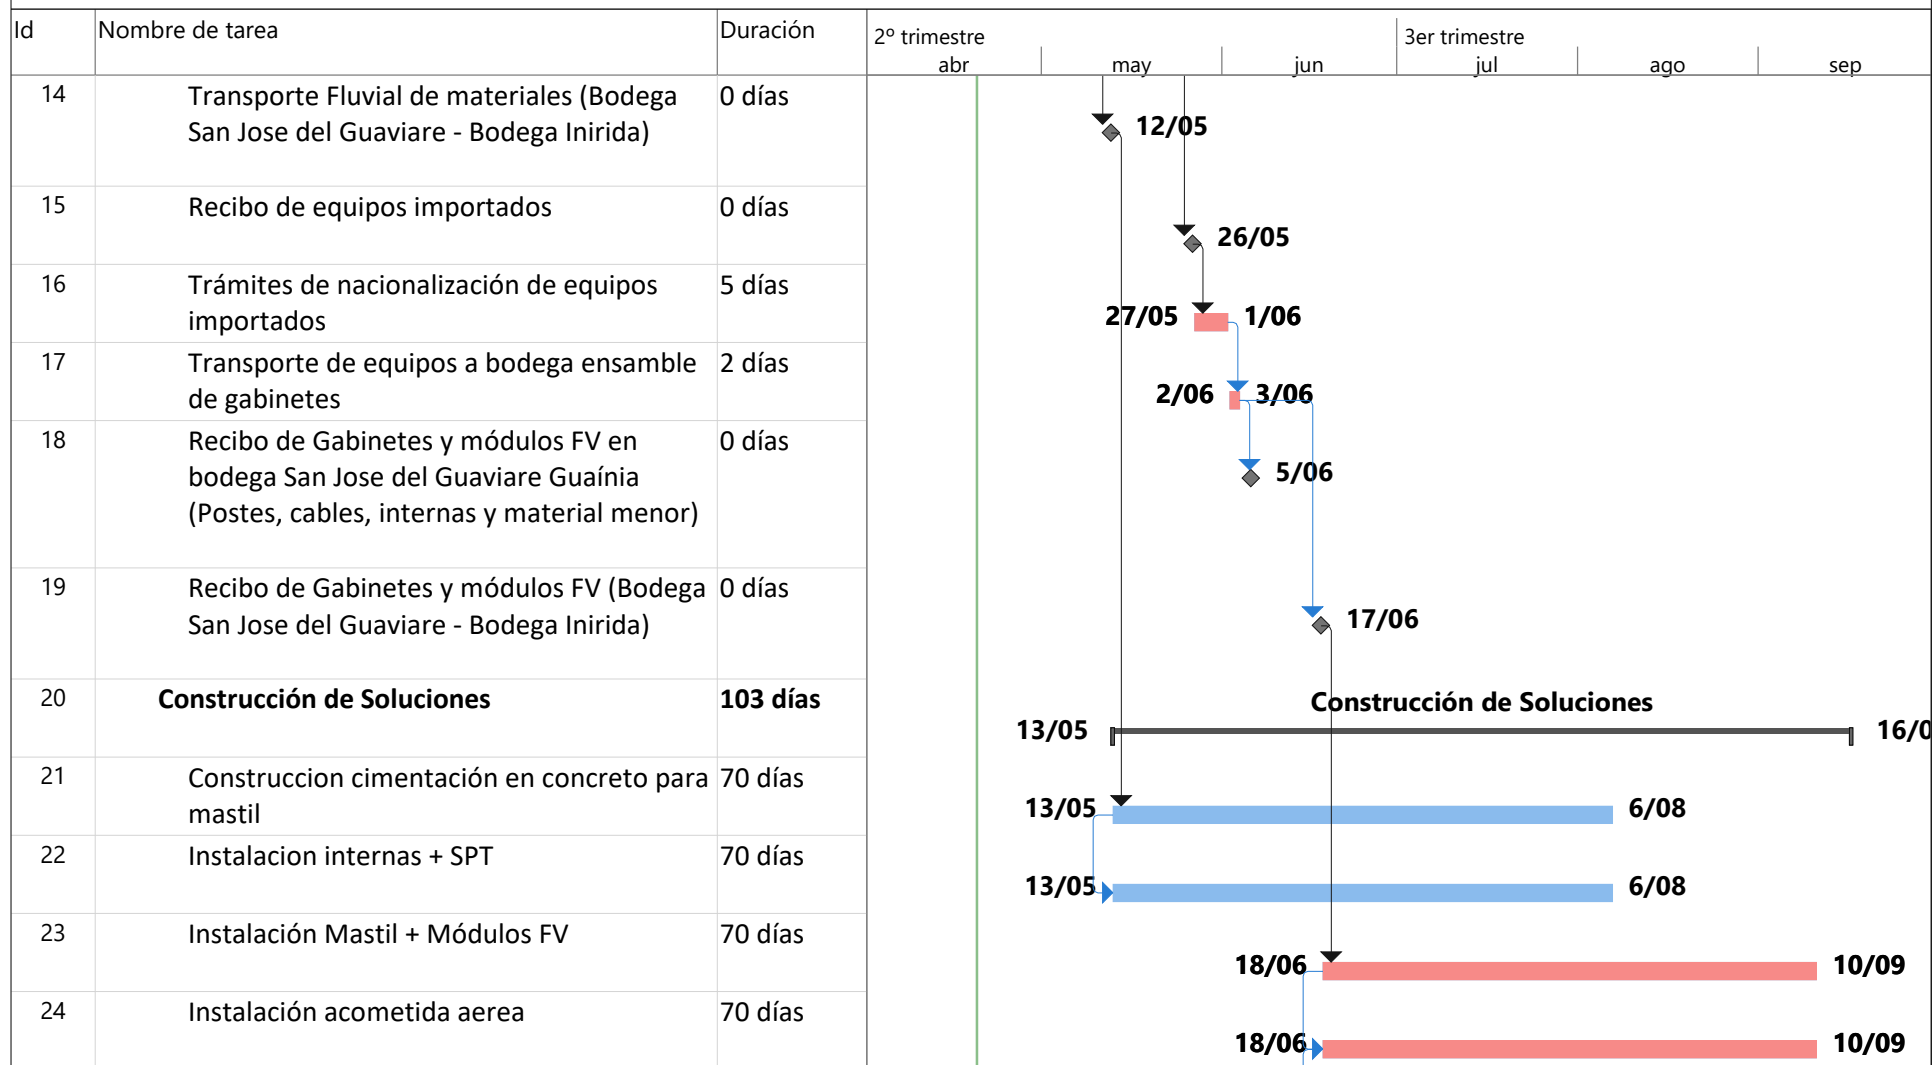

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea




Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

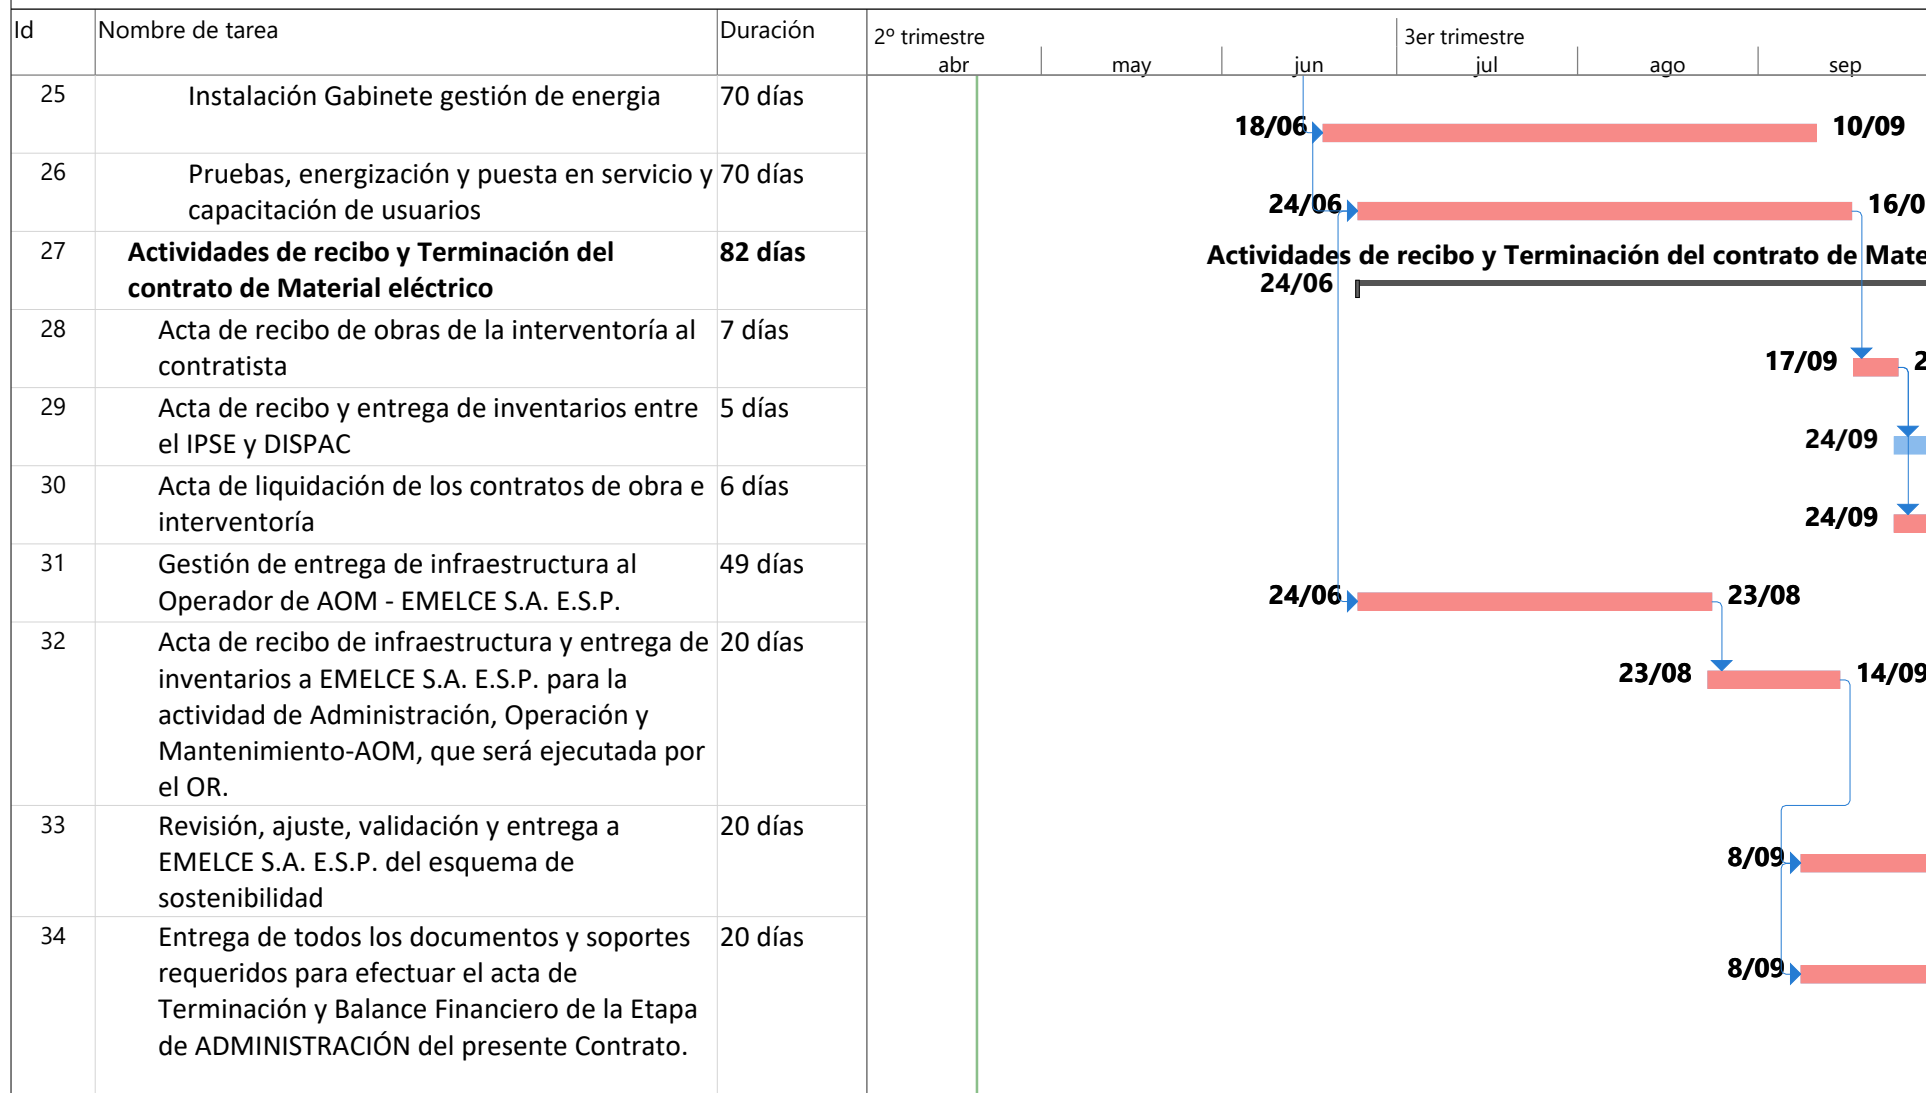

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea



Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Id	Nombre de tarea	Duración	4º trimestre				1er trimestre	
			sep	oct	nov	dic	ene	feb
1	INSTALACIÓN 620 SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES	237 días	<div><div></div><div>Beneficiarios</div><div></div></div>	<div><div></div><div>INIRIDA, GUAINIA</div><div></div></div>				
2	Contratacion de Obra	4 días						
3	Firma de contratos de interventoría y obra y legalización	4 días						
4	Suscripción de actas de inicio del contrato de obra e interventoría	2 días						
5	Actividades de suministro y construcción de obras	223 días						
6	Verificación de usuarios y replanteo (Aprobados 381)	30 días						
7	Validacion 239 viviendas replanteo	36 días						
8	Aprobacion Interventoria replanteo 239 viviendas	10 días						
9	Desarrollo del componente social	21 días						
10	Ordenes de compra de materiales y equipos importados	0 días						
11	Ordenes de compra de materiales y equipos nacionales	0 días						
12	Transporte de Materiales y Equipos	38 días						
13	Recibo de materiales bodega San Jose del Guaviare Guainia (Postes, cables, internas y material menor)	0 días						

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea



Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Id	Nombre de tarea	Duración	4° trimestre							1er trimestre	
			sep	oct	nov	dic	ene	feb			
14	Transporte Fluvial de materiales (Bodega San Jose del Guaviare - Bodega Inirida)	0 días									
15	Recibo de equipos importados	0 días									
16	Trámites de nacionalización de equipos importados	5 días									
17	Transporte de equipos a bodega ensamble de gabinetes	2 días									
18	Recibo de Gabinetes y módulos FV en bodega San Jose del Guaviare Guainia (Postes, cables, internas y material menor)	0 días									
19	Recibo de Gabinetes y módulos FV (Bodega San Jose del Guaviare - Bodega Inirida)	0 días									
20	Construcción de Soluciones	103 días	<div><div></div><div>16/09</div></div>								
21	Construccion cimentación en concreto para mastil	70 días	<div><div></div><div>10/09</div></div>								
22	Instalacion internas + SPT	70 días									
23	Instalación Mastil + Módulos FV	70 días									
24	Instalación acometida aerea	70 días									

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea



Tarea resumen



Tareas críticas



INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Id	Nombre de tarea	Duración	sep	4º trimestre oct	nov	dic	1er trimestre ene	feb
25	Instalación Gabinete gestión de energia	70 días	10/09					
26	Pruebas, energización y puesta en servicio y capacitación de usuarios	70 días	16/09					
27	Actividades de recibo y Terminación del contrato de Material eléctrico	82 días	trato de Material eléctrico	30/09				
28	Acta de recibo de obras de la interventoría al contratista	7 días	17/09	24/09				
29	Acta de recibo y entrega de inventarios entre el IPSE y DISPAC	5 días	24/09	29/09				
30	Acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría	6 días	24/09	30/09				
31	Gestión de entrega de infraestructura al Operador de AOM - EMELCE S.A. E.S.P.	49 días	/08					
32	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios a EMELCE S.A. E.S.P. para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	20 días	14/09					
33	Revisión, ajuste, validación y entrega a EMELCE S.A. E.S.P. del esquema de sostenibilidad	20 días	09	30/09				
34	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	20 días	09	30/09				

Puerto Inirida, Guainia
Contrato DG-038-2020

División crítica



Hito



Resumen del proyecto



Tarea




Tarea resumen



Tareas críticas





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Santiago de Cali, 20 de Abril de 2021

ING-020-038-013

Señores

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP

Atn. Ing. Juan Camilo Gómez Sánchez

Supervisor del Contrato DG-038-2020

SEGEN INGENIERIA SAS

Atn. Ing. Miguel Antonio Santacruz Varela

Interventor del Contrato DG-038-2020

Ref. CONTRATO No. DG-038-2020 “CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA”

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO

Cordial Saludo,

De manera atenta y en acuerdo con lo establecido a la CLAUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO del contrato en referencia, la cual estipula la duración del contrato, HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S se permite poner en conocimiento de ustedes aquellas novedades que han tenido un impacto significativo en el desarrollo del proyecto el cual tiene como fecha límite de terminación el 30 de Julio de 2021:

CONSIDERACIONES

Que el día 18 de Diciembre de 2020 se suscribió el contrato No. DG-038-2020 entre HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS y DISPAC SA ESP con un plazo de ejecución hasta el 30 de Julio de 2021, cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.”

Empresa



Certificada




www.hgingeneria.com.co



Carrera 64A# 5-30



(2) 3842963 (+57) 320 5664031



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Que posterior al cumplimiento de requisitos legales se firmó el acta de inicio, el día 18 de Diciembre de 2020 entre las partes con fecha de terminación el 30 de Julio de 2021.

Que durante la ejecución de la etapa de replanteo desarrollada en el mes de Diciembre de 2020 y Enero de 2021, se presentaron diferentes situaciones en las cuales se identificaron múltiples casos donde dos o más personas del listado inicial levantado por la empresa de Energía La Ceiba S.A ESP – EMELCE S.A ESP pertenecían a una misma casa y coordinada Adicionalmente, por la temporada decembrina y de fin de año, muchos usuarios no se encontraban en la vivienda. Esto último, retraso la etapa de replanteo ya que solo se permite un usuario beneficiado por vivienda, pues la solución fotovoltaica tiene proyectado otorgar el beneficio de energía eléctrica a la vivienda y, por ende, a todos sus habitantes. Esto significó que al terminar la actividad del replanteo se contara solo con 381 usuarios validados de 620 usuarios proyectados por el listado inicial, es decir el 61.45% del total de usuarios, quedando un déficit de 239 usuarios.


Que, debido a los inconvenientes presentados, el 23 de Febrero de 2021 en reunión con el IPSE, DISPAC SA ESP, EMELCE SA ESP e Interventoría se escaló las novedades encontradas en campo, por lo que por parte del IPSE se solicitó realizar nuevamente las visitas de replanteo, esta vez con el personal de EMELCE SA ESP dado que como estructuradores del proyecto, conocían la zona y ubicación exacta de los usuarios incluidos dentro del proyecto.

Que el día 24 de febrero de 2021, se solicitó a EMELCE SA ESP mediante comunicado Oficio ING - 020-038-006, el acompañamiento para las visitas de validación que iniciarían el 26 de Febrero de 2021, a lo cual recibimos respuesta positiva.

Que el día 27 de Febrero de 2021 se iniciaron nuevamente las visitas de verificación de usuarios con el EMELCE SA ESP e Interventoría en las 24 localidades beneficiadas del proyecto, actividad que termino el día 19 de marzo de 2021, obteniendo un resultado de 615 usuarios que representa el 99% del total de los usuarios del proyecto (620 usuarios).

Que el proyecto presenta un déficit 5 usuarios, los cuales se buscaran en las veredas beneficiadas en el contrato cuando inicie la etapa de construcción, pues se tiene conocimiento de múltiples casas que se encontraban en construcción durante el desarrollo del replanteo y cuyos habitantes afirmaron que se tendrían listas para cuando iniciase la etapa de construcción.





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Que, dado los inconvenientes presentados en la etapa de replanteo, no se pudo avanzar en las actividades de gestión y compra de materiales de importación del proyecto como se tenía previsto en el cronograma inicial, actividad que estaba prevista para el mes de Febrero hasta no tener certeza de la totalidad de usuarios validados del proyecto, dicha actividad como se indico anteriormente fue terminada a finales del mes de marzo.

Que, una vez terminado la etapa de replanteo, se procedió a realizar la compra de los materiales de importación (Paneles, Inversores, Controladores y Baterías) que tienen un tiempo estimativo de entrega de 13 semanas incluyendo los tramites de fabricación, transporte y nacionalización, es decir aproximadamente 3 meses, tiempo que comenzó a correr a partir de la primera semana del mes de abril por lo cual se estima la llegada de los equipos al puerto de Buenaventura aproximadamente el 18 de Junio de 2021.

Que una vez los equipos se encuentren nacionalizados, estos equipos van a ser transportados a las instalaciones del proveedor de los gabinetes de gestión de energía ubicada en la ciudad de Yumbo, para iniciar con el proceso de ensamble y conexión para posteriormente ser transportados a la ciudad de Inírida donde se encuentra el centro de acopio de materiales del contratista.


Que una vez los equipos se encuentren en Inírida, estos deberán ser distribuidos vía fluvial a los 620 usuarios beneficiados del proyecto que se encuentran distribuidos en 24 veredas.

Que surtida la etapa de transporte de materiales se iniciará con la etapa de montaje, instalación, pruebas de funcionamiento y posteriormente entrega de viviendas con su respectivo sistema de energía fotovoltaico funcionando.

Que desde el 18 de Junio de 2021 fecha que llegan los equipos a Colombia hasta el 31 de Julio de 2021 fecha límite de finalización del proyecto hay 43 días de ejecución para realizar las actividades de Ensamble de gabinetes, transporte de materiales a sitio de acopio, transporte de materiales a 620 usuarios, montaje de 620 gabinetes de gestión energía y paneles solares, pruebas de funcionamiento y entrega a satisfacción, adicionalmente la etapa de capacitación del AOM encargado de recibir el proyecto.

En mérito de las consideraciones expuestas, solicitamos que del respectivo contrato se tenga en cuenta las novedades e imprevistos que han tenido un impacto significativo en el desarrollo normal de las actividades planificadas y por tanto han dilatado los tiempos de ejecución principalmente la etapa de gestión y compra de





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

materiales; lo cual justifica suficientemente la posibilidad de que se suscriba entre las partes un otrosí de prórroga o documento de modificación al contrato por un término de ocho (8) semanas adicionales, contados a partir de la fecha de terminación del contrato, esto es, el 31 de Julio de 2020, ya que, con las situaciones actuales, ajenas al contratista, es inviable la ejecución del respectivo contrato en los tiempos estipulados

Cordialmente,

HERNAN GARCIA MAHECHA
REPRESENTANTE LEGAL
HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Empresa



Certificada



www.hgingeneria.com.co



Carrera 64A# 5-30



(2) 3842963 (+57) 320 5664031
