



Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P.
Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios S.S.P.
Nuir 1 - 17380000 - 1 RUPS 3021
Nit. 810004450-8
No aplicar retención ICA Artículo 32 ley 14 de 1983. Artículo 100 numeral 5 Acuerdo 051 del 2010
Estatuto Tributario Municipal
Centro Comercial Dorada Plaza Of. 202-1
Teléfonos: 8572004 - 8576097
<http://www.espladorada-caldas.gov.co>
Email: espladorada@hotmail.com
La Dorada, Caldas

**Documento
Soporte
Electrónico**

ESP34

Fecha generación 2023-03-10 00:00:00-05:00
Fecha validación 2023-03-10 16:32:44-05:00
Moneda COP
Tipo operación Estandar

Vendedor JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARIÑO
Documento/Nit 14325525-1
Dirección CLL 17# 10-17
Correo sebastiannmi56@gmail.com

Teléfono 3202315484
Código Postal 175030
Ciudad LA DORADA-CALDAS

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	001	1.00	94	contrato prestacion por servicios Como Ingeniero Civil, Correspondiente al mes de Febrero de 2023, CD-005-2023	3.410.000.00	3.410.000.00	0.00	0	3.410.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Código	Medio	Valor
Contado	2023-03-10 16:32:41Z	ZZZ	Acuerdo mutuo	\$ 3410000 COP

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	3.410.000.00
Total mas Impuesto	3.410.000.00
Total Operación	3.410.000.00



Observaciones

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00 /100 COP

Observación:

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a JUAN SEBASTIAN MILLIAN MARIÑO, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

INFORME DE CONTRATISTAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES N°2

Tipo de Informe:	Final ☐	Parcial ☒	Pago No: <u>2</u>
------------------	--------------------------------	---	-------------------

Número del contrato: CD 005 de 16 de Enero 2023	Fecha del contrato: 16 de Enero de 2023	Fecha de Iniciación: 16 de Enero de 2023	Fecha de Terminación: 31 de Marzo 2023
Nombre del Contratista: JUAN SEBASTIAN MILLAN MARIÑO		Identificación del Contratista: 14.325.525 DE HONDA	
Objeto del contrato de Prestación de Servicios (de servicios profesionales): PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA No. 12112103 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA – E.S.P.D.			
Nombre del Supervisor: Cristian Andrés Quiñones Díaz		Cargo del Supervisor: Director Administrativo y Financiero E.S.P.D.	Dependencia: Administrativa
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 66,66%			
VALOR POR PAGAR: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$3.410.000) BANCO: BBVA CUENTA No. (De ahorros): Cuenta de ahorros No. 390209591			



Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado (del mes de Febrero 2023)
1) Actuar como ente de control sobre el CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y apoyar, sin interferir en sus procedimientos privados.	Durante este periodo de tiempo de ejecución contractual, se ha ejercido control a las actividades para su buen desarrollo, dicho control no ha interferido en nada a sus procedimientos, se ha prestado un buen apoyo y colaboración.
2) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos asignados al contrato de obra.	La eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos asignados al contrato se garantizan en el seguimiento de las actividades a realizar semana a semana lo cual se evidencia en el informe quincenal en la parte del control de avances.
3) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del objeto contractual.	Durante el periodo de tiempo de este informe se aseguró de que CONTRATISTA DE OBRA de cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del objeto contractual. En este periodo de tiempo se realiza prórroga de tiempo de 60 días calendario y adición en dinero por \$403.689.161,00 se evidencia en los informes quincenales de febrero.
4) Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes, conceptos, aclaraciones y explicaciones que se requieran en los términos que se establezcan.	Se mantiene la constante comunicación y se está al tanto de todas las actividades de la obra para que en cualquier momento se pueda suministrar a la ESP Y A LA ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes, conceptos, aclaraciones y explicaciones necesarias.
5) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el desarrollo del proyecto, o cuando tal incumplimiento se presente	Se han realizado el envío de correos de alertas de obra por encontrarse en riesgo de incumplimiento de entrega de obra para la entrega de esta a la fecha contractual estipulada.
6) Velar porque el contrato de obra no se interrumpa de manera injustificada.	No se han generado interrupciones injustificadas.
7) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la información necesaria para realizar el seguimiento y control del contrato de obra, así como recomendar lo que contribuya a la mejora en la ejecución del objeto contractual del proyecto y, en general adoptar las medidas para un óptimo avance del contrato de obra.	El contratista de obra suministra la información que se le solicita, a la vez se le contribuye con la mejora del objeto contractual para así tener un óptimo avance de obra.



8) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones; las instrucciones que imparta serán por escrito, y son de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA DE OBRA siempre y cuando, estén en concordancia con la constitución, la ley y el contrato de obra.	Se deja constancia escrita las cuales las encontramos en los correos enviados, en la bitácora de obra y en las actas de seguimiento de obra.
9 Revisar y aprobar las obras y actas del CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la ejecución del contrato de obra.	En el periodo de este informe el contratista realiza acta parcial de obra 4.
10) Revisar los informes y documentos que se generen del contratista de obra.	Se revisaron documentos e informes semanales y mensuales presentados por el CONTRATISTA DE OBRA, esto lo encontramos en los informes quincenales que se entregan a la E.S.P. en la parte de control de avances y Anexo K informe mensual Contratista.
11) Revisar las cuentas de cobro del contratista de obra y llevar control de las pólizas	Se revisan las cuentas de cobro de contratista de obra como al igual se da control de las pólizas cuando las entrega el contratista con las modificaciones.
12) Entregar informes parciales desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico conforme al formato entregado por la alcaldía de la Dorada Caldas.	Se entregan los informes quincenales y ejecutivos en donde encontramos punto de vista administrativo, financiero y técnico conforme al formato entregado por la Alcaldía de la Dorada Caldas
13) Proyectar al acta de liquidación de la obra.	Se tiene en un archivo guardado la información del todo el proyecto para que en su momento de estar pronto a culminarse se pueda iniciar a proyectar el acta de liquidación de la obra.
14) . Llevar control sobre la bitácora del contratista.	Se lleva el control de la bitácora de obra diariamente y se realizan anotaciones cuando se necesiten dejar por escrito en esta para generar evidencia.
15) Velar por que se efectúe una correcta ejecución financiera del contrato.	Se lleva una correcta ejecución a la fecha, se puede evidenciar en los avances financieros que se anexan en los informes quincenales suministrados a la E.S.P.D para que se realice el envío de estos al Supervisor del contrato
16) Proyectar actas de suspensión, modificación, inicio, reinicio y actas de menores de mayores cantidades del contrato de obra	Se realizó revisión y aprobación de la prórroga y adición 6 solicitada por el contratista de obra
17) Realizar medición de las cantidades de obra.	Hasta el momento se han realizado las mediciones de las cantidades de obra dichos resultados de las mediciones reposan en las cantidades ejecutadas semanalmente estas se encuentran en el informe quincenal en la parte de control de avances
18) El contratista deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo	A la fecha 28 de febrero el contratista se encuentra al día y se anexa a este informe.



50 de la ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	
19) El contratista se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual.	El desarrollo del contrato se ejecuta dentro de los parámetros legales.
20) Acatar las instrucciones impartidas por parte del supervisor designado durante la ejecución del objeto	Se acatan las instrucciones impartidas de parte del supervisor. Suministrando y entregando la información e informes requeridos.



JUAN SEBASTIAN MILLAN MARIÑO
C.C 14.325.525 de Honda.

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas hasta el día (28) de Febrero de 2023.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.

Por lo anterior, se puede efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios (*Profesionales*) No CD 005 DE 16 DE ENERO DE 2023



Cristian Andrés Quiñones Díaz
C.C 1037614765
Supervisor

INFORME FOTOGRAFICO

- Actividades ejecutadas en el mes de Febrero

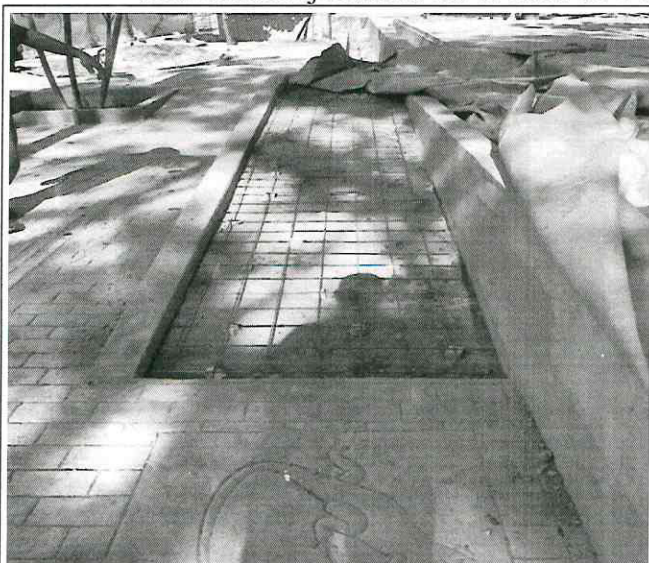
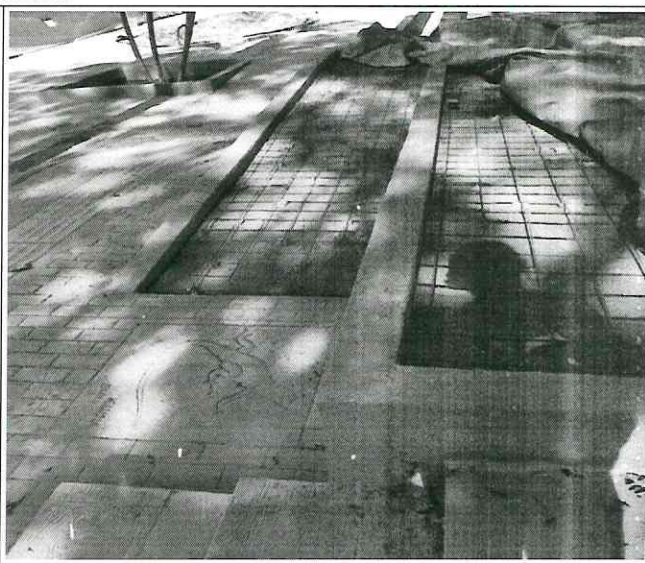


Imagen: 1-2

Descripción: Suministro e instalación de Malla electrosoldada de 15 x 15 x 5 mm

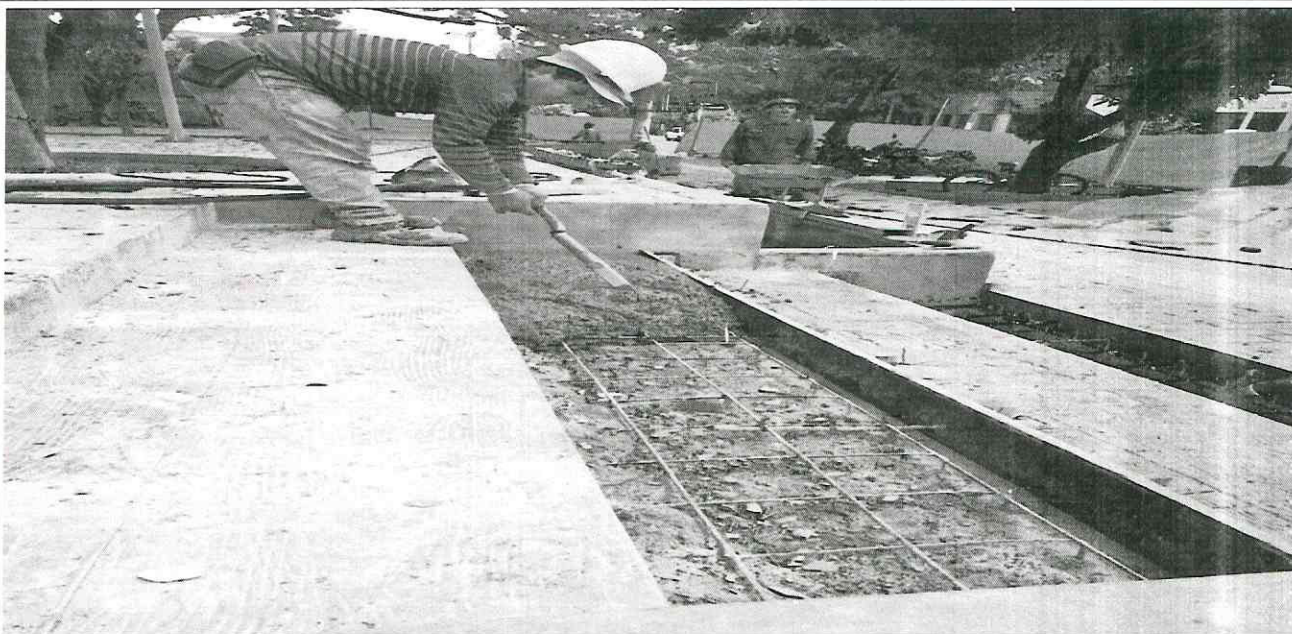


Imagen: 3-4

Descripción: Suministro e instalación de Malla electrosoldada de 15 x 15 x 6 mm



Imagen: 5-6

Descripción: Suministro e instalación de filtro para riego profundo de raíces arbóreas

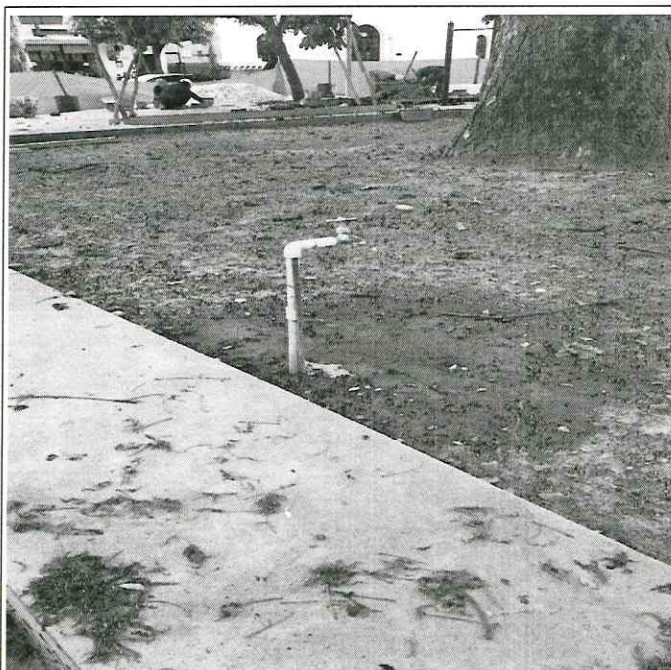


Imagen: 7-8

Descripción: Puntos hidráulicos 1/2"



Imagen: 9-10

- Descripción:** Suministro, transporte e instalación de parque infantil Modular 6.3 x 5.2 x 3.9 incluye una caseta con techo, Deslizadero Sencillo, Pasos de Equilibrio, Deslizadero Doble, Escalera de Ascenso y Descenso, incluye accesorios para su óptimo funcionamiento



Imagen: 11-12



- **Descripción:** Juego infantil modular de 5x5 incluye una caseta con techo en fibra de vidrio, 1 deslizador de fibra de vidrio, 1 plataforma, 1 escalera de accesorios curva, 1 pasamanos en lagrima, 1 pasamanos en línea, 2 barras, 2 pasamanos, 2 escaleras de acceso rectas, incluye accesorios para su optimo funcionamiento.



Imagen: 13-14

- **Descripción:** Suministro, transporte e instalación de concreto estampado de 20,7 mpa (3.000 psi) para losas- e=10 cm. color y figura según diseños suministrados.

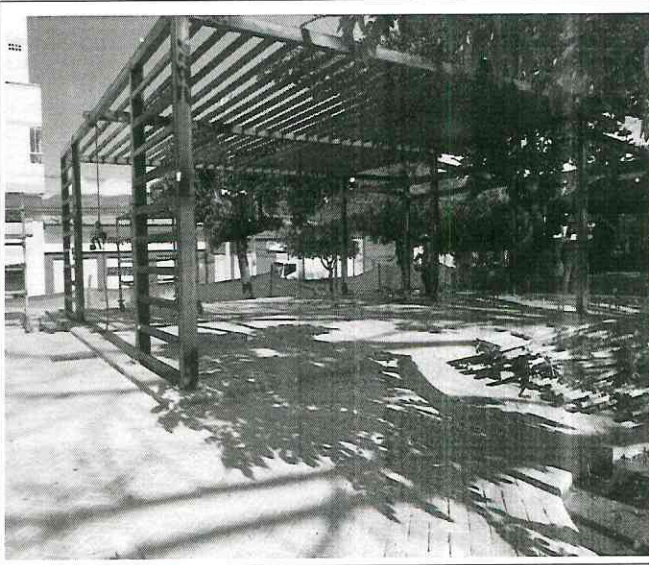


Imagen: 15-16

- **Descripción:**
- Suministro e instalación de perlin (perfil hr en c) 220x80x2.0mm
- Suministro e instalación de perfil estructural cuadrado de 150x150x4mm
- Suministro e instalación de perfil estructural cuadrado de 150x150x6mm
- Suministro e instalación de perfil estructural rectangular de 150x100x4mm
- Suministro e instalación de perfil estructural rectangular de 76x38x2mm

• Actividades ejecutadas en el Parque Jorge E. Gaitán del 16 al 31 de enero 2023



Imagen: 1-2

- **Descripción:** Suministro transporte e instalación de concreto para pavimento rígido MR-38, incluye sellado de juntas y acero de transferencia y unión, para zona de parqueaderos h 0.15m. PJEG



Imagen: 3-4

- **Descripción:** Suministro, transporte e instalación Tubería PVC d = 8" NOVAFORT. Incluye Accesorios. PJEG



	ACTA No. 57
Fecha:	02 de febrero de 2023
Hora inicio:	9:00 am
Lugar:	Parque Simón Bolívar
Responsable	Interventoría ESP.

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato de obra N°29122101 "Mejoramiento y transformación de los parques Simón Bolívar y Jorge Eliécer Gaitán en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada está en mi corazón".

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participación de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervisión de la alcaldía Municipal y la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.

Se da inicio al comité:

- Estado de la obra
 - Se continúa realizando actividades en el Parque Simón Bolívar de concreto estampado placa interna y andenes, conformación de rampas y escaleras. En el parque Jorge Eliécer Gaitán se está realizando excavación e instalación de tubería del sistema sanitario.
- Seguimiento a los compromisos
 - El contratista cumplió la entrega del informe mensual correspondiente al mes de diciembre.
- Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - La SST de interventoría manifiesta que el día miércoles 01 de febrero a las 3:45 pm, se continuo con la actividad de excavación e instalación de tubería sanitaria en el parque Jorge Eliécer Gaitán. La cual se coordinó con el equipo de trabajo la ejecución de dicha actividad, identificando los riesgos que se podían presentar; se implementaron medidas de protección, prevención y uso de Elementos de Protección Personal.

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité.

COMPROMISOS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen	1-2
Descripción	Desarrollo de comité



[illegible]



	ACTA No. 58
Fecha:	10 de febrero de 2023
Hora inicio:	9:00 am
Lugar:	Parque Simón Bolívar
Responsable	Interventoría ESP.
AGENDA:	
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato de obra N°29122101 "Mejoramiento y transformación de los parques Simón Bolívar y Jorge Eliecer Gaitán en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada está en mi corazón".	

DESARROLLO DE LA AGENDA:
<p>Se da inicio al comité de obra con la participación de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervisión de la alcaldía Municipal y la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.</p> <p>Se da inicio al comité:</p> <p>La interventoría sugiere al contratista iniciar con las actividades de instalación en el parque Simón Bolívar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tapas de sumideros, mortero de nivelación, canecas, bancas, instalación de piedra en materas, deck, pintar las bahías, tope llantas, cableado del sistema eléctrico de los reflectores, "filtros" de los árboles en las materas y referenciar su ubicación, tener en sitio la grama sintética, iniciar el montaje de los parques infantiles y de las casetas.- El contratista solicita a la supervisión especificar el tipo de señales informativas que se deben instalar en cada parque.• La interventoría manifiesta que se encuentra pendiente por parte del contratista la entrega del informe correspondiente al mes de enero.• El contratista solicita que se gestione la intervención de los árboles en el Parque Jorge Eliecer Gaitán.• La interventoría solicita al contratista, arreglar las losas afectadas en la calle 13 entre carrera primera y segunda del parque Jorge Eliecer Gaitán, por la afectación generada durante la actividad de excavación e instalación de tubería sanitaria.• Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo- Se solicita al contratista la planilla cancelada de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al mes de enero.- Se le recuerda al contratista dar cumplimiento a la entrega de dotación y reposición de los Elementos de Protección Personal e individual (EPP- EPI) a los colaboradores para mejorar sus condiciones de seguridad. <p>Siendo las 10:25 am se da por terminado el comité.</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO

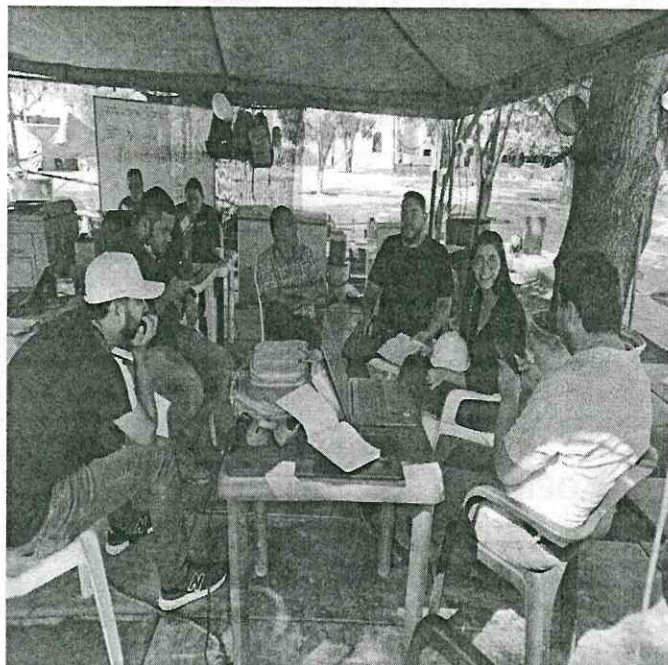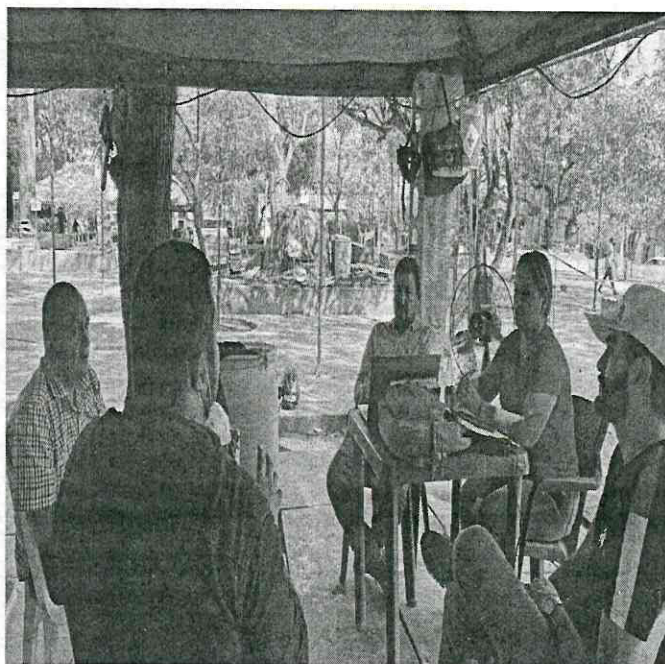

Imagen

1-2

Descripción

Desarrollo de comité

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1
Telefonos 8572004 8576097

ACTA No. 59	
Fecha:	17 de febrero de 2023
Hora inicio:	9:00 am
Lugar:	Parque Simón Bolívar
Responsable	Interventoría ESP.
AGENDA:	
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato de obra N°29122101 "Mejoramiento y transformación de los parques Simón Bolívar y Jorge Eliecer Gaitán en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada está en mi corazón".	

DESARROLLO DE LA AGENDA:
<p>Se da inicio al comité de obra con la participación de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervisión de la alcaldía Municipal y la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.</p> <p>Se da inicio al comité:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista reitera a la supervisión especificar el tipo de señales informativas que se deben instalar en cada parque. • Interventoría le recuerda al contratista, intervenir las losas afectadas en la calle 13 entre carrera primera y segunda del parque Jorge Eliecer Gaitán, por la afectación generada durante la actividad de excavación e instalación de tubería sanitaria. • Interventoría solicita al contratista, realizar demoliciones en puntos específicos de placa en la carrera tercera con calle 16, en el parque Simón Bolívar. • Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Se recuerda al contratista enviar planilla cancelada de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al mes de enero. Teniendo en cuenta que según el decreto 1990 de 2016, se establecen las fechas límites de pago para realizar los aportes al SGSS. - Se insiste al contratista dar cumplimiento a la entrega de dotación y reposición de los Elementos de Protección Personal e individual (EPP- EPI) a los colaboradores para mejorar sus condiciones de seguridad.

COMPROMISOS
<ul style="list-style-type: none"> • Contratista, entregar balance de obra a 17 de febrero de 2023. • Supervisión, definir y enviar al contratista el tipo de señales informativas que se deben instalar en cada parque.

REGISTRO FOTOGRAFICO

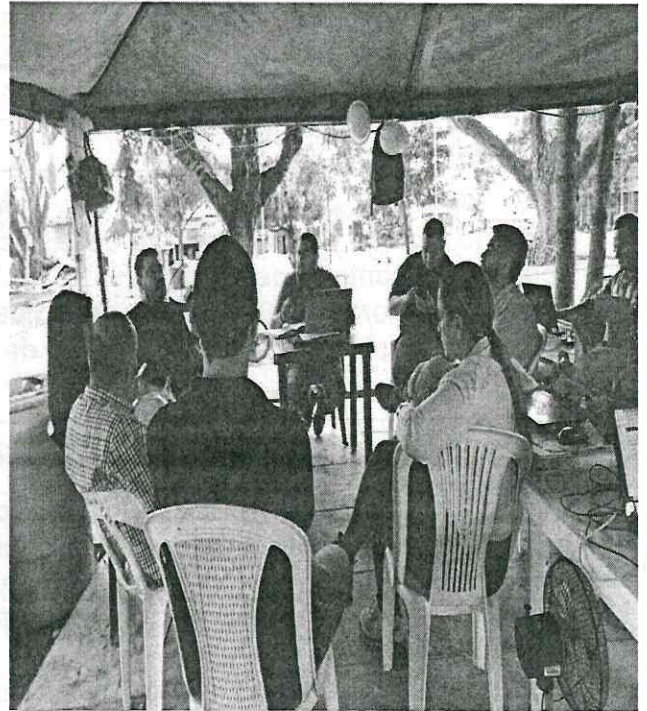


Imagen	1-2
Descripción	Desarrollo de comité

[illegible]



	ACTA No. 60
Fecha:	23 de febrero de 2023
Hora inicio:	9:00 am
Lugar:	Parque Simón Bolívar
Responsable	Interventoría ESP.
AGENDA:	
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato de obra N°29122101 "Mejoramiento y transformación de los parques Simón Bolívar y Jorge Eliécer Gaitán en el desarrollo del programa espacios educadores en cumplimiento del plan de desarrollo la Dorada está en mi corazón".	

DESARROLLO DE LA AGENDA:
<p>Se da inicio al comité de obra con la participación de Consorcio los parques La Dorada 2021, la supervisión de la alcaldía Municipal y la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P. con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.</p> <p>Se da inicio al comité:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a compromisos:<ul style="list-style-type: none">- El contratista cumplió la entrega del balance de obra.- Se encuentra pendiente por parte de la supervisión definir el tipo de señales informativas que se deben instalar en cada parque.• Reporte estado de la obra<ul style="list-style-type: none">- Pronóstico de entrega de las obras el día 15 de abril de 2023.- El contratista manifiesta que ya se compró el 90% del mobiliario para el parque Simón Bolívar, quedando pendiente las barandas y las canecas de basura.• Seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo<ul style="list-style-type: none">- Se reitera al contratista dar cumplimiento a la entrega de dotación y reposición de los Elementos de Protección Personal e individual (EPP- EPI) a los colaboradores para mejorar sus condiciones de seguridad.- El contratista manifiesta que en el transcurso del día realizara la entrega de las dotaciones pendientes y las reposiciones de los EPP de acuerdo al deterioro o contaminación que presenten por uso o desgaste.• Varios<ul style="list-style-type: none">- Realizar visita técnica con el secretario de planeación y definir la diferencia de colores de concretos externos.- El contratista manifiesta que se proyecta iniciar el día 24 de febrero, la fundición de las bahías del parque Jorge Eliécer Gaitán. <p>La interventoría solicita al contratista:</p>



DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Intervenir la conexión de la caja, de la vía en la carrera segunda con calle 16, en el parque Simón Bolívar.
- Solucionar lo antes posible el tema del pendientado en el Parque Jorge Eliecer Gaitán.

COMPROMISOS

- Supervisión:
 - en el transcurso del día enviará al contratista el tipo de señales informativas que se deben instalar en cada parque.
 - Gestionar retiro de postes en el parque Simón Bolívar.

REGISTRO FOTOGRAFICO

			
Imagen	1-2		
Descripción	Desarrollo de comité		

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION															
CÓDIGO	NOMBRE	Na.	COTIZANTES	COTIZACIÓN			APORTES VOLUNTARIOS			MORA			TOTALES				
				EMPL. LEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSIP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSIP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
330001	PROTECCIÓN		1		\$ 327.100		\$ 0		\$ 0		\$ 1.200		\$ 0		\$ 327.100	\$ 1.200	\$ 328.300
TOTALES:															\$ 327.100	\$ 1.200	\$ 328.300

[illegible]

[Handwritten signature]



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JUAN SEBASTIAN MILLAN MARINO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 14,325,525 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 390209591 aperturada el 29 de agosto de 2012 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 6 de diciembre de 2022.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0390209591
Cuenta de 16 dígitos:	0390000200209591
Cuenta de 20 dígitos:	00130390000200209591

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.
