

INFORME No.3 DE OBRA



ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC

OPS 173-2023

RADICADO 3131 FECHA 2/11/2023 HORA 11:27:24 a. m.
ASUNTO INFORME N. 3, CUMPLIMIENTO OPS N. 173-
2023, JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS No FOLIOS 42
ORIGEN JOSE ALIRIO ALVAREZ DESTINO NIXON CUEVA MARQUEZ
CARDENAS
Recibido por: 

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL RESCATE Y PROPAGACION DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA

CONTRATANTE: IES CINOC. PENSILVANIA – CALDAS

CONTRATISTA: ING. JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS

OCTUBRE DE 2023

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	5
4. DATOS BASICOS DEL CONTRATISTA.....	6
5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO	6
6. PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA.....	8
7. PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA No. 3.....	10
8. PERSONAL EN OBRA	16
9. REGISTRO FOTOGRAFICO	16

1. INTRODUCCIÓN

El colegio Integrado nacional del oriente de Caldas IES CINOC localizado en el municipio de Pensilvania, Caldas; es una estructura académica y de apoyo altamente flexible que permite ofrecer programas por ciclos propedéuticos desde el nivel técnico, tecnológico y profesional en alianzas interinstitucionales educativa, cumpliendo dentro de la organización integral de los procesos de docencia, investigación y proyección social como garantía de una eficaz contribución al desarrollo sostenible y productivo de la región y del país mediante el trabajo continuo ha desarrollado y fortalecido importantes procesos misionales y estratégicos encaminados a satisfacer los cambios económicos, sociales y tecnológicos de la región y de los procesos académicos.

La propagación vegetativa se ha convertido en una herramienta fundamental para la conservación de especies y/o variedades con alto valor comercial en el sector forestal. La técnica de macro y mini esquejes representa un papel importante en el rescate y propagación, los brotes generados por el árbol seleccionado son colectados y llevados al vivero con el fin de favorecer el enraizamiento y obtener al final del proceso, una planta funcional clonada de árbol rescatado para procesos de multiplicación que permita abastecer en cantidad y calidad el material vegetal disponible para los proyectos de reforestación a gran escala. La IES CINOC en el año 2023, matrícula el proyecto “Experiencia investigativa en rescate, clonación y conservación de árboles con características superiores como estrategia para el fortalecimiento de su vivero agroforestal” con la iniciativa de implementar un módulo soportado en la tecnología de ambiente controlado que facilite los procesos académicos y de investigación en la cadena relacionada con la silvicultura de viveros, cuyo objetivo es realizar la implementación de espacios de propagación vegetativa para silvicultura clonal que contribuya a la elaboración de protocolos para producción vegetal de las especies eucalipto rojo.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

- Realizar las adecuaciones requeridas en las áreas de semilleros del CDM del IES CINOC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Garantizar el cumplimiento de las obras contempladas dentro de la OPS 173-2023
- Mejorar las condiciones de uso y operación de las áreas del CDM de la institución IES CINOC
- Suministrar materiales de primera calidad para la ejecución de cada una de las actividades de obra.

3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

GENERALIDADES DEL IES CINOC

El IES CINOC, es una institución educativa que se localiza en el municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas; cuya misión es contribuir a la formación integral de seres humanos a través de procesos de educación por ciclos propedéuticos con una estructura académico-administrativa innovadora y con un grupo humano calificado; que facilita la organización efectiva de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social, bienestar e internacionalización, como apoyo al desarrollo sostenible de la región en el cumplimiento de nuestra función social como entidad educativa del Estado y su visión es que en el año 2030, el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES CINOC, será reconocido por la comunidad académica por desarrollar sus funciones misionales comprometidas con alta calidad, responsabilidad social y mejoramiento continuo, soportado en procesos de gestión del conocimiento y talento humano que contribuyen al desarrollo sostenible de la región y del país.



Figura No.1 Panorámica del CDM - IES CINOC, Pensilvania-Caldas

4. DATOS BASICOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE: José Alirio Álvarez Cárdenas
NIT ó C.C 16.075.551
DIRECCIÓN: Carrera 33 No 93 A 23
TELEFONO: 3113588094
EMAIL: joal2062@hotmail.com

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATACIÓN: OPS
No: C-173-2023
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL RESCATE Y PROPAGACION DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA
VALOR INICIAL: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON

	TRECE CENTAVOS MCTE (\$31.410.164,13)
VALOR FINAL:	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE (\$31.410.164,13)
VALOR ACTA N°1	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETETA Y UN PESOS CON SETETA Y UN CENTAVOS MCTE (\$9.410.671,71)
VALOR ACTA N°2	OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS Y CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$8.937.948,40)
VALOR PRESENTA ACTA N°3	OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS Y VEINTISEIS CENTAVOS MCTE (\$8.500.074,26)
SALDO PENDIENTE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE (\$2.866.712,12)
PLAZO:	DOS MESES
FECHA DE INICIO:	31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	IES CINOC
SUPERVISORES:	ING. JORGE MARIO SOTO ROMAN NIXON CUEVA MÁRQUEZ

6. PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA

CANTIDADES CONTRACTUALES							
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU% + IVA%	VALOR. PARCIAL CON AIU%	PORCETA JE
PRELIMINARES DE ADECUACIONES, DEMOLICIONES, DESMONTES, SUELOS Y CONCRETOS							17%
1	Desmonte y adecuación de áreas existente en pastico tipo invernadero	M2	200.0	\$ 971.36	\$ 1,267.75	\$ 253,550.85	1%
2	Demolición en muro en ladrillo e:0,15cm con enchape inc. acarreo horizontal hasta 50m	M2	20.0	\$ 10,569.67	\$ 13,794.90	\$ 275,897.98	1%
3	Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro, extendido y compactación de suelos en material pétreo triturada con equipo menor a gasolina incluye acarreo horizontal de suministro de material	M2	40.0	\$ 32,463.15	\$ 42,368.96	\$ 1,694,758.22	6%
4	construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 mpa incluye malla electrosoldada producción manual en sitio	M2	25.0	\$ 93,656.80	\$ 122,235.24	\$ 3,055,881.00	10%
ESTRUCTURALES, CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS							45%
5	Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" Inc. 3 templates y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE	ML	56.2	\$ 49,645.22	\$ 64,793.97	\$ 3,641,421.00	11%
6	Construcción de muro en ladrillo para cerramiento perimetral tres a cuatro hiladas	M2	17.0	\$ 72,271.15	\$ 94,323.97	\$ 1,603,507.47	5%
7	suministro e instalación de cubierta plástica (invernaderos) de 10 más ancho calibre 7.	UND	1.0	\$ 2,163,590.00	\$ 2,823,787.85	\$ 2,823,787.85	9%
8	Suministro e instalación de POLISOMBRA NEGRA 50% en cerramiento perimetral de área y cubierta	M2	131.6	\$ 13,889.09	\$ 18,127.21	\$ 2,385,540.94	8%
9	Suministro e instalación cubierta en teja lamina zinc y canal de recolección incluye sistema estructura perlineria metálica empotrados sobre suelo	UND	1.0	\$ 2,680,898.75	\$ 3,498,948.19	\$ 3,498,948.19	11%
SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PARA RIEGO, LLUVIAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS							35%

10	Filtro tipo francés para recolección y evacuación de aguas subterráneas infiltradas incluye tubería perforada pvc 4 pulgadas y excavación de suelo de 0,50x0,50m	M3	3.2	\$ 174,772.60	\$ 228,102.71	\$ 729,928.67	2%
11	Canal rectangular en concreto para recolección, transporte y entrega de aguas lluvias superficiales E=0.05, A=0.30, H=0.40	ML	15.0	\$ 121,950.25	\$ 159,162.15	\$ 2,387,432.23	7%
12	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1/2" EN PVC RDE 21	ML	60.0	\$ 11,555.29	\$ 15,081.27	\$ 904,875.96	3%
13	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21	ML	12.0	\$ 12,395.29	\$ 16,177.58	\$ 194,131.00	1%
14	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1" EN PVC RDE 21	ML	66.0	\$ 14,980.83	\$ 19,552.08	\$ 1,290,436.96	4%
15	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1 1/2" EN PVC RDE 21	ML	18.0	\$ 23,275.83	\$ 30,378.21	\$ 546,807.81	2%
16	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED MANGERA POLIETILENO DE "3/4 A 1PULG	ML	30.0	\$ 12,760.30	\$ 16,653.98	\$ 499,619.31	2%
17	Suministro de accesorios hidráulicos para los sistemas de riego en las diferentes áreas y puesto en sitio para disposición de instalación	UND	1.0	\$ 2,376,630.00	\$ 3,101,834.87	\$ 3,101,834.87	10%
18	Suministro e instalación de sistema de acometida y almacenamiento de aguas por tanques plásticos de agua potable	UND	1.0	\$ 1,099,261.03	\$ 1,434,689.54	\$ 1,434,689.54	5%
SISTEMA ELECTRICO 110VOLTIOS Y SISTEMA DE ILUMINACION							3%
19	Suministro e instalación de lámparas tipo led min 46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de sobreponer estructura en cielo PVC	UN	1.0	\$ 239,503.73	\$ 312,585.89	\$ 312,585.89	1%
20	Revisión de tablero de distribución eléctrica existente para puesta en marcha con reposición parcial de materiales eléctricos para el correcto funcionamiento	UN	1.0	\$ 481,839.50	\$ 628,868.00	\$ 628,868.00	2%
21	suministro e instalación salida tomacorriente con interruptor de luminaria en tubería galvanizada o conducir	UN	1.0	\$ 111,605.95	\$ 145,661.39	\$ 145,661.39	0%
SUMATORIA COSTO DIRECTO							\$ 31,410,165.13 100%

7. PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA No. 3

CANTIDADES CONTRACTUALES							PRESENTE ACTA No 3 TERMINACION ANTES DE LIQUIDACION	
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU% + IVA%	VALOR. PARCIAL	VALOR. PARCIAL CON AIU%	TOTAL
PRELIMINARES DE ADECUACIONES, DEMOLICIONES, DESMONTES, SUELOS Y CONCRETOS								
1	Desmonte y adecuación de áreas existente en pastico tipo invernadero	M2	200.0	\$ 971.36	\$ 1,267.75	\$ 194,271.00	\$ 253,550.00	\$ -
2	Demolición en muro en ladrillo e:0,15cm con enchape inc. acarreo horizontal hasta 50m	M2	20.0	\$ 10,569.67	\$ 13,794.90	\$ 211,393.40	\$ 275,898.00	\$ -
3	Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro, extendido y compactación de suelos en material pétreo triturada con equipo menor a gasolina incluye acarreo horizontal de suministro de material	M2	40.0	\$ 32,463.15	\$ 42,368.96	\$ 1,298,526.00	\$ 1,694,758.40	\$ -

4	construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 mpa incluye malla electrosoldada producción manual en sitio	M2	25.0	\$ 93,656.80	\$ 122,235.24	\$ 2,341,420.08	\$ 3,055,881.00	-	\$ -
ESTRUCTURALES, CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS									
5	Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" Inc. 3 templates y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE	ML	56.2	\$ 49,645.22	\$ 64,793.97	\$ 2,790,061.61	\$ 3,641,421.11		\$ -
6	Construcción de muro en ladrillo para cerramiento perimetral tres a cuatro hiladas	M2	17.0	\$ 72,271.15	\$ 94,323.97	\$ 1,228,609.56	\$ 1,603,507.49	-	\$ -
7	suministro e instalación de cubierta plástica (invernaderos) de 10 más ancho calibre 7.	UND	1.0	\$ 2,163,590.00	\$ 2,823,787.85	\$ 2,163,590.00	\$ 2,823,787.85	-	\$ -
8	Suministro e instalación de POLISOMBRA NEGRA 50% en cerramiento perimetral de área y cubierta	M2	131.6	\$ 13,889.09	\$ 18,127.21	\$ 1,827,804.64	\$ 2,385,540.84	20.40	\$ 369,795
						\$ 10,690,964.55			\$ 369,795.08

9	Suministro e instalación cubierta en teja lamina zinc y canal de recolección incluye sistema estructura perlineria metálica empotrados sobre suelo	UND	1.0	\$ 2,680,898.75	\$ 3,498,948.19	\$ 2,680,898.75	\$ 3,498,948.19	\$ -	\$ -
SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PARA RIEGO, LLUVIAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS									
10	Filtro tipo francés para recolección y evacuación de aguas subterráneas infiltradas incluye tubería perforada pvc 4 pulgadas y excavación de suelo de 0.50x0.50m	M3	3.2	\$ 174,772.60	\$ 228,102.71	\$ 559,272.32	\$ 729,928.67	4.5	\$ 1,026,462
11	Canal rectangular en concreto para recolección, transporte y entrega de aguas lluvias superficiales E=0.05, A=0.30, H=0.40	ML	15.0	\$ 121,950.25	\$ 159,162.15	\$ 1,829,253.75	\$ 2,387,432.25	0	\$ -
12	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1/2" EN PVC RDE 21	ML	60.0	\$ 11,555.29	\$ 15,081.27	\$ 693,317.16	\$ 904,876.20	66.6	\$ 1,004,413
13	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21	ML	12.0	\$ 12,395.29	\$ 16,177.58	\$ 148,743.43	\$ 194,130.96	1.5	\$ 24,266
14	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1" EN PVC RDE 21	ML	66.0	\$ 14,980.83	\$ 19,552.08	\$ 988,734.52	\$ 1,290,437.28	24	\$ 469,250
						\$ 8,496,986.06			\$ 8,215,287.47

15	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1 1/2" EN PVC RDE 21	ML	18.0	\$ 23,275.83	\$ 30,378.21	\$ 418,964.87	\$ 546,807.78	38	\$ 1,154,372
16	Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED MANGERA POLIETILENO DE "3/4 A 1PULG	ML	30.0	\$ 12,760.30	\$ 16,653.98	\$ 382,808.98	\$ 499,619.40	0	\$ -
17	Suministro de accesorios hidráulicas para los sistemas de riego en las diferentes áreas y puesto en sitio para disposición de instalación	UND	1.0	\$ 2,376,630.00	\$ 3,101,834.88	\$ 2,376,630.00	\$ 3,101,834.88	1	\$ 3,101,835
18	Suministro e instalación de sistema de acometida y almacenamiento de aguas por tanques plásticos de agua potable	UND	1.0	\$ 1,099,261.03	\$ 1,434,689.54	\$ 1,099,261.03	\$ 1,434,689.54	1	\$ 1,434,690
SISTEMA ELECTRICO 110VOLTIOS Y SISTEMA DE ILUMINACION									
19	Suministro e instalación de lámparas tipo led min 46w en panel rectangular de 1,20x0,30 de	UN	1.0	\$ 239,503.73	\$ 312,585.89	\$ 239,503.73	\$ 312,585.89	1	\$ 312,586
							\$ 832,949.18		\$ 941,453.90



Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas **Celular:** 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

ACTA FINAL DE ENTREGA PARA LIQUIDACION - PROYECTADA 31/10/2023	\$ 1,694,758.40
SUMATORIA DE ACTAS	\$ 29,569,915.21
SALDO DEL CONTRATO A REVERTIR A FAVOR DE LA INSTITUCION	\$ 1,840,249.92
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 31,410,165.13


Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas Celular: 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

8. PERSONAL EN OBRA


NOMBRE	CEDULA	CARGO	PERIODO Y PLANILLA	TIPO DE CONTRATO
PEDRO NEL PEDREROS	10267333	OFICIAL	22 AGOSTO - 09 DE SEPTIEMBRE	Obra labor
LEONARDO MUNERA OSPINA	15988566	AYUDANTE	23 AGOSTO - 09 DE SEPTIEMBRE	Obra labor

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Filtro tipo francés para recolección y evacuación de aguas subterráneas infiltradas incluye tubería perforada pvc 4pulgadas y excavación de suelo de 0,50x0,50m

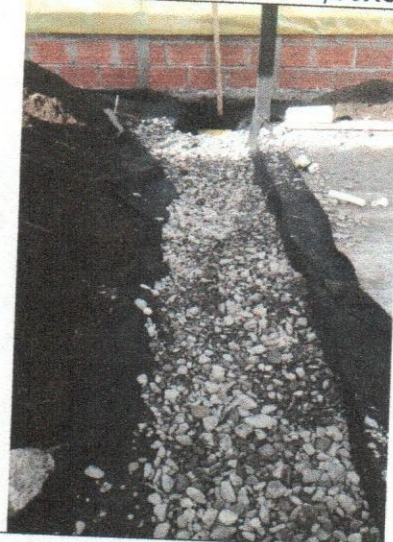


Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1/2" EN PVC RDE 21

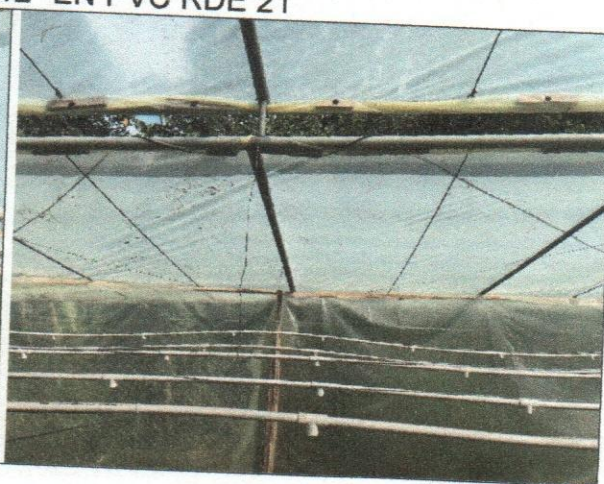



Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED
HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21

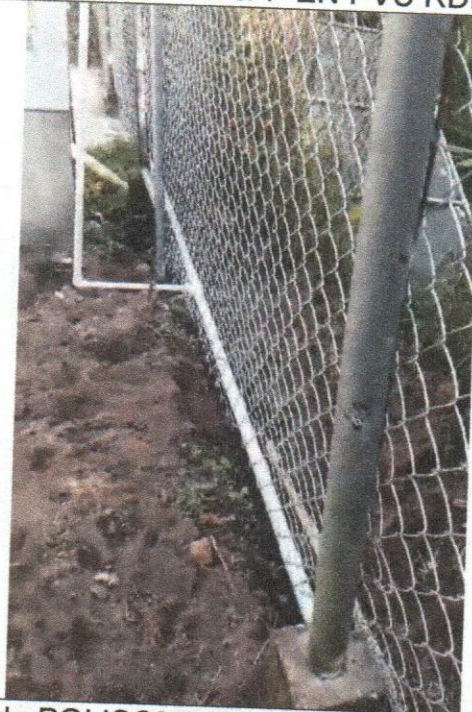


Suministro e instalación de POLISOMBRA NEGRA 50% en cerramiento perimetral
de área y cubierta






Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED
HIDRAULICA DE 1" EN PVC RDE 21



Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED
HIDRAULICA DE 1 1/2" EN PVC RDE 21

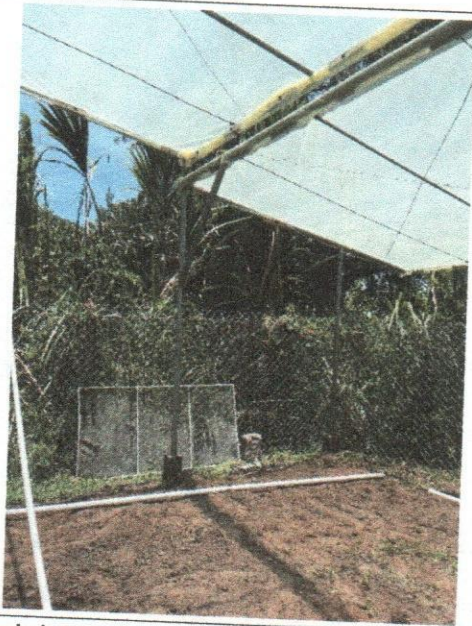


Suministro de accesorios hidráulicos para los sistemas de riego en las diferentes áreas y puesto en sitio para disposición de instalación

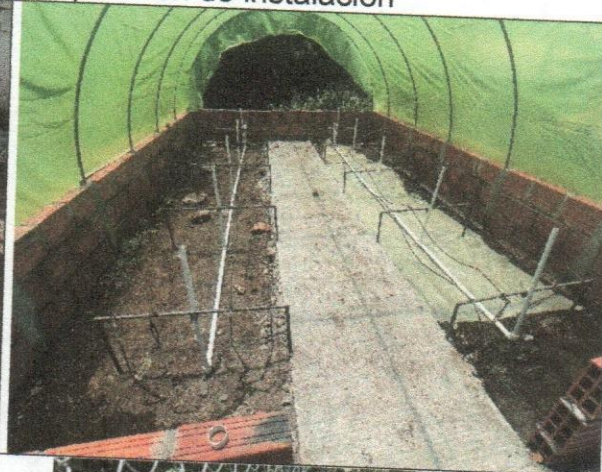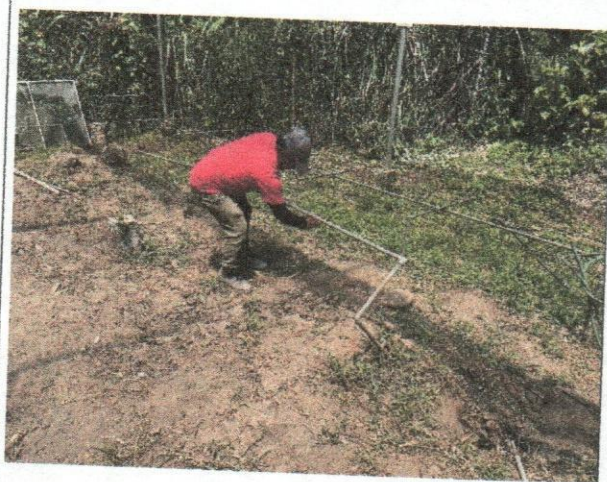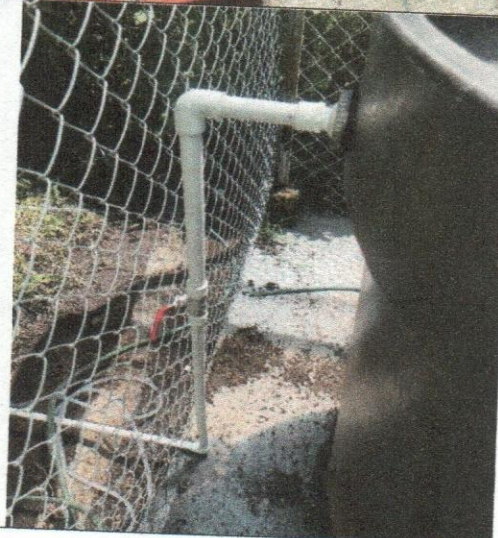


Suministro e instalación de sistema de acometida y almacenamiento de aguas por tanques plásticos de agua potable



Revisión de tablero de distribución eléctrica existente para puesta en marcha con reposición parcial de materiales eléctricos para el correcto funcionamiento

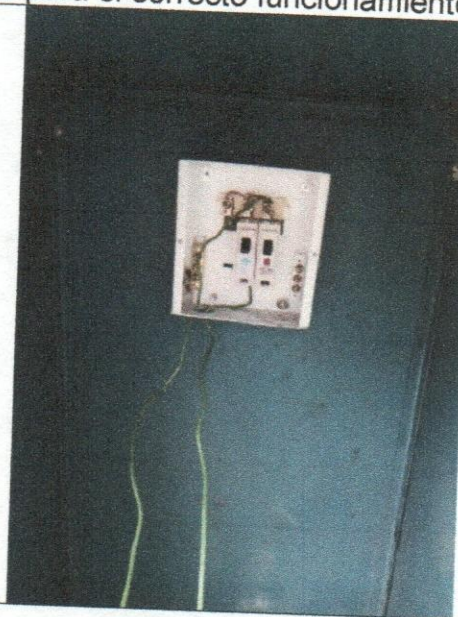

Atentamente,


JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
C.C 16.075.551 de Manizales

Dirección: Carrera 33 No. 93 A 23 Manizales Caldas Celular: 3113588094
Email: joal2062@hotmail.com

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

ACTA No. 3

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL RESCATE Y PROPAGACIÓN DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS

Suministro e instalacion de POLISOMBRA NEGRA 50% en cerramiento perimetral de area y cubierta

8.0

M2

FECHA PRESENTE ACTA

5/9/2023

UBICACIÓN

CANTIDADES

LARGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

TOTAL

ACTA N 3

Casa de Sombras

3.40

6.00

20.40



20.40

JORGE MARIO SOTO ROMÁN
Apoyo a la Supervisión

JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
Contratista

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS


ACTA No. 3

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL RESCATE Y PROPAGACIÓN DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS

Suministro e instalación del sistema hidráulico para riego por medio de RED HIDRAULICA DE 1/2" EN PVC RDE 21

ML

12.0

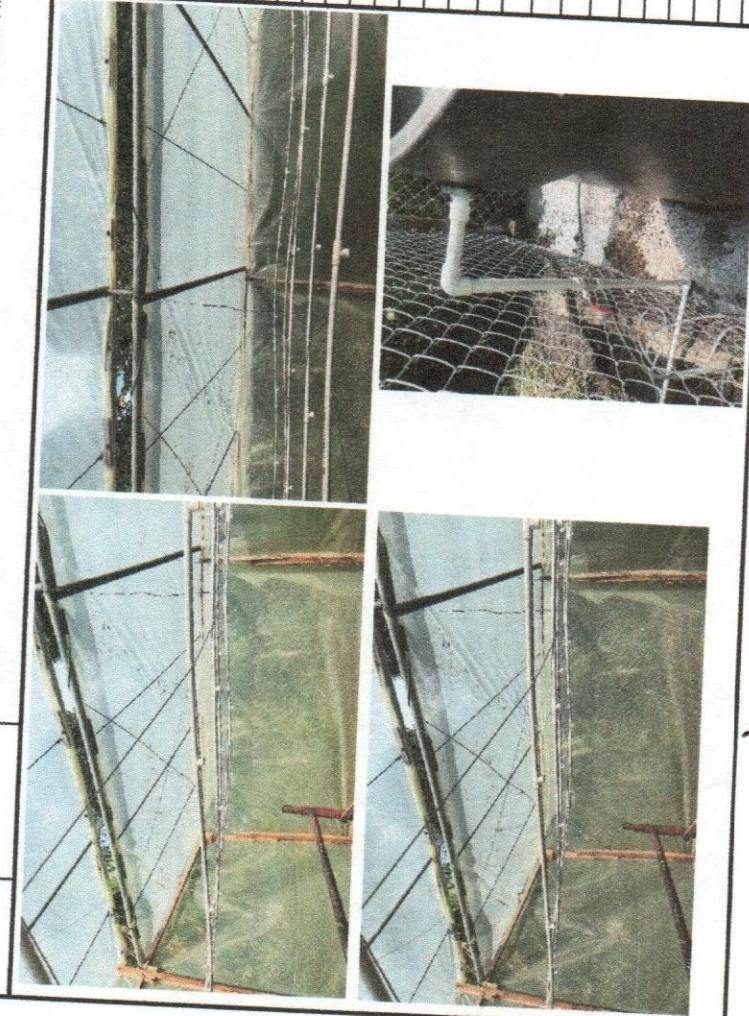

UBICACIÓN
Aspersores
Tubería para sustratos- llaves
Eras

FECHA PRESENTE ACTA

4/9/2023

CANTIDADES		CANTIDAD	TOTAL
LARGO	ANCHO		
7.80		6.0	46.80
4.50		2.0	9.00
1.00		2.0	2.00
5.60		1.0	5.60
3.20		1.0	3.20

4

JORGE MARIO SOTO ROMAN
Apoyo a la Supervisión

JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
Contratista

66.60

ACTA No. 3

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL RESCATE Y PROPAGACIÓN DE ARBOLES SELECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILÍNEOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M ÁREA EN EL CENTRO DE LA MADERA – CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS

[illegible]



JORGE MARIO SOTO ROMAN
Apoyo a la Supervisión


JOSE ALVARO ALVAREZ CARDENAS
Contratista

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

ACTA No. 3

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL RESCATE Y PROPAGACIÓN DE ARBOLES SELECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENIA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS

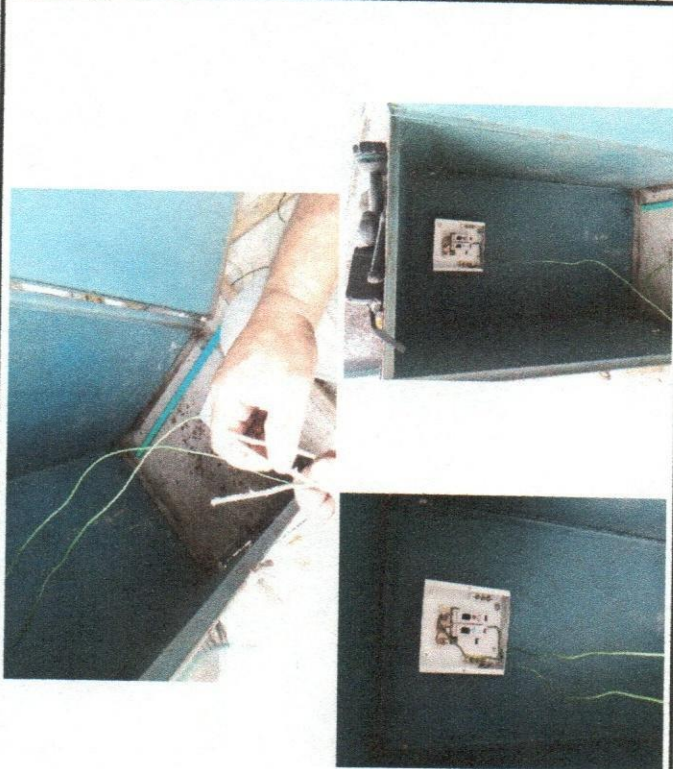20.0	UN	Revisión de tablero de distribución eléctrica existente para puesta en marcha con reposición parcial de materiales eléctricos para el correcto funcionamiento	FECHA PRESENTE ACTA	4/9/2023			
							
		UBICACIÓN	CANTIDADES			CANTIDAD	TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		Tablero Existente					1.00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cd56d8efe91347f6010fd757a4dc03a1ed0c25172f7cd2609152b42b31c467
d6b18ba6adc82504237ca70f8c12f6e00c
Número de Factura: FE-18
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO
Nombre Comercial: ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO
Nit del Emisor: 16075551
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 58 E 8 58
Teléfono / Móvil: 3113588094
Correo: josealirioalvarezcardenas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890802678
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Pensilvania
Dirección: Carrera 5 No 6-30
Teléfono / Móvil: 6068556026
Correo: rectoria@iescinoc.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ACTA No 3 OPS 173 2023	ZZ	1,00	\$ 6.630.221,46	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.630.221,46
2	IMP	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 331.511,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 331.511,07
3	UTI	UTILIDAD	ZZ	1,00	\$ 331.511,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.987,10	19,00			\$ 331.511,07
4	ADM	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	\$ 1.143.843,56	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.143.843,56

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
11-01 22:54:33
Documento generado el: 2023-11-01
22:54:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.437.087,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.437.087,16
IVA	62.987,10
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	62.987,10
Total neto factura (=)	8.500.074,26
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.500.074,26

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057029984

Rango desde: 16

Rango hasta: 50

Vigencia: 2024-03-29

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cd56d8efe91347f6010fd757a4dc03a1ed0c25172f7cd2609152b42b31c467
d6b18ba6adc82504237ca70f8c12f6e00c

Número de Factura: FE-18

Fecha de Emisión: 30/10/2023

Fecha de Vencimiento: 30/10/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Crédito ACH

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO

Nombre Comercial: ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO

Nit del Emisor: 16075551

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: CL 58 E 8 58

Teléfono / Móvil: 3113588094

Correo: josealirioalvarezcardenas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890802678

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Pensilvania

Dirección: Carrera 5 No 6-30

Teléfono / Móvil: 6068556026

Correo: rectoria@ieschoc.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ACTA No 3 OPS 173 2023	ZZ	1,00	\$ 6.630.221,46	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.630.221,46
2	IMP	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 331.511,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 331.511,07
3	UTI	UTILIDAD	ZZ	1,00	\$ 331.511,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.987,10	19,00			\$ 331.511,07
4	ADM	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	\$ 1.143.843,56	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.143.843,56

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-01 22:54:33
Documento generado el 2023-11-01 22:54:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.437.087,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.437.087,16
IVA	62.987,10
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	62.987,10
Total neto factura (=)	8.500.074,26
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.500.074,26

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057029984 Rango desde: 16 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-03-29

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS									
ACTA DE OBRA No. TERMINACIÓN ANTES DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGA FINAL PARA LIQUIDACIÓN DOS PAGOS									
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL RESCATE Y PROPAGACIÓN DE ARBOLES SELECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS) W. HILL EX MANDEN Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLLUM ROSPILOSI), (PLUG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TEMA DE MACRO ESTRUCTURAS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL ES CINCO EN MUNICIPIO DE PENINSULARIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS									
FECHA PRESENTE ACTA									
23/10/2023									
AJUSTADA									
CANTIDADES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA + IVA	VALOR PARCIAL CON IVA + IVA	VALOR PARCIAL CON IVA + IVA	VALOR PARCIAL CON IVA + IVA	VALOR PARCIAL CON IVA + IVA	VALOR PARCIAL CON IVA + IVA
PRELIMINARES DE ADECUACIONES, DEMOLICIONES, DESMONTES, SUELOS									
1	Demolición y adecuación de áreas existentes en parcelo tipo M2	M2	200.0	\$ 971.36	\$ 1,942.72	\$ 1,942.72	\$ 1,942.72	\$ 1,942.72	\$ 1,942.72
2	Demolición en muro en ladrillo e 0.15m con enlache inc. acaro horizontal hasta 50m	M2	20.0	\$ 10,599.67	\$ 13,794.90	\$ 13,794.90	\$ 13,794.90	\$ 13,794.90	\$ 13,794.90
3	Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro de arena y compactación de gasoil con equipo menor a gasolina incluye acarreo horizontal de suministro de construcción de base de contrapiso en concreto de 21 cmpa incluye malla	M2	40.0	\$ 32,463.15	\$ 1,298,526.00	\$ 1,298,526.00	\$ 1,298,526.00	\$ 1,298,526.00	\$ 1,298,526.00
4	Contrapiso en concreto de 21 cmpa incluye malla	M2	25.0	\$ 93,656.80	\$ 2,341,420.00	\$ 2,341,420.00	\$ 2,341,420.00	\$ 2,341,420.00	\$ 2,341,420.00
ESTRUCTURALES, CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS									
5	Suministro e instalación de cerramiento en malla esbionada de 2" x 2" inc. 3 tornillos y demás accesorios para funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE	ML	56.2	\$ 46,645.22	\$ 2,601,061.61	\$ 2,601,061.61	\$ 2,601,061.61	\$ 2,601,061.61	\$ 2,601,061.61
6	Construcción de muro en ladrillo para cerramiento perimetral free a cuatro haldas	M2	17.0	\$ 72,271.15	\$ 1,228,609.56	\$ 1,228,609.56	\$ 1,228,609.56	\$ 1,228,609.56	\$ 1,228,609.56
7	Suministro e instalación de sistema hidráulico para POLICOMPA NEGRO 50% en cerramiento perimetral de área y cubierta	UND	1.0	\$ 2,463,590.00	\$ 2,463,590.00	\$ 2,463,590.00	\$ 2,463,590.00	\$ 2,463,590.00	\$ 2,463,590.00
8	Suministro e instalación de sistema hidráulico para POLICOMPA NEGRO 50% en cerramiento perimetral de área y cubierta	M2	131.6	\$ 13,869.09	\$ 1,827,604.64	\$ 1,827,604.64	\$ 1,827,604.64	\$ 1,827,604.64	\$ 1,827,604.64
9	Suministro e instalación de sistema hidráulico para canal de recolección incluye sistema de recolección de agua metálica empotradas sobre suelo	UND	1.0	\$ 2,860,889.75	\$ 2,860,889.75	\$ 2,860,889.75	\$ 2,860,889.75	\$ 2,860,889.75	\$ 2,860,889.75
SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PARA REGO, LLUVIAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS									
10	Filtro tipo frances para recolección y evaluación de aguas subterráneas infiltradas en el terreno para períodos por aplicación de 0.50m/50m	M3	3.2	\$ 174,772.60	\$ 561,272.32	\$ 561,272.32	\$ 561,272.32	\$ 561,272.32	\$ 561,272.32
11	Canal rectangular en concreto para recolección, transporte y entrega de aguas lluvias	ML	15.0	\$ 121,950.25	\$ 1,829,253.75	\$ 1,829,253.75	\$ 1,829,253.75	\$ 1,829,253.75	\$ 1,829,253.75
12	Suministro e instalación del sistema hidráulico para rego por medio de RED POLIETILENO DE 1/2" EN PVC DE 21	ML	60.0	\$ 11,555.29	\$ 693,317.16	\$ 693,317.16	\$ 693,317.16	\$ 693,317.16	\$ 693,317.16
13	Suministro e instalación del sistema hidráulico para rego por medio de RED POLIETILENO DE 3/4" EN PVC DE 21	ML	12.0	\$ 12,365.29	\$ 148,383.48	\$ 148,383.48	\$ 148,383.48	\$ 148,383.48	\$ 148,383.48
14	Suministro e instalación del sistema hidráulico para rego por medio de RED POLIETILENO DE 1" EN PVC DE 21	ML	66.0	\$ 14,980.83	\$ 988,734.52	\$ 988,734.52	\$ 988,734.52	\$ 988,734.52	\$ 988,734.52
15	Suministro e instalación del sistema hidráulico para rego por medio de RED POLIETILENO DE 1 1/2" EN PVC DE 21	ML	18.0	\$ 23,275.83	\$ 418,964.97	\$ 418,964.97	\$ 418,964.97	\$ 418,964.97	\$ 418,964.97

Handwritten signature or mark.

16	Suministro e instalación del sistema de protección por medio de RED MANCERA 1PULG	ML	30.0	\$ 12,760.30	\$ 16,653.98	\$ 382,808.98	\$ 499,619.40	2%	\$ 499,619.40	-	-30,000	\$ 499,619.40	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
17	Suministro de accesorios eléctricos para los sistemas de protección por medio de RED MANCERA 1PULG	UND	1.0	\$ 2,376,630.00	\$ 3,101,634.88	\$ 2,376,630.00	\$ 3,101,634.88	10%	\$ 3,101,634.88	0.000	0.000	\$ -	0	\$ -	1	\$ 2,101,836	1	\$ 2,101,836
18	Suministro e instalación de sistema de protección por medio de RED MANCERA 1PULG	UND	1.0	\$ 1,099,261.03	\$ 1,434,689.54	\$ 1,099,261.03	\$ 1,434,689.54	5%	\$ 1,434,689.54	0.000	0.000	\$ -	0	\$ -	1	\$ 1,034,689	1	\$ 1,034,689
SISTEMA ELECTRICO 110VOLTIOS Y SISTEMA DE ILUMINACION																		
19	Suministro e instalación de lámparas tipo led en panel rectangular de 1,200x30 de sobrepone estructura en color PVC	UN	1.0	\$ 239,503.73	\$ 312,585.89	\$ 239,503.73	\$ 312,585.89	1%	\$ 312,585.89	0.000	0.000	\$ -	0	\$ -	1	\$ 312,586	1	\$ 312,586
20	Revisión de tablero de distribución eléctrica existente para verificar en marcha con materiales eléctricos para el correcto funcionamiento	UN	1.0	\$ 481,839.50	\$ 628,868.01	\$ 481,839.50	\$ 628,868.01	2%	\$ 628,868.01	0.000	0.000	\$ -	0	\$ -	1	\$ 628,869	1	\$ 628,869
21	Suministro e instalación de luminaria en tubera galvanizada o conduit	UN	1.0	\$ 111,605.95	\$ 145,661.39	\$ 111,605.95	\$ 145,661.39	0%	\$ 145,661.39	-1,000	-1,000	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
SUMATORIA																		
31,410,164.13																		
FALTA POR EJECUTAR																		
31,410,164.13																		
ACTA PARCIAL NO.1 - CANCELADA																		
ACTA PARCIAL NO.2 - CANCELADA																		
ACTA PARCIAL NO.3 ACTA DE TERMINACION DE OBRAS PRESENTE ACTA																		
SUMATORIAS ACUMULADAS PAGOS																		
ACTA FINAL DE ENTREGA PARA LIQUIDACION - PROYECTADA																		
SUMATORIA DE ACTAS																		
SALDO DEL CONTRATO A REVERTIR A FAVOR DE LA INSTITUCION																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO																		
31,410,165.13																		

[Firma]
INGENIERO ALVARO ALVAREZ
CONTRATISTA

[Firma]
NIXON CUEVA MARQUEZ
SUPERVISOR

[Firma]
ING. JORGE MANFREDI
APOYADOR A LA SUPERVISION

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 18075551	0	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	1	0	0	POSITIVA - 14.23	UNICA	4290	Natural
MUN-DEP	17-1	DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL				
		CALLE 58 E 8 58	5902395		JOL2002@HOTMAIL.COM				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	TIPO DE APORTANTE	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Nº AFILIADOS	ESTADO PLANILLA	
2023-09	2023-08	INDEPENDIENTE	2023-10-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1	Pagada	

N	ID	EMPLEADO	NOVEDADES												DÍAS		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA		PARAFISCALES		Sub. Terc. Cál.		ACTIVIDAD ECONOMICA	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	CC 16075551	ALVAREZ CARDENAS JOSE ALIRIO																														
			SALUD TOTAL-EPISODIO												1,377,400		1,377,400		1,377,400		1,377,400		1,377,400		1,377,400		1,377,400		1,377,400		1,377,400	

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	1,377,400	IBC SALUD	1,377,400
IBC RIESGOS	0	IBC CAJAS	1,377,400
IBC PARAFISCALES	0	IBC PARAFISCALES	0


 T. Lento. H. H. H. H. H.
 2023-09
 Registro - Salud

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e IOBF	
MIT 1607551	7	JOSE ALBIRIO ALVAREZ CARDENAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MANIZANARES	CALLE SBE No: 08 - 58	MANIZANARES-CALDAS	8753890		\$1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Valor
2023-09	2023-10	199874736		9457285781	E	2023/10/12	2023/10/04	BANCO DAVIVIENDA	\$216,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranj Temp. Jero Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tdo tae tdp	Cap vsp	Fecha Inicio vsp	cor vst sin	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-tr	Fecha Inicio vac-tr	Fecha Fin vac-tr	asp-w
1	CC	1598564	MUNERA OSPINA LEONARDO	Dependiente	0	No	No			X	2023/09/09												
2	CC	1026731	PEDRERO CEBALLOS PEDRO NEL	Dependiente	0	No	No			X	2023/09/09												
Total		Afiliados(2)																					

Revisado
Caf



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION										SALUD												
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio fin	Fecha Fin fin	Valor vlp	Integ ral	Valor	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
						\$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	9	\$ 348.000	168500 RIESGO	\$ 55.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.700		NIUEVA E.P.S.	9	\$ 348.000	4%	\$ 14.000	\$
						\$ 1.160.000	No	Fija	PORVENIR	9	\$ 348.000	168500 RIESGO	\$ 55.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.700		SALUD TOTAL	9	\$ 348.000	4%	\$ 14.000	\$
																			\$ 111.400						\$ 28.000	

Revisado
Cep

CCF										RIESGOS					PARAFISCALES									
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Contratación	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Contratación	Días	IBC	Tarifa SENIA	Valor Contratación SENIA	Tarifa ICBF	Valor Contratación ICBF	Tarifa ESAP	Valor Contratación ESAP	Tarifa MEN	Valor Contratación MEN	Exonerado SEN e ICBF	
0	\$ 14.000	CONFAMILIARES	9	\$ 348.000	4%	\$ 14.000.000	CONFAMILIARES SURBA	9	\$ 348.000	6,96%	5	\$ 24.300	9	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
0	\$ 14.000	CONFAMILIARES	9	\$ 348.000	4%	\$ 14.000.000	CONFAMILIARES SURBA	9	\$ 348.000	6,96%	5	\$ 24.300	9	\$ 0	0%	\$ 0	0%	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	SI
	\$ 28.000					\$ 28.000						\$ 48.600				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	

Revisado

 Talent Humano



aportes
en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 16075551	7	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MANTANARES	CALLE 58E No. 08 - 58	MANTANARES-CALDAS	8753890	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	199874736	9457288781	E	2023/10/12	2023/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$216,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$111,400	\$0	\$111,400	\$0	\$111,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$55,700	\$0	\$55,700	\$0	\$55,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$48,600	\$0	\$48,600	\$0	\$48,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$28,000	\$0	\$28,000	\$0	\$28,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$14,000	\$0	\$14,000	\$0	\$14,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$14,000	\$0	\$14,000	\$0	\$14,000
TOTAL			2		\$216,000	\$0	\$216,000	\$0	\$216,000

Revisado
Cecilia
Tolentino

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO
NI 89002678	4	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	B 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8541
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL
17-541		CRA 5 N 630		8555026		TALENT@UNIMAGBIESCOC.EDUC.CO
						EXENTO DE PARAFISCALES
						N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO FENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27857528	Y	2023-10-12	TODOS	TODOS	64.000	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	27857528	2023-10-19	Pagada						

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO
NI 990602678	4	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	B 0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8541
MUN-DEP 17-541		DIRECCIÓN CRA 5 N 630	TELÉFONO 8555528		EMAIL TALENT@UMANIAOJESBINOCC.EDU.CO	
EXENTO DE PARAFISCALES						N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2023-09	2023-09	27857528	Y	2023-10-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	64,000	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27857528		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	918.205	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
IPRA(Administradores: 1)				1	64.000		0	0	64.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	64.000		0	0	64.000
an Total					64.000		0	0	64.000

Received
Talents/Human
2023-09-
ARL.

