



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



INTRODUCCION

Con ocasión a la ejecución del contrato **CM-003-2023** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL – META"**. celebrado entre el **Municipio de Cumaral** y **CONSORCIO OBRA CM identificada con NIT No. 901776462-8** y dando cumplimiento a las funciones de la supervisión de obra, a continuación, se presenta el informe ejecutivo de supervisión que comprende el periodo entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y el 1 de Julio de 2024 al 8 de Julio de 2024.

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA CM
DE OBRA NIT No 901.779.408-3
R/L: CAMILO ANDRES NIÑO MORALES
C.C. 1.121.827.016 DE VILLAVICENCIO – META.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
DE NIT No 901.776.462-8
INTERVENTORIA R/L: DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C. 1.020.797.397 DE BOGOTA D.C.

SUPERVISOR: ALCALDIA DE CUMARAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El municipio de Cumaral situado en el departamento del Meta, Se encuentra a 23 km de la capital del departamento. Cumaral tiene alrededor de 23.743 habitantes y una altitud de 452 metros.

El municipio se encuentra en la región del Piedemonte del departamento del Meta el cual se encuentra en la región de la Orinoquia colombiana, el municipio limita por el Norte: Paratebueno, Oeste: Restrepo, Este: Cabuyaro, Sur: Restrepo.

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO.

El desarrollo de la obra se aprecia en la siguiente imagen extraído de Google maps

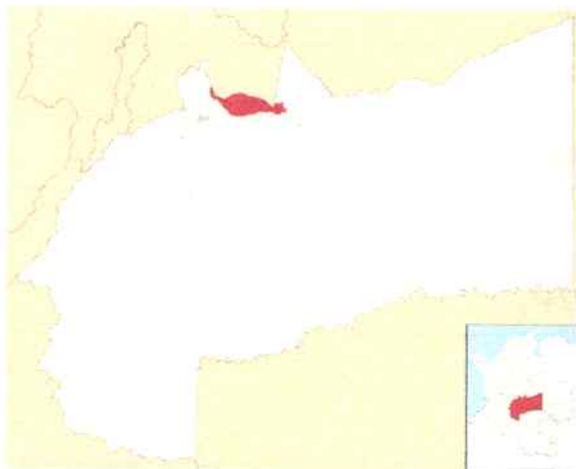



CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No. CM-003-2023	
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL – META"
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL NIT No 901.776.462-8 R/L: DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO C.C. 1.020.797.397 DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN	CUMARAL – META
VALOR INICIAL	CIENTO UN MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$101.113.629,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	TRECE (13) DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DOCE (12) DE MAYO DE 2024
MODIFICACIONES REALIZADAS	
VALOR DE ADICION AL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 18.219.328,00) M/CTE.
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$119.3332.957,00) M/CTE
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1	11 DE MAYO DE 2024
PRORROGA	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	DOCE (12) DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	31 DE MAYO DE 2024
REINICIACION	20 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	20 DE JUNIO DE 2024





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



TIEMPO	10 DIAS
REINICIO	1 DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No. 2	
TIEMPO	1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA SOLICITADA:	13 DE AGOSTO
% DE EJECUCIÓN A LA FECHA	69.11%

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del contrato se realiza una modificatoria dando lugar a la adición número N°1 y prórroga N°1 del contrato CM-003-2023, A continuación, se presenta un cuadro con las actividades contratadas inicialmente y las condiciones actualizadas según Modificatoria N°1, por medio de las cuales se da la ejecución del presente contrato:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.00	PRELIMINARES				\$ 338,779,840.46		\$ 410,948,977.61
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFIA, CARTERA Y PLANOS	M2	8218	\$ 6,153.00	\$ 50,565,354.00	8150	\$ 50,146,950.00
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	364.81	\$ 425,073.00	\$ 155,070.881,13	319,34	\$ 135,742.811,82
1.3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.35	\$ 491,870.00	\$ 172.154,50	0,38	\$ 186.910,60
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE	M3	1.32	\$ 437,217.00	\$ 577.126,44	1,46	\$ 638.336,82





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
	TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.						
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	900	\$ 12.427,00	\$ 11.184.300,00	805,61	\$ 10.011.315,47
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	58	\$ 46.056,00	\$ 2.671.248,00	52	\$ 2.394.912,00
1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	1	\$ 46.056,00	\$ 46.056,00	1	\$ 46.056,00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	722.97	\$ 95.187,00	\$ 68.817.345,39	1267,7	\$ 120.668.559,90
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	199	\$ 249.625,00	\$ 49.675.375,00	365	\$ 91.113.125,00
2.00	ZONA DURA				\$ 879,898,479.28		\$ 918,073,537.80
2.1	LOSETA A-50; 0.40X0.40X0.60 TIPO IDU (TACTIL GUIA)	M2	314.4	\$ 157,271.00	\$ 49,446,002.40	331.13	\$ 52,077,146.20
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	46	\$ 157.271,00	\$ 7.234.466	51,04	\$ 8.027.111,84
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1394,05	\$ 106.226,00	\$ 148.084.355	1412,81	\$ 150.077.155,01
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	354,14	\$ 84.558,00	\$ 29.945.370	318,14	\$ 26.901.282,10



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia

Tel. +573102537150

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co

Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2,5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	354,14	\$ 12.280,00	\$ 4.348.839	318,14	\$ 3.906.759,20
2,6	PLACA DE CONTRAPISO E=0,15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	414,34	\$ 1.188.081,00	\$ 492.269.482	421,87	\$ 501.215.731,47
2,7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3508,13	\$ 11.121,00	\$ 39.013.914	3826,19	\$ 42.551.058,99
2,8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	\$ 81.758,00	\$ 981.096,00	14	\$ 1.144.612,00
2,9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	\$ 90.156,00	\$ 1.081.872,00	14	\$ 1.262.184,00
2,10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22	\$ 81.758,00	\$ 1.798.676,00	26	\$ 2.125.708,00
2,11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22	\$ 81.758,00	\$ 1.798.676,00	26	\$ 2.125.708,00





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2,12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	21,85	\$ 743.874,00	\$ 16.253.646,90	28,67	\$ 21.326.867,58
2,13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	394,61	\$ 133.494,00	\$ 52.678.067,34	495,14	\$ 66.098.219,16
2,14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/K M	18548,55	\$ 1.885,00	\$ 34.964.016,75	20813,79	\$ 39.233.994,15
3.00	MOBILIARIO URBANO				\$ 110,862,787.88		\$ 110,189,185.16
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30 SUMINISTRO E INSTALACION	UND	53	\$ 1.196.529,00	\$ 63,416,037,00	53	\$ 63,416,037,00
3,2	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	36	\$ 253.800,00	\$ 9.136.800,00	36	\$ 9.136.800,00
3,3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	20	\$ 1.160.778,00	\$ 23.215.560,00	20	\$ 23.215.560,00
3,4	VALLA NORMAS BASICAS VERSION INGLES - ESPAÑOL, RECTANGULO DE 30 X 40 CM. CON PARAL EN TUBO GALV. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	11	\$ 850.986,00	\$ 9.360.846,00	11	\$ 9.360.846,00
3,5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	2	\$ 795.263,00	\$ 1.590.526,00	2	\$ 1.590.526,00
3,6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	5,72	\$ 724.304,00	\$ 4.143.018,88	4,79	\$ 3.469.416,16



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 310253750

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co

Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
4.00	PAISAJISMO				\$ 53,833,728.64		\$ 67,955,973.24
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	30	\$ 9,794.00	\$ 293,820.00	30	\$ 293,820.00
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	210	\$ 15.803,00	\$ 3.318.630,00	210	\$ 3.318.630,00
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	1800	\$ 3.613,00	\$ 6.503.400,00	1800	\$ 6.503.400,00
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	3	\$ 50.713,00	\$ 152.139,00	3	\$ 152.139,00
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL ACHIOTE H=1.00M	UND	5	\$ 31.651,00	\$ 158.255,00	5	\$ 158.255,00
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	450	\$ 27.478,00	\$ 12.365.100,00	450	\$ 12.365.100,00
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	30	\$ 31.606,00	\$ 948.180,00	30	\$ 948.180,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	203,4	\$ 12.936,00	\$ 2.631.182,40	203,4	\$ 2.631.182,40
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	43,81	\$ 208.716,00	\$ 9.143.847,96	43,81	\$ 9.143.847,96
4.1	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	4,48	\$ 88.522,00	\$ 396.578,56	4,48	\$ 396.578,56
4.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	4,48	\$ 41.828,00	\$ 187.389,44	4,48	\$ 187.389,44
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2,5	\$ 36.563,00	\$ 91.407,50	2,5	\$ 91.407,50





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumará
Secretaría De Infraestructura



CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
4,13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	0,14	\$ 118.427,00	\$ 16.579,78	0,14	\$ 16.579,78
4,14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	1	\$ 674.895,00	\$ 674.895,00	21,28	\$ 14.361.765,60
4,15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES DE 5KM	UND	5	\$ 391.338,00	\$ 1.956.690,00	8	\$ 3.130.704,00
4,16	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	UND	10	\$ 73.864,00	\$ 738.640,00	0	\$ 0
4,17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	4	\$ 398.079,00	\$ 1.592.316,00	4	\$ 1.592.316,00
4,18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES > 40 CMS	UND	13	\$ 974.206,00	\$ 12.664.678,00	13	\$ 12.664.678,00
N. P	ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0.00		\$ 125,473.378.07
NP.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	0	\$ 132,251.31	\$ 0.00	23	\$ 3,041,784.73
NP.2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	0	\$ 85.855,14	\$ 0.00	48	\$ 4.121.046,72
NP.3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	0	\$ 715.674,00	\$ 0.00	12	\$ 8.588.088,00
NP.4	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0	\$ 31.678,41	\$ 0.00	30	\$ 950.352,30
NP.5	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0	\$ 89.605,22	\$ 0.00	239,34	\$ 21.446.113,31



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumará - Meta - Colombia
Tel. +57310253750

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co

Web: www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP.6	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0	\$ 37.535,83	\$ 0.00	390,55	\$ 14.659.618,41
NP.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	0	\$ 10.790,80	\$ 0.00	1486,07	\$ 16.036.374,56
NP.8	LETRAS (CUMARAL CIUDAD CORDIAL) LAMINA GALVANIZADA	GL	0	\$ 56.630.000	\$ 0	1	\$ 56.630.000,00
TOTAL					\$1,383,374,836.00		\$ 1,632,641,052.00





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM)	UND	\$ 46,056.00	1	\$ 46,056.00	1	\$ 46,056.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 46,056.00	1.00	\$ 46,056.00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	\$ 95,187.00	722.97	\$ 68,817,345.39	1267.7	\$ 120,668,559.90	591.98	\$ 56,348,800.26	383.26	\$ 36,481,369.62	975.24	\$ 92,830,169.88
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	\$ 249,625.00	199	\$ 49,675,375.00	385	\$ 91,113,125.00	178.00	\$ 44,433,250.00	106.00	\$ 26,480,250.00	284.00	\$ 70,893,500.00
Subtotal					\$ 338,779,840.46		\$ 410,948,977.61		\$ 207,746,480.28		\$ 115,711,614.81		\$ 323,458,095.09

ZONA DURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
2.1	LOSETA A-50. 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUÍA)	M2	\$ 157,271.00	314.4	\$ 49,446,002.40	331.13	\$ 52,077,146.23	157.55	\$ 24,778,046.05	72.49	\$ 11,400,574.79	230.04	\$ 36,178,620.84
2.2	LOSETA A-50. 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	\$ 157,271.00	46	\$ 7,234,466.00	51.04	\$ 8,027,111.84	22.16	\$ 3,485,125.36	12.88	\$ 2,025,650.48	35.04	\$ 5,510,775.84
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	\$ 106,226.00	1394.05	\$ 148,084,355.30	1412.81	\$ 150,077,155.06	667.09	\$ 70,862,302.34	408.40	\$ 43,382,698.40	1075.49	\$ 114,245,000.74
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	\$ 84,558.00	354.14	\$ 29,945,370.12	318.14	\$ 26,901,282.12	161.66	\$ 13,689,646.28	82.19	\$ 6,949,822.02	243.85	\$ 20,619,468.30
2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	\$ 12,280.00	354.14	\$ 4,348,839.20	318.14	\$ 3,906,759.20	0	\$ 0.00	161.66	\$ 1,985,184.80	161.66	\$ 1,985,184.80
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	\$ 1,188,081.00	414.34	\$ 492,269,481.54	421.87	\$ 501,215,731.47	154.44	\$ 183,487,229.64	150.03	\$ 178,247,792.43	304.47	\$ 361,735,022.07
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2. 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	\$ 11,121.00	3508.13	\$ 39,013,913.73	3826.19	\$ 42,561,058.99	1403.38	\$ 15,606,988.98	1469.64	\$ 16,343,866.44	2873.02	\$ 31,950,855.42





DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presenta un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR UNIT.	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR TOTAL
PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	\$ 6,153.00	8218	\$ 50,565,354.00	8150	\$ 50,146,950.00	4075.00	\$ 25,073,475.00	2282.00	\$ 14,041,146.00
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 425,073.00	364.81	\$ 155,070,881.13	319.34	\$ 135,742,811.82	174.58	\$ 74,208,244.34	83.67	\$ 35,565,857.91
1.3	DEMOLICION CIMENTO ENTERRADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 491,870.00	0.35	\$ 172,154.50	0.38	\$ 186,910.60	0.38	\$ 186,910.60	0.38	\$ 186,910.60
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 437,217.00	1.32	\$ 577,126.44	1.46	\$ 638,336.82	1.46	\$ 638,336.82	1.46	\$ 638,336.82
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$ 12,427.00	900	\$ 11,184,300.00	805.61	\$ 10,011,315.47	455.38	\$ 5,659,007.26	202.64	\$ 2,518,207.28
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBREPESOS 9KM)	UND	\$ 46,056.00	58	\$ 2,671,248.00	52	\$ 2,394,912.00	26.00	\$ 1,197,456.00	13.00	\$ 598,728.00





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	12	\$ 981,096.00	14	\$ 1,144,612.00	8	\$ 654,064.00	4.00	\$ 327,032.00	12.00	\$ 981,096.00
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 90,156.00	12	\$ 1,081,872.00	14	\$ 1,262,184.00	8	\$ 721,248.00	4.00	\$ 360,624.00	12.00	\$ 1,081,872.00
2.10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	22	\$ 1,798,676.00	26	\$ 2,125,708.00	15	\$ 1,226,370.00	8.00	\$ 654,064.00	23.00	\$ 1,880,434.00
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	22	\$ 1,798,676.00	26	\$ 2,125,708.00	15	\$ 1,226,370.00	8.00	\$ 654,064.00	23.00	\$ 1,880,434.00
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	\$ 743,874.00	21.85	\$ 16,253,646.90	28.67	\$ 21,326,867.58	12.43	\$ 9,246,353.82	8.85	\$ 6,583,284.90	21.28	\$ 15,829,638.72
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDIA, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	\$ 133,494.00	394.61	\$ 52,678,067.34	455.14	\$ 66,098,219.16	257.24	\$ 34,339,996.56	150.89	\$ 20,142,909.66	408.13	\$ 54,482,906.22
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	\$ 1,885.00	18548.55	\$ 34,964,016.75	20813.8	\$ 39,233,994.15	12090.12	\$ 22,789,876.20	7194.84	\$ 13,562,273.40	19284.96	\$ 36,352,149.60
Subtotal					\$ 879,898,479.28		\$ 918,073,537.80		\$ 382,093,617.23		\$ 302,619,841.32		\$ 684,713,458.55
MOBILIARIO URBANO													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNIT	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR TOTAL
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 1,196,529.00	53	\$ 63,416,037.00	53	\$ 63,416,037.00	0.00	\$ 0.00	23.00	\$ 27,520,167.00	23.00	\$ 27,520,167.00



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 302537950
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; contactenos@cumaralmeta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



3.2	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 253,800.00	36	\$ 9,136,800.00	36	\$ 9,136,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND	\$ 1,160,778.00	20	\$ 23,215,560.00	20	\$ 23,215,560.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 8,125,446.00	\$ 8,125,446.00
3.4	VALLA NORMAS BASICAS VERSION INGLES - ESPAÑOL RECTANGULO DE 30 X 40 CM CON PARALELO TUBO GALV. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 850,986.00	11	\$ 9,360,846.00	11	\$ 9,360,846.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	\$ 795,263.00	2	\$ 1,590,526.00	2	\$ 1,590,526.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	\$ 724,304.00	5.72	\$ 4,143,018.88	4.79	\$ 3,469,416.16	0.00	\$ 0.00	3.09	\$ 2,238,099.36	\$ 2,238,099.36
Subtotal					\$ 110,862,787.88		\$ 110,189,185.16		\$ 0.00		\$ 37,883,712.36	\$ 37,883,712.36

PAISAJISMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	\$ 9,794.00	30	\$ 293,820.00	30	\$ 293,820.00	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 293,820.00	30.00	\$ 293,820.00
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	\$ 15,803.00	210	\$ 3,318,630.00	210	\$ 3,318,630.00	0.00	\$ 0.00	105.00	\$ 1,659,315.00	105.00	\$ 1,659,315.00
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	\$ 3,613.00	1800	\$ 6,503,400.00	1800	\$ 6,503,400.00	0.00	\$ 0.00	900.00	\$ 3,251,700.00	900.00	\$ 3,251,700.00
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	\$ 50,713.00	3	\$ 152,139.00	3	\$ 152,139.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 152,139.00	3.00	\$ 152,139.00
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL ACHOTE H=1.00M	UND	\$ 31,651.00	5	\$ 158,255.00	5	\$ 158,255.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	\$ 27,478.00	450	\$ 12,365,100.00	450	\$ 12,365,100.00	0.00	\$ 0.00	225.00	\$ 6,182,550.00	225.00	\$ 6,182,550.00
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	\$ 31,606.00	30	\$ 948,180.00	30	\$ 948,180.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 632,120.00	20.00	\$ 632,120.00





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



4 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0 10M	M2	\$ 12,936.00	203.4	\$ 2,631,182.40	203.4	\$ 2,631,182.40	0.00	\$ 0.00	137.81	\$ 1,782,710.16	137.81	\$ 1,782,710.16
4 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	\$ 208,716.00	43.81	\$ 9,143,847.96	43.81	\$ 9,143,847.96	0.00	\$ 0.00	41.92	\$ 8,749,374.72	41.92	\$ 8,749,374.72
4 10	MURO TOILETE RECOCIDO COMUN 0 20X0 10X0 06. MORTERO TIPO 1 4	M2	\$ 88,522.00	4.48	\$ 396,578.56	4.48	\$ 396,578.56	0.00	\$ 0.00	4.48	\$ 396,578.56	4.48	\$ 396,578.56
4 11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1 4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	\$ 41,828.00	4.48	\$ 187,389.44	4.48	\$ 187,389.44	0.00	\$ 0.00	4.48	\$ 187,389.44	4.48	\$ 187,389.44
4 12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0 12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	\$ 36,563.00	2.5	\$ 91,407.50	2.5	\$ 91,407.50	0.00	\$ 0.00	2.50	\$ 91,407.50	2.50	\$ 91,407.50
4 13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 118,427.00	0.14	\$ 16,579.78	0.14	\$ 16,579.78	0.00	\$ 0.00	0.14	\$ 16,579.78	0.14	\$ 16,579.78
4 14	CONCRETO 3000 PSI - 20 7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	\$ 674,895.00	1	\$ 674,895.00	21.28	\$ 14,361,765.60	0.00	\$ 0.00	13.89	\$ 9,374,291.55	13.89	\$ 9,374,291.55
4 15	TALA DE ARBOLES 5M < 41 < 10M INCLUYE DESEÑARCE Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES DE 5KM	UND	\$ 391,338.00	5	\$ 1,956,690.00	8	\$ 3,130,704.00	1.00	\$ 391,338.00	5.00	\$ 1,956,690.00	6.00	\$ 2,348,028.00
4 16	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	UND	\$ 73,864.00	10	\$ 738,640.00	0	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4 17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	\$ 388,079.00	4	\$ 1,552,316.00	4	\$ 1,552,316.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 796,158.00	2.00	\$ 796,158.00
4 18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES > 40 CMS	UND	\$ 974,206.00	13	\$ 12,664,678.00	13	\$ 12,664,678.00	3.00	\$ 2,922,618.00	6.00	\$ 5,845,236.00	9.00	\$ 8,767,854.00
Subtotal					\$ 53,833,728.64		\$ 67,955,973.24		\$ 3,313,956.00		\$ 41,368,059.71		\$ 44,682,015.71
ITEMS NO PREVISTOS													
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNIT.	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR TOTAL
NP 1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	\$ 132,251.51	0.00	\$ 0.00	23	\$ 3,041,784.73	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 1,587,018.12	12.00	\$ 1,587,018.12



Dir: calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel: +57310253750
E-mail: alcaldia@cumaralmeta.gov.co; contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web: www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



NP 2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	\$ 85,855.14	0.00	\$ 0.00	48	\$ 4,121,046.72	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 1,717,102.80	20.00	\$ 1,717,102.80
NP 3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO	UND	\$ 715,674.00	0.00	\$ 0.00	12	\$ 8,588,088.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 3,578,370.00	5.00	\$ 3,578,370.00
NP 4	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 31,678.41	0.00	\$ 0.00	30	\$ 950,352.30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
NP 5	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8 DUCTO PVC 1- 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 89,605.22	0.00	\$ 0.00	239.34	\$ 21,446,113.35	0.00	\$ 0.00	159.34	\$ 14,277,695.75	159.34	\$ 14,277,695.75
NP 6	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 37,535.83	0.00	\$ 0.00	390.55	\$ 14,659,618.41	0.00	\$ 0.00	190.45	\$ 7,148,698.82	190.45	\$ 7,148,698.82
NP 7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	\$ 10,791.13	0.00	\$ 0.00	1486.07	\$ 16,036,374.56	0.00	\$ 0.00	859.33	\$ 9,273,141.74	859.33	\$ 9,273,141.74
NP 8	LETRAS (CUMARAL CIUDAD CORDIAL) LAMINA GALVANIZADA	GL	\$ 56,630,000.00	0.00	\$ 0.00	1	\$ 56,630,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 0.00		\$ 125,473,378.07		\$ 0.00		\$ 37,582,027.23		\$ 37,582,027.23
TOTAL					\$ 1,383,374,836.00		\$ 1,632,641,052.00		\$ 593,154,054.00		\$ 535,165,255.00		\$ 1,128,319,309.00





BALANCE DE OBRA Y EJECUCIÓN.

Para la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra presenta un avance físico ejecutado del 69,11% con un porcentaje restante final de 30,89%

RESUMEN DE EJECUCION DE INTERVENTORIA CONTRATO CM-003-2023

INFORME TÉCNICO DE INTERVENTORIA
PARCIAL No.

2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN
MODIFICATORIA No.1

\$101.113.629,00

\$119.332.957,00

PERIODO	EJECUTADO	%EJECUTADO
15 DE MAYO 2024- 31 DE MAYO 2024	\$43.353.663,00	36,33%
1 DE JULIO DE 2024 – 8 DE JULIO DE 2024	\$39.117.343,00	32,78%

REFERENCIA	VALOR DE EJECUCION	% DE EJECUCION
% EJECUTADO AL PRESENTE INFORME PARCIAL No. 2 DE INTERVENTORIA	\$82.471.006,00	69,11%
% PORCENTAJE POR EJECUTAR	\$36.861.951,00	30,89%
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	\$119.332.957,00	100,00%

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

VALOR INICIAL	VALOR MODIFICADO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
\$101.113.629,00	\$119.332.957,00	\$43.353.663,00	\$75.979.294

Lo anterior, en razón a que la FORMA DE PAGO establecida se contempló así: El ochenta por ciento (80%) mediante Actas Parciales según avance de obra, ajustadas al correspondiente estado actual del proceso, previa presentación de informe del contratista, que incluya la acreditación y los soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, la factura electrónica y/o cuenta de cobro, el acta de recibo parcial con sus respectivas memorias de cálculo aprobadas por la interventoría, el informe de la supervisión y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por la misma.





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



b) El veinte por ciento (20%) mediante un Pago Final a la liquidación del contrato, una vez finalice la totalidad del objeto contractual, previa presentación de informe de contratista, que incluya la acreditación y los soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, la factura electrónica y/o cuenta de cobro, el acta de recibo final con sus respectivas memorias de cálculo aprobadas por la interventoría, el informe de la supervisión y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por la misma, y la correspondiente actualización de las garantías previamente aprobadas.

ASPECTOS FINANCIEROS

Registro presupuestal

Nº	FECHA	RUBRO	VALOR
1213	07 de diciembre de 2023	40.02.1400.020-2023502260001-1.2.4.3.04	\$101.113.629,00
389	11 de mayo de 2024	40.02.1400.020-2023502260001-1.2.3.1.16	\$18.219.328,00
TOTAL			\$119.3332.957,00

CONTROL A GARANTÍAS – VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

POLIZAS EXPEDIDAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CM-003-2023

GARANTIA	ASEGURADOR A	POLIZ A	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994-0000-51459	13/03/2024	13/11/2024	\$20.222.725,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	13/05/2027	\$20.222.725,80
CALIDAD DEL SERVICIO			13/05/2024	13/05/2029	\$20.222.725,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		620-74-994-0000-11846	06/06/2024	13/09/2024	\$260.000.000,00

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA No. 1.

GARANTIA	ASEGURADORA	POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
----------	-------------	--------	-------	-------	-------





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47- 994- 0000- 51459	13/03/2024	13/12/2024	\$20.222.725,80
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	13/06/2027	\$20.222.725,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			13/06/2024	13/06/2029	\$20.222.725,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			13/09/2024	13/10/2024	\$260.000.000,00

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DE ADICION No. 1.

GARANTIA	ASEGURADORA	POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47- 994- 0000- 51459	13/03/2024	13/12/2024	\$23.866.591,60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	13/06/2027	\$23.866.591,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			13/06/2024	13/06/2029	\$23.866.591,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			13/09/2024	13/10/2024	\$260.000.000,00

POLIZAS ACTUALIZADAS DE CONFORMIDAD AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1, AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 y ACTA DE REINICIO No. 1

GARANTIA	ASEGURADORA	POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47- 994- 0000- 51459	13/03/2024	15/01/2025	\$23.866.591,60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	15/07/2027	\$23.866.591,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			13/07/2024	13/07/2029	\$23.866.591,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			13/03/2024	15/11/2024	\$260.000.000,00

ACTAS LEGALES TRAMITADAS



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia

Tel. +57 310253750

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co

Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ACTA/ CONTRATOS	FECHA	CAUSAL
MINUTA DEL CONTRATO No CM-003-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	30/11/2023	SOPORTE JURIDICO DE LA CONTRATACION ENTRE CONSORCIO OBRAS CM
ACTA DEL CONTRATO CM-003-2023	06/03/2024	PRESENTACION DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD MUNICIPIO CUMARAL
ACTA DE INICIO	13/03/2024	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CM-003-2023
MODIFICACION, ADICIÓN Y PRORROGA No.1	11/05/2024	SE AJUSTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ITEMS NO PREVISTOS, ADICION Y PRORROGA No. 1
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	31/05/2024	SE SUSPENDE POR 20 DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	20/06/2024	SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN POR 10 DIAS
ACTA DE REINICIO	01/07/2024	SE DA REINICIO FORMAL A LAS ACTIVIDADES
ACTA DE PRORROGA No. 2	11/07/2024	SE PRORROGA POR UN (01) MES EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTOS ADMINISTRATIVOS

PRÓRROGA No. 1		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
001	30 días	11/05/2024

SUSPENSION No. 1		
ACTA N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
002	20 días	31/05/2024

AMPLIACIÓN SUSPENSION No. 1		
ACTA N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
003	10 días	20/06/2024

REINICIO No. 1		
ACTA N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
004	13 días	01/07/2024

PRORROGA No. 2		
----------------	--	--





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ACTA N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
005	30 días	11/07/2024

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS – PARCIAL

1. PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	8218.00	8150.00	4075.00	2282.00	6357.00	78.00%
								





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	364.81	319.34	174.58	83.67	258.25	80.87%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	900.00	805.61	455.38	202.64	658.02	81.68%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	58.0	52.00	26.00	13.00	39.00	75.00%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	722.97	1267.7	591.98	383.26	975.24	76.93%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	199.00	365.00	178.00	106.00	284.00	77.81%





2. ZONA DURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUIA)	M2	314.40	331.13	157.55	72.49	230.04	69.47%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	46.00	51.04	22.16	12.88	35.04	68.65%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM.	ML	1394.05	1412.81	667.09	408.40	1075.49	76.12%



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia

Tel. +57 310253750

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co

Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	354.14	318.14	161.66	82.19	243.85	76.65%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	354.14	318.14	0.00	161.66	161.66	50.81%





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	414.34	421.87	154.44	150.03	304.47	72.17%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3508.13	3826.19	1403.38	1469.64	2873.02	75.09%






República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumará
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	14	8.00	4.00	12	85.71%

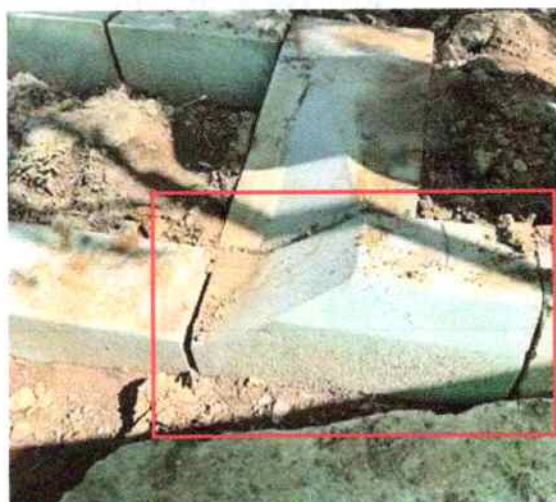

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	14	8.00	4.00	12	85.71%





Departamento del Meta
Municipio de Cumará
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22.00	26.00	15.00	8.00	23.00	88.46%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22.00	26.00	15.00	8.00	23.00	88.46%



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumará - Meta - Colombia
Tel. +57 310253750

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	21.85	28.67	12.43	8.85	21.28	74.22%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	394.61	495.14	257.24	150.89	408.13	82.43%





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	18548.55	20813.79	12090.12	7194.84	19284.96	92.65%



3. MOBILIARIO URBANO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	53.00	53.00	0.00	23.00	23.00	43.40%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	20.00	20.00	0.00	7.00	7.00	35.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	5.72	4.79	0.00	3.09	3.09	64.51%





4. PAISAJISMO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	210.00	210.00	0.00	105.00	105.00	50.00%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	1800.00	1800.00	0.00	900.00	900.00	50.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00%



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia

Tel. +57 310253750

F-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co - contactenos@cumaral-meta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	450.00	450.00	0.00	225.00	225.00	50.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	30.00	30.00	0.00	20.00	20.00	66.67%



Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 310253750
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; cocontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	203.40	203.40	0.00	137.81	137.81	67.75%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	43.81	43.81	0.00	41.92	41.92	95.69%





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.10	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	100.00%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.5	2.5	0.00	2.50	2.50	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	100.00%





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	1.00	21.28	0.00	13.98	13.89	65.27%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES DE 5KM	UND	5.00	8.00	1.00	5.00	6.00	75.00%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	50.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES > 40 CMS	UND	13.00	13.00	3.00	6.00	9.00	69.23%





5. ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
NP.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	0.00	23.00	0.00	12.00	12.00	52.17%




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
NP.2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	0.00	48.00	0.00	20.00	20.00	41.67%





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura

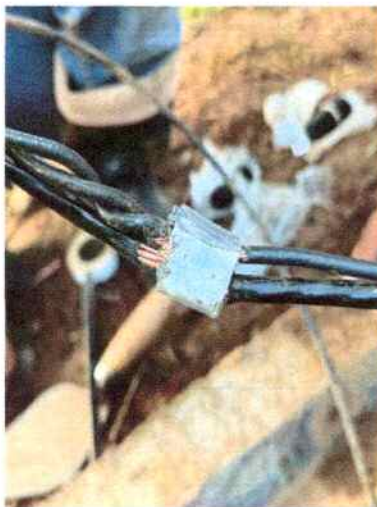

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
NP.3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	0.00	12.00	0.00	5.00	5.00	41.67%




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
NP.5	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	239.34	0.00	159.34	159.34	66.57%





Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura

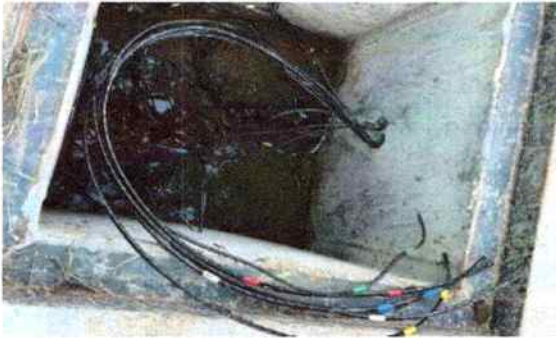

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
NP. 6	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	390.55	0.00	190.45	190.45	48.76%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
NP.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	0.00	1486.07	0.00	1859.33	859.33	57.83%



Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 310253750
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; cocontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



CONTROL SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo al informe entregado por la INTERVENTORIA, a continuación, se relaciona el personal vinculado al contrato de obra LP-001 - 2023:

PERIODO COTIZADO MAYO DE 2024			
NOMBRE	CARGO	CEDULA	No. PLANILLA
CARLOS GARAVITO	DIRECTOR DE OBRA	79.690.097	9469208478
MONICA HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	1.121.888.907	9469208478
EINER RIVERA	PROFESIONAL SST	1.075.234.319	9469208478
MARIA FERNANDA ANDRADE LOMBANA	AUX PROF. SST	1.121.877.632	9469838591
DAVID ESTEBAN GALLEGO MARTINEZ	AYUDANTE	1.118.120.548	9469208478
YILMER ALBEIRO NEIRA	AYUDANTE	1.006.656.286	9469208478
YEISON FABIAN GARZÓN	AYUDANTE	1.119.891.532	9469208478
MILTON VALENCIA	AYUDANTE	3.273.037	9469208478
DEINER STHIWAR HOYOS	AYUDANTE	1.122.922.659	9469208478
EVER JOSE HURTADO	AYUDANTE	8.435.601	9469208478
CRISTOBAL GREGORIO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.116.784.983	9469208478
TERRY ALEJANDRO MORILLO	AYUDANTE	4.997.928	9469208478
HOLMAN ARTURO BARRERA	AYUDANTE	1.094.274.623	9469208478



Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia

Tel. +57 3102537150

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co o contactenos@cumaral-meta.gov.co



JHON FREDY CASTRO JIMENEZ	OFICIAL	1.122.651.458	9469208478
DIEGO HERNAN VEGA	AYUDANTE	1.010.235.966	9469208478
CARLOS ORTIZ	AYUDANTE	5.873.155	9469208478
JOSE MIGUEL GAMEZ	AYUDANTE	1.010.063.486	9469208478
ANGELLO PATIÑO ROCHA	AYUDANTE	1.119.890.476	9469208478
KEVIN CAMILO URREGO	AYUDANTE	1.119.886.125	9469208478
MONICA ANDREA RIOS ESCOBAR	SECRETARIA	35.261.485	9469208478
CRISTIAN GUSTAVO GUTIERREZ	AYUDANTE	1.007.293.909	9469208478
JOSE ALEJANDRO DELGADO	AYUDANTE	1.234.788.612	9469208478
JAHERERSON CIFUENTES	AYUDANTE	1.234.789.493	9469208478

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO COTIZADO MAYO 2024			
NOMBRE	CARGO	CEDULA	Nº PLANILLA
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	80.037.941	77828094, 77289935
EDGAR AUGUSTO VILLATE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	74.376.833	77828250
MARIA CAMILA PEREZ ROA	INSPECTOR SST	1.121.864.728	77828250
YESICA QUINEME FOSCA	INGENIERO AMBIENTAL	52.439.517	9467830593, 77828094
LEONARDO OSPINA TOVAR	TOPOGRAFO INSPECTOR	1.121.914.547	77828250
WILIAN DEIBY CARRERA ANDRADE	CADENERO 1	1.121.839.789	77827292

CONCLUSIONES

El informe de supervisión parcial del contrato de interventoría CM-003-2023 al corte del presente informe, muestra un 69.11% de avance, en el cual la interventoría atiende diligente, y oportunamente todos los requerimientos escritos y/o recomendaciones garantizando la supervisión de actividades operativas, técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y ambientales para la correcta ejecución del contrato. Restando así un 30.89% de ejecución, el cual se llevará a cabo manteniendo siempre el compromiso con la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

- A fecha de presentación del presente informe, en el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y el 1 de Julio de 2024 y el 8 de Julio de 2024 se tiene un avance ejecutado del 32.78% del valor total del contrato que equivale a **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$39,117,343.00).**





República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral
Secretaría De Infraestructura



- A fecha de presentación del presente informe, se tiene un avance ejecutado acumulado del 69.11% del valor total del contrato que equivale a **OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS PESOS M/CTE (\$82.471.006.00)**.
- Las actividades administrativas, financieras, legales y ambientales relacionadas en el presente informe de supervisión no eximen de responsabilidades al contratista de obra ni a la interventoría de la información suministrada a esta supervisión.
- De acuerdo con el presente informe de supervisión, la firma del secretario de infraestructura se emite con base en los documentos entregados por los contratistas de interventoría, de la cual se presume sea veraz y autentica por parte del CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL, R/L: DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO.
- Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$39,117,343.00)**,

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

ACTIVIDAD	PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ / VO.BO.
NOMBRE	JULIAN DAVID MARTIN ROBAYO	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
CARGO	CPS - Profesional en Ingeniería Civil	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura
FIRMA			



CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CM-003-2023

CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL con NIT No 901.776.462-8, representada legalmente por DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO, identificado con c.c. N° 86.050.246 de VILLAVICENCIO - META, vinculado mediante el contrato CM-003-2023 y cuyo Objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"**, se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral, en el periodo correspondiente al mes de mayo de 2024. De conformidad con la certificación del contador y planillas anexas, de las cuales se presume sea veridico por parte del contratista de interventoria.

Igualmente, se certifica que el contratista cuenta con un avance del 69,11% de las actividades contratadas, para cobro parcial No. 2.

La presente se expide a los veinte (25) días del mes de julio de 2024.

Firma

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO

Secretario de Infraestructura

Vo. Bo

Julian David Martin Robayo

CPS - Profesional en Ingenieria Civil
