



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

Periodo 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

**PUERTO ESCONDIDO
LOS CÓRDOBAS**



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4858 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS.

FEBRERO DE 2024

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Objeto del Proyecto	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías terciarias de los municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba.		
Contrato Interventoría	No. 4858 de 2023		
Interventor	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS		
Contratistas	OAC San José de Canalete OAC Martinez OAC Villa Esther OAC Morindo Santa Cruz	4313-2023 4081-2023 4122-2023 4578-2023	

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0	Versión original	Diciembre de 2023

	Nombre	Firma
Elaboró		
Revisó		
Aprobó		

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO

VERSION

PAGINA

FECHA

2/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: Febrero de 2024

CONVENIO No.: 4313 - 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL: \$ 199.508.096,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO PRORROGADO: 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR ACUMULADO: \$ 200.508.096,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALETE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8.474.501,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

Corregimiento San José de Canalete. Inicio del comité operativo.

Corregimiento San José de Canalete. Desarrollo del comité operativo.

Activar Wind
Ve a Configuració

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

	Foto 4
Corregimiento San José de Canalete. Culminación del comité operativo.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div></div><div>Firma Nombre Director de Interventoría Matrícula Profesional No.</div><div>NELSON FERNANDO VANEĞAS ORTIZ 2520276797 CND</div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA2/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: Febrero de 2024

CONVENIO No.: 4081 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL: \$ 200.688.487,00

VALOR ADICIONALES: \$

VALOR ACUMULADO: \$ 200.688.487,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 9.064.837,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Martinez, casa presidenta de la OAC. Inicio del comité operativo.

Vereda Martinez, casa presidenta de la OAC. Desarrollo del comité operativo.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

Vereda Martinez, casa presidenta de la OAC. Culminación del comité operativo.	Vereda Martinez, K0+000 del tramo a intervenir. Inicio de excavación del apique.
Vereda Martinez, tramo a intervenir. Visualización de las excavaciones.	Vereda Martinez, K0+050 del tramo a intervenir. Colocación de los cilindros para la toma de muestras.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div>Firma</div></div> <div><div>Nombre</div>NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div> <div><div>Director de Interventoría</div></div> <div><div>Matrícula Profesional No.</div>2520276797 CND</div>	
<div><div>Original:</div>Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div><div>Copias:</div>Interventor. Dirección Territorial</div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

2/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: Febrero de 2024

CONVENIO No.: 4122 - 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN: 18 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : \$ 199.928.587,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 209.928.587,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR ACARDY GALEANO

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8.094.637,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Corregimiento de Villa Esther, punto de encuentro. Inicio del comité operativo.

Corregimiento de Villa Esther, punto de encuentro. Desarrollo del comité operativo.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

Corregimiento de Villa Esther, punto de encuentro. Culminación del comité operativo.	Corregimiento de Villa Esther, K0+000 del tramo a intervenir. Inicio de la excavación del apique.
Corregimiento de Villa Esther, K0+050 del tramo a intervenir. Inicio de la toma de muestra.	Corregimiento de Villa Esther, K0+100. Muestra extraída del apique.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div></div> <div>Firma NombreNELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.2520276797 CND</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA
2/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: Febrero de 2024

CONVENIO No.: 4578 - 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL: \$ 199.822.623,00

VALOR ADICIONALES: \$

VALOR ACUMULADO: \$ 200.822.623,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación Mejoramiento		
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación Mejoramiento			
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLIDOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8.453.110,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

Activar Wind
Ve a Configuración

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

Vereda Morindo Santa Cruz. Culminación del comité operativo.	Vereda Morindo Santa Cruz, K0+000 del tramo a intervenir. Colocación de los cilindros para la toma de la muestra.
Vereda Morindo Santa Cruz. Evidencia fotográfica de la muestra del primer apique.	Vereda Morindo Santa Cruz, K0+100 del tramo a intervenir. Inserción de los cilindros para la extracción de la muestra.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre</div><div>NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.</div><div>2520276797 CND</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>	

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	16
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	17
2.1. LOCALIZACIÓN.....	17
2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	17
2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS	18
2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	19
2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	19
2.2.2. VEREDA MARTINEZ	20
2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	21
2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	22
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS.....	24
2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	25
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	27
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	27
3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS.....	30
3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	30
3.2.2. VEREDA MARTINEZ	31
3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	32
3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	33
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	34
3.3.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	34
3.3.2. VEREDA MARTINEZ	35
3.3.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	35
3.3.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	36
3.4. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	37
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	38
4.1. RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	38
4.10. INFORMES SEMANALES.....	39
4.11. ACTAS DE COMITÉ.....	39

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

4.12.	ACTAS DE REUNIÓN	39
5.	CONCLUSIONES.....	39
6.	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	40
7.	ANEXOS.....	44
7.1.	ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CHEQUES DE DESEMBOLSO DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE.....	48
7.2.	ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DE LA VEREDA MARTINEZ	56
7.3.	ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER	66

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido	18
Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.....	19
Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.....	20
Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martinez.....	21
Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther.	22
Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.	23
Ilustración 7. Espesores de la placa huella.....	25
Ilustración 8. Detalles técnicos de diseño de la placa huella (Cartilla de INVÍAS).	26
Ilustración 9. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.....	30
Ilustración 10. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez.	31
Ilustración 11. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.	32
Ilustración 12. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.	33
Ilustración 13. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	34
Ilustración 14. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	35
Ilustración 15. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	36
Ilustración 16. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	37

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete. 28

Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez..... 28

Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther. 29

Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz..... 29

Tabla 5. Fechas estimadas de inicio 38

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.	24
Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martinez.....	24
Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.....	25
Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.....	25
Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.....	26
Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.	27

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, adelantó el programa de Obra Pública denominado “CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”, considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte entre veredas y corregimientos, se constituye en una de las principales estrategias a adelantar.

La política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

En este sentido, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios **interadministrativos** con el municipio de Puerto Escondido del Departamento de Córdoba cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS DIFERENTES JUNTAS DE ACCION COMUNAL SELECCIONADAS DENTRO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, para que a través de las juntas de acción comunal se adelantaran los procesos contractuales bajo la modalidad de **licitación pública** con el fin de que las juntas de acción comunal realicen la ejecución de las obras consistentes en el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, LA VEREDA MARTINEZ, EL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Y LA VEREDA MORINDO DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

*“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso **de licitación pública**, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”* (La subraya no es del texto)

Por lo anterior y con el fin de realizar las labores de control y seguimiento, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, adjudicando la Interventoría a VANEGAS DUMAR INGENIERIAS SAS, mediante contrato No 4858 de 2023, y quien realizará la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. Bajo el marco anterior a continuación se presenta control y seguimiento de los convenios No 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, el Municipio de Puerto Escondido y el municipio de Los Córdoba.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las administraciones de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Martínez, Villa Esther y Morindo Santa Cruz, del municipio de Puerto Escondido y Los Córdoba, aplicaron al programa de CAMINOS COMUNITARIO PARA LA PAZ TOTAL, con el fin de mejorar sus redes viales terciarias, razón por la cual se celebran los convenios No. 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, con el Instituto Nacional de Vías “INVIAS”.

Cabe resaltar que los convenios al ser de menor cuantía, las juntas de acción comunal deberán desarrollar el objeto los convenios en las vías terciarias ubicadas en cada zona de influencia correspondiente, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

Por lo anterior se realiza un proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, para adjudicar el contrato No 4858 de 2023, con el fin de seleccionar la interventoría, que se encargara de la adecuada vigilancia, control de las actividades consistentes y cumplimiento satisfactorio de cada uno de los convenios anteriormente mencionados.

Se establecen las siguientes fechas de inicio 19 de diciembre de 2023, 12 de diciembre de 2023, 20 de diciembre de 2023 y 2 de diciembre de 2023, correspondiente a los anteriores No de contratos. Para veracidad de lo anterior, estos documentos se anexarán en el presente informe.

2.1. LOCALIZACIÓN

2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO

Puerto Escondido es un municipio de Colombia perteneciente al departamento de Córdoba. Se encuentra ubicado a 62 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba. La principal actividad económica es la agricultura, y los productos que se cultivan en la región son: el plátano, el maíz, el arroz, el coco y los tubérculos (ñame y yuca). La segunda actividad económica en nivel de importancia del municipio es la ganadería, y luego la pesca, el comercio y la actividad turística, ya que en Puerto Escondido aproximadamente 1.135 personas dependen de las temporadas turísticas. No se puede dejar a un lado el gremio de artesanos, que son aproximadamente 30 familias que se dedican a esta actividad. El municipio tiene una extensión de 417 km² y posee 27 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe de los cuales solo 2.49 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana y 414.51 kilómetros cuadrados de zona rural por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Puerto Escondido se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 9°01'09"N

Longitud: 76°15'41"O

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		



Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido

2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS

Los Córdoba es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento de Córdoba. Se encuentra a una distancia 57 km de la capital departamental, Montería. Predominan las actividades económicas primarias como la ganadería, la agricultura y la pesca artesanal, predomina el cultivo del plátano, aunque en los últimos años se aprecia un crecimiento de la actividad turística. Tiene una extensión total de 430 Km cuadrados de los cuales solo 5,20 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Los Córdoba se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°53'43"N

Longitud: 76°21'17"O

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

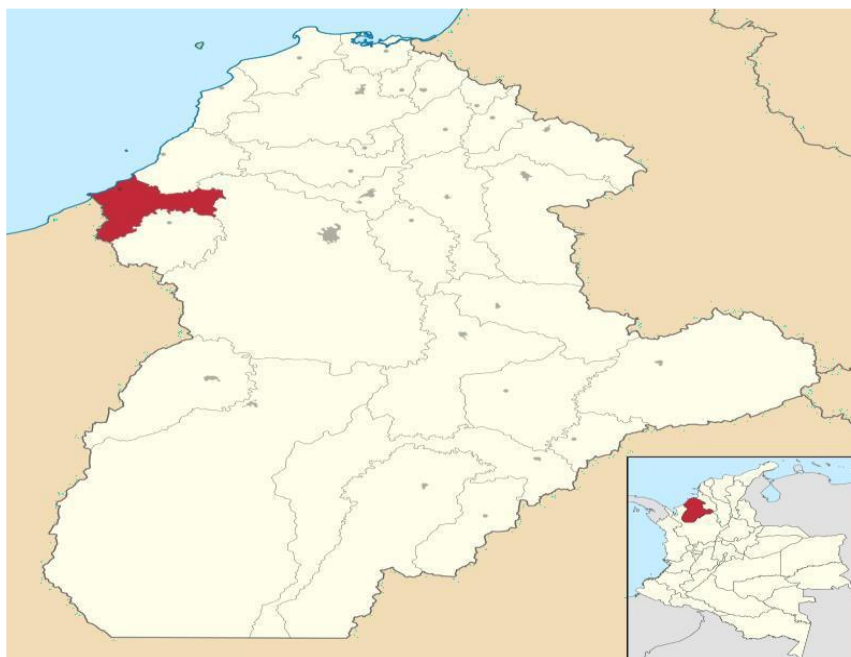


Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.

En ambos municipios las condiciones actuales de las vías rurales no son las óptimas, esto se da por la falta de intervención y la alta pluviosidad que se manifiesta en la zona, donde no se cuenta con cunetas ni obras hidráulicas que permitan controlar el factor erosionante provocado por la escorrentía del agua, siendo los nativos de estas zonas los que diariamente tienen que enfrentarse a las congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje que implica una limitación al derecho a la libre circulación, dando como consecuencia la baja comercialización de productos y afectando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos. Se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud, también inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios afectando el derecho a la educación, junto con un incremento de los precios de los productos de la región debido al aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros.

2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Las zonas de influencia directa de los proyectos, son las jurisdicciones territoriales de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Vereda Martinez, Villa Esther y Morindo de Santa Cruz.

2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Para poder ingresar al tramo a intervenir, debemos partir de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo dos punto ochenta y dos (2.82) kilómetros en dirección hacia el cruce ruta 74, por la vía nacional código 74CR08 INVIAS Puerto Escondido - Cruce Ruta 74, hasta llegar al PR2+820, para luego tomar dirección sur por la vía terciaria que conduce al corregimiento San José de Canalete.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

En el mencionado punto a 3 kilómetros, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°58'8.8"N y Longitud: 76°15'43.4"W; con punto de referencia final en el PR3+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°56'49.1"N y Longitud: 76°15'57.9"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

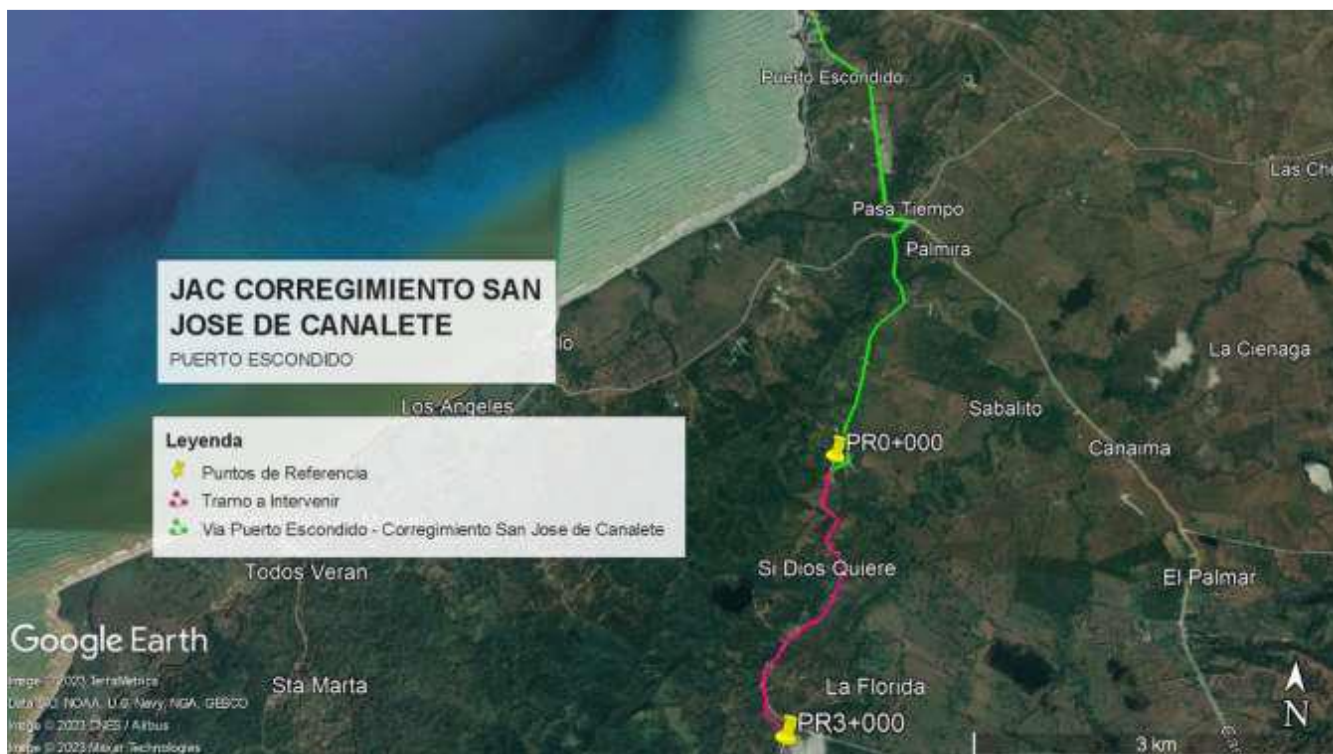


Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.

2.2.2. VEREDA MARTINEZ

En el caso de esta OAC, para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8.2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo ocho punto cinco (8.5) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, hasta la vereda Martínez.

En el mencionado punto, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'51.9"N y Longitud: 76°9'40.5"W; con punto de referencia final en el PR0+811 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°9'27.1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martínez.

2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Puerto Escondido del departamento de Córdoba, en el Corregimiento Villa Esther. Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8,2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo catorce punto seis (14,6) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, en la intersección dirección norte recorriendo uno punto catorce (1,14) kilómetros, encontramos la vía terciaria que conduce a la vereda Villa Esther .

En el mencionado punto, se ubica el PR1+700 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°3'39"N y Longitud: 76°7'48.2"O; con punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°7'35.5"O, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

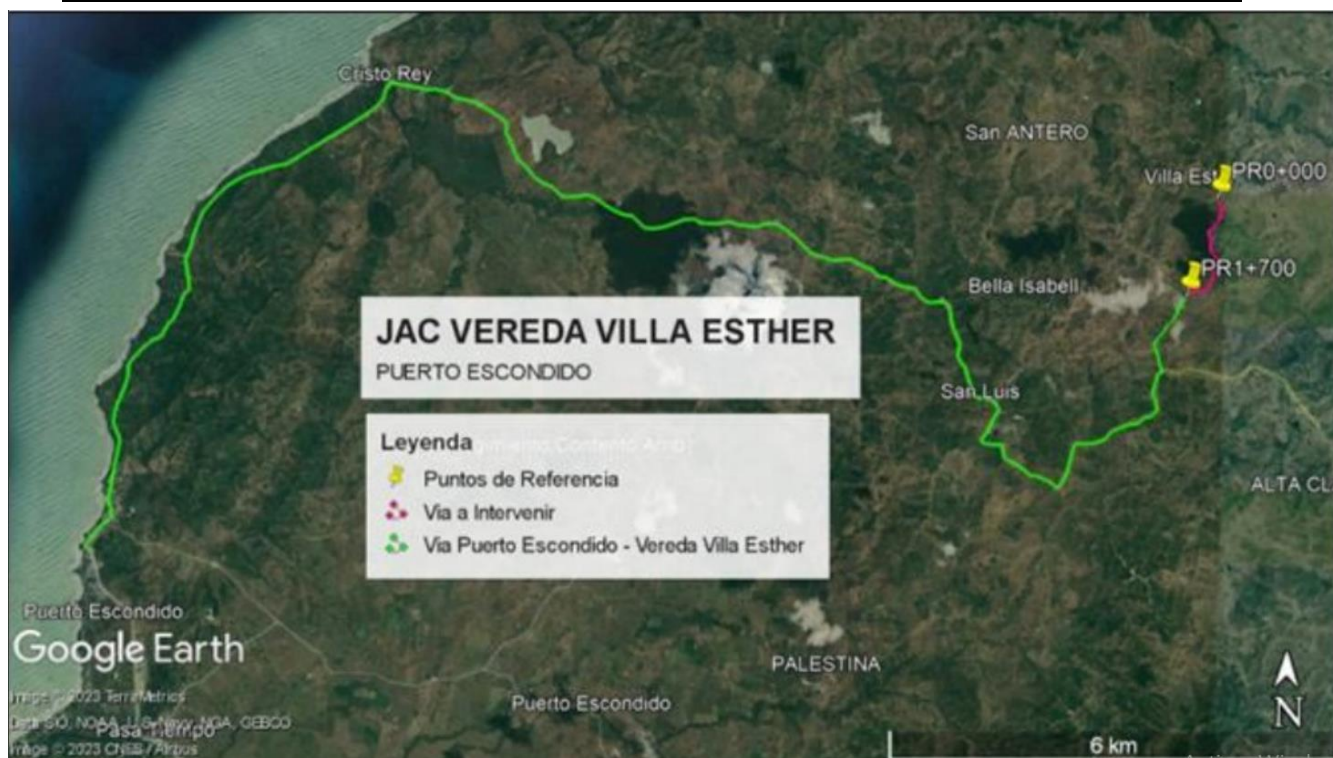


Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther.

2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

El tramo a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Los Córdoba del departamento de Córdoba, en la Vereda Morindo El Cielo. Para acceder a este, se parte de la cabecera municipal del municipio de Los Córdoba, recorriendo veinticuatro (24) kilómetros en dirección al municipio de Montería, por la vía nacional código 7401 INVIAS Puerto Rey - Montería hasta llegar al PR30+000, para luego tomar dirección Norte por la vía terciaria hacia la Vereda Morindo El Cielo.

En el mencionado punto a 2.8 kilómetros, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'7.4"N y Longitud: 76°8'47.3"W; con punto de referencia final en el PR0+830 con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'16.2"N y Longitud: 76°8'22.6"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

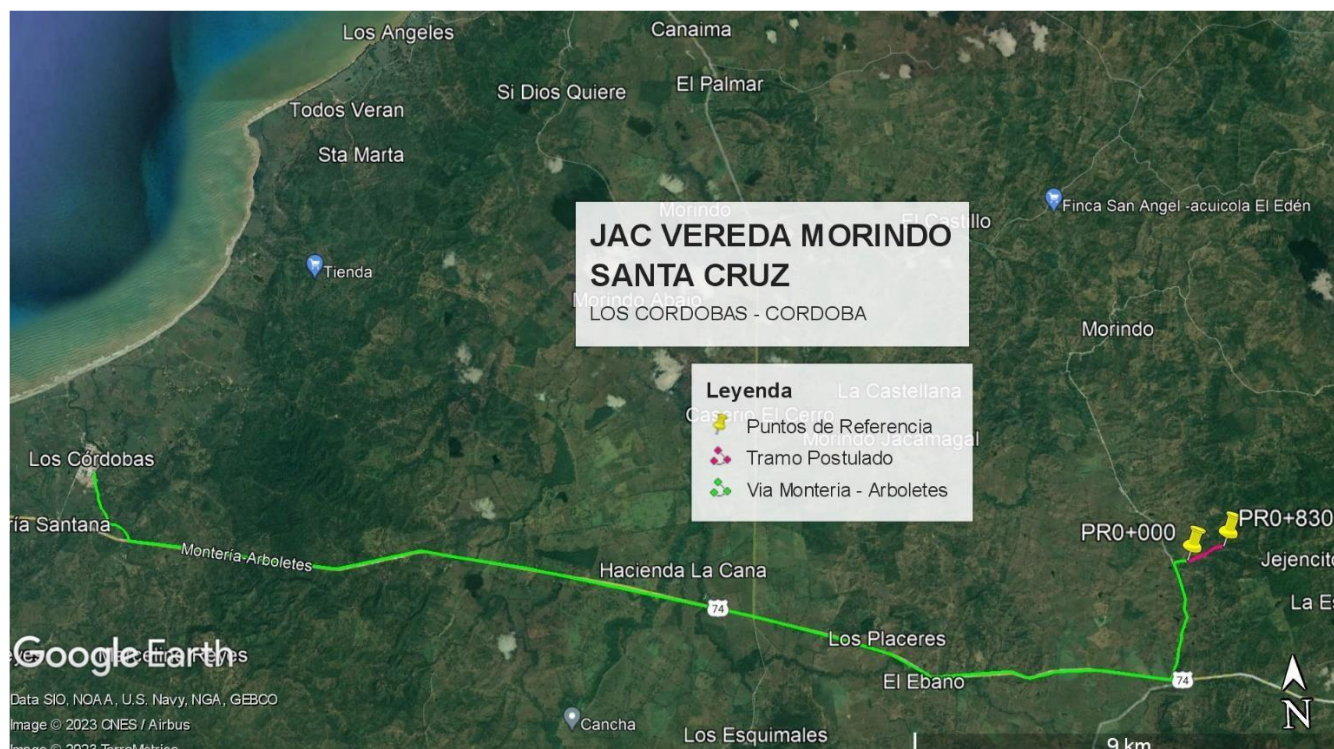


Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.

Las mejoras a estos tramos viales representan un gran desarrollo cultural, turístico y económico entre las regiones, permitiendo la comunicación de las veredas y corregimientos de municipio, así mismo como el acceso a las vías primarias del Departamento. Es importante recalcar que, durante el periodo de ejecución del proyecto, se generará empleo en las zonas de influencia del mismo, con la vinculación de personal que se haya en sus alrededores y que den cumplimiento con los perfiles que se requieran, teniendo en cuenta la necesidad de vinculación de profesionales y personal de mano de obra calificada y no calificada, de tal manera que está contribuyendo al desarrollo económico de esta zona del país.

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto el cual es *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN CUMNAL DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS SELECCIONADAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*, se busca realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados, con el fin de:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes poblaciones.
- Mayor integración y comunicación entre las comunidades.
- Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- Mejorar la competitividad y transitabilidad de los tramos a intervenir.
- Disminución de costos de transporte y comercialización agrícola.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS

El estado actual de los diferentes tramos es deficiente, pues no poseen ninguna superficie de rodadura que garantice confort al usuario y, por el contrario, la superficie de rodadura, fue construida sin consideraciones técnicas, puesto que se compone de suelos de la zona y afirmado.

Por lo anterior, las vías sufren de altas deformaciones y encharcamientos a causa del tránsito de vehículos, las altas precipitaciones que se presentan en la zona y la escorrentía de estas, lo que desencadena un remoldeo del material de la superficie de la vía, que con el pasar del tiempo empeora, hasta el punto volver intransitable y peligroso estos tramos.

A continuación, se mostrará el estado actual de los tramos:



Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.



Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martínez.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		



Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.



Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El diseño inicial de los espesores de la estructura de pavimento se **realizado** de manera estandarizada según el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad, lo cual un **dinero** preliminar de grosores.

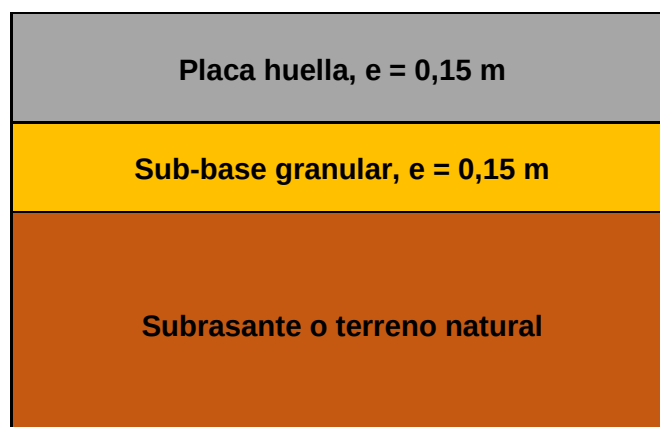


Ilustración 7. Espesores de la placa huella.

SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA (CORTE B-B)

SECCIÓN LONGITUDINAL DE PLACA HUELLA (CORTE A)

SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA SIN ESCALA

PLANTA PLACA HUELLA ESCALA: 1:100

CANTIDADES DE OBRA POR CADA 100 m ² DE VÍA (ANCHO DE BANCA 4.3 m)		
CONCRETO F'c=21 Mpa (m³)	57.0	
CONCRETO CICLOPEO (m³)	13.0	
ACERO DE REFUERZO (kg)	2625	
MATERIAL GRANULAR COMPACTADO O SUELO CEMENTO (m³)	65	

NOTAS:

- EL CONCRETO PARA LA BERMA, CUNETTA, VIGAS RIOSTRA Y EN LOS RIELES O PLACAS HUELLAS TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 21 MPa, Y DEBERÁ CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO INV-630-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INIAV.
- EL CONCRETO CICLOPEO TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 14 MPa Y DEBERÁ CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO INV-630-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INIAV.
- EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LAS PLACAS DEBERÁN TENER UN FY=420 MPa Y ATENDERÁ TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTÍCULO INV-640-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INIAV.
- EL SUELO CEMENTO DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INDEFINIDA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DÍAS DE CURADO Y DEBERÁ CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTÍCULOS INV-350-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INIAV.
- LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O AFIRMADO DEBERÁN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTÍCULOS INV-330-13, INV-320-13 E INV-311-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INIAV.
- PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE EMPLEARÁ MATERIAL ASFALTICO O PNEUMOLADO, CUYA CARACTERÍSTICAS SE ESTABLEZCAN EN LAS ESPECIFICACIONES ANEXO M-8B, M-33, M-153 Y M-30.
- TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SE DEBE GENERAR UN ÁREA DE TRANSICIÓN DEL SUELO A LA ESTRUCTURA RÍGIDA. PARA ESTOS CASOS EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONSIDERAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL QUE PUEDE CONSISTIR EN LA ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE MATERIALES GRANULARES COMO AFIRMADOS O SUBBASES, O DE LA CONFORMACIÓN DE UN REEMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.15 m EN LAS ZONAS EN CONTACTO POR FUERA DE LA PLACA HUELLA. ESTE TRATAMIENTO SE DEBE REALIZAR EN UNA LONGITUD DE AL MENOS 2 m.
- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
 - LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA; REMOCIÓN DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y DERRUMBES.
 - REALIZACIÓN DE BACHEOS, PARCHES Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
 - MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERIALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.
 - LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALcantarillas.

Es importante recordar que en algunos tramos no solo se habla de llevar a cabo, determinados metros de placa huella, si no que también se estableció realizar estructuras tales como Box-Culvert. Las tablas que se tuvieron en cuenta para el diseño preliminar son.



BOX COULVERT DE H1=1.00 m x B=2.00 m										
ALTURA DEL RELLENO (H)	ESPESORES		REFUERZO					CANTIDADES DE OBRA		
	T	TI	REF - 1	REF - 2	REF - 3	REF - 4	REF - 5	CONCRETO m ³ /m	SOLADO m ³ /m	ACERO Kg/m
0.00 - 0.30	0.30	0.35	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.29	0.13	213.08
0.30 - 0.60	0.30	0.30	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.16	0.13	210.27
0.60 - 1.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
1.00 - 1.50	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
1.50 - 2.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
2.00 - 2.50	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
2.50 - 3.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
3.00 - 4.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
4.00 - 5.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
5.00 - 6.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
6.00 - 7.00	0.30	0.35	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.29	0.13	213.08
7.00 - 8.00	0.35	0.35	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.59	0.14	221.51

Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.


 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

GEOMETRÍA Y CANTIDADES DE OBRA																						
SECCIONES	GUARDARUEDAS		ALETAS						BASE ALETAS							REFUERZO				CANTIDADES DE OBRA		
	tg	tr	H externo	h1	h2	a1	tba	tbs	a2	a3	a4	a5	a6	a7	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	CONCRETO m3	SOLADO m3	ACERO kg	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m								
1.00 X 1.00	0.25	0.30	1.50	0.50	1.00	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55	1/2" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	2.77	0.41	156.96	
1.50 X 1.50	0.25	0.30	2.00	0.70	1.30	2.00	0.25	0.25	1.15	2.32	0.32	0.58	1.15	0.95	1/2" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	5.19	0.87	285.81	
2.00 X 2.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	1/2" Ø0.25	1/2" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	8.93	1.61	981.22	
2.50 X 2.50	0.25	0.30	3.00	0.80	2.20	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.20	10.31	1.73	1418.18	
3.00 X 3.00	0.25	0.30	3.50	1.30	2.20	3.00	0.25	0.25	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	13.26	2.33	2356.35	
4.00 X 4.00	0.30	0.30	4.60	1.10	3.50	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.15	20.22	2.66	3682.08	
2.00 X 3.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.20	10.06	1.85	1259.22	
2.00 X 4.00	0.30	0.30	2.60	0.60	2.00	2.60	0.30	0.30	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	11.53	2.13	1853.08	
3.00 X 4.00	0.30	0.30	3.60	1.30	2.30	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	16.29	2.66	2759.11	
2.50 X 2.50 DOBLE	0.30	0.30	3.10	1.40	1.70	2.60	0.30	0.30	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.15	12.20	2.45	1615.47	
3.00 X 3.00 DOBLE	0.30	0.30	3.60	1.30	2.30	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.15	16.70	3.30	2726.79	
3.50 X 3.50 DOBLE	0.30	0.30	4.10	1.10	3.00	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	7/8" Ø0.25	7/8" Ø0.25	19.01	3.58	3322.75	
4.00 X 4.00 DOBLE	0.30	0.30	4.60	1.10	3.50	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	7/8" Ø0.25	7/8" Ø0.20	20.99	3.87	3937.71	

BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO



DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98



41

Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.

Es importante aclarar que estos diseños preliminares se realizaron aplicando suposiciones y sin ensayos en campo, por ello las juntas de acción comunal están en la obligación de realizar una revisión de estos, llevando a cabo todos los estudios pertinentes con sus respectivos profesionales, para poder ajustar a la realidad estas estructuras.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, la información general de los **contratos** solidarios.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-803-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4313-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	
Fecha de reanudación del contrato	
Prorroga del contrato	30 DE ABRIL DE 2024
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-671-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4081-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	12 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-694-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4122-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	20 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-970-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4578-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS

3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

								
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN			
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE	3,00	CÓRDOBA	03/08/2023			
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,20	\$ 21.819,00	\$ 91.640,00
2	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	108,50	\$ 166.800,50	\$ 18.114.534,00
3	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	75,10	\$ 866.784,80	\$ 64.344.538,00
4	630.1.7	630-13		Concreto Cidlopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33,00	\$ 391.013,60	\$ 12.903.449,00
5	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	3.491,00	\$ 5.872,00	\$ 20.499.152,00
							SUB-TOTAL	\$ 115.953.313,00
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT 2x1								
6	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	68,00	\$ 21.819,00	\$ 1.483.692,00
7	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	6,80	\$ 138.498,50	\$ 941.790,00
8	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	20,30	\$ 866.784,80	\$ 17.392.731,00
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,80	\$ 551.781,40	\$ 993.207,00
10	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	1758,00	\$ 5.872,00	\$ 10.322.976,00
							SUB-TOTAL	\$ 31.134.396,00
							SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	\$ 147.087.709,00
							PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.412.631,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 48.007.756,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 199.508.096,00
 Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matrícula Profesional: 22202223728COR				 Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC				

Ilustración 9. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

3.2.2. VEREDA MARTINEZ


								
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN			
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ	0,81	CÓRDOBA	3/08/2023			
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,10	\$ 21.819,00	\$ 111.277,00
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	133,00	\$ 186.002,50	\$ 24.738.333,00
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	92,00	\$ 876.932,20	\$ 80.677.762,00
4	630.1.7	630-22		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,50	\$ 409.624,80	\$ 16.589.804,00
5	640.1	640-22		Aceros de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.272,00	\$ 5.886,00	\$ 25.144.992,00
SUB-TOTAL								\$ 147.262.168,00
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA								\$ 147.262.168,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 4.417.865,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 48.008.454,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 199.688.487,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR Matricula Profesional: 22202223728COR</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</p> </div> </div>								

Ilustración 10. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CORDOBA		PUERTO ESCONDIDO		JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER		1,70		CÓRDOBA	3/08/2023
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2022	PARTICULAR						
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA									
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,30	\$ 21.819,00	\$ 115.641,00	
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	137,80	\$ 174.268,00	\$ 24.014.130,00	
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	92,50	\$ 865.739,00	\$ 80.080.858,00	
4	630.1.7	630-22		Concreto Cidlopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,00	\$ 398.975,00	\$ 17.953.875,00	
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.310,00	\$ 5.877,00	\$ 25.329.870,00	
SUB-TOTAL								\$ 147.494.374,00	
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 147.494.374,00	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 4.424.831,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 48.009.382,00	
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 199.928.587,00	
<div><div><p>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR Matrícula Profesional: 2202223728COR</p></div><div><p>Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC</p></div></div>									

Ilustración 11. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

									
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CORDOBA		LOS CORDOBAS		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ		0,83		CÓRDOBA	1/09/2023
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2022	PARTICULAR						
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA									
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,30	\$ 21.819,00	\$ 115.641,00	
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	139,20	\$ 139.064,20	\$ 19.357.737,00	
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	105,40	\$ 827.683,10	\$ 87.237.799,00	
4	630.1.7	630-22		Concreto Cidlopo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,00	\$ 364.130,70	\$ 12.380.444,00	
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.836,00	\$ 5.852,00	\$ 28.300.272,00	
								SUB-TOTAL	\$ 147.391.893,00
								SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	\$ 147.391.893,00
								PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.421.757,00
								GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 48.008.973,00
								VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 199.822.623,00
<div><div> Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DÍAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matricula Profesional: 2220223728COR</div><div> Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</div></div>									

Ilustración 12. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.

Los convenios establecen que, del presupuesto establecido, cada una de las juntas de acción comunal deben hacer un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor en cual se cuantifica monetariamente en **UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$ 1'000.000,00)**. Los presupuestos se realizaron teniendo en cuenta los diseños preliminares y metros lineales definidos como metas a alcanzar en cada uno de los proyectos, para el caso del corregimiento de San José de Canalete se estableció una meta de 129 ml de placa huella y un Box-Culvert de 2x1, para la vereda Martinez son 158 ml de placa huella, el corregimiento de Villa Esther 158 ml y la vereda de Morindo Santa Cruz 182 ml. Es importante resaltar que estos presupuestos deben de ser ajustados, puesto que los diseños serán acoplados a la realidad de cada caso y también los precios de los materiales, equipos, mano de obra y herramientas, que fueron cotizados el año pasado, deben ser actualizados al presente año. Por lo anterior, estos objetivos fijados al inicio de los convenios, se verán afectados.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)	

3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

A continuación, describiremos las actividades realizadas en las diferentes juntas de acción comunal referente a los convenios, es importante aclarar que aún no se han iniciado actividades en campo, puesto que esta primera etapa de los proyectos es la etapa de revisión, la cual, según lo establecido en el contrato “La etapa de revisión tendrá un plazo total de cuarenta y cinco días **(45) DÍAS CALENDARIO**”.

Por lo anterior las tareas se han hecho en conjunto entre la interventoría y las juntas de acción comunal, para poder establecer todos los requerimientos necesarios para ejecutar los convenios de manera idónea.

3.3.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Las actividades realizadas en el mes de febrero en esta JAC fueron:

- Socialización del proyecto.
- Conformación del comité de partición.
- Elección de representante del comité de participación.
- La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.
- Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.
- Seguimiento de los compromisos establecidos.
- Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.
- Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.087.709,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	147.087.709,00 100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	8.474.501,00 6%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	- %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	- %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	- %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	- %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	- %
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>SI ☐</div> <div>NO ☐</div> </div>
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____		
PERIODO FACTURADO: _____		
VALOR FACTURA:	\$	_____
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.		

Ilustración 13. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)	

3.3.2. VEREDA MARTINEZ

Las actividades adelantadas son:

- Socialización del proyecto.
- Conformación del comité de partición.
- Elección de representante del comité de participación.
- La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.
- Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.
- Seguimiento de los compromisos establecidos.
- Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.
- Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.
- Toma de muestras para los estudios y diseños.

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.262.168,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	147.262.168,00 100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	8.094.637,00 5%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	- %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	- %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	- %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	- %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	- %
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	☐ SI ☐ NO	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	\$	-
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.		

Ilustración 14. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

3.3.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

Las actividades realizadas en el mes fueron:

- Socialización del proyecto.
- Conformación del comité de partición.
- Elección de representante del comité de participación.
- La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.
- Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.
- Seguimiento de los compromisos establecidos.
- Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.
- Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)	

- Toma de muestras para los estudios y diseños.

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.494.374,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	147.494.374,00 100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	8.094.537,00 5%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	- %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	- %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	- %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	- %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	- %
<div style="text-align: center;"> SI NO </div>		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____		
PERIODO FACTURADO: _____		
VALOR FACTURA: \$ _____ -		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.		

Ilustración 15. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

3.3.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

Las actividades acumuladas en el mes son:

- No se logró ubicar al presidente de la junta de acción comunal, el número que aparece de contacto, está fuera de servicio.
- La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.
- Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.
- Se logra contactar al presidente de la junta de acción comunal y se establecen fechas para realizar las debidas actividades.
- Socialización del proyecto.
- Conformación del comité de partición.
- Elección de representante del comité de participación.
- Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.
- Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.
- Toma de muestras para los estudios y diseños.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)	

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.391.893,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	147.391.893,00 100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	8.453.110,00 6%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> SI NO </div>		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____		
PERIODO FACTURADO: _____		
VALOR FACTURA: \$ _____		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.		

Ilustración 16. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

Se establecen metas para las primeras semanas de febrero de 2024.

- Selección del resto de personal para ejecución de la obra (8 obreros).
- Realización de los exámenes médicos para los ingresos.
- Registro del personal a la seguridad social.
- Definición del plan ambiental.
- Cotización de la dotación para el personal.
- Cotización de materiales y equipos necesarios para la ejecución del convenio.
- Realización del plan de compras, inversión y presupuesto del convenio.

Se pactan estos compromisos con el fin de determinar el alcance real del proyecto y así poder iniciar labores en campo.

3.4. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- La interventoría se compromete a guiar a las juntas de acción comunal con el fin de que cumplan con todos los requisitos necesarios para poder dar inicio a los trabajos en campo, cumpliendo con las fechas estipuladas para estos.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

MUNICIPIO	CONVENIO No.	OAC	FECHA APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRA
Puerto Escondido	4313	San José de Canalete	11/03/2024	18/03/2024
Puerto Escondido	4081	Vereda Martinez	07/03/2024	13/03/2024
Puerto Escondido	4122	Villa Esther	07/03/2024	13/03/2024
Los Córdoba	4578	Morindo Santa Cruz	09/03/2024	13/03/2024

Tabla 5. Fechas estimadas de inicio

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Los reportes necesarios que se realizarán periódicamente para llevar a cabo el convenio, serán los consignados a continuación, estos se hacen al momento de entrar en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento, y como aún no hemos entrado en esta etapa, aun no se han diligenciado, pero al igual se consignarán aquí, los formatos, para tener constancia de ellos.

4.1. RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

4.8. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Formato MEPI-MN1-IN-2-FR14

4.9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2

4.10. INFORMES SEMANALES

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.11. ACTAS DE COMITÉ

Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

4.12. ACTAS DE REUNIÓN

Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

5. CONCLUSIONES

- Hasta el momento los convenios han avanzado poco a poco, puesto que esto es un nuevo desafío para todas las juntas, la interventoría ha estado allí, para el apoyo de estas y brindándole acompañamiento en cada una de las actividades y metas planteadas, pero como son personas que tienen muy poca experticia en el tema, se han presentado demoras.
- Los alcances en metros lineales de placa huella y estructuras establecidas en los convenios, deben de ser reevaluados, puestos que estos se hacen a base de diseño preliminares que consideran datos hipotéticos, al igual que los presupuestos, que también se basan según estos supuestos y utilizan precios del año en que salió el convenio, es decir, están desactualizados y no consideran las condiciones de disponibilidad de materiales y equipos en la zona.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		

6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONVENIO SOLIDARIO 4313 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**



DESCRIPCIÓN:

Realización del primer comité operativo, para autorización de compras.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4081 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO



DESCRIPCIÓN:

Realización del primer comité operativo y toma de muestras para los estudios y diseños.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4122 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO



DESCRIPCIÓN:

Realización del primer comité operativo y toma de muestras para los estudios y diseños.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4578 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS



DESCRIPCIÓN:

Realización del primer comité operativo y toma de muestras para los estudios y diseños.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

7. ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN
1
PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 4313 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALATE
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1253823		10	NACIÓN	4313 - 2023	\$ 199.508.096	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.508.096,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 8.474.501	\$ 8.474.501	\$ 8.474.501	\$ -	\$ -	1253823	\$ 191.033.595	\$ 191.033.595				SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 8.474.501	\$ 8.474.501	\$ 8.474.501				\$ 191.033.595	\$ 191.033.595				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGOMEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN1

PÁGINA

FECHA28/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.:4081 - 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ

MES INFORME MENSUAL:FEBRERO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	156623		10	NACIÓN	4313 - 2023	\$ 200.688.487	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:\$ 200.688.487,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 8.094.637	\$ 8.094.637	\$ 8.094.637	\$ -	\$ -	1253823	\$ 192.593.850	\$ 192.593.850				SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 8.094.637	\$ 8.094.637	\$ 8.094.637				\$ 192.593.850	\$ 192.593.850				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS.
Copiar: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 4122 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	156623		10	NACIÓN	4122 - 2023	\$ 199.928.587	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.928.587.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 8.094.637	\$ 8.094.637	\$ 8.094.637	\$ -	\$ -	1253823	\$ 191.833.950	\$ 191.833.950				SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 8.094.637	\$ 8.094.637	\$ 8.094.637				\$ 191.833.950	\$ 191.833.950				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
2/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 4578 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	156623		10	NACIÓN	4578 - 2023	\$ 199.822.623	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.822.623,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 8.453.110	\$ 8.453.110	\$ 8.453.110	\$ -	\$ -	1253823	\$ 191.369.513	\$ 191.369.513				SE LE HACE DESEMBOLO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POUZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 8.453.110	\$ 8.453.110	\$ 8.453.110				\$ 191.369.513	\$ 191.369.513				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

7.1. ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CHEQUES DE DESEMBOLSO DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPL-MNT-IN-14-FR-2 1
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)		FECHA	16/04/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
ACTA DE REUNIÓN No. <u>2</u> <small>(La numeración será consecutiva)</small>			
UNIDAD EJECUTORA: <u>TERRITORIAL CORDOBA</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>4313-2023</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
CONTRATISTA: <u>JAC Corregimiento San José de Canalete. Pto Escondido</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
<u>AVANZAR ESFUERZOS INVIAS - JAC</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>4858-2023</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
INTERVENTOR: <u>VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS.</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN			
<u>COMITE OPERATIVO # 1</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN			
<u>Aprobación Compras.</u>			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<ol style="list-style-type: none"> Se realiza cambio de Firma del Director Territorial Cordoba por representante legal de la Interventoria. el día 8 de febrero 2024 Se presenta Cotización de Estudio y/o Ajustes de Estudios y Diseños por parte de: <ol style="list-style-type: none"> Fabio Luis Acuña \$ 6.200.000 Cobaing Diseños y Asesorias SAS \$ 6.000.000 			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

3. Seguridad Industrial y Dotación
\$ 2.343.110.

4. Valla Informativa \$ 350.000
Exámenes Ingreso \$ 660.000

5. Reposición de Póliza \$ 1.421.391

6. Subsidio de Transporte \$ 400.000
Cabañeros \$ 300.000

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																								
			VERSIÓN	1																								
			PÁGINA																									
			FECHA	(Día / Mes / Año)																								
<table><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)</th><th>RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Entrega de soporte de Facturas</td><td></td><td>JAC - San José de Canalete.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	Entrega de soporte de Facturas		JAC - San José de Canalete.																		
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES																										
Entrega de soporte de Facturas		JAC - San José de Canalete.																										
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)																												
NOTAS:																												



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPL-MNT-IN-14-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	
ACTA DE REUNIÓN		FECHA	(Día / Mes / Año)
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
<u>Julio Currena</u>	<u>Representante Comité participar</u>		
<u>Jorge E Galeano B.</u>	<u>Contratista</u>		<u>Jorge E Galeano B.</u>
<u>Royce E. Florez Pacheco</u>	<u>ING CIVIL</u>		
<u>Modesto - M.</u>	<u>Zamora Representante JDS</u>		
<u>Dina Dumar</u>	<u>Interventoría Vanegas Dumar</u>		
<u>Nelson Vanegas</u>	<u>Director Int Vanegas Dumar Ing.</u>		
<u>Guillermo Miguel Augusto C.</u>	<u>Presidente de Interventoría</u>	<u>Presidente</u>	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)</p>		



Fabio Luis Acuña Izquierdo

Ingeniero Civil –
Especialista en Análisis y Diseño de Estructuras – Universidad del Norte
Msc. en Ingeniería Civil – Universidad Tecnológica de Bolívar
Estudiante de Doctorado en Ingeniería Civil – Universidad del Norte
Profesor Universitario en el área de Estructuras Universidad del Sinú

Montería 19 de enero 2024

Junta de Acción Comunal del Corregimiento San Jose de Canalete Canalete

Ref: Cotización revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños

Por medio de la presente me permito remitir a usted la propuesta para revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños del proyecto cuyo objeto es : "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETO, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

En la **propuesta técnica** se establece como plazo máximo de ejecución un término de 15 días calendario, esta propuesta se encuentra de acuerdo a lo contemplado en las normas colombianas. NSR10, código de puentes CCP14.

Entregables de propuesta:

- Revisión de Ajustes y Diseños del Proyecto en mención.

La **propuesta económica** tiene un valor de \$ 6.200.000.00. (seis millones doscientos mil pesos m/te) La forma de pago será 50% anticipo y 50% contraentrega de la revisión del proyecto.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



Fabio Luis Acuña Izquierdo

Ingeniero Civil –
Especialista en Análisis y Diseño de Estructuras – Universidad del Norte
Msc. en Ingeniería Civil – Universidad Tecnológica de Bolívar
Estudiante de Doctorado en Ingeniería Civil – Universidad del Norte
Profesor Universitario en el área de Estructuras Universidad del Sinú

Espero que esta propuesta sea de su completo interés y que este sea un primer acercamiento importante para que ustedes conozcan la calidad y rapidez de los trabajos que acostumbro a desarrollar.

Atentamente,

Fabio Acuña Izquierdo
Ing. Civil
Esp. Análisis y Diseño de Estructuras
Msc. En Ingeniería Civil y Ambiental
MAT.22202-269745 COR



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

Banco Agrario de Colombia
CTA CTE. 3-2769-000160-4
PUERTO ESCONDIDO -02769
PUERTO ESCONDIDO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

Cheque No. 000001 40
800. 037. 800-8
AÑO MES DÍA (20/24/02/16)
CERD CERCERUOND
\$ 3'000'000-

Páguese a:
La suma de: Tres millones de pesos moneda corriente
000001-08/11/2023
Número de cuenta
Firma
9# 00000004013276900016040000001

Banco Agrario de Colombia
CTA CTE. 3-2769-000160-4
PUERTO ESCONDIDO -02769
PUERTO ESCONDIDO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

Cheque No. 000002 40
800. 037. 800-8
AÑO MES DÍA (20/24/02/16)
CERD CERCERUDOS
\$ 2.343.110-

Páguese a:
La suma de: Dos millones trescientos cuarenta y tres mil ciento diez pesos moneda corriente.
000002-08/11/2023
Número de cuenta
Firma

Banco Agrario de Colombia
CTA CTE. 3-2769-000160-4
PUERTO ESCONDIDO -02769
PUERTO ESCONDIDO-CORDOBA
PAGO NACIONAL

Cheque No. 000003 40
800. 037. 800-8
AÑO MES DÍA (20/24/02/16)
CERD CERCERUTRES
\$ 1.010.000-

Páguese a: Modesto Antonio Zamora Estrada
La suma de: Un millón diez mil pesos moneda corriente
000003-08/11/2023
Número de cuenta
Firma
3# 00000004013276900016040000003

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

7.2. ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DE LA VEREDA MARTINEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-14-FR-2 1
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)		FECHA <u>8/02/2024</u> (Día / Mes / Año)	
ACTA DE REUNIÓN No. <u>2</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>TERRITORIAL CORDOBA</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>4081-2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC VEREDA MARTINEZ MUNICIPIO PTO ESCONDIDO</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>AUXILIO FUERZOS INVIAS Y JAC VEREDA MARTINEZ</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>4858-2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN <u>COMITE OPERATIVO #1</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN <u>Aprobacion Compras.</u>			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN <ol style="list-style-type: none"> El día Martes 6 de Febrero de 2024 se realizó cambio de firma del Director Territorial Cordoba por la representante legal de la Interventoria. El Interventor manifiesta que el manejo de los recursos se harían mediante chequeva así como lo estipula el convenio 4081-2023, sin embargo en AV Villas informan que no se entregara chequeva sino cheque de gerencia con lo cual se incurre en gastos financieros que van en detrimento de la JAC, además la situación se vuelve compleja por que el Banco AV Villas adicional al cheque de Gerencia va a cruzar dicho cheque ocasionando gastos adicionales y demoras en los desembolsos. 			



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

3. COTIZACIONES: Se presentan 3 cotizaciones para el estudio, ajustes a diseño.

- DIJOCLES - Diseño y soluciones Estructurales S.A.S. Valor \$ 7.015.100
- IMBELABCOR S.A.S. Valor \$ 6.450.000
- ROBINSON MARTINEZ Valor \$ 6.345.000

Por votación Jesus Alberto Gonzalez, de la Idar. Martinez y Dina Ixabel Dumar seleccionan la propuesta del Ingeniero del Ing. Robinson Martinez.

Quedamos pendientes de las cotizaciones de Uniformes y exámenes de Ingreso.

Así mismo se hara reintegro del pago de la póliza del convenio.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**DISEÑOS Y SOLUCIONES
ESTRUCTURALES S.A.S**

NIT: 900577955-1

PRESUPUESTO ESTUDIO PARA PLACA HUELLA

SOLICITANTE:		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR.UNIT	SUBTOTAL
1	INFORME				
1.1	REVISIÓN DE DISEÑO Y AJUSTE DE DISEÑO FINAL	UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
2	ESTUDIOS DE SUELOS				
2.1	ESTUDIOS DE SUELO	UN	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5.800.000
Administración				13%	\$ 754.000
Imprevistos				2%	\$ 116.000
Utilidad				5%	\$ 290.000
SUBTOTAL					\$ 6.960.000
IVA (19%) Sobre Utilidad					\$ 55.100
TOTAL					\$ 7.015.100

Atentamente,

JORGE ESCOBAR BUELVAS Ing. Civil. Ms. I.C
M.P. 1320278328 BLV



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



INGELABCON S.A.S.
Confiable en nuestros resultados

SOLICITANTE:		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ			
		PRESUPUESTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL
1	Estudios de suelos CONO DINAMICO	GL	1	\$ 3.150.000	\$ 3.150.000
2	REVISIÓN DE DISEÑO ACTUAL	GL	1	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 6.450.000


JESÚS DAVID PIZARRO FERNANDEZ
Coordinador de Consultoría INGELABCON S.A.S.
Ingeniero Civil



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**ROBINSON
MARTÍNEZ**

**Ingeniero Civil
Esp. Geotecnia
Nit. 11002312-2**

C102024

Montería, febrero 07 de 2024

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

Luis Vargas

Presidente

Cordial saludo,

La presente es la propuesta económica para la realización del estudio geotécnico para vías en el corregimiento Villa Esther, en el Departamento de Córdoba.

La primera fase consiste en la exploración del subsuelo para conocer las propiedades físicas y mecánicas de este. Teniendo en cuenta la longitud de los tramos viales a intervenir se realizarán 4 apiques a 1.50 m de profundidad distribuidos a lo largo de la zona de estudio, estos corresponden a 4 tomas de muestras CBR. En los cuales se extraerán muestras alteradas e inalteradas de suelo.

La segunda fase consiste en la realización de los diferentes ensayos de laboratorio, los ensayos por realizar son los siguientes:

- Capacidad Relativa de Soporte (CBR)
- Expansión axial en molde de CBR
- Peso unitario
- Humedad natural
- Límites de Atterberg
- Granulometría

En el caso que se requiera realizar la verificación de algún parámetro adicional y para ello se requiera de otros ensayos que no estén relacionados anteriormente, se deberá reconocer su valor adicional por ensayo realizado.

Valor de la propuesta

A continuación, se describe el valor de cada componente. El valor obtenido representa el valor a cancelar, es decir, antes de impuestos. Las retenciones serán asumidas por el solicitante del servicio de consultoría.

Carrera 14C No 39-38. B/La Floresta. Montería-Córdoba.
Tel. 6047891152-3137836397
laboratoriorams@gmail.com





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**ROBINSON
MARTÍNEZ**

**Ingeniero Civil
Esp. Geotecnia
Nit. 11002312-2**

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor total
Componente geotécnico	1	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00
Revisión de diseños actuales	1	\$3.150.000,00	\$3.150.000,00
Transporte de equipos ida y regreso	1	\$500.000,00	\$500.000,00
Gastos técnicos	1	\$295.000,00	\$295.000,00
Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos		Total	\$6.345.000,00

Forma de pago

Como forma de pago se establece cancelar de forma anticipada el 60% del valor total de la oferta (\$6.345.000) y el 40% restante deberá ser cancelado una vez se entregue la totalidad de los productos descritos anteriormente y sean aprobados por parte de la interventoría de obra. La cancelación de los servicios de consultoría se podrá realizar en efectivo o a través de la cuenta de ahorro # 680-414028 - 00 de Bancolombia a nombre de Robinson Antonio Martínez Sandoval.

Inicio de trabajo de campo geotécnico

Una vez recibida la orden de servicio donde se expresa la aceptación de la presente oferta económica y se tenga la evidencia de la cancelación del 60% del valor total de la oferta correspondiente al anticipo se dará inicio a las diferentes actividades. Dicha información debe ser enviada vía correo electrónico a: laboratoriorams@gmail.com

Tiempos de entrega

- El informe final del estudio de suelos para será entregado en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar la ejecución de los trabajos en campo.
- El trabajo de campo del componente geotécnico tiene una estimación de tiempo de 1 día.

Agradecemos el interés en nuestra propuesta, estamos atentos a sus inquietudes.

Atentamente,

ROBINSON MARTINEZ SANDOVAL

Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia
Magister en Ingeniería

Carrera 14C No 39-38. B/La Floresta. Montería-Córdoba.
Tel. 6047891152-3137836397
laboratoriorams@gmail.com





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

Montería, Febrero 15 de 2024

Señores:
Banco Av Villas
Oficina Montería

Ref: **Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

Nombre	Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido
	Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS
Nit	901.605.175-6
Cuenta Corriente	550082986

Transferir a:

Banco	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Nombre Titular	Nit/cc	Valor
Bancolombia	Ahorros	68041402800	ROBINSON ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL	11.002.312	\$ 3.810.000
Banco Agrario	Ahorros	427692038502	SUSANA MARGARITA NOBLE PEREZ	1.064.307.491	\$4.284.637

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,
Firmar autorizadas

Luis Angel Vargas Madrid
Nombre: LUIS ANGEL VARGAS MADRID
Representante Legal
JAC Vereda Villa Esther
C.C. 1.233.688.295

Dina Isabel Dumar Sevilla
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal Interventoría
C.C. 50.907.967

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA 19/04/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)			
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. <u>1</u> <small>(La numeración será consecutiva)</small>			
UNIDAD EJECUTORA: <u>Subdirección vías regionales</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Córdoba</u>			
CONVENIO No. <u>4081-2023</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
CONTRATISTA: <u>JAC Martinez</u>			
OBJETO DEL CONVENIO:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>4858-2023</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
INTERVENTOR: <u>Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.</u>			
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS <div style="border: 1px solid black; height: 150px; padding: 10px;"> N/A. </div>			
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA <div style="border: 1px solid black; height: 120px; padding: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suministro de materiales. 2. Verificación de actividades en campo. 3. Programación de actividades. 4. Ensayos de laboratorio. </div>			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	19/04/2024 (Día / Mes / Año)
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA			
<p>1. El día de hoy comercializadora TIF suministrará cemento y acero para iniciar actividades de fundida.</p> <p>2. Se verificó en campo la colocación de las parrillas de acero y la compactación de la sub-base.</p> <p>3. Se presenta un atraso del 14% de lo programado con lo ejecutado. Se solicita al contratista celeridad en la colocación de concretos para ajustarse a la programación.</p> <p>4. Se toman muestras de sub-base y se verificó la calidad de los aceros en campo.</p>			

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

7.3. ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-14-FR-2 1
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)		FECHA	2/02/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
ACTA DE REUNIÓN No. <u>2</u> <small>(La numeración será consecutiva)</small> UNIDAD EJECUTORA: <u>TERRITORIAL CORDOBA</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>		
CONTRATO DE OBRA No. <u>4122-2023</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
CONTRATISTA: <u>SAC COLLEGIADO VILLA ESTHER MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>AUXILIO ESFUERZO INVIAS Y SAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>4858-2023</u> <small>(Indicar número de contrato y año)</small>			
INTERVENTOR: <u>VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S.</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN <u>COMITE OPERATIVO #1</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN <u>Aprobacion compra.</u>			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. El día Martes 6 de Febrero de 2024 se realizó cambio de Firma del Director Territorial Cordoba. Por la del representante legal de la Interventoría. 2. El interventor manifiesta que el manejo de los recursos se harían mediante chequera así como lo estipula el convenio 4122-2023, sin embargo en INVILLAS informan que no se entregaba chequera sino cheque de gerencia con lo cual se incurría en gastos financieros que van en detrimento de la SAC, además la situación se vuelve compleja porque el Banco INVILLAS a diferencia al cheque de Gerencia va a crear dicho cheque ocasionando gastos adicionales y demoras en los desembolsos.			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLMNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8/02/2024 (Día / Mes / Año)
<p>3. COTIZACIONES => Se presentan 3 cotizaciones para el estudio, ajustes a diseños.</p> <ul style="list-style-type: none">• JUAN CARLOS GONDER FUENTES - INGENIERO CIVIL Valor \$ 8.500.000 —• ING. ROBINSON MARTINEZ Valor \$ 6.345.000 —• LUIS GUILLERMO BARVA CERO Valor \$ 6.500.000 — <p>Por votación Luis Vargas, Antonio Jose Gonzales y Dina Isabel Dumar seleccionan la propuesta del Ing Robinson Martinez</p> <p>Que damos pendientes de la cotizaciones de uniformes y exámenes de ingreso.</p> <p>Así mismo se hará reintegro del pago de la póliza del convenio.</p>			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLAN-PE-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN			
(Día / Mes / Año)			
NOTAS:			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**ROBINSON
MARTÍNEZ**

**Ingeniero Civil
Esp. Geotecnia
Nit. 11002312-2**

C102024

Montería, febrero 07 de 2024

**Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER
Luis Vargas
Presidente**

Cordial saludo,

La presente es la propuesta económica para la realización del estudio geotécnico para vías en el corregimiento Villa Esther, en el Departamento de Córdoba.

La primera fase consiste en la exploración del subsuelo para conocer las propiedades físicas y mecánicas de este. Teniendo en cuenta la longitud de los tramos viales a intervenir se realizarán 4 apiques a 1.50 m de profundidad distribuidos a lo largo de la zona de estudio, estos corresponden a 4 tomas de muestras CBR. En los cuales se extraerán muestras alteradas e inalteradas de suelo.

La segunda fase consiste en la realización de los diferentes ensayos de laboratorio, los ensayos por realizar son los siguientes:

- Capacidad Relativa de Soporte (CBR)
- Expansión axial en molde de CBR
- Peso unitario
- Humedad natural
- Límites de Atterberg
- Granulometría

En el caso que se requiera realizar la verificación de algún parámetro adicional y para ello se requiera de otros ensayos que no estén relacionados anteriormente, se deberá reconocer su valor adicional por ensayo realizado.

Valor de la propuesta

A continuación, se describe el valor de cada componente. El valor obtenido representa el valor a cancelar, es decir, antes de impuestos. Las retenciones serán asumidas por el solicitante del servicio de consultoría.

Carrera 14C No 39-38. B/La Floresta. Montería-Córdoba.
Tel. 6047891152-3137836397
laboratoriorams@gmail.com





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**ROBINSON
MARTÍNEZ**

**Ingeniero Civil
Esp. Geotecnia
Nit. 11002312-2**

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor total
Componente geotécnico	1	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00
Revisión de diseños actuales	1	\$3.150.000,00	\$3.150.000,00
Transporte de equipos ida y regreso	1	\$500.000,00	\$500.000,00
Gastos técnicos	1	\$295.000,00	\$295.000,00
Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos		Total	\$6.345.000,00

Forma de pago

Como forma de pago se establece cancelar de forma anticipada el 60% del valor total de la oferta (\$6.345.000) y el 40% restante deberá ser cancelado una vez se entregue la totalidad de los productos descritos anteriormente y sean aprobados por parte de la interventoría de obra. La cancelación de los servicios de consultoría se podrá realizar en efectivo o a través de la cuenta de ahorro # 680-414028 - 00 de Bancolombia a nombre de Robinson Antonio Martínez Sandoval.

Inicio de trabajo de campo geotécnico

Una vez recibida la orden de servicio donde se expresa la aceptación de la presente oferta económica y se tenga la evidencia de la cancelación del 60% del valor total de la oferta correspondiente al anticipo se dará inicio a las diferentes actividades. Dicha información debe ser enviada vía correo electrónico a: laboratoriorams@gmail.com

Tiempos de entrega

- El informe final del estudio de suelos para será entregado en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar la ejecución de los trabajos en campo.
- El trabajo de campo del componente geotécnico tiene una estimación de tiempo de 1 día.


Agradecemos el interés en nuestra propuesta, estamos atentos a sus inquietudes.

Atentamente,

ROBINSON MARTINEZ SANDOVAL

Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia
Magíster en Ingeniería

Carrera 14C No 39-38. B/La Floresta. Montería-Córdoba.
Tel. 6047891152-3137836397
laboratoriorams@gmail.com





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

Montería, Febrero 15 de 2024

Señores:
Banco Av Villas
Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

Nombre	Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS
Nit	901.605.175-6
Cuenta Corriente	550082986

Transferir a:

Banco	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Nombre Titular	Nit/cc	Valor
Bancolombia	Ahorros	68041402800	ROBINSON ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL	11.002.312	\$ 3.810.000
Banco Agrario	Ahorros	427692038502	SUSANA MARGARITA NOBLE PEREZ	1.064.307.491	\$4.284.637

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,
Firmar autorizadas

LUIS ANGEL VARGAS M

Nombre: LUIS ANGEL VARGAS MADRID

Representante Legal

JAC Vereda Villa Esther

C.C. 1.233.688.295

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA

Representante Legal Interventoría

C.C. 50.907.967

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

7.4. ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DEL VEREDA DE MORINDO SANTA CRUZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-14-FR-2 1
		FECHA	16/02/2024 (Día / Mes / Año)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)			
ACTA DE REUNIÓN No. <u>2</u> (La numeración será consecutiva)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>TERRITORIAL CORDOBA</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>	
CONTRATO DE OBRA No. <u>4578-2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
CONTRATISTA: <u>JAC MORINDO SANTA CRUZ LOS CORDOBA</u>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
<u>AUNAR ESFUERZO INVIAS Y JAC MORINDO SANTA CRUZ</u>			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>4858-2023</u> (Indicar número de contrato y año)			
INTERVENTOR: <u>VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS</u>			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN			
<u>COMITE OPERATIVO #</u>			
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN			
<u>APROBACION COMPRAS</u>			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Se realiza cambio de Firma del Director Territorial CORDOBA por representante Legal de la Interventoría el día 8 Febrero 2024</p> <p>2. Se presentan cotizaciones de ajustes Estudios por parte de:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Disolce - Diseños y soluciones estructurales SAS. Valor \$7'015.100 * Ingelab SAS. Valor \$6'450.000 * Robinson Martinez. Valor \$6'345.000 <p>Por votación Irene Maria Angel, delegada del comité de participación y Dinia Isabel Dumar seleccionaron la propuesta del ingeniero Robinson Martinez</p>			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)
<p>3. Seguridad In situ total y Dotación \$ 2.343.110</p> <p>4. Valla Informativa \$ 350.000 Examen In peso \$ 660.000</p> <p>5. Reposición de Poliza \$ 1400.000 =</p> <p>6. Subsidio de Transporte \$ 400.000 Carga Menor \$ 300.000</p>			

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	
		(Día / Mes / Año)	
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN			
(Día / Mes / Año)			
NOTAS:			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Juán Vargas	J.A.C.	Municipio de Salinas	Juán Vargas
Jesús A. Martínez	ing residente	J.A.C.	Jesús A. Martínez
Nelson Varela	Director Ist.	Varela Dumar Ing.	Nelson Varela
DINA DUMAS	Interventor	Vanegas Dumar Ing.	DINA DUMAS
don Miguel Dugo C.	Residente de Interventor	Vanegas Dumar Ing.	don Miguel Dugo C.
Francisco María	Asesor	J.A.C.	Francisco María
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**ROBINSON
MARTÍNEZ**

**Ingeniero Civil
Esp. Geotecnia
Nit. 11002312-2**

C102024

Montería, febrero 07 de 2024

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER
Luis Vargas
Presidente

Cordial saludo,

La presente es la propuesta económica para la realización del estudio geotécnico para vías en el corregimiento Villa Esther, en el Departamento de Córdoba.

La primera fase consiste en la exploración del subsuelo para conocer las propiedades físicas y mecánicas de este. Teniendo en cuenta la longitud de los tramos viales a intervenir se realizarán 4 apiques a 1.50 m de profundidad distribuidos a lo largo de la zona de estudio, estos corresponden a 4 tomas de muestras CBR. En los cuales se extraerán muestras alteradas e inalteradas de suelo.

La segunda fase consiste en la realización de los diferentes ensayos de laboratorio, los ensayos por realizar son los siguientes:

- Capacidad Relativa de Soporte (CBR)
- Expansión axial en molde de CBR
- Peso unitario
- Humedad natural
- Límites de Atterberg
- Granulometría

En el caso que se requiera realizar la verificación de algún parámetro adicional y para ello se requiera de otros ensayos que no estén relacionados anteriormente, se deberá reconocer su valor adicional por ensayo realizado.

Valor de la propuesta

A continuación, se describe el valor de cada componente. El valor obtenido representa el valor a cancelar, es decir, antes de impuestos. Las retenciones serán asumidas por el solicitante del servicio de consultoría.

Carrera 14C No 39-38. B/La Floresta. Montería-Córdoba.
Tel. 6047891152-3137836397
laboratoriorams@gmail.com





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



**ROBINSON
MARTÍNEZ**

**Ingeniero Civil
Esp. Geotecnia
Nit. 11002312-2**

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor total
Componente geotécnico	1	\$2.400.000,00	\$2.400.000,00
Revisión de diseños actuales	1	\$3.150.000,00	\$3.150.000,00
Transporte de equipos ida y regreso	1	\$500.000,00	\$500.000,00
Gastos técnicos	1	\$295.000,00	\$295.000,00
Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos		Total	\$6.345.000,00

Forma de pago

Como forma de pago se establece cancelar de forma anticipada el 60% del valor total de la oferta (\$6.345.000) y el 40% restante deberá ser cancelado una vez se entregue la totalidad de los productos descritos anteriormente y sean aprobados por parte de la interventoría de obra. La cancelación de los servicios de consultoría se podrá realizar en efectivo o a través de la cuenta de ahorro # 680-414028 - 00 de Bancolombia a nombre de Robinson Antonio Martínez Sandoval.

Inicio de trabajo de campo geotécnico

Una vez recibida la orden de servicio donde se expresa la aceptación de la presente oferta económica y se tenga la evidencia de la cancelación del 60% del valor total de la oferta correspondiente al anticipo se dará inicio a las diferentes actividades. Dicha información debe ser enviada vía correo electrónico a: laboratoriorams@gmail.com

Tiempos de entrega


- El informe final del estudio de suelos para será entregado en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar la ejecución de los trabajos en campo.
- El trabajo de campo del componente geotécnico tiene una estimación de tiempo de 1 día.

Agradecemos el interés en nuestra propuesta, estamos atentos a sus inquietudes.

Atentamente,

ROBINSON MARTINEZ SANDOVAL
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia
Magíster en Ingeniería

Carrera 14C No 39-38, B/La Floresta, Montería-Córdoba.
Tel. 6047891152-3137836397
laboratoriorams@gmail.com



 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3 (01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)	



Banco Agrario de Colombia

Cheque No.

000001

Ciudad	Año	Mes	Día
	2024	02	16
A favor de			
Robinson Antonio			
Martinez Sandoval			
Por concepto de			
Antiguo Estadio			
Señales			
Recibí			
C.C No.			

Saldo anterior	\$
Depósitos	
Suma	\$ 3'000'000
Deducciones y notas débito	
Menos este cheque	
Saldo que pasa	\$



Banco Agrario de Colombia

Cheque No.

000002

Ciudad	Año	Mes	Día
Montevideo	2024	02	16
A favor de			
Luis Emilio Vergara			
Salgado			
Por concepto de			
Seguridad y Robo			
Recibí			
C.C No.			

Saldo anterior	\$
Depósitos	
Suma	\$ 2.343.110
Deducciones y notas débito	
Menos este cheque	
Saldo que pasa	\$



Banco Agrario de Colombia

Cheque No.

000003

Ciudad	Año	Mes	Día
Montevideo	2024	02	16
A favor de			
Luis Emilio Vergara			
Salgado			
Por concepto de			
Valla y Exámenes			
Recibí			
C.C No.			

Saldo anterior	\$
Depósitos	
Suma	\$ 1.010.000
Deducciones y notas débito	
Menos este cheque	
Saldo que pasa	\$



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3
(01 DE FEBRERO HASTA 29 DE FEBRERO 2024)



Banco Agrario de Colombia

Cheque No.

000004

Ciudad	Monteña	Año	2024	Mes	02	Día	16
A favor de	Juis Emiro Vergara						
	Salgado						
Por concepto de	Traspaso de 2400 000						
	Caja menor \$ 800 000						
Recibí							
C.C No.							

Saldo anterior	\$
Depósitos	
Suma	\$ 200 000
Deducciones y notas débito	
Menos este cheque	
Saldo que pasa	\$



Banco Agrario de Colombia

Cheque No.

000005

Ciudad	Monteña	Año	2024	Mes	02	Día	16
A favor de	Juis Emiro Vergara						
	Salgado						
Por concepto de	Pago por						
Recibí							
C.C No.							

Saldo anterior	\$
Depósitos	
Suma	\$ 1400 000
Deducciones y notas débito	
Menos este cheque	
Saldo que pasa	\$
