

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	2091	Contratista:	INGPRA SAS
Contrato de Interventoría No.	2701	Interventoría:	1570 INGENIERIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

INFORME MENSUAL No.	2	MES O PERIODO:	Septiembre de 2024
---------------------	---	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: Elías Jaimes Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°2

CONTRATO No. 2091 DE 2024: “MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01”.

PERIODO: 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2701 DE 2024

“INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01”

Ocaña, octubre de 2024

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	9
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9
2.1	<i>Localización</i>	10
2.2	<i>Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.</i>	10
2.3	<i>Inventario y estado inicial de la vía.</i>	10
2.4	<i>Características Técnicas del Proyecto</i>	11
3.	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.	12
3.1	<i>Información General del contrato</i>	12
3.2	<i>Descripción de las actividades ejecutadas en el mes</i>	12
3.3	<i>Seguimiento ítems no previstos</i>	12
3.4	<i>Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría</i>	12
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	13
4.1	<i>Resumen Mensual Estado General del Proyecto</i>	13
4.2	<i>Maquinaria y Equipo Contrato de Obra</i>	13
4.3	<i>Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.</i>	13
4.4	<i>Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra</i>	13
4.5	<i>Estado General del Tiempo</i>	13
4.6	<i>Resumen Ensayos de Laboratorio</i>	13
4.7	<i>Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra</i>	13
4.8	<i>Informes semanales</i>	13
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14
5.1	<i>Información general del contrato</i>	14
5.2	<i>Descripción de las actividades realizadas por el interventor.</i>	14
5.3	<i>Informes especialistas</i>	14
5.4	<i>Informe del Programa Anual de Caja - PAC</i>	14
5.5	<i>Información otros programas y aplicativo</i>	14
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	15
6.1	<i>Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría</i>	15
6.2	<i>Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría</i>	15
6.3	<i>Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría</i>	15
6.4	<i>Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría</i>	15
6.5	<i>Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría</i>	15
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16
8.	ANEXOS	17



8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 17

8.2. Registro fotográfico..... 17

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 17

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías en cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, tiene el deber de realizar mantenimiento de la Red Vial a su cargo, con el propósito de habilitar y brindar transitabilidad en adecuadas condiciones dentro de las vías del territorio nacional bajo su cuidado; estas actividades de mantenimiento no solo se incluye mejorar la capacidad estructural de la carretera, sino también optimizar el drenaje, estabilizar taludes y renovar la señalización, garantizando la seguridad vial a largo plazo, optimizando el flujo vehicular contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las zonas aledañas.

La ruta 70NS01 específicamente en el PR04+0310-PR04+0330 y PR06+0000-PR06+0140 de la Carretera Ondina - Llano Grande - Convención es estratégica para el desarrollo económico y social de la región, facilitando el acceso a mercados y centros educativos. Es por ello, que La Dirección Territorial OCAÑA del INVIAS, en cumplimiento de su deber constitucional y misional hace necesaria la contratación de servicios para llevar a cabo el corrector mantenimiento de este sector de la vía Nacional, el cual será llevado a cabo bajo estándares de calidad y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental durante su ejecución.

Durante la ejecución de este proyecto se busca generar bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades y desarrollo del contrato de obra No. 2091 de 2024, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024 al cual se le ejerce Interventoría a través del contrato 2701 de 2024, por parte de 1570 INGENIERIA SAS, siendo este último supervisado por el ingeniero Elías Jaimes Fernández.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Ocaña, en el corregimiento de Aguas Claras, en la vía: Ondina - Llano Grande - Convención en el PR04+0310-PR04+0330 y PR06+0000-PR06+0140 ruta 70NS01.



Figura: 1 Localización Tramo a intervenir- Corregimiento de Aguas Claras

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto de los contratos de referencia se ejecutan en su totalidad en el PR04+0310-PR04+0330 y PR06+0000-PR06+0140 de la carretera nacional Ondina - Llano Grande - Convención, específicamente en el corregimiento de Aguas Claras, es decir, que de su ejecución se beneficia la población de este corregimiento y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

La ruta a intervenir 70NS01 específicamente en el PR04+0310-PR04+0330 y PR06+0000-PR06+0140 de la Carretera Ondina - Llano Grande – Convención, ubicado en el corregimiento de Aguas Claras, municipio de Ocaña, Norte de Santander, requiere con urgencia la creación de espacios destinados a peatones para garantizar la seguridad de los estudiantes que necesitan llegar al colegio y demás transeúntes, los cuales se ven obligados a transitar por la vía nacional debido a la falta de aceras o áreas seguras para peatones. Esta situación los expone a un alto riesgo, ya que deben caminar directamente por la carretera, donde los vehículos circulan a gran velocidad. La ausencia de infraestructura peatonal adecuada pone en peligro su integridad física, incrementando la posibilidad de accidentes y arrollamientos.



2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presente contrato tiene por objeto el mantenimiento de la carretera ondina - llano grande - convención PR04+0310-PR04+0330 y PR06+0000-PR06+0140, para la creación de espacios destinados a peatones y así garantizar la seguridad de los estudiantes y demás transeúntes.

Para el efecto descrito anteriormente, se han ejecutado las siguientes actividades:

- Construcción de muro en gaviones
- Construcción de andén para la circulación segura de estudiantes y comunidad en general.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información General del contrato

CONTRATO No.	2091 DE 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01
CONTRATISTA	INGPRA SAS
FECHA DE INICIACIÓN	01/08/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	04/11/2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	04/11/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 396.184.952.05 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 396.184.952.05 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre, se llevaron a cabo diversas actividades. Se finalizó la instalación de base de concreto ciclópeo para muro en gaviones y posteriormente se dio inicio a la construcción del muro.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica, en el presente periodo no se ha tramitado Ítems no previstos).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el período evaluado en el contrato de obra se ejecutó con normalidad, siguiendo el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) previamente aprobado y respetando las especificaciones generales de construcción. Sin embargo, en el período actual se observó un bajo rendimiento en la ejecución del proyecto, atribuido a las constantes lluvias y también por la apertura de un Paro Nacional, lo que dificultó el avance y el transporte de material a la obra. Ante esta situación, fue necesario sugerir la inclusión de una cuadrilla adicional para compensar la pérdida de productividad y minimizar el impacto de estos factores externos en el cronograma del proyecto.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 *Resumen Mensual Estado General del Proyecto*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 *Maquinaria y Equipo Contrato de Obra*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 *Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 *Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 *Estado General del Tiempo*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 *Resumen Ensayos de Laboratorio*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 *Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 *Informes semanales*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2701 de 2024
OBJETO	INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01
INTERVENTOR	1570 INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA INICIACIÓN	01/08/2024
FECHA TERMINACIÓN	31/10/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 51.730.615 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 51.730.615 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las actividades para el contrato de obra 2091 del 2024, verificando que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas por el INVIAS en el anexo técnico del proceso de contratación que originó el contrato en comento.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.
- Requerimiento al contratista para la señalización de sitios que generasen riesgo para el usuario.

5.3 Informes especialistas (No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC (No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo (No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 *Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 *Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 *Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.4 *Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.5 *Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Continuar con una revisión constante de la zona para garantizar que las actividades de construcción sigan fielmente los planos aprobados y no se generen desajustes en la estructura.
- Mantener medidas estrictas de seguridad, incluyendo la correcta implementación del PMT.
- Es crucial implementar un plan de contingencia para enfrentar situaciones imprevistas que puedan afectar la ejecución del proyecto, como fenómenos climáticos adversos y eventos sociales.
- A pesar de que el proyecto se ejecutó de acuerdo con lo establecido en el PMT y las especificaciones técnicas, factores externos como las lluvias constantes y un paro nacional influyeron negativamente en el rendimiento del proyecto durante este periodo. Para mitigar el impacto de estas eventualidades, fue necesario sugerir la inclusión de una cuadrilla adicional.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:


Ver anexo 15

ANEXOS


Anexo 1
Resumen Mensual Estado General del Proyecto
MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																														
					VERSION	1																																																																														
					PÁGINA																																																																															
MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01					FECHA	5/10/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		PERIODO MES: Septiembre de 2024																																																																																
CONTRATO DE OBRA No.: 2091 de 2024		PLAZO INICIAL: Tres (03) meses		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 396.184.952,05																																																																																
OBJETO: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01		FECHA DE INICIO: 1/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																																
CONTRATISTA: INGPRA SAS		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 396.184.952,05																																																																																
		FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																																
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																
		PLAZO ACUMULADO:																																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2701 del 2024		INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ																																																																																
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Muro en gaviones</td><td>m3 450</td></tr><tr><td>Anden</td><td>ml 245</td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Muro en gaviones	m3 450	Anden	ml 245	Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Muro en gaviones</td><td>m3 310</td><td>360</td></tr><tr><td>Anden</td><td>ml 0</td><td>0</td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Muro en gaviones	m3 310	360	Anden	ml 0	0	Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																		
Pavimentación	Construcción																																																																																			
	Mejoramiento																																																																																			
	Rehabilitación																																																																																			
Estructuras	Muro en gaviones	m3 450																																																																																		
	Anden	ml 245																																																																																		
	Pontones																																																																																			
Mantenimiento																																																																																				
Otros (Especificar cuales)																																																																																				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																																	
Pavimentación	Construcción																																																																																			
	Mejoramiento																																																																																			
	Rehabilitación																																																																																			
Estructuras	Muro en gaviones	m3 310	360																																																																																	
	Anden	ml 0	0																																																																																	
	Pontones																																																																																			
Mantenimiento																																																																																				
Otros (Especificar cuales)																																																																																				
AVANCE FINANCIERO																																																																																				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																	
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 390.698.250,00</td><td></td><td>\$ 396.184.952,05</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 390.698.250,00</td><td></td><td>\$ 396.184.952,05</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 390.698.250,00		\$ 396.184.952,05	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 390.698.250,00		\$ 396.184.952,05	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>\$ 146.523.994,10</td><td>\$ 168.393.994,07</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 168.393.994,07</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS			\$ 146.523.994,10	\$ 168.393.994,07	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO				\$ 168.393.994,07
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																	
OBRAS	\$ 390.698.250,00		\$ 396.184.952,05																																																																																	
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 390.698.250,00		\$ 396.184.952,05																																																																																	
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																
OBRAS			\$ 146.523.994,10	\$ 168.393.994,07																																																																																
AJUSTES																																																																																				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA																																																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																				
VALOR EJECUTADO				\$ 168.393.994,07																																																																																
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																				
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 185.780.970,12			MANO DE OBRA CALIFICADA: 7																																																																																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 168.393.994,07			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11																																																																																	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 43,10%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																	
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 18																																																																																	
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																				
Instalación de muro en gaviones en el PR04+0310-PR04+0330			Instalación de muro en gaviones en el PR04+0310-PR04+0330																																																																																	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																				
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: Ligia Mercedes Gómez Araque</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202-216095 NTS</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																																																				

Anexo 2
Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

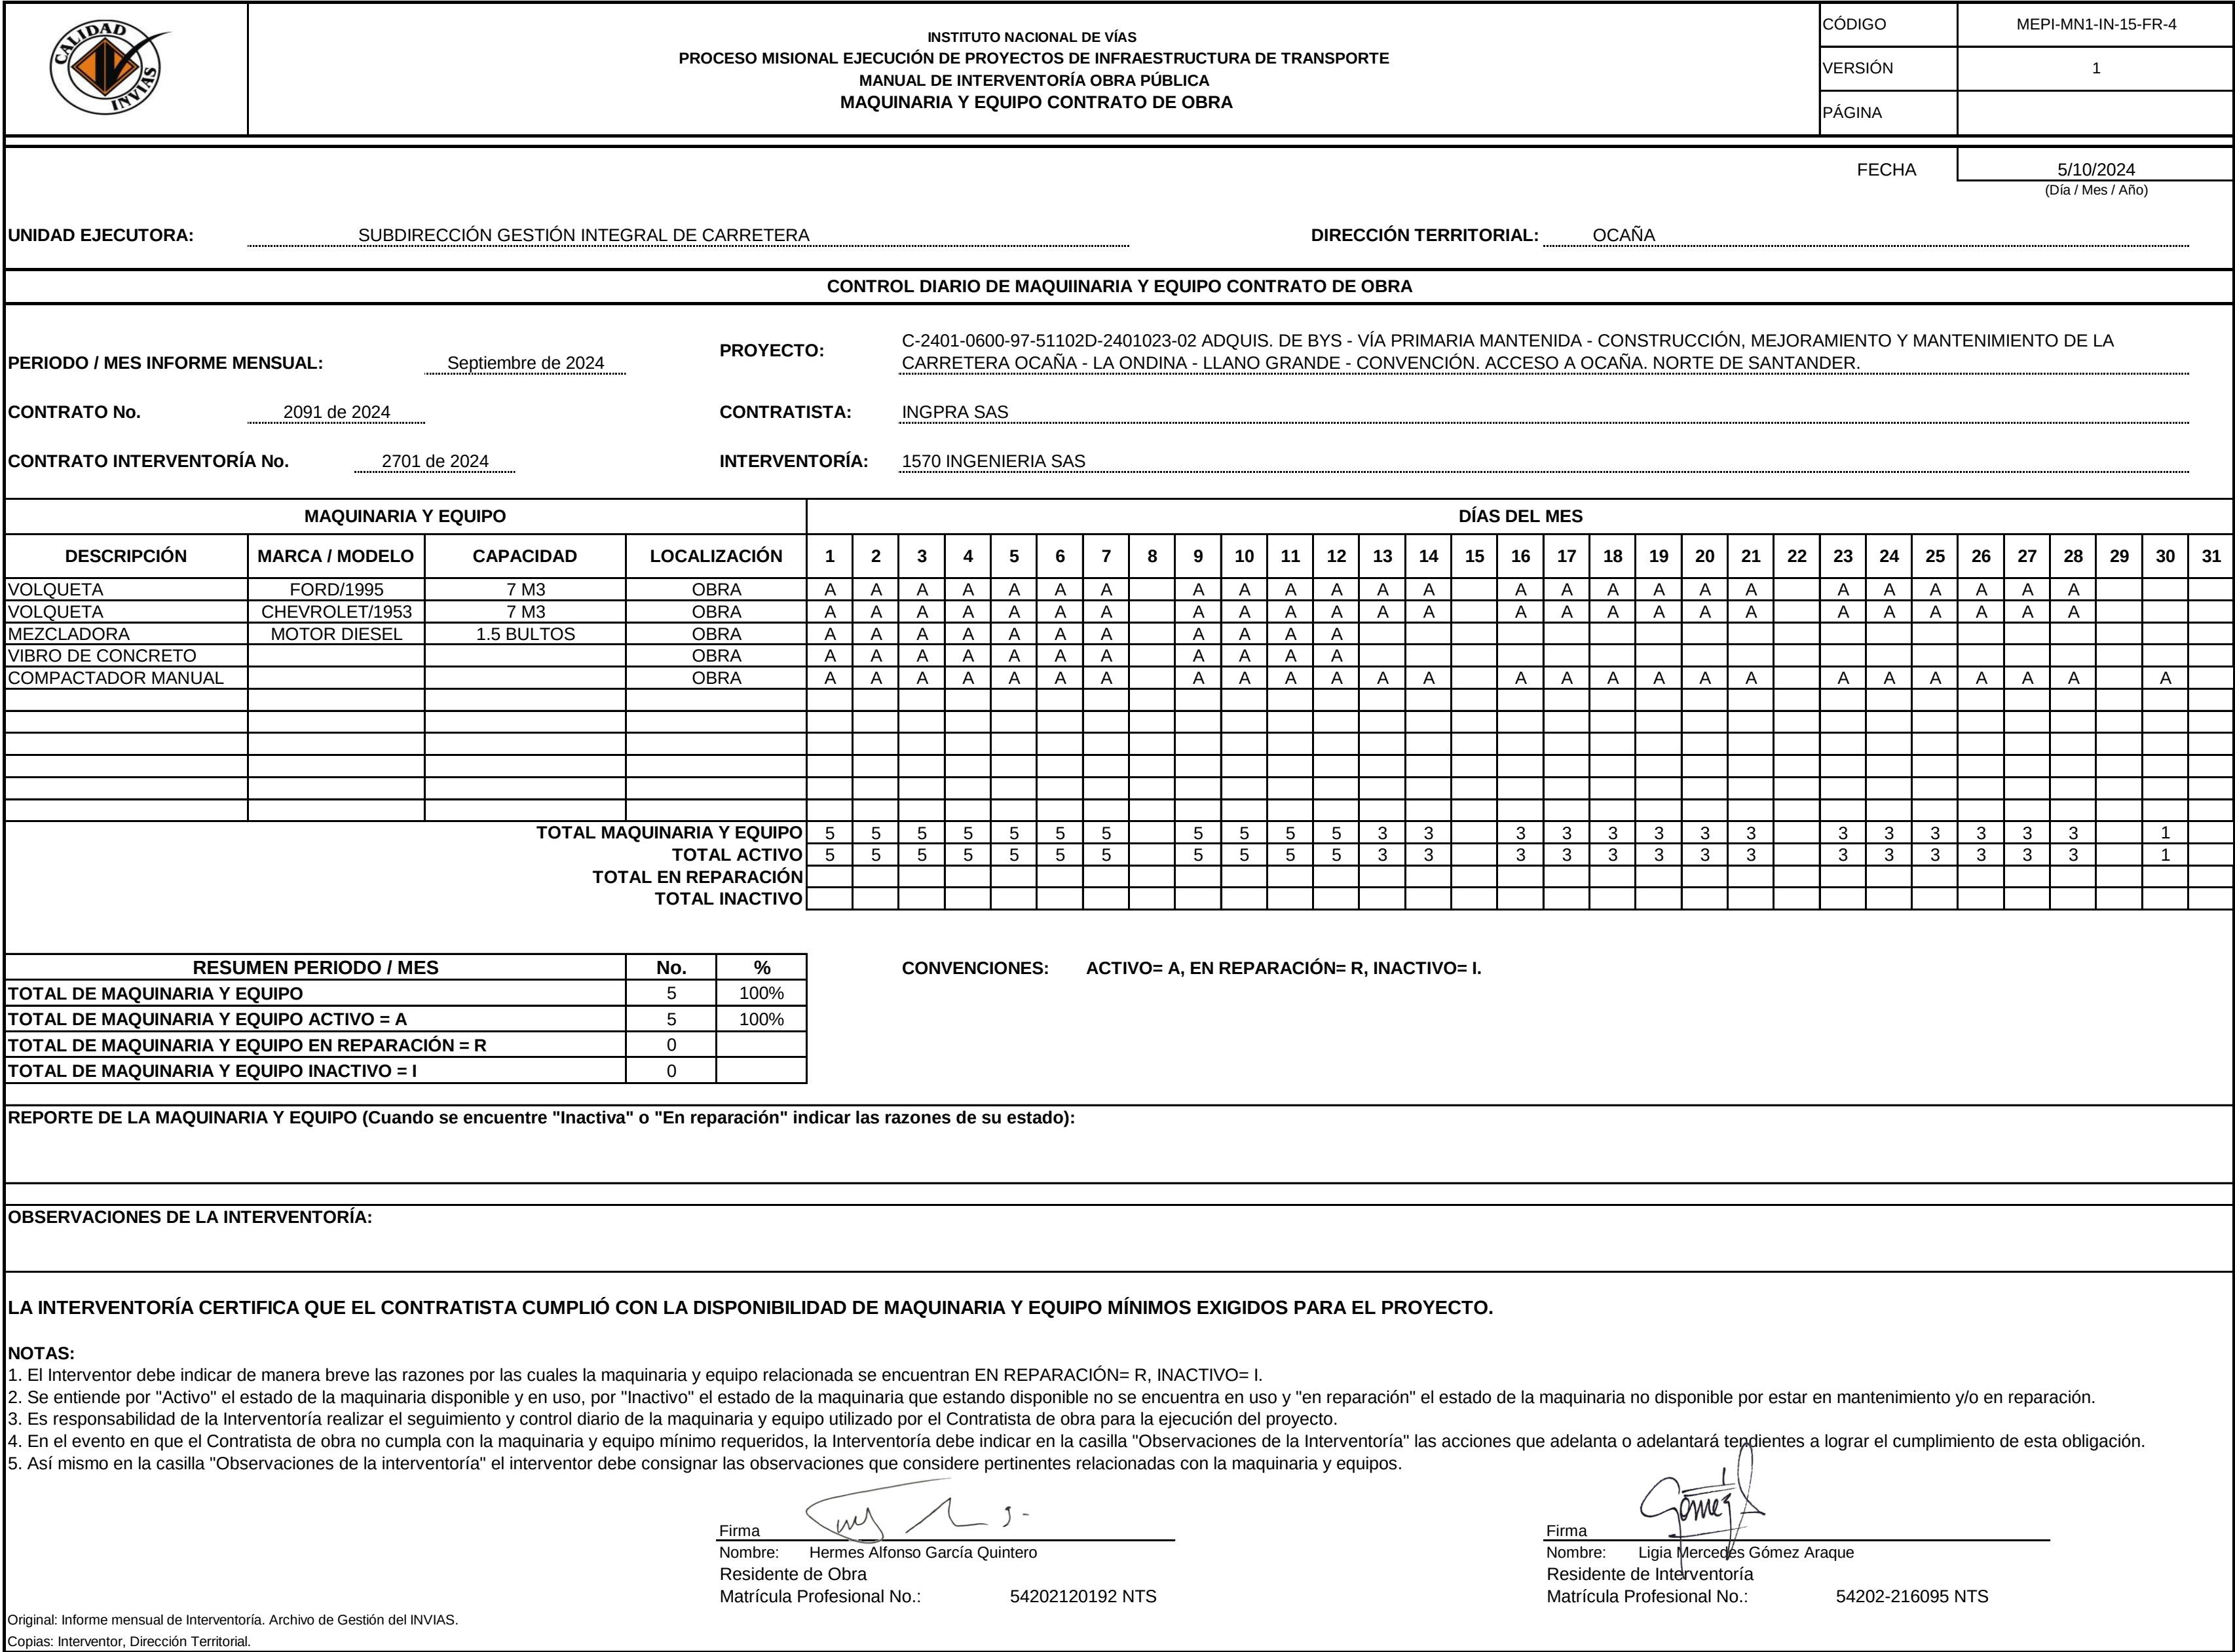

Anexo 3
Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-6.



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA

FECHA	10/10/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATISTA:	INGPRA SAS
PROYECTO:	MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01
INTERVENITOR:	1570 INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 8/10/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.


Firma _____
Nombre: ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
APODERADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Interventor 1570 INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

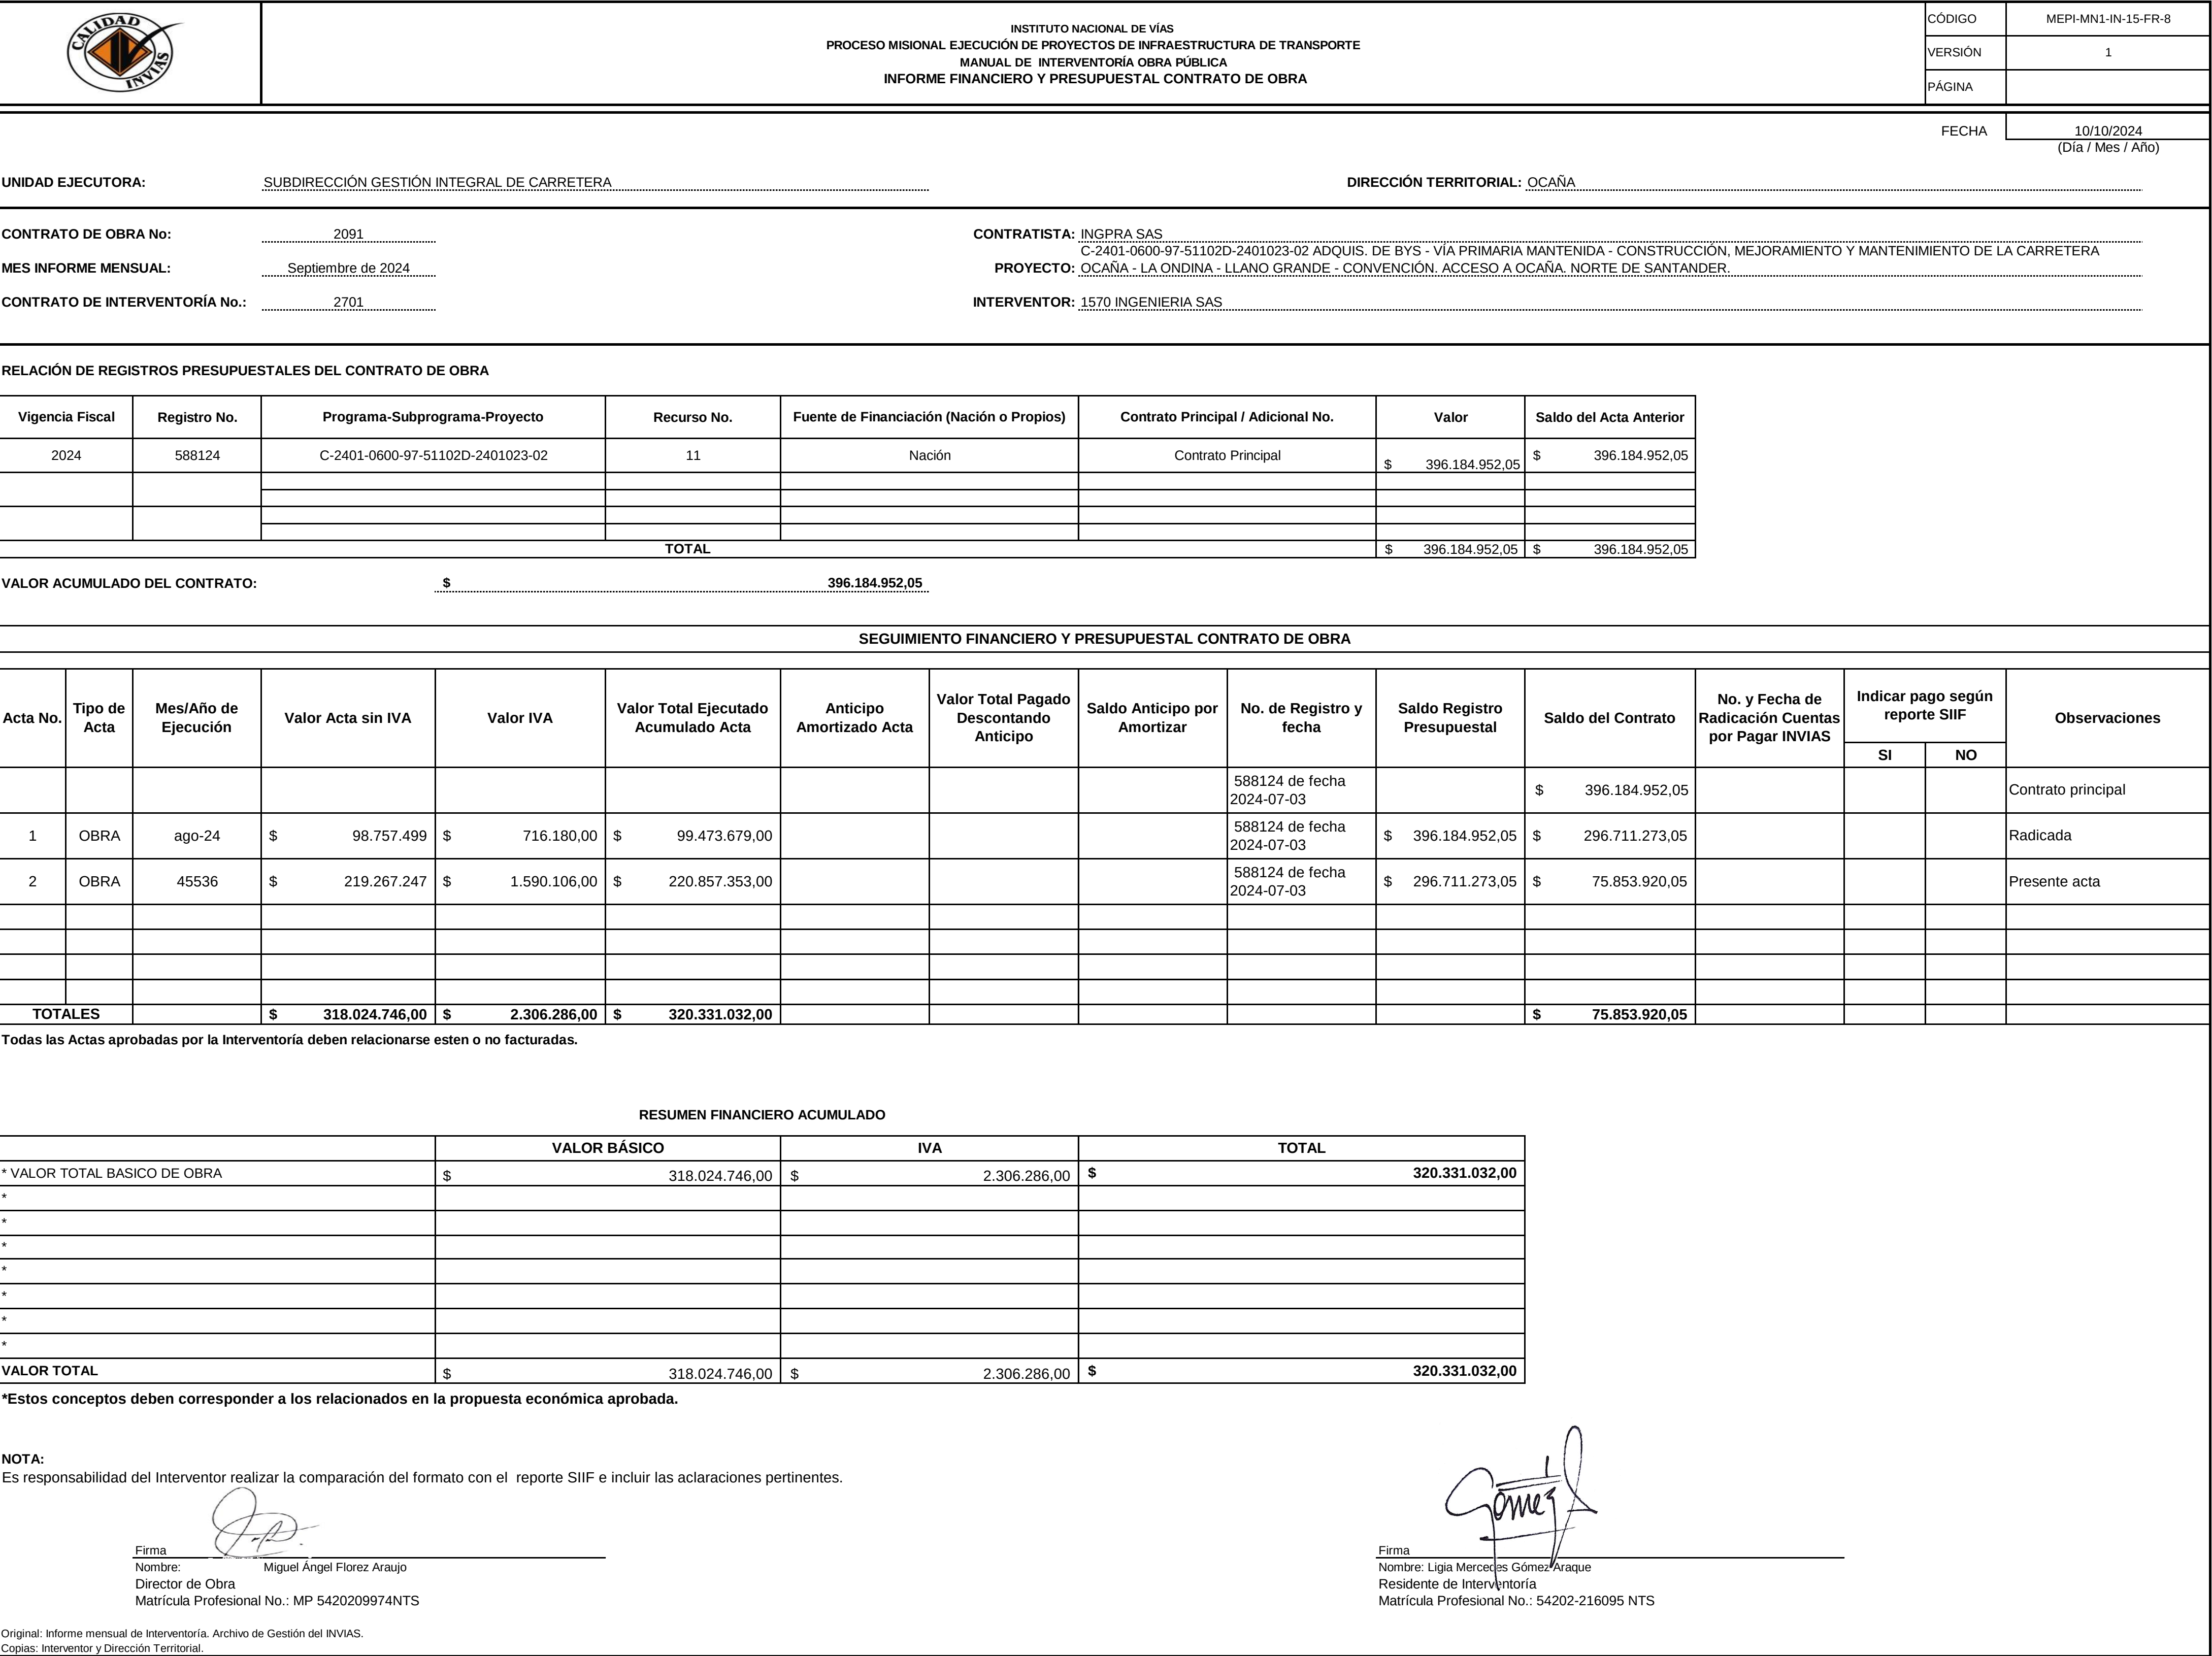

Anexo 5
Estado General del Tiempo
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN		1									
																					PÁGINA											
																				FECHA		5/10/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA												
CONTRATO DE OBRA No: 2091																				CONTRATISTA: INGPRA SAS C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE -												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24																				PROYECTO: CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER.												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2701																				INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	24	22	22	23	23	24	24	24	22	23	24	23	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	22	21	24	22	24	24	22		697
Lluvias moderadas	2		2	2	1	1				2	1		1			1	1							2	3		1			2		22
Lluvias intensas																1																1
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: Hermes Alfonso García Quintero Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 54202120192 NTS</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: Ligia Mercedes Gómez Araque Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-216095 NTS</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	5/10/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA									
CONTRATO DE OBRA No.: 2091 de 2024 CONTRATISTA: INGPRA SAS C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Septiembre de 2024 PROYECTO: LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2701 de 2024 INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES: En este mes solo se realizaron actividades relacionadas con la instalación de muro en gaviones.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma Nombre: Miguel Ánge Director de Obra Matrícula Profesional No.: 54202-09974NTS					Firma Nombre: Ligia Mercedes Gómez Araque Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-216095 NTS				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

Anexo 7
Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	5	10	2024																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 2091 de 2024		CONTRATISTA: INGPRASAS																																																															
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																	
MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01																																																																	
FECHA DE INICIO: 1/08/2024																																																																	
PLAZO INICIAL: Tres (03) meses																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																	
VALOR INICIAL: \$ 396.184.952,05																																																																	
VALOR ACUMULADO: \$ 396.184.952,05 (Incluye adiciones)																																																																	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2701		INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 39.618.495,20</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 79.236.990,40</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 118.855.485,60</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 39.618.495,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 79.236.990,40	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 118.855.485,60	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>28</td><td>3</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>28</td><td>9</td><td>2027</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>9</td><td>2024</td><td>29</td><td>9</td><td>2029</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			28	6	2024	28	3	2025							28	6	2024	28	9	2027							28	9	2024	29	9	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento	10%	\$ 39.618.495,20																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 79.236.990,40																																																															
Calidad de Estudios y Diseños																																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 118.855.485,60																																																															
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
28	6	2024	28	3	2025																																																												
28	6	2024	28	9	2027																																																												
28	9	2024	29	9	2029																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100008371																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 260.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>28</td><td>9</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			28	6	2024	28	9	2024																																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00																																																															
Otros																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
28	6	2024	28	9	2024																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT - 100002026																																																																	
OTRAS PÓLIZAS No.																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	5	10	2024																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																	
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																	
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento																																																																	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																																	
Calidad de Estudios y Diseños																																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.:																																																																	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																	
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																	
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																																	
Otros																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.																																																																	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																	
OBSERVACIONES:																																																																	
NOTAS:																																																																	
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																																	
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																																	
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Ligia Mercedes Gómez Araque</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 54202-216095 NTS</div></div>																																																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																																	
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																																	

Anexo 8
Informes semanales
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-3
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	

FECHA		5/09/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

SEMANA No.:

5

del

30/08/2024

al

5/09/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140). RUTA 70NS01

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Obra de contención y estructura (Anden lado izquierdo de la calzada) en el Pr6+0000 (Sector PR06+0000-PR06+0140) de la ruta 70NS01 La Ondina – Llano Grande – Convención.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Proyecto a desarrollar se encuentra ubicado de la Ruta 70NS01, tramo La Ondina – Llano Grande - Convención en el Departamento de Norte de Santander, comprendido entre (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), y consiste en la construccion de un muro en gaviones y 425 ml de estructura de andén, con la finalidad de mejorar las condiciones de transibilidad del sector.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	INGPRA SAS	INTERVENTOR:	1570 INGENIERIA SAS	REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA		
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	CONTRATO No.	2701 DE 2024	FECHA DE INICIO:	1/08/2024	VALOR INICIAL:	\$ 51.730.615,00
FECHA DE INICIO:	1/08/2024	VALOR INICIAL:	\$ 396.184.952,05	VALOR ADICIONES:		VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/11/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 396.184.952,05	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/10/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 51.730.615,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/11/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/10/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ -
						VALOR AMORTIZADO:	\$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 396.184.952			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 100.017.500			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 296.167.452			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 51.730.615			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 19.896.390			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 31.834.225			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 390.693.331,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 100.017.500,00 25,60%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 100.017.500,00 25,60%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 100.017.500,00 25,60%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 100.017.500,00 25,60%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 78.147.500,00 20,00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 78.147.500,00 20,00%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 19.896.390,38 38%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 19.896.390,38 38%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 3.979.278,08 8%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.979.278,08 8%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$ \$ -

Amortizado \$ \$ -

Saldo \$ \$ -

INDICADOR I/C

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$ \$ -

Amortizado \$ \$ -

Saldo \$ \$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,6%

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % 25,6%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
* EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	766,80	2024		Prog	470			470	4,45%
					Ejec	470			470	4,45%
* CONCRETO CICLOPEO CON RESISTENCIA 17 MPA	M3	56,0	2024		Prog	27			27	2,90%
					Ejec	27			27	2,90%
* GEOTEXTIL	M2	200,0	2024		Prog	135			135	0,43%
					Ejec	135			135	0,43%
* GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	M3	450,0	2024		Prog	200			200	17,81%
					Ejec	200			200	17,81%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: TRITURADORA EL GUAYABAL SAS

PERMISO MINERO: SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI X NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

ZONA DE DEPOSITO: ESCOMBRERA PABLO RIZO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALUOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finalizó instalación de concreto ciclopeo para base de muro en gaviones en la sección 1

Se continúa con instalación de concreto ciclopeo para base de muro en gaviones en la sección 2

se hace remoción de derrumbes

Se inicia la instalación de muro en gaviones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con actividades de excavación y con la instalación de concreto ciclopeo para base de muro en gaviones.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Muro en gaviones	Programado 25,60%	Ejecutado 25,60%
Anden	Programado	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REMOCIÓN DE DERRUMBE

INSTALACIÓN DE BASE EN CONCRETO CICLOPEO

INSTALACIÓN DE MURO EN GAVIONES

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Erneslu Castro Peñaranda R.L. / 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-5

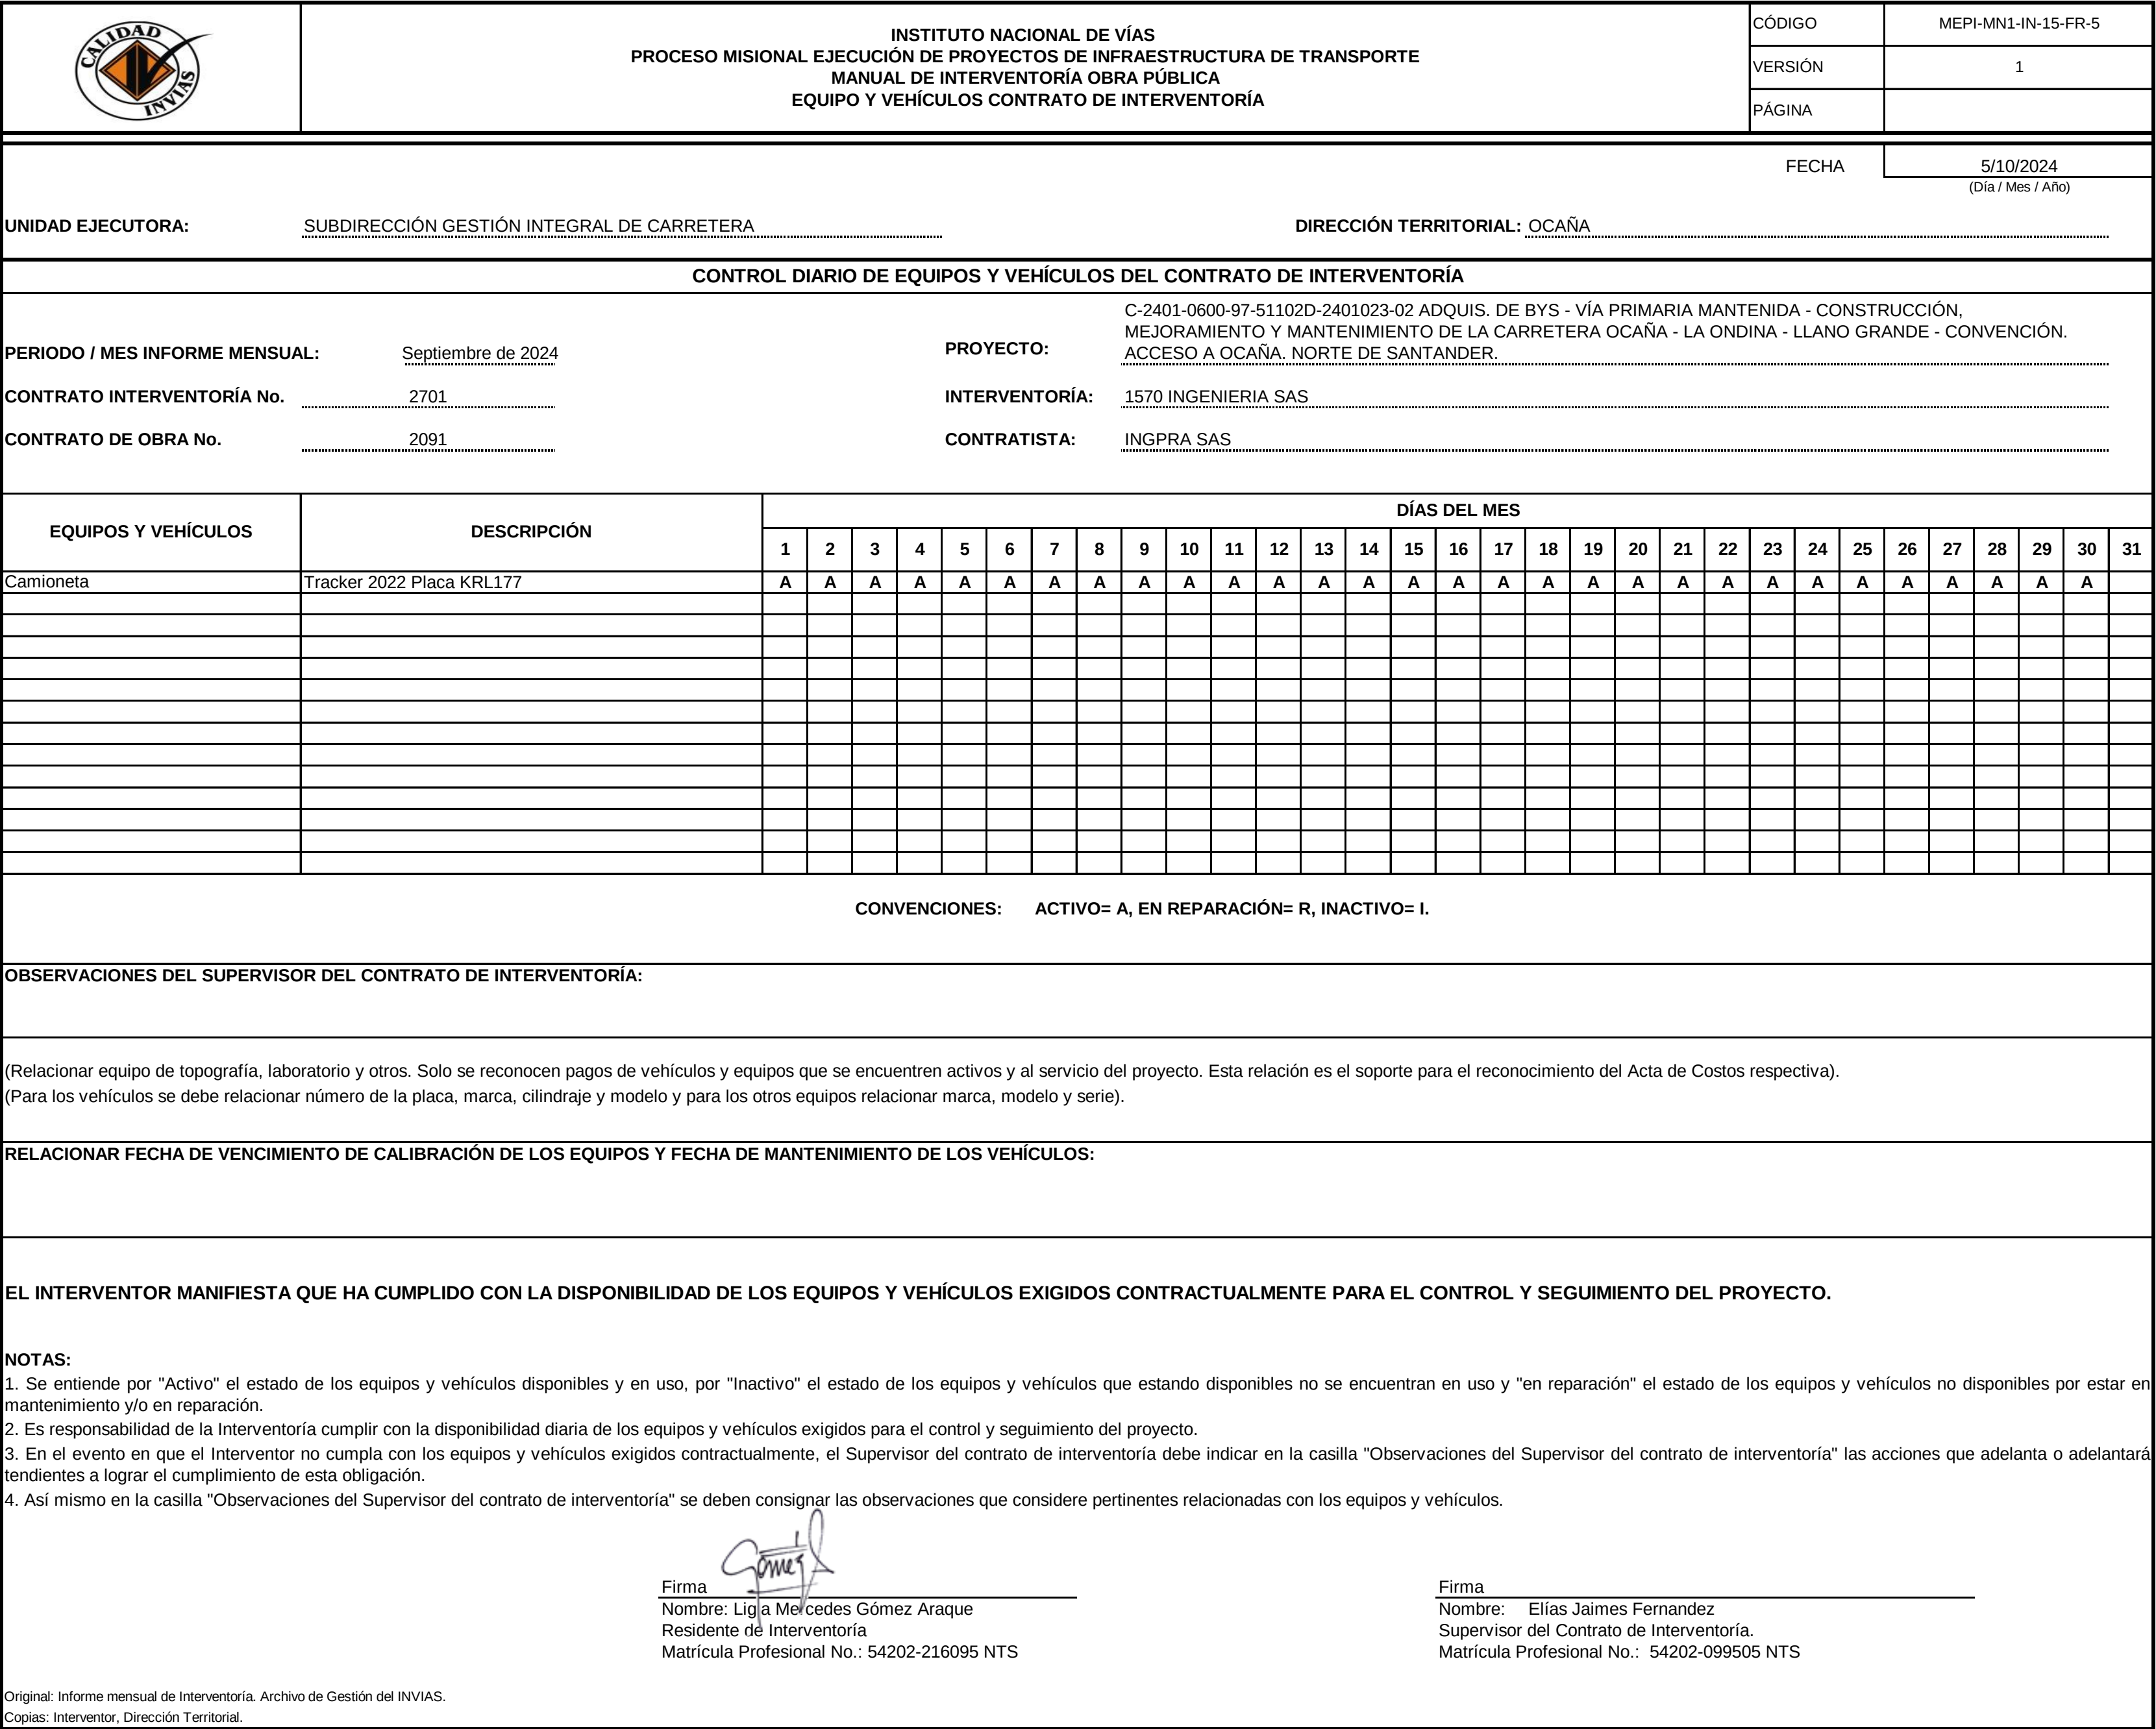

Anexo 10
Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-7



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA

FECHA	5/10/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Elías Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA

5102024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	Ocaña
-------------------	--	------------------------	-------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2701 del 2024	INTERVENTOR:	1570 INGENIERIA SAS
MES INFORME MENSUAL:	Septiembre de 2024	PROYECTO:	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO No:	2091 de 2024	CONTRATISTA:	INGPRA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	692324	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato principal	\$ 51.730.615,00	\$ 51.730.615,00
							\$ -
TOTAL						\$ 51.730.615,00	\$ 51.730.615,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 51.730.615,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								692324 de 29/7/2024	\$ -	\$ 51.730.615,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	01 al 31 de agosto del 2024	\$ 12.542.000,00	\$ 2.382.980,00	\$ 14.924.980,00				692324 de 29/7/2024	\$ 14.924.980,00	\$ 36.805.635,00		RADICADA
2	01 al 30 de septiembre del 2024	\$ 21.929.105,00	\$ 4.166.529,95	\$ 26.095.634,95				692324 de 29/7/2024	\$ 41.020.614,95	\$ 10.710.000,05		PRESENTE TRÁMITE
TOTALES		\$ 34.471.105,00	\$ 6.549.509,95	\$ 41.020.614,95					\$ 41.020.614,95	\$ 10.710.000,05		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	\$ 28.991.105,00	\$ 5.508.310,00	\$ 34.499.415,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 5.480.000,00	\$ 1.041.200,00	\$ 6.521.200,00
* VALOR TOTAL	\$ 34.471.105,00	\$ 6.549.510,00	\$ 41.020.615,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Ligia Mercedes Gómez Araque
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-216095 NTS

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13								
			VERSIÓN	1								
			PÁGINA									
			FECHA	5/10/2024 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			2701 de 2024			INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS						
OBJETO DEL CONTRATO:												
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER.												
FECHA DE INICIO:							1/08/2024					
PLAZO INICIAL:							Tres (03) meses					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:							31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)					
VALOR INICIAL:							\$ 51.730.615,00					
VALOR ACUMULADO:							\$ 51.730.615,00 (Incluye adiciones)					
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							Elías Jaimes Fernandez					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Cumplimiento			10%		\$ 5.173.061,50		26 7 2024			26 4 2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%		\$ 10.346.123,00		27 7 2024			26 10 2027		
Calidad del servicio			30%		\$ 15.519.184,50		26 10 2024			26 10 2029		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.							56-44-101008215					
Certificado de modificación o anexo No.:							4					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)												
Razón Social Compañía Aseguradora:							SEGUROS DEL ESTADO SA					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.												
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Cumplimiento												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones												
Calidad del servicio												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: Ligia Mercedes Gómez Araque

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-216095 NTS

Firma

Nombre: Elías Jaimes Fernandez

Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

**Relación de la correspondencia generada entre contratista e
interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RELACION DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	5/10/2024
I. INFORMACIÓN GENERAL			
OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-006-2024	3/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024
OF-007-2024	3/09/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO 2024S-VOCA-056352 DE FECHA 2024-08-15
OF-008-2024	10/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	REITERACIÓN AL OFICIO OF-004-2024 DE FECHA 16-08-2024 (SEÑALIZACIÓN DE OBRA)
OF-009-2024	10/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024
OF. 2091-2024-004	10/09/2024	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	Respuesta a la solicitud presentada por la interventoría mediante oficio OF-008- 2024, en el marco del contrato 2091-2094
OF-010-2024	26/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>			

ANEXO 14

Registro Fotográfico



Instalación de base en concreto ciclópeo



Remoción de derrumbes



Instalación de muro en gaviones



Instalación de muro en gaviones



Instalación de muro en gaviones



Instalación de muro en gaviones



Señalización de Obra



Señalización de Obra


ANEXO 15

Bitácora Del Mes Correspondiente

Cumplan todos los parámetros técnicos. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al plan de Manejo de Tránsito (PMT).


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G.



Residente de interventoría.

Ligia Mercedes Gómez A.



Lunes 02 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Seco - Tarde: lluvioso

Personal de interventoría: Ingeniera residente e inspectora

Personal de obra: Director, ingeniero residente, inspector, maestro y obreros.


Equipo en obra: Mezcladora, Vibrador eléctrico de concreto tipo aguja, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se continua con la elaboración del concreto en obra, siguiendo las especificaciones del diseño de mezclas y a su vez se realiza la conformación de la base con ayuda de una plancha vibratoria para asegurar una compactación óptima del terreno, preparando así la base donde se instalará el concreto ciclópeo. Posteriormente, se procede con la colocación del concreto en las áreas correspondientes a la sección 2, asegurando que se cumplan todos los parámetros técnicos. Se realiza remoción de derrumbes. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Nota: Debido a las fuertes lluvias se suspenden actividades en horas de la tarde


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.



Martes 03 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana-Tarde: Seco

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Director, ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo en Obra: Mezcladora, Vibrador eléctrico de concreto tipo aguja, plancha vibratona tipo rana y herramienta menor


Se continúa con la instalación del concreto ciclopeo en las áreas correspondientes a la sección 2 y a su vez, se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones.

Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Nota: Se impide el paso de material granular debido a paro nacional, lo cual dificulta el avance de Obra.


Residente de Obra

Hames Alfonso Quintero G



Residente de interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Miércoles 04 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana-Tarde: Seco

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Director, ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo de Obra: Plancha vibratona tipo rana y herramienta menor

Se continúa con la instalación del concreto ciclopeo en las áreas correspondientes a la sección 2 y a su vez, se realizan actividades relacionados con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al


Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Nota: Se impide el paso de material granular debido a paro nacional, lo cual

dificulta el avance de obra.


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G.



Residente de interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Jueves 05 de Septiembre de 2024

Hora de Inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Seco - Tarde: Lluvioso

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora

Personal de obra: Director, ingeniero residente, inspector maestro y obreros

Equipo de Obra: Plancha Vibratoria tipo rana y herramienta menor


Se continúa con la instalación del concreto ciclópeo en las áreas correspondientes a la sección 2 y a su vez, se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones.

Se da los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Nota: Se impide el paso de material granular debido a paro nacional, lo cual dificulta el avance de obra.


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G.



Residente de interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Viernes 06 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Seco - Tarde: Lluvioso

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora

Personal de obra: Director, ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo de Obra: Volqueta, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor


Se continúa con la instalación del concreto ciclópeo en las áreas corres-

líder=

pendientes a la Sección 2 y a su vez, se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones. Se da inicio al montaje y construcción de muro en gaviones. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al plan de Manejo de Tránsito (PMT) —. —. —. —. —. —. —.


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Sábado 07 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am —. —. —. —. —. —. —.

Hora fin: 12:00 pm —. —. —. —. —. —. —.

Estado del clima: Mañana-Tarde: Seco —. —. —. —. —. —. —.

Personal de interventoría: Ingeniero residente e inspectora —. —. —. —. —. —. —.

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros —. —. —. —. —. —. —.

Equipo en Obra: Plancha Vibratoria tipo rana y herramienta menor. —. —. —. —. —. —. —.

Se finaliza la instalación de base en concreto ciclópeo. Se continúa con la instalación de formaleta y se da inicio al montaje y construcción de muro en gaviones. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT)


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.



Lunes 09 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am —. —. —. —. —. —. —.

Hora fin: 5:00 pm —. —. —. —. —. —. —.

Estado del clima: Mañana-Tarde: Seco —. —. —. —. —. —. —.

Personal de interventoría: Ingeniero residente e inspectora —. —. —. —. —. —. —.


Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestros y obreros —. —. —. —. —. —. —.

Equipo en Obra: Volqueta, Plancha Vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT)


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Mañes 10 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00am

Hora fin: 5:00pm

Estado del clima: Mañana-Tarde: Seco

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora


Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo en Obra: Volqueta, Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT)


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Miércoles 11 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00am

Hora fin: 5:00 pm

líder

Estado del Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso ————

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora ————

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y Obreros ————


Equipo en Obra: Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor. ————

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito ————

Nota: Debido a las fuertes lluvias se impide el desarrollo normal en el rendimiento de las actividades ————


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Jueves 12 de Septiembre de 2024.

Hora inicio: 7:00am ————

Hora fin: 5:00 pm ————

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco ————

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora ————


Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros ————

Equipo en Obra: Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor. ————

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ————


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Viernes 13 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros.

Equipo en Obra: Volqueta, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el

montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y


se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria

dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Nota: Debido a las fuertes lluvias se impide el desarrollo normal en el rendimiento de las actividades.


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Sábado 14 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo en Obra: Plancha Vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el

montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de

demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de

Manejo de Tránsito (PMT)


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de interventoria

Ligia Mercedes Gómez A.



Lunes 16 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso

Personal de interventoría: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Director, ingeniero residente, inspector, maestro y obreros


Equipo en Obra: Volqueta, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Nota: Debido a las fuertes lluvias se impide el desarrollo normal en el rendimiento de las actividades


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.



Martes 17 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo en Obra: Volqueta, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de

Residente de Obra

ms/2/-

Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.

Portugal

hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5.00 pm

Estado del Clima: Mañana - Tarde: Seco ——— • ——— • ———

Personal de Interventoria: Ingeniera residente e inspectoros — . —

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros —

Equipo en Obra: Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta

Para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se

realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los ele-

mentos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento

al plan de Manejo de Tránsito (PMT) — • — • —

Residente de Obra

~~Hermes Alfonso Quintero G~~

~~W.S. 19~~

Residente de Interventoria

Ligia Herodes Gómez A

Fontez

Jueves 19 de Septiembre de 2024

hora de início: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: lluvioso — ° —

Personal de interventoria: Ingeniera residente e inspectora — • —

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros = —

Equipo en Obra: Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor. —

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta

para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se

líder=

realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMTT) — • — • — • — • —


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G

 -

Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.



Viernes 20 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am — • — • — • — • —

Hora fin: 5:00 pm — • — • — • — • —

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco — • — • — • — • —

Personal de interventoría: Ingeniera residente e inspectora — • — • — • — • —


Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros — • — • — • — • —

Equipos en Obra: Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor. — • — • — • — • —

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMTT) — • — • — • — • —


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G

 -

Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Sábado 21 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am — • — • — • — • —

Hora fin: 12:00 pm — • — • — • — • —

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco — • — • — • — • —

Personal de interventoría: Ingeniera residente e inspectora — • — • — • — • —

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros — • — • — • — • —

Equipos en obra: Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor. — • — • — • — • —

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta

Para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al plan de Manejo de Tránsito (PMT) — • — • — • —


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.



Lunes 23 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am — • — • — • —

Hora fin: 5:00 pm — • — • — • —

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso — • — • — • —

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora — • — • — • —

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y Obreros — • — • — • —

Equipo en Obra: Volqueta, Plancha Vibratoria tipo rara y herramienta menor

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) — • — • — • —

Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A.



Martes 24 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am — • — • — • —

Hora fin: 5:00 pm — • — • — • —

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso — • — • — • —

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora. — • — • — • —

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y Obreros — • — • — • —

Equipo en Obra: Plancha vibratoria tipo rara y herramienta menor. — • — • — • —


líder: 

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMTT).

Residente de Obra
Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría
Ligia Mercedes Gómez A.



Miércoles 25 de Septiembre de 2024.

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso.


Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora.

Personal de Obra: Volqueta, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMTT).


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Jueves 26 de Septiembre de 2024.

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvioso

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora.

Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros.

Equipo en Obra: Volqueta, plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y la construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMTT)


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Viernes 27 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora


Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo en Obra: Plancha Vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMTT).

Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Sábado 28 de Septiembre de 2024.

Hora de inicio: 7:00am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del clima: Mañana - Tarde: Seco.

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora


Personal de Obra: Ingeniero residente, inspector, maestro y obreros.

líder=

Equipo en Obra: Plancha Vibratoria tipo rana y herramienta menor.
Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT).


Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A



Lunes 30 de Septiembre de 2024

Hora de inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Estado del Clima: Mañana - Tarde: Seco

Personal de Interventoría: Ingeniera residente e inspectora

Personal de Obra: Director, ingeniero residente, inspector, maestro y obreros

Equipo en Obra: Volqueta, Plancha vibratoria tipo rana y herramienta menor.

Se realizan actividades relacionadas con la instalación de formaleta para la construcción de muro en gaviones al mismo tiempo que se realiza el montaje y construcción del mismo. Se reciben viajes de material y se disponen los elementos de demarcación y señalización necesaria dando cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Residente de Obra

Hermes Alfonso Quintero G



Residente de Interventoría

Ligia Mercedes Gómez A

