


GELVER RUBIANO GÓMEZ

**INFORME SEGUNDO PAGO RECURSOS PROPIOS
(PLAZOLETA)
CONTRATO DE OBRA N° 068 DEL 2022 CUYO OBJETO
ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA CATEDRAL
DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM**

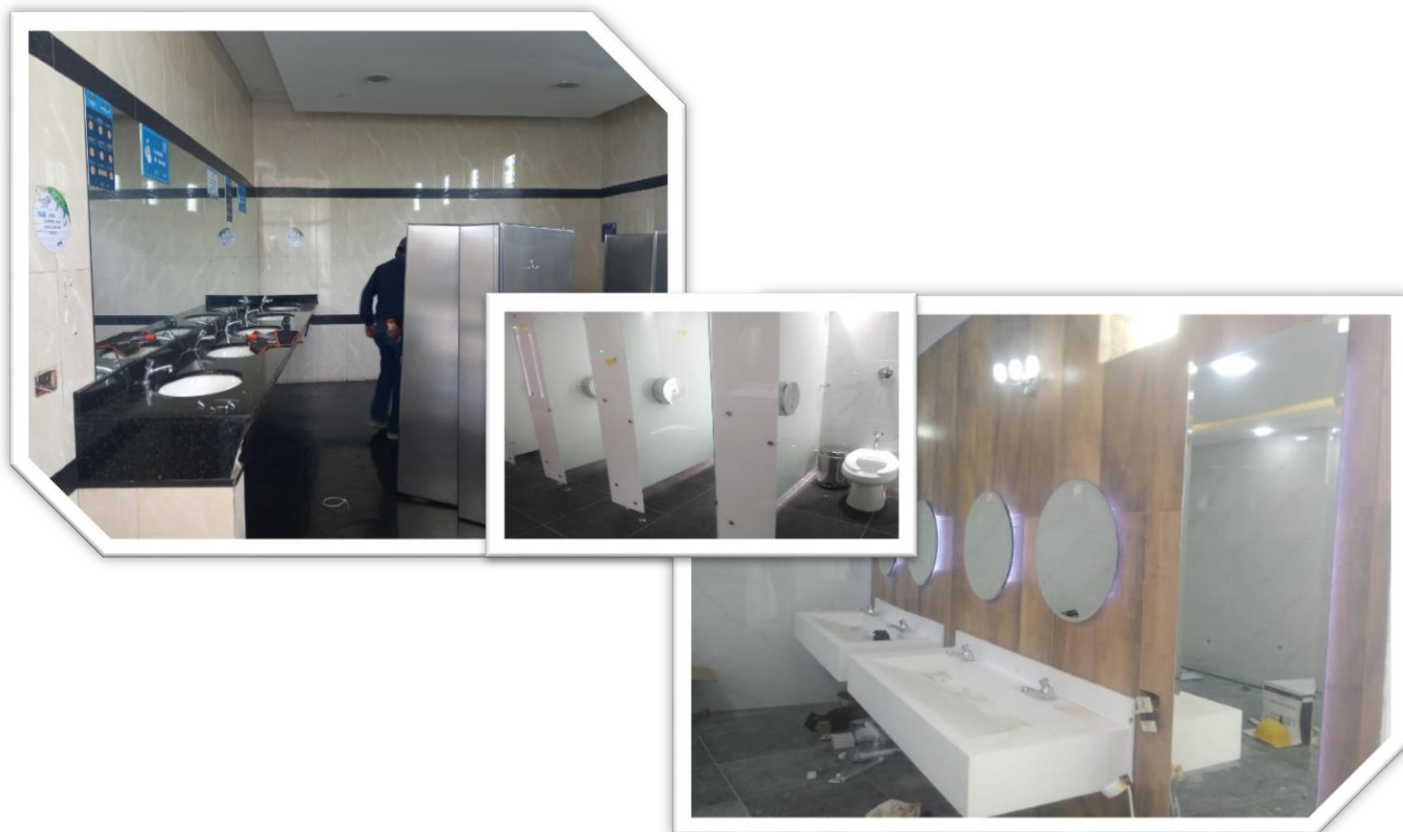

**CONTRATANTE: CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.
CONTRATISTA: GELVER RUBIANO GOMEZ
SUPERVISOR: ING. MARCOS NIÑO**

**MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA
DICIEMBRE DE 2022**

GELVER RUBIANO GÓMEZ

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.
2. Antecedentes del proyecto y localización.
3. Información básica del contrato.
4. Actividades desarrolladas en el transcurso del contrato.
5. Condiciones climáticas.
6. Equipo, personal y materiales.
 - 6.1. Equipo
 - 6.2. Personal
 - 6.3. Materiales
7. Aspectos administrativos
8. Estado actual de las obras
9. Condiciones técnicas, administrativas y financieras
10. Parafiscales
11. Comentarios y conclusiones
12. Anexos
 - Parafiscales a cargo del contratista
 - Registro fotografico
 - Polizas
 - Otros documentos

GELVER RUBIANO GÓMEZ


1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al segundo pago recursos propios referente a la entrega luego del avance de obra y terminación de actividades constructivas de los baños PLAZOLETA pertenecientes al contrato de obra N° 068 de 2022 cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los baños de la catedral de sal de Zipaquirá s.a. sem, actividades comprendidas entre el 01 de noviembre del 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, el presente informe comprende la descripción de las actividades constructivas derivadas del contrato anteriormente nombrado, indica aspectos técnicos, administrativos, financieros, etc.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

La Catedral de la Sal Primera maravilla de Colombia ubicada en el Municipio de Zipaquirá Cundinamarca la cual capta la atención a nacionales y extranjeros por las magníficas obras en su interior, nada mejor se puede comparar con tener la oportunidad de apreciarla en vivo. Por lo cual es importante mantener este recinto en las mejores condiciones para dar bienvenida a todos y cada uno de los visitantes, realizando proyectos de mantenimiento y rehabilitación de cada una de las instalaciones que la compone dando mejor impresión y conformidad a sus allegados.

LOCALIZACIÓN GENERAL:

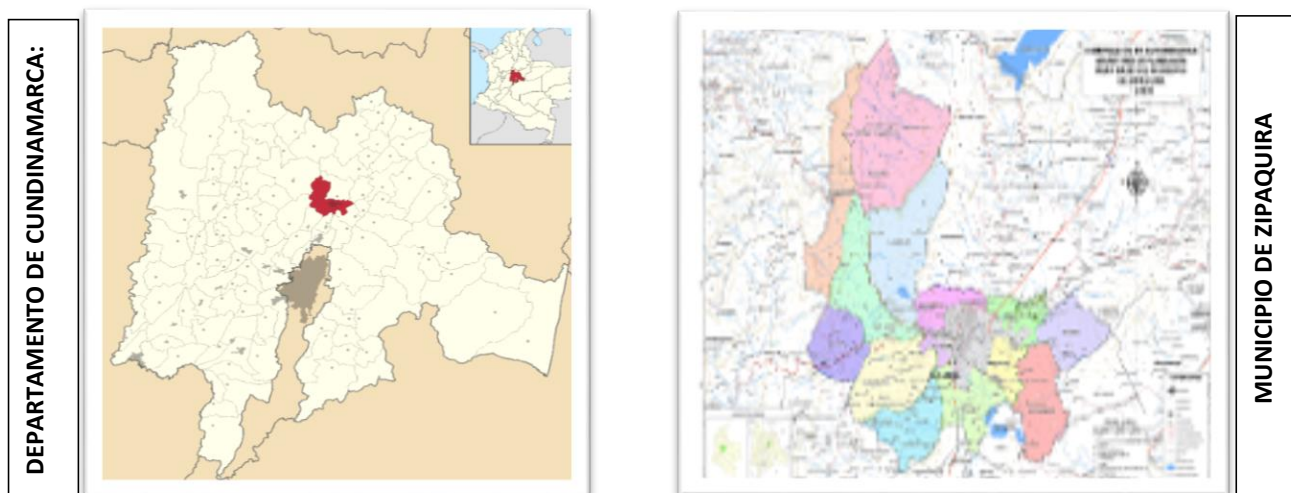

GELVER RUBIANO GÓMEZ

UBICACIÓN ESPECIFICA:

-CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA



Catedral de Sal - Municipio de Zipaquirá – Imagen tomada de google earth

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO	068/2022
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA CATEDRA DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM
CONTRATISTA	GELVER RUBIANO GOMEZ
CONTRATANTE	CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (\$ 979.197.990,00)
FECHA DE SUSCRIPCION	ZIPAQUIRA, OCTUBRE 28 DE 2022

GELVER RUBIANO GÓMEZ

ADICIONES Y/O PRORROGAS	
ADICIÓN EN TIEMPO	SI ☒ NO ☐
TIEMPO DE ADICION	60 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1	28 FEBRERO DE 2022
ADICIONES EN VALOR	
ADICIÓN EN VALOR	SI ☒ NO ☐
VALOR DE ADICION	\$397.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.376.197.990,00

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRANCURSO DEL CONTRATO:

Durante en desarrollo del contrato se realizaron las siguientes actividades en Baño Plazoleta:

BAÑOS PLAZOLETA		
Item	Actividad	Unidad
1	Desmonte de Sanitarios y Lavamanos	UND
2	Desmonte de Divisiones de Baño Existentes	GL
3	Desmonte de Espejos Existentes	GL
4	Demolicion de Enchapes en Piso	M2
5	Demolicion de Enchapes en Muros	M2
6	Suministro en Instalacion de techos en Drywall Antihongo verde	M2
7	Puntos Hidraulicos Nuevos	UND
8	Puntos Sanitarios Nuevos - Orinales	UND
9	Puntos Electricos Iluminacion Nuevos	UND
10	Superficies en Corian 2 puestos 1.60m (Mesones lavamanos)	UND
12	Suministro de combo Sanitarios con Fluxometro	UND

GELVER RUBIANO GÓMEZ

13	Suministro de Orinales Sin Agua Con Cartucho	UND
14	Suministro e Instalacion de Luminaria sencilla	UND
15	Suministro e Instalacion de Luminaria tipo regleta x 2 bombillos	UND
16	Suministro e Instalacion Divisiones de baño en Vidrio laminado 5+5 Blanco Hielo	M2
17	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera - Pared Mate	M2
18	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Pizarra - Piso	M2
19	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Marmolizado – Pared	M2
20	Cargue y Retiro de Escombros (Volqueta)	GL
21	Aseo	GL
ITEM NO PREVISTO		
22	Griferia push para Lavamanos	UN
23	revisión y limpieza de puntos salitarios	GL
24	Desmonte de cubierta existente	M2
25	suministro e instalacion de cubierta tipo termoacustica	M2
26	Desmonte de Drywall Existente	M2
27	desmonte de puertas y ventanas en fachada	GL
28	Suministro e instalacion de puertas en vidrio Laminado y Templado 5+5mm (incluyen herrajes en acero y elementos para su instalacion)	M2
29	Suministro e instalacion de Chapa a piso para puertas de acceso a baños	UN
30	suministro e instalacion de ventanas en vidrio laminado 5+5 (incluyen herrajes en acero y elementos para su instalacion)	M2
31	limpieza ,mantenimiento y pintura de estructura de pergola	GL
33	Suministro e instalacion de secadores de manos	UN
34	Dispensadores de toallas o papel en acero inoxidable	UN

GELVER RUBIANO GÓMEZ

35	Cambiadores de bebe	UN
36	Papeleras en acero inoxidable	UN
37	Dispensadores de jabon en acero inoxidable a pared	UN
38	suministro de espejos circulares 54 cm de diametro + led	UN
39	suministro de espejos Rectangulares 180* 50 cm +led	UN
40	suministro e instalacion de cinta de 24w & drivers	UN
41	suministro e instalacion de barras de seguridad para discapacitados	UN
43	Pañete liso muros 1:5, E=1,5cm	M2
44	Alistado pisos 1:3, E=0,04m	M2
45	cerca en tela verde H=2,10m	ML
46	Flanche en lamina Galvanizada CAL. 22; DS=30	ML
47	Suministro e instalacion de Herrajes y accesorios para divicion de baño	M2
49	Desmonte, suministro y reinstalacion de persianas en aluminio	UND
50	suministro e instalacion de panel led redondo de incrustar -sin borde de 20cm de diametro	UND
51	suministro e instalacion de panel led redondo de incrustar -sin borde de 10cm de diametro	UND
52	pintura antibacterial para Techo Drywall	M2
53	pintura Exterior tipo Koraza en Gris Basalto	M2

5. CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Se presentaron algunas lluvias, las cuales afectaron la red de suministro de agua a la catedral lo que retraso la ejecución de algunas actividades no afectando gravemente el desarrollo de procesos constructivos.

GELVER RUBIANO GÓMEZ

6. EQUIPO, PERSONAL Y MATERIALES

6.1. EQUIPO:

El equipo utilizado para la ejecución de las obras ha sido el siguiente:

- ✓ Herramienta menor
- ✓ Volqueta 6m3
- ✓ Pulidora eléctrica
- ✓ taladro eléctrico
- ✓ Rotomartillo
- ✓ Carretillas
- ✓ Motobomba
- ✓ Cortadora de tableta

6.2. PERSONAL:

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista utilizó el siguiente personal:

- ✓ 2 Ingenieros
- ✓ 1 Residente de obra
- ✓ 2 Maestros general
- ✓ 7 Ayudantes de construcción
- ✓ 1 Profesional de Seguridad y salud en el trabajo
- ✓ 4 Instaladores de vidrios de seguridad

Funciones: Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, administración de materiales, realización de los diferentes procesos constructivos.

6.3. MATERIALES E INSUMOS:

- ✓ Hilos
- ✓ Cinta peligro
- ✓ Alambre Dulce
- ✓ Cemento gris

GELVER RUBIANO GÓMEZ

- ✓ Arena de río
- ✓ Arena de peña & semilavada
- ✓ Agua
- ✓ Puntilla
- ✓ Poli sombra
- ✓ Durmientes
- ✓ Tubería PVC y accesorios
- ✓ Manguera
- ✓ Limpiador de tubería
- ✓ Pegante de tubería
- ✓ Tubería conduit
- ✓ Enchape tipo madera, mármol y pizarra, para pisos y paredes
- ✓ Pegante de cerámica
- ✓ Niveladores y dilatadores
- ✓ Boquilla
- ✓ Pintura Koraza
- ✓ Laminas techo Drywall
- ✓ Estructura y perfilera para cielo raso
- ✓ Vidrio templado laminado
- ✓ Herrajes y accesorios en acero inoxidable

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PÓLIZAS:

ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA			ANEXO: 0	
GARANTÍA	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento Entidad Estatal	980-47-994000022890	\$ 195.839.598,00	28.10.2022	30.06.2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	980-47-994000022890	\$ 97.919.799,00	28.10.2022	31.12.2025

GELVER RUBIANO GÓMEZ

Estabilidad y calidad de la obra	980-47-994000022890	\$ 170.584.340.70	Si ampara 5 año, 0 meses y o días	
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento / predios laborales y operaciones	980-47-994000022891	\$ 200.000.000.00	28.10.2022	31.12.2022

ESTADO JURÍDICO:

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSENSIONES		X	
PRORROGA		X	
MODIFICACIONES	X		Inclusión de ítems no previsto
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	
ADICIONAL EN DINERO	X		\$ 61.200.000,00

8. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

La obra baños PLAZOLETA se encuentra ejecutada en un 100 % donde se realizaron todas y cada una de las actividades presupuestadas para la remodelación de la infraestructura de los baños plazoleta, de acuerdo a lo establecido dentro del contrato.

9. CONDICIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS

TÉCNICAS:

Las obras se desarrollan según las instrucciones e indicaciones dadas por el contratante, supervisor y contratista. Realizando el debido seguimiento técnico durante las actividades del presente contrato.

GELVER RUBIANO GÓMEZ

El suministro de materiales, insumos y herramientas, al igual que el retiro de escombros se dio de manera oportuna brindando un buen desarrollo de la obra.

FINANCIERA:

VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (\$ 979.197.990,00)
RUBRO RECURSOS PROPIOS	\$196.524.809,00
VALOR COBRADO-PAGO NUMERO 1 RECURSOS PROPIOS (PLAZOLETA)	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (\$ 78.609.924,00)
PORCENTAGE COBRADO	30,5%
VALOR ADICIONAL EN DINERO	SESENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS MIL MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (\$61.200.000,00)
VALOR TOTAL RUBRO RECURSOS PROPIOS (PLAZOLETA)	\$257.724.809,00
VALOR COBRADO-PAGO NUMERO 2 RECURSOS PROPIOS (PLAZOLETA)	CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (\$179.114.885,00)
PORCENTAGE COBRADO	69,5%
VALOR POR COBRAR	\$0,00
PORCENTAGE POR COBRAR	0,0 %

10. PARAFISCALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Ver anexo No 2

GELVER RUBIANO GÓMEZ

11. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- ✓ Se realizó entrega de Implementos de seguridad junto con capacitaciones profesionales para proteger a cada uno de los trabajadores del riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud.



- ✓ Se llevó a cabo todas y cada una de las actividades propuestas para la remodelación de los baños plazoleta, con el debido seguimiento técnico para cumplir con las especificaciones presentes en el contrato.



GELVER RUBIANO GÓMEZ

- ✓ Se realizaron los debidos cargues y retiros de los escombros provenientes de las demoliciones y demás actividades, al igual que la limpieza y aseo correspondiente para la entrega de los baños plazoleta.



- ✓ Se realizó la entrega a funcionarios de Catedral de Sal de los accesorios, divisiones, sanitarios, orinales, lavamanos y demás implementos desmontados de baño PLAZOLETA.




GELVER RUBIANO GÓMEZ

- ✓ se realizó alquiler de bodega por parte del contratista para almacenar materiales, enchapes, pegantes, combos sanitarios y demás, con el fin de lograr cumplir con el horario de ingreso a las instalaciones de la catedral y permitiendo un mejor avance en la ejecución de la obra evitando atrasos en suministro de los mismos.



12.RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO, USO Y CUIDADO

- SUPERFICIES CORIAN (LAVAMANOS)

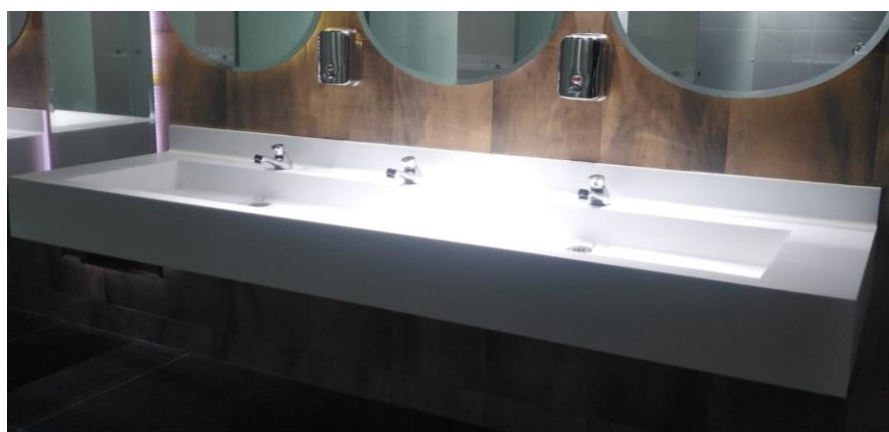

Para realizar la limpieza Utilice un trapo húmedo y una crema detergente abrasiva o un desengrasante general. Siempre frote en movimientos circulares. Para tratar manchas más tenaces o rayones difíciles de solucionar se debe

GELVER RUBIANO GÓMEZ

realizar un pulido general de la superficie la cual la realiza directamente el proveedor

La superficie Corian® es "renovable" por naturaleza porque es sólido y homogéneo en todo su espesor. La mayoría de los daños, incluso los causados por un golpe, el calor y productos químicos, se pueden reparar en el sitio de instalación.

- GRIFERIA PUSH



Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.

Por consecuencia del ambiente salino al cual están expuesta la grifería se es recomendable el debido mantenimiento y limpieza, aplicando Limpiador con fórmula efectiva que limpia y brilla grifería, elimina y remueve el sarro, restos de jabón, además de otras manchas similares, proporcionando una limpieza rápida y práctica aumentando el brillo y protección de la grifería.


GELVER RUBIANO GÓMEZ

- ORINALES SIN AGUA CON CARTUCHO- SISTEMA EN SECO



El orinal instalado utiliza la Tecnología Drena y Sella TDS2□ con 2 esferas que no permiten el paso de los malos olores, no utiliza gel ni suministro de agua.

Se recomienda Realizar el lavado diariamente usando un poco de agua, desinfectante cloro o producto preferiblemente biodegradable



GELVER RUBIANO GÓMEZ

C.C. No. 11.342.620 de Zipaquirá

GELVER RUBIANO GÓMEZ

REGISTRO FOTOGRAFÍCO

GELVER RUBIANO GÓMEZ

	ACTIVIDADES EJECUTADAS BANOS PLAZOLETA
1	<p>Desmante de Sanitarios ,Lavamanos, divisiones de baño, orinales y accesorios</p> 
2	<p>Demolición de Enchapes en Piso y Paredes, demolición de muros</p> 


GELVER RUBIANO GÓMEZ

3	Desmonte y demolición de techos Drywall
	
4	Retiro de escombros correspondiente a demoliciones.
	
5	Puntos Hidraulicos y sanitarios Nuevos
	

GELVER RUBIANO GÓMEZ

6	Pañete liso muros 1:5, E=1,5cm Y Alistado pisos 1:3, E=0,04m
	
8	Puntos Electricos Iluminacion Nuevos
	
9	Desmante de cubierta existente e instalacion de cubierta nueva tipo termoacustica
	

GELVER RUBIANO GÓMEZ

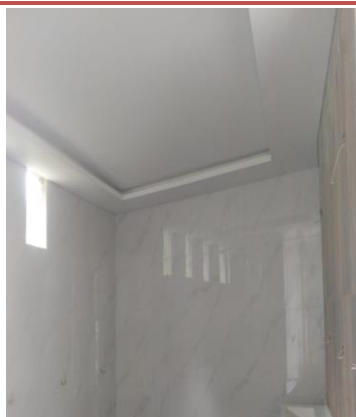10	Flanche en lamina Galvanizada CAL. 22; DS=30
	  
11	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera – Pizarra- Marmolizado
	  
14	Suministro e Instalacion de techos en Drywall Antihongo verde con pintura antibacterial
	  

GELVER RUBIANO GÓMEZ

15	Superficies en Corian 2 puestos 1.60m (Mesones lavamanos), e instalación de grifería push
	
16	Suministro de combo Sanitarios con Fluxometro
	
17	suministro de espejos circulares 54 cm de diametro y Rectangulares 180*50 cm +led
	


GELVER RUBIANO GÓMEZ

19	Suministro de Orinales Sin Agua Con Cartucho
	
20	Suministro e Instalacion de Luminaria tipo regleta x 2 bombillos
	
21	suministro e instalacion de panel led redondo de incrustar -sin borde de 20 y 10 cm de diámetro, e instalación de cinta led 24w
	

GELVER RUBIANO GÓMEZ

22	Desmonte, suministro y reinstalacion de persianas en Aluminio
	
23	limpieza ,mantenimiento y pintura de estructura de pergola
	
24	suministro e instalacion de barras de seguridad para discapacitados
	

GELVER RUBIANO GÓMEZ

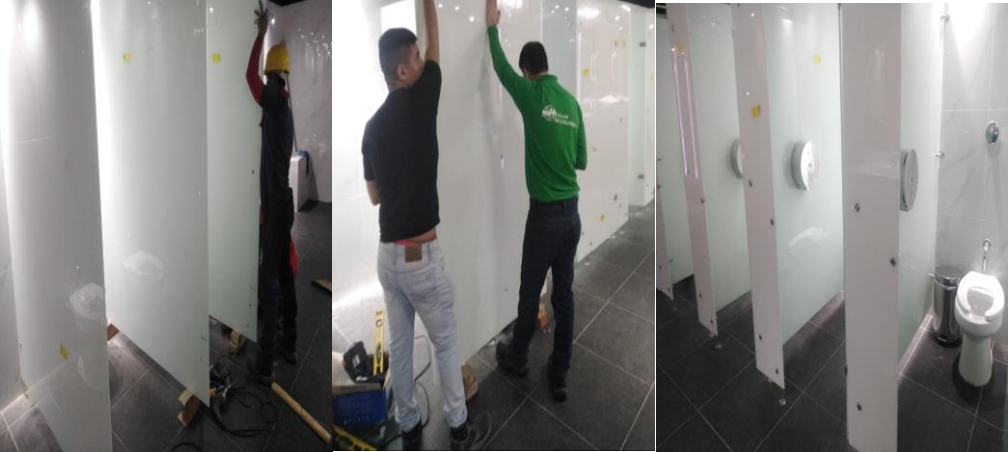25	Pintura Exterior tipo Koraza en Gris Basalto
	
26	Suministro e instalación de secadores de manos ,dispensadores de papel,cambiadores de bebe, dispensadores de jabon y papeleras.
	
27	Suministro e Instalación Divisiones de baño en Vidrio laminado 5+5 Blanco Hielo (incluyen herrajes en acero y elementos para su instalacion)
	

GELVER RUBIANO GÓMEZ

BALANCE DE OBRA

CONTRATTISTA:	<i>GELVER RUBIANO GOMEZ</i>	CATEDRAL DE SAL SA SEM	BALANCE DE OBRA- RECURSOS PROPIOS
---------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------

CONTRATO No. 068 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A SEM

CONDICIONES INICIALES						ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 1			
No.	ACTIVIDAD/ ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	CANTIDAD +/-	Vr. TOTAL +/-	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1. Obra para el Manetenimiento de Baños Plazoleta de Comidas							\$ 47.076.923,00		\$ 198.249.853,00
1	Desmorte de Sanitarios y Lavamanos	UND	15,00	\$ 26.000,00	\$ 390.000,00	0,00	\$ -	15,00	\$ 390.000,00
2	Desmorte de Divisiones de Baño Existentes	GL	1,00	\$ 710.000,00	\$ 710.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 710.000,00
3	Desmorte de Espejos Existentes	GL	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 220.000,00
4	Demolicion de Enchapes en Piso	M2	46,00	\$ 14.000,00	\$ 644.000,00	4,00	\$ 56.000,00	50,00	\$ 700.000,00
5	Demolicion de Enchapes en Muros	M2	160,80	\$ 14.000,00	\$ 2.251.200,00	-25,80	-\$ 361.200,00	135,00	\$ 1.890.000,00
6	Suministro en Instalacion de techos en Drywall Antihongo verde	M2	50,00	\$ 75.000,00	\$ 3.750.000,00	6,00	\$ 450.000,00	56,00	\$ 4.200.000,00
7	Puntos Hidraulicos Nuevos	UND	11,00	\$ 92.000,00	\$ 1.012.000,00	6,00	\$ 552.000,00	17,00	\$ 1.564.000,00
8	Puntos Sanitarios Nuevos - Orinales-lavamanos	UND	3,00	\$ 92.000,00	\$ 276.000,00	8,00	\$ 736.000,00	11,00	\$ 1.012.000,00
9	Puntos Electricos Iluminacion Nuevos	UND	24,00	\$ 130.000,00	\$ 3.120.000,00	8,00	\$ 1.040.000,00	32,00	\$ 4.160.000,00
10	Superficies en Corian 2 puestos 1.60m (Mesones lavamanos)	UND	4,00	\$ 3.200.000,00	\$ 12.800.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 12.800.000,00
11	Griferias para Lavamanos con Sensor	UND	8,00	\$ 1.633.320,00	\$ 13.066.560,00	-8,00	-\$ 13.066.560,00	0,00	\$ -
12	Suministro de combo Sanitarios con Fluxometro	UND	9,00	\$ 3.711.720,00	\$ 33.405.480,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 33.405.480,00
13	Suministro de Orinales Sin Agua Con Cartucho	UND	3,00	\$ 1.371.480,00	\$ 4.114.440,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 4.114.440,00
14	Suministro e Instalacion de Luminaria sencilla	UND	18,00	\$ 160.000,00	\$ 2.880.000,00	-18,00	-\$ 2.880.000,00	0,00	\$ -
15	Suministro e Instalacion de Luminaria tipo regleta x 2 bombillos	UND	4,00	\$ 630.000,00	\$ 2.520.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.520.000,00
16	Suministro e Instalacion Divisiones de baño en Vidrio laminado 5+5 Blanco Hielo	M2	37,35	\$ 855.000,00	\$ 31.934.250,00	-1,98	-\$ 1.692.900,00	35,37	\$ 30.241.350,00
17	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera - Pared Mate	M2	27,00	\$ 220.000,00	\$ 5.940.000,00	-2,00	-\$ 440.000,00	25,00	\$ 5.500.000,00
18	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Pizarra - Piso	M2	46,00	\$ 246.000,00	\$ 11.316.000,00	2,00	\$ 492.000,00	48,00	\$ 11.808.000,00
19	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Marmolizado - Pared	M2	133,80	\$ 135.000,00	\$ 18.063.000,00	-23,80	-\$ 3.213.000,00	110,00	\$ 14.850.000,00
20	Cargue y Retiro de Escombros (Volqueta)	GL	2,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.400.000,00	-1,00	-\$ 1.200.000,00	1,00	\$ 1.200.000,00
21	Aseo	GL	1,00	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	-1,00	-\$ 360.000,00	0,00	\$ -
ITEM NO PREVISTO									
22	Griferia push para Lavamanos	UN		\$ 340.000,00		8,00	\$ 2.720.000,00	8,00	\$ 2.720.000,00
23	revison y limpieza de puntos salitarios	GL		\$ 280.000,00		0,20	\$ 56.000,00	0,20	\$ 56.000,00
24	Desmorte de cubierta existente	M2		\$ 28.400,00		58,75	\$ 1.668.500,00	58,75	\$ 1.668.500,00
25	suministro e instalacion de cubierta tipo termoacustica	M2		\$ 116.938,00		58,75	\$ 6.870.107,50	58,75	\$ 6.870.107,50
26	Desmorte de Drywall Existente	M2		\$ 22.897,00		56,00	\$ 1.282.232,00	56,00	\$ 1.282.232,00
27	desmorte de puertas y ventanas en fachada	GL		\$ 180.000,00		1,00	\$ 180.000,00	1,00	\$ 180.000,00
28	Suministro e instalacion de puertas en vidrio Laminado y Templado 5+5mm (incluyen herrajes en acero y elementos para su instalacion)	M2		\$ 2.491.860,00		6,19	\$ 15.427.105,26	6,19	\$ 15.427.105,26
29	Suministro e instalacion de Chapa a piso para puertas de acceso a baños	UN		\$ 238.400,00		2,00	\$ 476.800,00	2,00	\$ 476.800,00
30	suministro e instalacion de ventanas en vidrio laminado 5+5 (incluyen herrajes en acero y elementos para su instalacion)	M2		\$ 855.000,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -
31	limpieza ,mantenimiento y pintura de extructura de pergola	GL		\$ 350.000,00		1,00	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00
32	suministro e instalacion de policarbonato para pergola	M2		\$ 113.400,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -
33	Suministro e instalacion de secadores de manos	UN		\$ 1.430.000,00		2,00	\$ 2.860.000,00	2,00	\$ 2.860.000,00
34	Dispensadores de toallas o papel en acero inoxidable	UN		\$ 211.165,00		11,00	\$ 2.322.815,00	11,00	\$ 2.322.815,00
35	Cambiadores de bebe	UN		\$ 2.159.880,00		2,00	\$ 4.319.760,00	2,00	\$ 4.319.760,00
36	Papeleras en acero inoxidable	UN		\$ 236.500,00		11,00	\$ 2.601.500,00	11,00	\$ 2.601.500,00
37	Dispensadores de jabon en acero inoxidable a pared	UN		\$ 370.250,00		4,00	\$ 1.481.000,00	4,00	\$ 1.481.000,00
38	suministro de espejos circulares 54 cm de diametro + led	UN		\$ 220.000,00		8,00	\$ 1.760.000,00	8,00	\$ 1.760.000,00
39	suministro de espejos Rectangulares 180* 50 cm +led	UN		\$ 732.000,00		2,00	\$ 1.464.000,00	2,00	\$ 1.464.000,00
40	suministro e instalacion de cinta de 24w & drivers	UN		\$ 35.000,00		28,00	\$ 980.000,00	28,00	\$ 980.000,00
41	suministro e instalacion de barras de seguridad para discapacitados	UN		\$ 389.000,00		4,00	\$ 1.556.000,00	4,00	\$ 1.556.000,00

42	Mantenimiento limpieza y remplazo de vidrios de perianas exiatentes	UN		\$ 65.000,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -
43	Pañete liso muros 1:5, E=1,5cm	M2		\$ 19.924,00		130,00	\$ 2.590.120,00	130,00	\$ 2.590.120,00
44	Alistado pisos 1:3, E=0,04m	M2		\$ 28.479,00		50,00	\$ 1.423.950,00	50,00	\$ 1.423.950,00
45	cerca en tela verde H=2,10m	ML		\$ 24.349,00		10,00	\$ 243.490,00	10,00	\$ 243.490,00
46	Flanche en lamina Galvanizada CAL. 22; DS=30	ML		\$ 31.000,00		34,00	\$ 1.054.000,00	34,00	\$ 1.054.000,00
47	Suministro e instalacion de Herrajes y accesorios para divicion de baño	M2		\$ 150.000,00		21,00	\$ 3.150.000,00	21,00	\$ 3.150.000,00
48	Suministro e instalacion de lampara individual espejo mira de muro	UND		\$ 220.000,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -
49	Desmonte, suministro y reinstalacion de persianas en uluminio	UND		\$ 230.000,00		8,00	\$ 1.840.000,00	8,00	\$ 1.840.000,00
50	suministro e instalacion de panel led redondo de incrustar -sin borde de 20cm de diametro	UND		\$ 62.000,00		10,00	\$ 620.000,00	10,00	\$ 620.000,00
51	suministro e instalacion de panel led redondo de incrustar -sin borde de 10cm de diametro	UND		\$ 41.000,00		6,00	\$ 246.000,00	6,00	\$ 246.000,00
52	pintura antibacterial para Techo Drywall	M2		\$ 15.000,00		56,00	\$ 840.000,00	56,00	\$ 840.000,00
53	pintura Exterior tipo Koraza en Gris Basalto	M2		\$ 25.000,00		92,57	\$ 2.314.346,38	92,57	\$ 2.314.346,38
54	Suministro e instalacion de puertas Discapacitados en acrilico blanco 9mm , incluye herrajes y accesorios	M2		\$ 1.122.857,00		3,80	\$ 4.266.856,86	3,80	\$ 4.266.856,86
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 151.172.930,00		\$ 47.076.923,00		\$ 198.249.853,00
					Administración	23%	\$ 34.769.773,90	23%	\$ 45.597.466,19
					Imprevistos	4%	\$ 6.046.917,20	4%	\$ 7.929.994,12
					Utilidad	3%	\$ 4.535.187,90	3%	\$ 5.947.495,59
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 45.351.879,50		\$ 14.123.077,00		\$ 59.474.956,00
TOTAL PROYECTO					\$ 196.524.809,50		\$ 61.200.000,00		\$ 257.724.809,00

 GELVER RUBIANO GOMEZ Contratista	MARCOS NIÑO Supervisor	YENNY PAEZ SABOGAL Gerente Catedral de sal SA SEM
--	---------------------------	--

GELVER RUBIANO GÓMEZ

PÓLIZAS DEL CONTRATO

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
9801908709

PÓLIZA No: 980 -74 - 994000009491 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT			COD. AGE: 980			RAMO: 74			PAP:								
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO				
28	10	2022	28	10	2022	23:59	31	12	2022	23:59	64	28	10	2022			
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION					

TIPO DE MOVIMIENTO	EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA			
			28	10	2022	23:59	31	12	2022	23:59	64			
			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS		

DATOS DEL TOMADOR											
NOMBRE: GELVER RUBIANO GOMEZ											
DIRECCIÓN: KR 9 8 88											
CIUDAD: ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA											
TELÉFONO: 6018523869											

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO											
ASEGURADO: CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM											
DIRECCIÓN: CALLE 1 CR 3 VIA CATEDRAL DE SAL											
CIUDAD: ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA											
TELÉFONO: 6018529890											
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS											
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8											

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS											
ASEGURADO: CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM											
NIT : 832006568											
ITEM: 1											
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA											
CIUDAD: ZIPAQUIRA											
DIRECCION: BAÑOS CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA											
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA											
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO											
TIPO DE RIESGO: ESTATAL											
MANZANA:											

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				
BENEFICIARIOS				
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS				
NIT 832006568 - CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM				

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución DEL CONTRATO DE OBRA NO. 068 DE 2022, DEE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022, RELACIONADO CON EL CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***200,000,000.00	\$ *****105,205	\$ *****0.00	\$ *****19,989	\$ *****125,195
INTERMEDIARIO				
COASEGURO CEDIDO				
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
GLORIA INES HERNANDEZ ALONSO	5502	100.00		
VALOR ASEGURADO				

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.	
FIRMA ASEGURADOR	FIRMA TOMADOR

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9801908576

PÓLIZA No: 980-47-994000022890 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: **980** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA **28** MES **10** AÑO **2022**
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA **28** MES **10** AÑO **2022**
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **GELVER RUBIANO GOMEZ**

IDENTIFICACIÓN: CC **11.342.620**

DIRECCIÓN: **KR 9 8 88**

CIUDAD: **ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA**

TELÉFONO: **6018523869**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM**

IDENTIFICACIÓN: NIT **832.006.568-7**

BENEFICIARIO: **CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM**

IDENTIFICACIÓN: NIT **832.006.568-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/10/2022	30/06/2023	195,839,598.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/10/2022	31/12/2025	97,919,799.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER	NOTA ACLARATORIA	195,839,598.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/10/2022	30/06/2023	195,839,598.00
CALIDAD DEL BIEN	28/10/2022	31/12/2024	195,839,598.00

BENEFICIARIOS
NIT 832006568 - CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 068 DEL 2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO COEL CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM.

NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***881,278,191.00	VALOR PRIMA: \$ *****4,356,868	GASTOS EXPEDICION: \$ *****9,000.00	IVA: \$ *****829,515	TOTAL A PAGAR: \$ *****5,195,383
---	--	---	--------------------------------	--

NOMBRE INTERMEDIARIO GLORIA INES HERNANDEZ ALONSO	CLAVE 5502	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO 	%PART 	VALOR ASEGURADO
---	----------------------	------------------------	---	------------------	----------------------------

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000980190857

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C7D02079060FF47B58

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

GELVER RUBIANO GÓMEZ

FACTURA DE COBRO

RUBIANO GOMEZ GELVER**NIT 11342620-4****Nombre Comercial:** RUBIANO GOMEZ GELVER**Régimen:** RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA**Actividad Económica CIIU Nro.** 4112**Dirección:** CR 3 2 48 BRR PASOANCHO**Teléfono:** 3114417749**Correo:** grubianog_999@hotmail.com**Ciudad:** ZIPAQUIRA**CUFE:**ebcb03e4b36c3f3c08563f7c480656617a9f7131197eb02f7aca9a91494233df71e8c0196146ca1c652dff1453834e75**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. GR8**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764039935516 de 2022-11-21 Vigencia 6 Meses

Rango Autorizado desde GR 1 hasta GR 1000

Tipo Documento: Factura de Venta Nacional**Tipo Operación:** Estándar**Fecha Facturación:** 2022-12-29 09:19:03**Fecha Vencimiento:** 2023-01-30**Fecha Dian:** 2022-12-29 09:19:23**Divisa:** COP**Orden Compra Asociada:** 068/2022**Cliente:** CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.S.E.M.**NIT 832006568-7****Nombre Comercial:** CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.S.E.M.**Dirección:** CALLE 1 CARRERA 6**Teléfono:** 6018519502**Correo:** facturacionypagos@catedraldesal.gov.co**Ciudad:** ZIPAQUIRA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Efectivo

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	Valor total
1	007	SEGUNDO PAGO BATERÍA BAÑOS PLAZOLETA DEL CONTRATO DE OBRA 068/2022	94	179,114,885.00	1.0	179,114,885.00	179,114,885.00

Total de líneas: 1

Observaciones:

SEGUNDO PAGO BATERÍA DE BAÑOS PLAZOLETA DEL CONTRATO DE OBRA 068/2022 CUYO OBJETO ES " EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	179,114,885.00
SUBTOTAL	179,114,885.00

TOTAL EN LETRAS CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	179,114,885.00
--------------------	----------------

GELVER RUBIANO GÓMEZ

PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11342620		RUBIANO GOMEZ GELVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 90 barrio la esmeralda	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-09	1693811712	9441167616	I	2022/10/06	2022/10/07	BANCO DAVIVIENDA	1	\$316,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$100	\$0	\$24,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$24,400	\$100	\$0	\$24,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,000	\$100	\$0	\$6,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$6,000	\$100	\$0	\$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$200	\$0	\$125,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$125,000	\$200	\$0	\$125,200
TOTAL				1	\$315,400	\$600	\$0	\$316,000

DATOS DE LA PÓLIZA

PAGINA: 2

IDENTIFICACION: **11.342.620**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA	832006568-7	BAÑOS CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQ	ZIPAQUIRA	200,000,000.00	105,205	125,195
					PRIMA TOTAL SIN IVA		PRIMA TOTAL CON IVA
					105,205		125,195

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11342620		RUBIANO GOMEZ GELVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 90 barrio la esmeralda	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-09	1693811712	9441167616	I	2022/10/06	2022/10/07	BANCO DAVIVIENDA	1	\$316,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$100	\$0	\$24,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$24,400	\$100	\$0	\$24,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,000	\$100	\$0	\$6,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$6,000	\$100	\$0	\$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$200	\$0	\$125,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$125,000	\$200	\$0	\$125,200
TOTAL				1	\$315,400	\$600	\$0	\$316,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11342620		RUBIANO GOMEZ GELVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 90 barrio la esmeralda	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1794096326	9443700307	I	2022/12/06	2022/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,437,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	CC	11342620	RUBIANO GOMEZ GELVER																	25-14	30	\$4,692,000	\$797,800	EPS017	30	\$4,692,000	\$586,500	CCF21	30	\$4,692,000	\$28,200	14-11	30	\$4,692,000	\$24,500	30	\$0	\$0	No	\$1,437,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total Afiliados(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11342620		RUBIANO GOMEZ GELVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 90 barrio la esmeralda	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1794096326	9443700307	I	2022/12/06	2022/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,437,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$797,800	\$0	\$0	\$797,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$797,800	\$0	\$0	\$797,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,500	\$0	\$0	\$24,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$24,500	\$0	\$0	\$24,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,200	\$0	\$0	\$28,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$28,200	\$0	\$0	\$28,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$586,500	\$0	\$0	\$586,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$586,500	\$0	\$0	\$586,500	
TOTAL				1	\$1,437,000	\$0	\$0	\$1,437,000	

GELVER RUBIANO GÓMEZ

PARAFISCALES DE TRABAJADORES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11342620		RUBIANO GOMEZ GELVER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GELVER RUBIANO GOMEZ	CR 3 2 48	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3114417749	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	1786060545	9443148022	E	2022/12/06	2022/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,909,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	11348811	AGUILAR MIGUEL	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	
2	CC	35423836	AGUILAR OLGA	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	
3	CC	1003922441	AREVALO DUVAN	230301	21	\$700,000	\$112,000	EPS037	21	\$700,000	\$28,000	CCF21	21	\$700,000	\$28,000	14-11	21	\$700,000	\$48,800	21	\$0	\$0	
4	CC	80550388	AREVALO FRANCISCO	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS010	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$2,400	1	\$0	\$0	
5	CC	19201384	GARCIA LUIS		0	\$0	\$0	EPS017	12	\$400,000	\$16,000	CCF21	12	\$400,000	\$16,000	14-11	12	\$400,000	\$27,900	12	\$0	\$0	
6	CC	208222	GARNICA ELIECER	230201	12	\$400,000	\$64,000	EPS008	12	\$400,000	\$16,000	CCF21	12	\$400,000	\$16,000	14-11	12	\$400,000	\$27,900	12	\$0	\$0	
7	CC	2986658	GARNICA HECTOR	230201	12	\$400,000	\$64,000	EPS041	12	\$400,000	\$16,000	CCF21	12	\$400,000	\$16,000	14-11	12	\$400,000	\$27,900	12	\$0	\$0	
8	CC	1070307296	MONTAÑO JUAN	230201	12	\$400,000	\$64,000	EPS017	12	\$400,000	\$16,000	CCF21	12	\$400,000	\$16,000	14-11	12	\$400,000	\$27,900	12	\$0	\$0	
9	CC	1003196258	PREN JERFISON	230301	23	\$766,667	\$122,700	EPS002	23	\$766,667	\$30,700	CCF21	23	\$766,667	\$30,700	14-11	23	\$766,667	\$53,400	23	\$0	\$0	
10	CC	11340850	SIERRA GUILLERMO	230201	24	\$800,000	\$128,000	EPS002	24	\$800,000	\$32,000	CCF21	24	\$800,000	\$32,000	14-11	24	\$800,000	\$55,700	24	\$0	\$0	
11	CC	1048847668	SUAREZ JOHANA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	
12	CC	2976838	URBINA EZEQUIEL	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	
13	CC	11349848	VASQUEZ HUGO	230301	12	\$400,000	\$64,000	EPS037	12	\$400,000	\$16,000	CCF21	12	\$400,000	\$16,000	14-11	12	\$400,000	\$27,900	12	\$0	\$0	
14	CC	80539840	VASQUEZ JUAN	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	
15	CC	11341846	VILLAMIL JOSE	25-14	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF21	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	\$20,900	9	\$0	\$0	
Total Afiliados(15)						\$9,200,001	\$1,472,100			\$9,600,001	\$384,100			\$9,600,001	\$384,100			\$9,600,001	\$668,700		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$1,472,100	\$0	\$0	\$1,472,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$464,100	\$0	\$0	\$464,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$668,700	\$0	\$0	\$668,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$668,700	\$0	\$0	\$668,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$62,700	\$0	\$0	\$62,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL				15	\$2,909,000	\$0	\$0	\$2,909,000

GELVER RUBIANO GÓMEZ

CRONOGRAMA DE OBRA

Obra para el Mantenimiento de Baños de Fabricata																			
1	Desmonte de Sanitarios y Lavamanos	UND	16,00	\$ 26.000,00	\$ 416.000,00	0,04%													
2	Desmonte de Divisiones de Baño Existentes	GL	1,00	\$ 710.000,00	\$ 710.000,00	0,07%													
3	Desmonte de Espejos Existentes	GL	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	0,02%													
4	Demolicion de Enchapes en Piso	M2	45,00	\$ 14.000,00	\$ 630.000,00	0,06%													
5	Demolicion de Enchapes en Muros	M2	140,80	\$ 14.000,00	\$ 1.971.200,00	0,20%													
6	Puntos Hidraulicos Nuevos	UND	20,00	\$ 92.000,00	\$ 1.840.000,00	0,19%													
7	Puntos Sanitarios Nuevos	UND	16,00	\$ 92.000,00	\$ 1.472.000,00	0,15%													
8	Puntos Electricos Iluminacion Nuevos	UND	16,00	\$ 130.000,00	\$ 2.080.000,00	0,21%													
9	Superficies en Corian 3 puestos 2.00m (Mesones lavamanos)	UND	3,00	\$ 4.900.000,00	\$ 14.700.000,00	1,50%													
10	Superficies en Corian 1 puesto 60m (Meson lavamanos)	UND	2,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,41%													
11	Griferias para Lavamanos con Sensor	UND	9,00	\$ 1.633.320,00	\$ 14.699.880,00	1,50%													
12	Suministro de combo Sanitarios con Fluxometro	UND	8,00	\$ 3.711.720,00	\$ 29.693.760,00	3,03%													
13	Suministro de Orinales Sin Agua Con Cartucho	UND	3,00	\$ 1.371.480,00	\$ 4.114.440,00	0,42%													
14	Suministro e Instalacion de Luminaria sencilla	UND	11,00	\$ 160.000,00	\$ 1.760.000,00	0,18%													
15	Suministro e Instalacion de Luminaria tipo regleta x 2 bombillos	UND	3,00	\$ 630.000,00	\$ 1.890.000,00	0,19%													
16	Suministro e Instalacion Divisiones de baño en Vidrio laminado 5+5 Blanco Hielo	M2	20,10	\$ 855.000,00	\$ 17.185.500,00	1,76%													
17	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera - Pared Mate	M2	28,80	\$ 220.000,00	\$ 6.336.000,00	0,65%													
18	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Pizarra - Piso	M2	42,00	\$ 246.000,00	\$ 10.332.000,00	1,06%													
19	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Marmolizado - Pared	M2	102,80	\$ 175.000,00	\$ 17.990.000,00	1,84%													
20	Cargue y Retiro de Escombros (Volqueta)	GL	2,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.400.000,00	0,25%													
21	Aseo	GL	1,00	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	0,04%													
Obra para el Manetenimiento de Baños de Taquillas																			
1	Desmonte de Sanitarios y Lavamanos	UND	19,00	\$ 26.000,00	\$ 494.000,00	0,05%													
2	Desmonte de Divisiones de Baño Existentes	GL	1,00	\$ 710.000,00	\$ 710.000,00	0,07%													
3	Desmonte de Espejos Existentes	GL	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	0,02%													
4	Demolicion de Enchapes en Piso	M2	44,00	\$ 14.000,00	\$ 616.000,00	0,06%													
5	Demolicion de Enchapes en Muros	M2	108,46	\$ 14.000,00	\$ 1.518.440,00	0,16%													
6	Suministro en Instalacion de techos en Drywall Antihongo verde	M2	44,00	\$ 75.000,00	\$ 3.300.000,00	0,34%													
7	Puntos Hidraulicos Nuevos	UND	25,00	\$ 92.000,00	\$ 2.300.000,00	0,23%													
8	Puntos Sanitarios Nuevos	UND	18,00	\$ 92.000,00	\$ 1.656.000,00	0,17%													
9	Puntos Electricos Iluminacion Nuevos	UND	22,00	\$ 130.000,00	\$ 2.860.000,00	0,29%													
10	Superficies en Corian 3 puestos 2.00m (Mesones lavamanos)	UND	3,00	\$ 4.900.000,00	\$ 14.700.000,00	1,50%													
11	Superficies en Corian 1 puesto 60m (Meson lavamanos)	UND	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	0,20%													
12	Griferias para Lavamanos con Sensor	UND	10,00	\$ 1.633.320,00	\$ 16.333.200,00	1,67%													
13	Suministro de combo Sanitarios con Fluxometro	UND	9,00	\$ 3.711.720,00	\$ 33.405.480,00	3,41%													
14	Suministro de Orinales Sin Agua Con Cartucho	UND	4,00	\$ 1.371.480,00	\$ 5.485.920,00	0,56%													
15	Suministro e Instalacion de Luminaria sencilla	UND	11,00	\$ 160.000,00	\$ 1.760.000,00	0,18%													
16	Suministro e Instalacion de Luminaria tipo regleta x 3 bombillos	UND	3,00	\$ 685.000,00	\$ 2.055.000,00	0,21%													
17	Suministro e Instalacion Divisiones de baño en Vidrio laminado 5+5 Blanco Hielo	M2	41,60	\$ 855.000,00	\$ 35.568.000,00	3,63%													
18	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera - Piso Mate	M2	29,70	\$ 220.000,00	\$ 6.534.000,00	0,67%													
19	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera - Pared Mate	M2	40,00	\$ 220.000,00	\$ 8.800.000,00	0,90%													
20	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Pizarra - Piso	M2	78,76	\$ 246.000,00	\$ 19.374.960,00	1,98%													
21	Suministro e Instalacion de Enchapes tipo Madera - Pared - Torino Marmol Brillante 60x60	M2	17,10	\$ 185.000,00	\$ 3.163.500,00	0,32%													
22	Suministro e instalacion de Poliuarea - Impermeabilizacion de cubierta (placa)	M2	40,00	\$ 195.000,00	\$ 7.800.000,00	0,80%													
23	Cargue y Retiro de Escombros (Volqueta)	GL	2,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.400.000,00	0,25%													
24	Aseo	GL	1,00	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	0,04%													
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 711.967.685,00														
Administración				23%	\$ 163.752.567,55														
Imprevistos				4%	\$ 28.478.707,40														
Utilidad				3%	\$ 21.359.030,55														
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 213.590.306,00														
Alquiler Baños Portatiles por 6 meses (8 Baterias Sanitarias Completas)		GL	6	\$ 6.240.000,00	\$ 37.440.000,00	3,82%													
Diseño Hidraulico, Sanitario, y Electrico		GL	12	\$ 1.349.990,00	\$ 16.199.880,00	1,65%													
TOTAL PROYECTO					\$ 979.197.871,00	100,00%													
MARCOS NIÑO SUPERVISOR																			

GELVER RUBIANO GÓMEZ

COMPROMISO DE LOS ESCOMBROS

GELVER RUBIANO GÓMEZ

Zipaquirá, 23 de noviembre de 2022

Señores
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A SEM
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 068 de 2022 cuyo objeto es: Contrato de obra para efectuar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los baños de la catedral de sal de Zipaquirá S.A SEM

ASUNTO: Compromiso

Yo GELVER RUBIANO GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 11.342.620 de Zipaquirá, me comprometo a entregar el respectivo certificado de manejo adecuado y disposición final de residuos especiales (escombros) teniendo en cuenta los residuos resultantes del contrato de la referencia.

Atentamente,



GELVER RUBIANO GOMEZ

C.C. No. 11.342.620 de Zipaquirá

GELVER RUBIANO GÓMEZ

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N.º 068 DE 2022

MANTENIMIENTO DE BAÑOS

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA.

DIA 1 MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Taladros,

3) MATERIALES

- Polisombra, Alambre, Puntilla, listones de Madera.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

- BAÑOS PLAZOLETA. INICIO 7:30 am.

- Se realiza censo de la zona a intervenir.

- Se realiza Comité de Obra por parte de Funcionarios, Supervisor, director de Obra, Residente y Profesionales de Apoyo

- Se lleva a cabo Desmonte de 9 portapapel, 4 Jaboneras, 13 Puercos, 2 Instalaciones de dispositivos, 10 Papeleras, 2 Combiodoros de baño, 4 Orinales, 2 Lavamanos tipo meson, 2 Estructuras de Perfil, 10 Sanitarios, 13 Divisiones en Acero

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

- Se Finalizan Actividades a las 4:30 pm.

DIA 2 MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) EQUIPOS

- Herramienta menor, Percutores, Pulidora.

3) MATERIALES

- Discos de Corte, Brocas, Alambre, Puntilla.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

BAÑOS PLAZOLETA. INICIO 7:00 am.

- Se inicia la demolición de Enchapes, demolición de techos en diawall, desmonte de tubería de Fluxómetros existentes, desmonte de lámparas 12 en total.
- Se realiza el cargue y Entrega de Accesorios desmontados a catedral de sal.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES.

- Se Finalizan Actividades a las 5:00 pm.

DIA 3. JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

- 1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) EQUIPOS

- Herramienta Menor, Percutores, Pulidora

3) MATERIALES

- Discos de Corte, Brocas

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS PLAZOLETA. INICIO : 7:00 am.

- Inicio de demolición de Pisos con alístateo, se evidencia desnivel en pisos existentes por lo cual se es necesario el desmonte total del alístateo y adecuación de uno nuevo de igual manera se debe realizar repañete para corregir

los baches y sobrecostos luego de la demolición de enchape

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se finaliza actividades a las 5:00 pm.

DIA 4. VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1) Personal de Obra

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) Equipos

Herramienta Menor, Perforadores, Pulidora, Valqueta.

3) MATERIALES

Escombros proveniente de demolición.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS PLAZOLETA INICIO 5:30 am.

- Se remite permiso para el ingreso de una valqueta para realizar el CARGUE Y RETIRO DE EXCOMBROS.

Se continua la demolición de Pisos

BAÑOS INTERIOR MINA. 9:30 am.

- Se llebo a Cabo Visita tecnica para Suministro e Instalacion de Baños Portatiles.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

- Se deja en Condiciones Aceptables el Area de Cargue de excombros provenientes de la demolición.
- Se finaliza Actividades a las 4:30 pm.

DIA 5 SABADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL.

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramiento Menor, Percutores

3) MATERIALES

Excombio proveniente de demolición.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

- BAÑOS PLAZOLETA. INICIO 7:00 am.

- Se continua con Demolicion de Pisos y la Respectiva Revision de cada uno de los puntos Sanitarios los cuales presentaban taponamiento.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se Finalizan Actividades a las 12:30 pm.

DIA 6. MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1) PERSONAL

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramiento Menor, Percutores, Andamios, Escalera

3) MATERIALES.

Excombio proveniente de Demolicion.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

BAÑOS PLAZOLETA INICIO 7:00 am.

- Demolicion de Sobante de Enchapes y Pisos.

- Se reciben Baños Postalites 9 unidades en total en perfectas Condiciones, son ubicados en el parqueadero administrativo para en días posteriores ser ingresados al interior de la mina.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

- Se finalizan actividades a los 5:00 pm.

7 MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramienta menor, Conetillos,

3) MATERIALES.

Cemento, Arena, Tuberia PVC, Accesorios PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS PLAZOLETA. INICIO: 6:00 am.

- Con previo permiso se Ingresa volqueta con arena amarilla la cual es descargada y trasladada dejando en condiciones aceptables este punto
- Se genera retrasos en ejecución de Obra por corte de Agua, necesaria para realizar Mezcla, se tiene en cuenta que en días anteriores por deslizamiento de talud se rompió la red de Suministro de la catedral Afirmado por el Ingeniero Supervisor.
- Revisión e Instalación de Nuevos Puntos Hidráulicos.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se finalizan Actividades a los 5:00 pm.

DIA 8 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Andamios, Escalera, Regleta Aluminio o Bagueta

3) MATERIALES

- Cemento - Arena - Pegante PVC - Limpiador PVC - Tubería PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS PLAZOLETA. INICIO 7:00 am.

- Trazo y Replanteo de Nuevos puntos hidráulicos y Sanitarios
- Inicio de Repañete de Muros.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se Finalizan Actividades a las 5:00 pm.

DIA 9 VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1) PERSONAL DE OBRA.

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Andamios, Escalera, Bagueta en Aluminio

3) MATERIALES.

Cemento, Arena, Accesorios, Tubería PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS PLAZOLETA. INICIO 7:00 am.

- Continuación en Repañete de Muros de baños

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES.
Se Finaliza Actividades a los 5:00 pm.

DIA 10 SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Ahollador, ~~Polisombra~~ Escalera, Motobomba.

3) MATERIALES

- Postes de Madera, Listones, Polisombra, Alambre, Puntilla.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS INTERIOR MINA INICIO 8:20 am.

- Se realiza cerramiento de los baños del Interior de la mina, ademas se ubican los baños portatiles y se instala un montaje de equipos y accesorios para realizar la debida limpieza de las 9 unidades

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

- Se realiza solicitud de Informar los fechas de cierre de los baños para los usuarios y apertura de las unidades portatiles con restricciones, solo para uso exclusivo de funcionarios y Trabajadores de la Catedral.

- Se Finalizan Actividades a las 12:30 pm.

DIA 11

MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Taladros, Percutores, Pulidora, Corriellos, Andamios

3) MATERIALES

Excombros provenientes de demolición.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

BAÑOS INTERIOR MINA INICIO: 8:20. a.m.

- Se Inician Actividades de desmonte de 9 divisiones de Orinales
- 12 Divisiones de Baños Sanitario con Puerta, 2 divisiones de baño para discapacitados, 9 orinales, 13 sanitarios
- 13 papeleiras, 11 Dispensadores de papel, 4 dispensadores de jabon
- 2 papeleiras grandes plasticas, 2 lavamanos de 13 grifos
- 1 Secador de Manos

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES.

- Se Finaliza Actividades a las 4:30 pm.

DIA 12

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) EQUIPOS

TALADRO, PERCUtores, Pulidora, Andamios

3) MATERIALES

Exambio de demolicion , Accesorios y Tuberia PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

INICIO 7:00 am

BAÑOS INTERIOR MINA

- Se continua con el desmante de Accesorios y la demolicion de enchopes de muros
- Se realiza limpieza de los Baños Portatiles.

BAÑOS PLAZOLETA.

- Se realiza Comité de Obra por parte de la Gerente de la catedral, Supervisor, director de Obra, Residente, Inspectores SST y maestria de Obra. con el fin de hacer seguimiento de Obra y tratar temas referentes a item no previstos dentro del escenario
- Se continua con la instalacion de la red hidraulica y repañete de Muros

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se finalizan actividades a los 5:00 pm.

13 JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro, 4 Operarios, 2 Ingeniero, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Taladro, Percutores, Herramienta menor, Andamios

3) MATERIALES.

Exambios de Demolicion, Arena, Cemento, Accesorios y Tuberia PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

INICIO 7:00 am.

BAÑOS PLAZOLETA.

- Continuación en reparo de muros e instalación de puntos hidráulicos faltantes

BAÑOS INTERIOR MINA

- Demolicion de Enchape de Pisos e Inicio de demolicion de Muro en bloque de Concreto
- Limpieza de Baños portatiles.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se Finalizaron actividades a los 5:00 pm.

DIA 14. ~~SABADO~~ 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 VIERNES

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) EQUIPOS

Rotomantillos, Picuatores,

3) MATERIALES

Excombros de demolicion,

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

BAÑOS MINA

INICIO: 7:00

- Se continua con la demolicion de enchape de pisos y muros a demas de la disposicion de estos en un mismo punto para realizar el coigue y retiro de los excombros en dias posteriores.

- 5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES
Se Finalizan Actividades a los 5:00 pm.

DIA 15 SABADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

1 Maestro de Obra, 4 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector de Obra.

2) EQUIPOS.

Herramienta Menor, Rotomartillos, Andamios

3) MATERIALES

Escombros de Demolicion,

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

Baños INTERIOR MINA.

- Traslado de escombros a punto de carga para ser retirados en días posteriores
- Se dispuso de 2 Operarios para realizar la limpieza de los Baños portátiles durante el fin de semana donde se llevaban a cabo algunos eventos de la Catedral.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES.

- Se Finalizan Actividades a los 12:30.
- Se realizó arreglo en baños de Taguilla, de una división la cual se fabricó en lamina para poner en funcionamiento 2 baños en este escenario.

DIA 16 LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

2 Maestros de Obra, 9 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Pulidora, Taladros, Percutores, Rotamantillos

3) MATERIALES.

Cemento, Arena, Tuberia Conduit, Pegante PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

INICIO 7:00. am.

- Se dividió el Personal de Obra en dos frentes uno para los Baños del Interior de Mina y el segundo para los Baños de Plazoleta. con el fin de dar origen y Rendimiento en las Actividades de la Obra.

BAÑOS PLAZOLETA.

- Se continúa con Repañete y alisado de Muros
- Se Realiza el trazado e Instalación de puntos electricos para Iluminaria de espejos y barras.

BAÑOS INTERIOR MINA.

- Se realiza desmonte de las valvulas de Fluxometro existentes y la revision de la red hidraulica.
- Se lleva a Cabo el trazado e inicio de Instalación de los nuevos puntos hidraulicos y Sanitarios

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES.

Se Finalizan las Actividades a los 5:00 pm

DIA 17

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

2 Maestros de Obra, 9 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Pulidora, Rotomartillos, Andamios.

3) MATERIALES.

Cemento, Arena, Tubería Conduit, Valvulas de Fluxometro, Teflon Industrial, Pegante PVC, Tuberio PVC.

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES

INICIO 7:00

BAÑOS PLAZOLETA

- Se realiza el cambio de las valvulas de Fluxometro
- Se continua con la Instalacion de los puntos Electricos faltantes para la luminaria.
- Se finaliza repañete de muros y se inicio la tana de niveles para el alistado del piso

BAÑOS INTERIOR MINA.

- Se realiza Ingreso de Material para iniciar Repañete de muros (arena, cemento, tubería) y luego se aprovecha para realizar coigue y retire de excombrio proveniente de demolición

5) CONCLUSION DE ACTIVIDADES

- Se realiza Comité de Obra entre contratista, Supervisor, residente, Inspectores SST para revision de documentación referente a primer pago, se reciben las Observaciones pertinentes las cuales el contratista se compromete a ser llegadas y cumplidas en el tiempo menor posible.

- Se exponen algunos Items y Actividades no previstos en los demas escenarios o Intervenir para ser Aceptados y poder ser realizados, donde el contratista se compromete a realizar la documentacion pertinente para ser presentada y justificada.

Se finalizan las Actividades a las 5:00 pm.

DIA 18

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

1) PERSONAL DE OBRA

2 Maestros de Obra, 9 Operarios, 2 Ingenieros, 1 Inspector SST.

2) EQUIPOS

Herramienta Menor, Pulidora, Rotomortillos, Andamios

3) MATERIALES

Cemento, Arena, Tuberia Conduit, Tuberia PVC, Accesorios

4) OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES.

INICIO : 7:00 am.

BAÑOS PLAZOLETA

→ Se realiza Alistado y Nivelacion de Pisos

BAÑOS INTERIOR MINA

→ Se realiza cargue y retiro de viaje de excombrio

→ Se inicia Instalacion de puntos electricos para Iluminario de espejos y barras, ademas de trazado y revision de puntos Sanitarios e hidraulicos.

5) CONCILIACION DE ACTIVIDADES

Se Finaliza Actividades a las 5:00 pm.

GRIFERÍA LAVAMANOS AUTOMÁTICA MESA NIZA

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Material	Latón
Acabado	Cromo
Tipo de repuesto	Cartucho Cerámico
Uso	Institucional
Tiempo de cierre	4 segundos
Garantía	2 años en funcionamiento
	3 años en acabado
Presión mínima*	20 psi
Presión máxima*	80 psi




CONSUMO

*Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la Obra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ En construcciones nuevas es importante drenar la tubería antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- ▶ Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- ▶ **La garantía no será válida cuando el producto haya sido:**
 - ▶ Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
 - ▶ Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
 - ▶ Alterado o reparado por personas no autorizadas.

DIMENSIONES

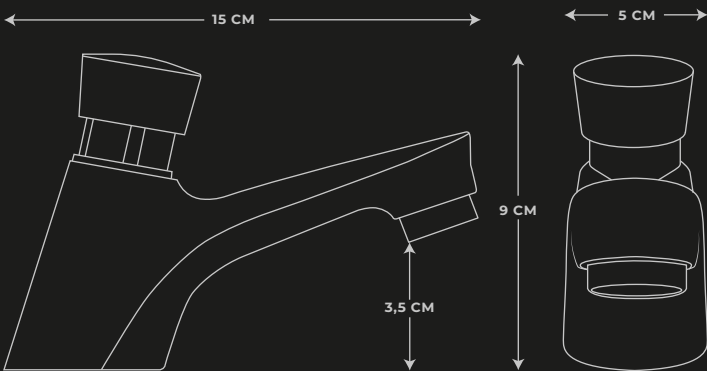

DuPont™ Corian®

Instrucciones para el uso y el cuidado



PARA VIVIR A GUSTO CON CORIAN® ...

DuPont™
CORIAN®
SOLID SURFACES

APRENDA A VIVIR CON CORIAN®

La encimera de Corian® recién instalada tiene un aspecto satinado. Con el uso, Corian® adquiere una superficie más suave y sedosa. Para desarrollar ese lustre de manera uniforme, consulte nuestras instrucciones para el Uso y el Cuidado. Quedará sorprendido observando cómo Corian® conserva su belleza con el tiempo.

CÓMO LIMPIAR ENCIMERAS Y FREGADEROS/LAVABOS DE CORIAN®

¡Corian® no es autolimpiable, aún si es eso lo que se le ha prometido!

Pero es verdad que es fácil mantener su apariencia inicial.



- **Para hacer la limpieza cotidiana, ¡pruebe primero lo más sencillo!**

Corian® no absorbe los líquidos, pero se recomienda pasar la esponja inmediatamente para secar las salpicaduras. Utilice un trapo húmedo y una crema detergente abrasiva o un desengrasante general (como Cif). Siempre frote en movimientos circulares. Para tratar manchas más tenaces, a continuación le damos algunas indicaciones.

- **Haga la limpieza del fregadero una o dos veces a la semana.**

Elimine del fregadero todos los residuos de la preparación de comidas con detergente o un producto para limpiar superficies duras. Llene un spray con $\frac{3}{4}$ de un detergente doméstico y $\frac{1}{4}$ de agua, rocíe el fregadero y déjelo así varias horas o toda la noche. El tiempo de exposición no debe sobrepasar las 16 horas. Al día siguiente aclare o frote con un trapo húmedo. Esto dejará el fregadero como nuevo.



- **Para las peores degradaciones:**

Pruebe primero la solución más sencilla para resolver cualquier problema.

- **Manchas usuales como vinagre, café, té, zumo de limón, tintes, ketchup, vino o residuos vegetales:**

Primero, pruebe los métodos fáciles. Luego continúe con una esponja abrasiva y un detergente o producto con amoníaco para limpiar superficies duras.

Reserve este tipo de tratamiento con estropajo abrasivo y líquido decolorante para eliminar manchas tenaces (polen de lirio, azafrán,...) y arañazos superficiales. Aclare varias veces con agua caliente y seque con un trapo. Recupere el brillo uniforme de la encimera con un trapo húmedo y una crema ligeramente abrasiva.

Para eliminar los depósitos de cal formados por agua dura alrededor



del desagüe o del grifo, puede emplear una esponja abrasiva y frotar la mancha con un producto para eliminar la cal, con las precauciones recomendadas por el fabricante. Aclare varias veces con agua caliente y seque con un trapo suave. Recupere el brillo uniforme de la superficie como se indica arriba.

EVITAR LOS DAÑOS...



- **Calor :**

- *Ponga siempre las cacerolas calientes sobre un salvamanteles (con apoyos de goma si es metálico) o sobre una estera protectora, o déjelas enfriar sobre la cocina. No deposite nunca una cacerola caliente, particularmente de fundición, directamente sobre la encimera o en el fregadero de Corian®.* El calor desprendido podría dañar cualquier superficie.
- Si tiene que verter líquidos en ebullición en el fregadero, tenga el grifo de agua fría abierto al mismo tiempo para evitar daños.
- *La cacerola debe ser del mismo tamaño que la placa y debe quedar centrada. Una cacerola que sobresale puede quemar la superficie del contorno.*





- **Arañazos :**

- Como en cualquier otro material, el uso cotidiano deja ligeras marcas de abrasión en Corian®.
- Nunca corte directamente sobre Corian® – idañaría la superficie!
Tenga a mano una tabla para cortar.
- El polvo, los arañazos y otras huellas del uso son más visibles sobre las superficies de colores oscuros con mucho pigmento, si se comparan con los colores claros y menos pigmentados (para más detalles, véase el folleto con los colores).



- **Salpicaduras de productos químicos:**

¡Limpie rápidamente todas salpicaduras de productos químicos (decapantes de pintura, productos para lavar las brochas o los metales, productos para limpiar el horno, productos de limpieza con cloro de metileno, ácidos para desatascar el desagüe, disolventes de esmalte de uñas con acetona) con abundante agua jabonosa para evitar la degradación de la encimera! Puede eliminar una mancha de esmalte de uñas con un disolvente que no contenga acetona, y lavar luego con agua. El contacto prolongado con los productos químicos puede dañar la superficie. (Para más detalles sobre exposición a los productos químicos, siga las instrucciones que se dan en la ficha de especificaciones Corian®, o contacte con su proveedor habitual). En el caso de una exposición que sobrepase las especificaciones mencionadas en nuestros datos técnicos, la garantía limitada de 10 años no será válida y los daños serán considerados como un caso de uso indebido.

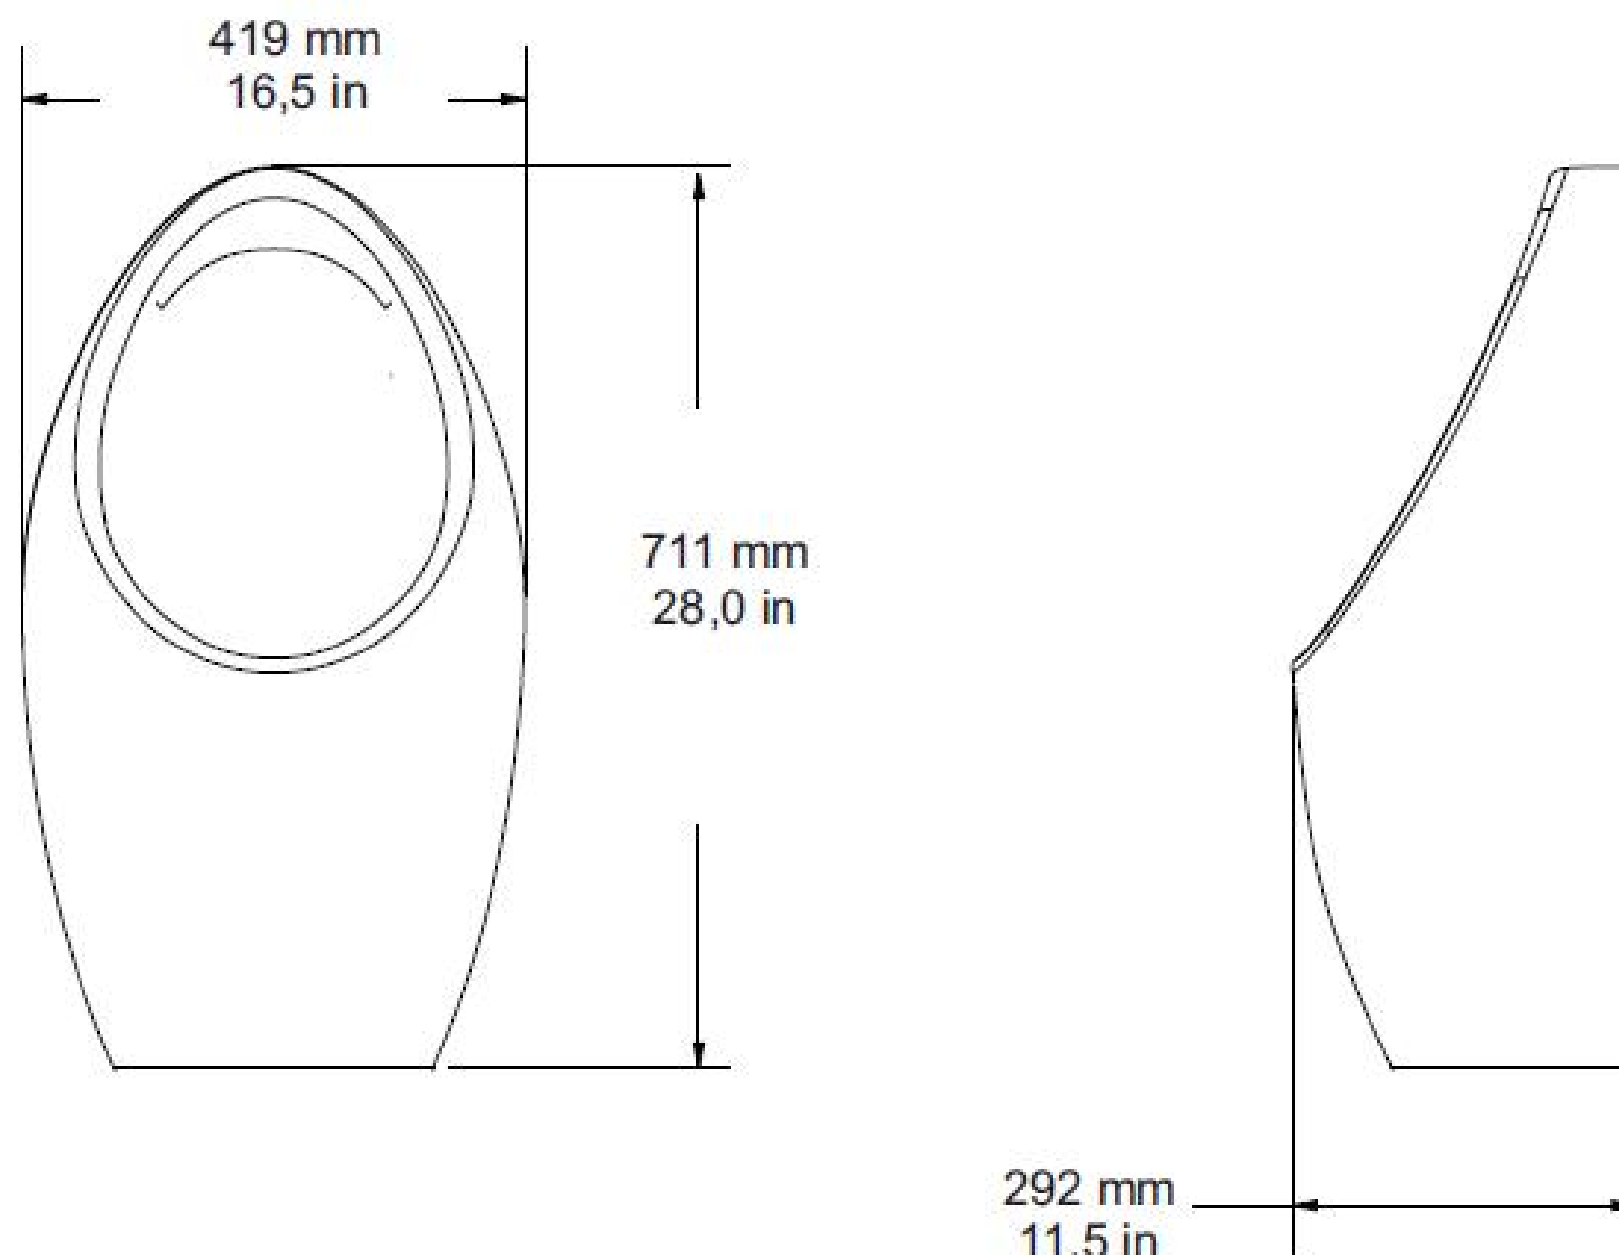

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Atractivo diseño, con operación sin contacto, de fácil instalación, utiliza la Tecnología Drena y Sella TDS2® con 2 esferas que no permiten el paso de los malos olores, rápida y simple sustitución del sistema TDS2®, no utiliza gel ni suministro de agua.

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo
Cuerpo del cartucho: polipropileno de alta densidad
Base del cartucho: teflón

ACCESORIOS:

Incluye kit para mingitorio seco
Incluye ancla para fijación de ac. inox. y tornillos

INSTALACIÓN:

Conexión a la descarga Ø 38 mm (1,5")

GARANTÍA:

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.
El dispositivo TDS® en el mingitorio seco por 3 años.
Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

PRODUCT FEATURES

Attractive design, with non-contact operation, easy to install, uses TDS2® Drain and Seal Technology with 2 spheres that do not allow passage of bad odors, quick and simple replacement of the TDS2® system, does not use gel or water supply.

MATERIALS:

Vitreous-china
Body cartridge: High density polypropylene
Base cartridge: Teflon

ACCESSORIES:

Waterless urinal kit
Includes setting kit

INSTALLATION:

Inlet Thread Ø 38 mm (1,5")

WARRANTY:

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

In hardware for manufacturing defects for 5 years.
The TDS® device in the dry urinal for 3 years.
Cover and seat for a period of 2 years.

The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico:
Consultancy and Technical
Service:

(52) 55 53 33 94 31

servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Spare Parts:

www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx

(52) 55 53 33 94 00
(52) 55 53 33 94 21
Ext. 5913, 5068 y 4815
