

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO</p>		CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

*De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021*

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

NIT. 901.005.671-3

Valor: \$903.924,00

Letras: NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 MCTE

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X): **ACTA No. 3 y final**, periodo 1 de septiembre 2023, correspondiente al Contrato número **2400 de 2023** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS**

Con cargo al registro presupuestal número: **795023 de 11-JUL-2023**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.



Firmado digitalmente
por JUAN GABRIEL
RODRIGUEZ SOLANO

FIRMA:

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Fecha: 11/9/2023



MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
S.A.S
NIT 901.005.671-3
Calle 12 No 18 -46
Tel: (3143417001)
Yopal - Colombia
gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMO 18

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(038) 6347983
Dirección	CL 40 No 21 - 75	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2023, 10:13
Expedición	26/09/2023, 15:59
Vencimiento	26/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 3 Y FINAL QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO 2400 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000.	1.00	903,924.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos tres mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación \$ 903,924.00

Observaciones:
#\$24-02-00;2400-2023; jgrodriguez@invias.gov.co#\$.

Total Bruto	759,600.00
IVA 19%	144,324.00
Total a Pagar	903,924.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764056605094 aprobado en 20230922 prefijo FEMO desde el número 17 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 7d442ba17735fadc4f17001b9a87775e772aea9bd4b9939ca970635e9f936a36a32109612f8742193fd2f4507d656c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CASANARE

ACTA Nº

3 y FINAL

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 759,600.00

FECHA

04 - SEP - 2023

MES

1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023

CONTRATO No :

2400 DE 2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

CONTRATISTA:

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

N/A

INTERVENTOR:

N/A

YTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

PLAZO INICIAL:

1.0 MES

PLAZO ACUMULADO:

1.40 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

21 Jul 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

01 Sep 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):

75,327,000.00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

\$ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):

75,327,000.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No 1 FECHA 18-ago-2023		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000	MES	1.00	\$ 63,300,000.00	\$ 63,300,000.00	1.00	\$ 63,300,000.00	0.012	\$ 759,600.00	1.000	\$ 63,300,000.00	
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN											
				SUBTOTAL OBRAS (A)					\$ 63,300,000.00		\$ 63,300,000.00		\$ 759,600.00		\$ 63,300,000.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					\$ 63,300,000.00		\$ 63,300,000.00		\$ 759,600.00		\$ 63,300,000.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)					\$ 12,027,000.00		\$ 12,027,000.00		\$ 144,324.00		\$ 12,027,000.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)					\$ 75,327,000.00		\$ 75,327,000.00		\$ 903,924.00		\$ 75,327,000.00
				TOTAL - BASICO					\$ 63,300,000.00		\$ 63,300,000.00		\$ 759,600.00		\$ 63,300,000.00
				TOTAL - IVA					\$ 12,027,000.00		\$ 12,027,000.00		\$ 144,324.00		\$ 12,027,000.00
				VALOR TOTAL (F+I+J+K+L)					\$ 75,327,000.00		\$ 75,327,000.00		\$ 903,924.00		\$ 75,327,000.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU

10

%

Utilidad

5

%

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 759,600.00	\$ 144,324.00	\$ 903,924.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 759,600.00	\$ 144,324.00	\$ 903,924.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

N.A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

N.A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 2

FECHA

04 - SEP - 2023

UNIDAD EJECUTORA

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CASANARE

ACTA Nº

3 y FINAL

VALOR BÁSICO ACTA:

\$759,600.00

MES

1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023

ACTA FINAL

CONTRATO No :

2400 DE 2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

CONTRATISTA:

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

N/A

INTERVENTOR:

N/A

TO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

PLAZO INICIAL:

1.0 MES

PLAZO ACUMULADO:

1.40 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

21 Jul 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

01 Sep 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

75,327,000.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$-

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

75,327,000.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 903,924.00

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

1. En la comunicación DT-CAS 41474 del 19 de julio de 2023 se da orden de inicio a partir del día 21 de julio de 2023 únicamente con actividades de mantenimiento rutinario. Lo anterior obedece a que, en oficio DT CAS 30033 del 26/5/2023, se requirió a la Empresa CONSORCIO TVG, quien tiene contrato vigente de obra No.990-2022, realizar la actividad de control de tráfico vehicular en el puente Cravo Sur PR 2+0385 de la ruta 6513 Yopal – Paz de Ariporo con personal del sector a partir del día 3 de junio de 2023, dada la finalización del contrato de mantenimiento rutinario 1286-2022. La Empresa CONSORCIO TVG , en el momento tenía dispuesto el personal de controladores viales en el puente Cravo Sur, quienes fueron contratados hasta el 2 de agosto de 2023. El contratista Multiobras de la Orinoquia S.A.S, mediante correo electrónico enviado el día 31 de julio de 2023 solicita: “Con el fin de presentar el acta del contrato 2400 de 2023 y debido a que se iniciaron labores sin el personal completo (las seis personas del puente) proponemos dividir el valor mensual de mantenimiento en 17 que es el número del personal y multiplicarla por el personal de mantenimiento”

2. Teniendo en cuenta lo expuesto en la observación 1 se realizó acta de modificación para prorrogar el plazo en doce (12) días (0,40 meses) durante los cuales se mantendría laborando exclusivamente las seis (6) personas que venían realizando el control de tránsito en el Puente Cravo Sur y así poder invertir la totalidad de los recursos del presente contrato. Nuevo plazo = 1,40 meses y se mantiene la cantidad a ejecutar en 1,0 Mes para mantener el equilibrio contractual

Teniendo en cuenta lo anterior y además que el contrato contempla un solo ítem que involucra las dos actividades (mantenimiento rutinario y control de tránsito) a continuación se muestra el cálculo de la cantidad equivalente

ACTA 2 AGOSTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (1)	TOTAL PERSONAL QUE DEBE DISPONER EL CONTRATISTA SEGÚN PUEGO DE CONDICIONES (2)	VALOR UNITARIO BÁSICO CON 17 PERSONAS (DIA) (3)	PERSONAL LABORANDO (4)	VALOR UNITARIO BÁSICO CON 11 PERSONAS (DIA) (5)	CANTIDAD A PAGAR ESTA ACTA (DIAS) (6)	VALOR BÁSICO A PAGAR PRESENTE ACTA (7)	CANTIDAD EQUIVALENTE EN MESES
1 al 1 de septiembre	MES	1	\$ 63,300,000.0	17 Personas	\$ 2,110,000.0	6 Personas	\$ 744,706.0	1 Dias	\$ 744,706.0	0.012 Meses
										0.012 Meses

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de “Observaciones” del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma

MAURICIO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

INGENIERO SUPERVISOR

Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CODIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

FECHA04 - SEP - 2023(Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANAREDIRECCIÓN TERRITORIAL CASANAREPERIODO MES: 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 y FINAL (Indique el número del acta)ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)VALOR BÁSICO ACTA: \$ 759,600.00

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/4/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS	FIRMA	<div>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</div>
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/4/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9/4/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 2400 DE 2023		
OBJETO:	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS	
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	NIT 901.005.671-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	AUTORIZA EL PAGO A MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 903,924.00 VALOR EN LETI NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 MCTE		
CORRESPONDIENTE AL ACTA	PARCIAL DE OBRA N° 3 y FINAL	DEL PERIODO 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023 Y CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL INDICADO EN EL FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Firma:MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDOMatricula Profesional No. 25202 - 7804 CNDINGENIERO SUPERVISORFecha firma: 04-SEP-2023(Suscribe según su competencia)

Firma:JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANOMatricula Profesional No. 54202240042 NTSDIRECTOR TERRITORIAL (e)Fecha firma: 11-SEP-2023(Suscribe según su competencia)

Firma:N.ANombreMatricula profesionalGESTOR TÉCNICO DEL CONTRATOFecha firma(Suscribe según su competencia)

Firma:JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANOMatricula Profesional No. 54202240042 NTSORDENADOR DEL PAGOFecha firma: 11-SEP-2023(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04 - SEP - 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 y FINAL DE 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 759,600.00
SEGUIIMIENTO No. 3 y FINAL
(Se numeración orden con consecutiva y corresponden al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2400 DE 2023	PLAZO INICIAL: 1.00 MES <small>(En meses según el contrato)</small>	PLAZO ACUMULADO: 1,40 MESES <small>(En meses según los GPPs y el contrato)</small>
OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 Jul 2023 <small>(Indique la suspensión)</small>	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1 Sep 2023 <small>(Indicadas las suspensiones, indicar el vencimiento)</small>
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. <small>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</small>	FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. <small>(Indique la reanudación)</small>
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: N/A	INTERVENIENTE: N/A	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0.00
	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 75,327,000.00 <small>(Incluya el IVA)</small>	
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 75,327,000.00	

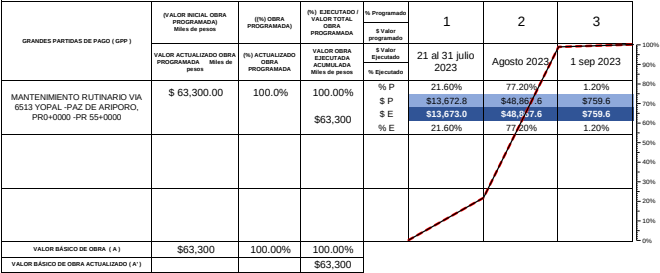

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	21.60%	77.20%	1.20%
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (1)	%	21.60%	98.80%	100.00%
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	21.60%	77.20%	1.20%
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (2)	%	21.60%	98.80%	100.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
	\$	\$	-
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$	\$	-
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	\$	\$	-
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$63,300	\$63,300	100.00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$63,300	\$63,300	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprobado
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Aprobado Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2400 DE 2023

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO ☐

ACTA DE OBRA ☒

3 y FINAL

1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023

PAGO ANTICIPADO ☐

ACTA DE INTERVENTORIA ☐

DESEMBOLSO ☐

ACTA DE AJUSTE ☐

PRESTACION DE SERVICIOS ☐

OTRO ☐

CUAL ?:

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 795023 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02

RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO \$ 903,924.00

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____

RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO _____

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____

RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO _____

TOTAL ACTA \$ 903,924.00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

INGENIERO SUPERVISOR


Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 1	

Contrato No.	2400 DE 2023	Contratista	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S			
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS					
Acta No.	3 y FINAL	Valor básico	\$	759,600.00	Período	1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023
Valor incluido el Iva	\$	903,924.00				
VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:						

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			\$ 903,924.00	\$ 903,924.00
2						
3						
4						
TOTALES					\$ 903,924.00	\$ 903,924.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	\$ 542,354.40	\$ 455,760.00
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	\$ 361,569.60	\$ 303,840.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 903,924.00	\$ 759,600.00
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -


Firma
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S



Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, ingeniero supervisor de la Territorial Casanare de Invias , certifico que la empresa MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3, durante el desarrollo del contrato N° 2400 DE 2023 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS y en cumplimiento de la cláusula décimo segunda: presentó los soportes de pago de los aportes parafiscales y seguridad social del personal que laboró durante el periodo: 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 3 y FINAL, del contrato de mantenimiento rutinario N° 2400 DE 2023

(Firma)




MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor, MAURICIO PULIDO representante legal de MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S certifica que la firma contratista MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3 en desarrollo del contrato N° 2400 DE 2023 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS y en cumplimiento de la cláusula décima segunda: presentó los soportes de pago de los aportes parafiscales y seguridad social del personal que laboró durante el periodo: 1 AL 1 DE SEPTIEMBRE - 2023, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 3 y FINAL, del contrato de mantenimiento rutinario N° 2400 DE 2023



(Firma)

MAURICIO PULIDO

C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá

REPRESENTANTE LEGAL

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

La confianza y la credibilidad

Yopal, 16 de agosto de 2022

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

CERTIFICADO

Cordial saludo,


BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **MULTIOBRAS DE LA ORINIQUIA SAS** identificado(a) con Nit **901005671** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS 026 PERSONA JURIDICA	363-000030-46	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA**.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6334656 ext 140 en nuestra sucursal Yopal Principal Ubicada en la Carrera 19 N° 7-59.

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Yopal - Of. 363 Yopal
Asesor de servicios No 157
Karina Rojas L.

Asesor Comercial Multsegmentos

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.


En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14835830162



(415)7707212489984(8020) 000001483583016 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 5 6 7 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 18 46

42. Correo electrónico

gerenciamultiabrasorinoquia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 4 1 4 5 5 1

45. Teléfono 2

6 3 2 8 6 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 8 3 0

Actividad secundaria

48. Código

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 8 3 0

Otras actividades

1

2

4 9 2 3

4 2 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 07 - 01 / 08 : 50: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHAPARRO BARRERA CAMILO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-10:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 94223 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	795023	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	75.327.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	75.327.000,00	Saldo x Obligar:	75.327.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901005671	Razón Social:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	36300003046	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1094267357	Nombre:	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO			Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2400/2023	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-07-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF									
							75.327.000,00	0,00					
						Total:	75.327.000,00	0,00	75.327.000,00	75.327.000,00			

Objeto: DTCAS CON 2400/2023 PLAZO 1 MES MEMO DT-CAS 52034 DEL 10/07/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PRO+0000 - PR55+0000.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	75.327.000,00	75.327.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	04 - SEP - 2023

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No:	2400 DE 2023	CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
MES INFORME MENSUAL:	SEPTIEMBRE 2023	PROYECTO:	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORE EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	NA	INTERVENTOR	N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2023	795023 (11-JUL-2023)	ADQUISICIÓN Y DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 75.327.000,00	\$ 903.924,00
TOTAL						\$ 75.327.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 75.327.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVÍAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$ 13.672.800,00	\$ 2.597.832,00	\$ 16.270.632,00	N.A	\$ 16.270.632,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ 59.056.368,00	\$ 59.056.368,00				
2	PARCIAL	1 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$ 48.867.600,00	\$ 9.284.844,00	\$ 58.152.444,00	N.A	\$ 58.152.444,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ 903.924,00	\$ 903.924,00				
3 y Final	PARCIAL	1 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 759.600,00	\$ 144.324,00	\$ 903.924,00	N.A	\$ 903.924,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ -	\$ -				
TOTALES			\$ 63.300.000,00	\$ 12.027.000,00	\$ 75.327.000,00	N.A	\$ 75.327.000,00	N.A	\$ - \$ -						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 63.300.000,00	\$ 12.027.000,00	\$ 75.327.000,00
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 63.300.000,00	\$ 12.027.000,00	\$ 75.327.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.
