

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO</p>	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

***De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021***

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

NIT. 901.005.671-3

Valor: \$58.152.444,00

Letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X): **ACTA No. 2**, periodo agosto 2023, correspondiente al Contrato número **2400 de 2023** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS**

Con cargo al registro presupuestal número: **795023 de 11-JUL-2023**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.



Firmado digitalmente
por JUAN GABRIEL
RODRIGUEZ SOLANO

FIRMA: _____

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Fecha: 8/9/2023



MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
S.A.S
NIT 901.005.671-3
Calle 12 No 18 -46
Tel: (3143417001)
Yopal - Colombia
gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMO 17

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(038) 6347983
Dirección	CL 40 No 21 - 75	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2023, 10:04
Expedición	26/09/2023, 10:30
Vencimiento	26/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 2 QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO 2400 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000.	1.00	58,152,444.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y ocho millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 58,152,444.00

Observaciones:


#\$24-02-00;2400-2023; jgrodriguez@invias.gov.co#\$.

Total Bruto	48,867,600.00
IVA 19%	9,284,844.00
Total a Pagar	58,152,444.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056605094 aprobado en 20230922 prefijo FEMO desde el número 17 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 918163c9e905914b2bdbf71962f99c2c13c5e81a1193ca725b85a577d63b5a5a25f951d42dfb44fcf819f6ad50c0761a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

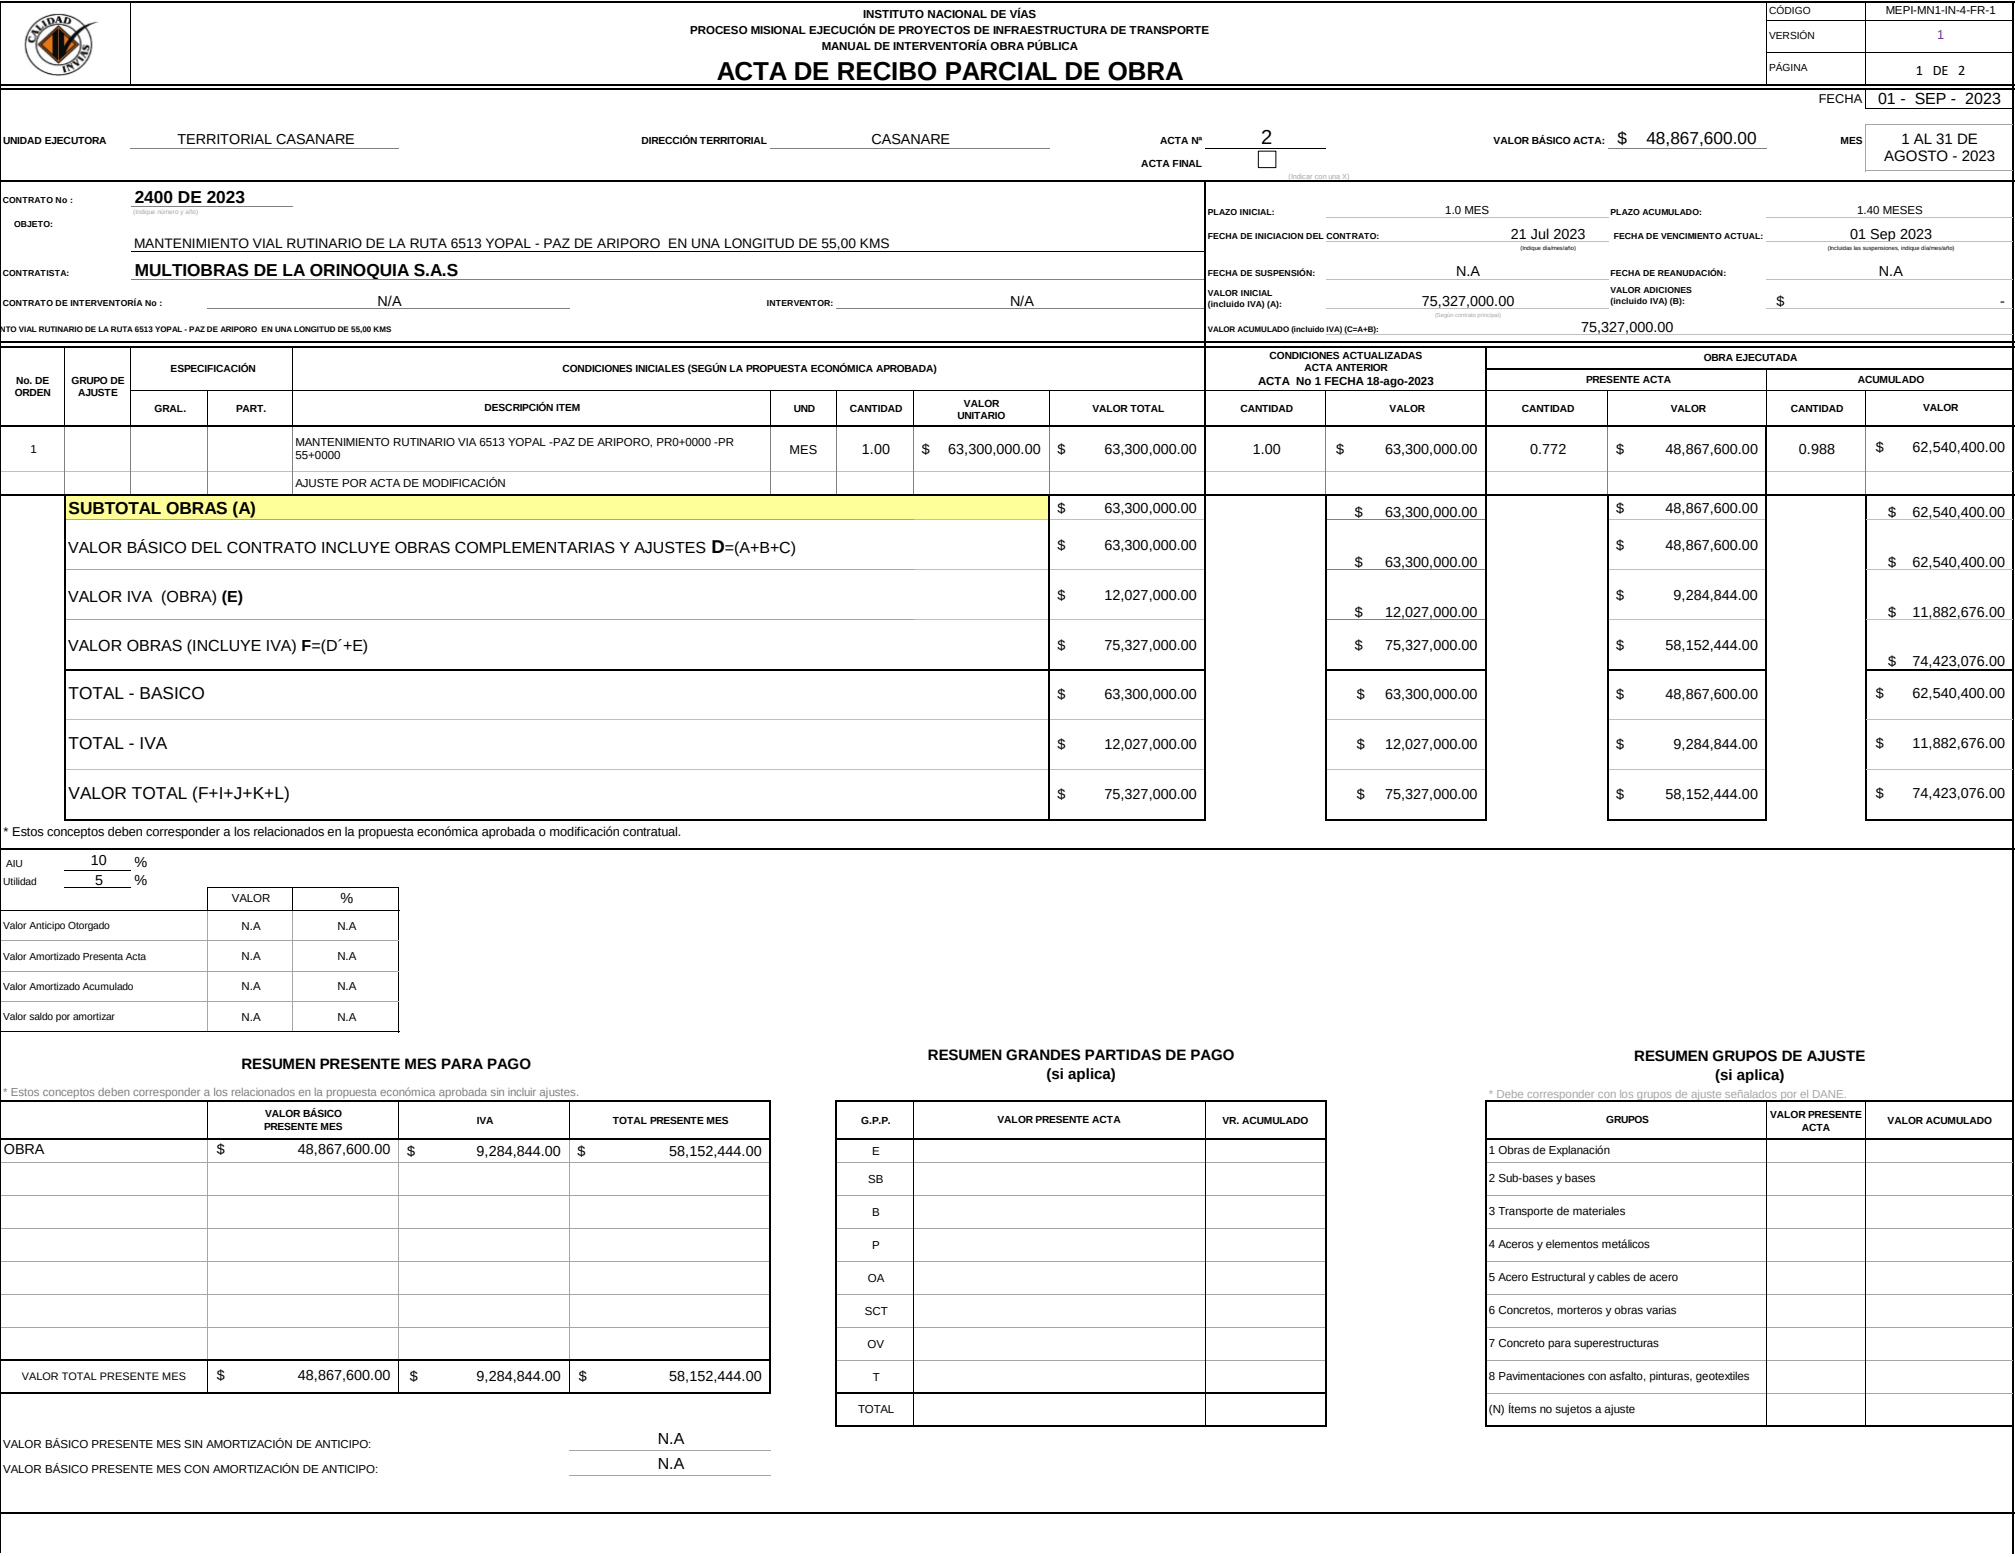

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CASANARE

ACTA N°

2

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 48,867,600.00

FECHA

01 - SEP - 2023

ACTA FINAL

MES

1 AL 31 DE AGOSTO - 2023

CONTRATO No :

2400 DE 2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

CONTRATISTA:

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

N/A

INTERVENTOR:

N/A

PLAZO INICIAL:

1.0 MES

PLAZO ACUMULADO:

1.40 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

21 Jul 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

01 Sep 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

75,327,000.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

75,327,000.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 58,152,444.00

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES

1. En la comunicación DT-CAS 41474 del 19 de julio de 2023 se da orden de inicio a partir del día 21 de julio de 2023 únicamente con actividades de mantenimiento rutinario. Lo anterior obedece a que, en oficio DT CAS 30033 del 26/5/2023, se requirió a la Empresa CONSORCIO TVG, quien tiene contrato vigente de obra No.990-2022, realizar la actividad de control de tráfico vehicular en el puente Cravo Sur PR 2+0385 de la ruta 6513 Yopal – Paz de Ariporo con personal del sector a partir del día 3 de junio de 2023, dada la finalización del contrato de mantenimiento rutinario 1286-2022. La Empresa CONSORCIO TVG , en el momento tenía dispuesto el personal de controladores viales en el puente Cravo Sur, quienes fueron contratados hasta el 2 de agosto de 2023. El contratista Multiobras de la Orinoquia S.A.S, mediante correo electrónico enviado el día 31 de julio de 2023 solicita: “Con el fin de presentar el acta del contrato 2400 de 2023 y debido a que se iniciaron labores sin el personal completo (las seis personas del puente) proponemos dividir el valor mensual de mantenimiento en 17 que es el número del personal y multiplicarla por el personal de mantenimiento”

2. Teniendo en cuenta lo expuesto en la observación 1 se realizó acta de modificación para prorrogar el plazo en doce (12) días (0,40 meses) durante los cuales se mantendría laborando exclusivamente las seis (6) personas que venían realizando el control de tránsito en el Puente Cravo Sur y así poder invertir la totalidad de los recursos del presente contrato. Nuevo plazo = 1,40 meses y se mantiene la cantidad a ejecutar en 1,0 Mes para mantener el equilibrio contractual

Teniendo en cuenta lo anterior y además que el contrato contempla un solo ítem que involucra las dos actividades (mantenimiento rutinario y control de tránsito) a continuación se muestra el cálculo de la cantidad equivalente

ACTA 2 AGOSTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (1)	TOTAL PERSONAL QUE DEBE DISPONER EL CONTRATISTA SEGÚN PUEGO DE CONDICIONES (2)	VALOR UNITARIO BÁSICO CON 17 PERSONAS (DÍA) (3)	PERSONAL LABORANDO (4)	VALOR UNITARIO BÁSICO CON 11 PERSONAS (DÍA) (5)	CANTIDAD A PAGAR ESTA ACTA (DÍAS) (6)	VALOR BÁSICO A PAGAR PRESENTE ACTA (7)	CANTIDAD EQUIVALENTE EN MESES
1 al 2 de agosto	MES	1	\$ 63,300,000.0	17 Personas	\$ 2,110,000.0	11 Personas	\$ 1,365,294.0	2 Días	\$ 2,730,588.0	0.043 Meses
3 al 20 de agosto			17 Personas	\$ 2,110,000.0	17 Personas	\$ 2,110,000.0	18 Días	\$ 37,980,000.0	0.600 Meses	
21 al 31 de agosto			17 Personas	\$ 2,110,000.0	6 Personas	\$ 744,706.0	11 Días	\$ 8,191,766.0	0.129 Meses	
										0.772 Meses

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de “Observaciones” del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma

MAURICIO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS




INGENIERO SUPERVISOR

Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CODIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
				VERSIÓN	1																																																																						
				PÁGINA	1 DE 1																																																																						
FECHA 01 - SEPT - 2023 (Día / Mes / Año)																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE		PERIODO MES: 1 AL 31 DE AGOSTO - 2023																																																																							
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)																																																																							
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48,867,600.00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9/1/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>9/1/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>9/1/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>9/8/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>---</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>N.A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>9/8/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO</td><td></td></tr></tbody></table>							Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/1/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/1/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9/1/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9/8/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9/8/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/1/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/1/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9/1/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9/8/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO																																																																								
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9/8/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO																																																																								
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																											
AUTORIZACIÓN DE PAGO																																																																											
CONTRATO No : 2400 DE 2023																																																																											
OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS																																																																											
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT 901.005.671-3																																																																											
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO AUTORIZA EL PAGO A MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S																																																																											
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 58,152,444.00 VALOR EN LET CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE																																																																											
CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO - 2023 Y CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL INDICADO EN EL FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL																																																																											
<table><tr><td> Firma: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Matrícula Profesional No. 25402 - 77804 CND INGENIERO SUPERVISOR Fecha firma: 01-SEPT-2023 (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS DIRECTOR TERRITORIAL (e) Fecha firma: 08-SEP-2023 (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: N.A Nombre Matrícula profesional GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO Fecha firma (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma: 08-SEP-2023 (Suscribe según su competencia)</td></tr></table>						 Firma: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Matrícula Profesional No. 25402 - 77804 CND INGENIERO SUPERVISOR Fecha firma: 01-SEPT-2023 (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS DIRECTOR TERRITORIAL (e) Fecha firma: 08-SEP-2023 (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: N.A Nombre Matrícula profesional GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO Fecha firma (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma: 08-SEP-2023 (Suscribe según su competencia)																																																																		
 Firma: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Matrícula Profesional No. 25402 - 77804 CND INGENIERO SUPERVISOR Fecha firma: 01-SEPT-2023 (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS DIRECTOR TERRITORIAL (e) Fecha firma: 08-SEP-2023 (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: N.A Nombre Matrícula profesional GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO Fecha firma (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firma: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma: 08-SEP-2023 (Suscribe según su competencia)																																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																											



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	18 - AGO - 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

 (Indicar con una X)
1

 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2400 DE 2023


OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2631 DE 2019 INTERVENTOR: INTERPRO SAS

PLAZO INICIAL:	1 MES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21 Jul 2023 (según el contrato)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acto)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 75,327,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A)-(B):	\$ 75,327,000.00

PLAZO ACUMULADO:	1,4 MESES <small>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)</small>
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	1 Sep 2023 <small>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)</small>
FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A <small>(Indique día/mes/año)</small>
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 0.00

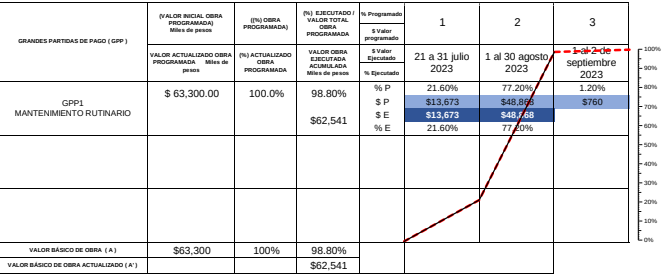

MANTENIMIENTO ROUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	21.60%	77.20%	1.20%	760						
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 13,673	\$ 48,868									
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	21.60%	98.80%	100.00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 13,673	\$ 62,540	\$ 63,300								
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	21.60%	77.20%	0.00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 13,673	\$ 48,868		-							
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	21.60%	98.80%								
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 13,673	\$ 62,541	\$ 62,541								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	—————

PROVISIONES*	VALOR REAL	VALOR EXISTENTE	% EJECUCIÓN
	VALOR ACUMULADO		
1	0	0	-
2	0	0	-
3	0	0	-
4	0	0	-
5	0	0	-
6	0	0	-
7	0	0	-
8	0	0	-
9	0	0	-
10	0	0	-
11	0	0	-
12	0	0	-
13	0	0	-
14	0	0	-
15	0	0	-
16	0	0	-
17	0	0	-
18	0	0	-
19	0	0	-
20	0	0	-
21	0	0	-
22	0	0	-
23	0	0	-
24	0	0	-
25	0	0	-
26	0	0	-
27	0	0	-
28	0	0	-
29	0	0	-
30	0	0	-
31	0	0	-
32	0	0	-
33	0	0	-
34	0	0	-
35	0	0	-
36	0	0	-
37	0	0	-
38	0	0	-
39	0	0	-
40	0	0	-
41	0	0	-
42	0	0	-
43	0	0	-
44	0	0	-
45	0	0	-
46	0	0	-
47	0	0	-
48	0	0	-
49	0	0	-
50	0	0	-
51	0	0	-
52	0	0	-
53	0	0	-
54	0	0	-
55	0	0	-
56	0	0	-
57	0	0	-
58	0	0	-
59	0	0	-
60	0	0	-
61	0	0	-
62	0	0	-
63	0	0	-
64	0	0	-
65	0	0	-
66	0	0	-
67	0	0	-
68	0	0	-
69	0	0	-
70	0	0	-
71	0	0	-
72	0	0	-
73	0	0	-
74	0	0	-
75	0	0	-
76	0	0	-
77	0	0	-
78	0	0	-
79	0	0	-
80	0	0	-
81	0	0	-
82	0	0	-
83	0	0	-
84	0	0	-
85	0	0	-
86	0	0	-
87	0	0	-
88	0	0	-
89	0	0	-
90	0	0	-
91	0	0	-
92	0	0	-
93	0	0	-
94	0	0	-
95	0	0	-
96	0	0	-
97	0	0	-
98	0	0	-
99	0	0	-
100	0	0	-
101	0	0	-
102	0	0	-
103	0	0	-
104	0	0	-
105	0	0	-
106	0	0	-
107	0	0	-
108	0	0	-
109	0	0	-
110	0	0	-
111	0	0	-
112	0	0	-
113	0	0	-
114	0	0	-
115	0	0	-
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	0	0	-
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	0	0	-
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$63,300	\$62,541	98.80%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$63,300	\$62,541	

OBSERVACIONES:

Firma: 
 MAURICIO PULIDO
 Representante Legal o Aposderado
 Contratista
 C.C. 9.525.526 Soqamoso - Boyacá

Firma: **NA**

Ingeniero Residente - AMV2
Interventoría
Matrícula No. 52020 - 95967 ANT

Firma: N.A

Titular Gerencia

Firma: N.A

Gestor Técnico de Proyecto

Firma: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Ingeniero Supervisor
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND

Firmado digitalmente por
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Firma: 

JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Director Territorial (e)

Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS

Firmado digitalmente por
JUAN GABRIEL
RODRIGUEZ
SOLANO

Firma: 

JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Jefe Unidad Ejecutora (e)

Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - SEPT - 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE AGOSTO - 2023 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 48,867,600.00
SEGUIMIENTO No. 2
(Su numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2400 DE 2023	PLAZO INICIAL: 1.00 MES <small>(En meses según el contrato)</small>	PLAZO ACUMULADO: 1,40 MESES <small>(En meses según los contratos)</small>
OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 Jul 2023 <small>(Indique la suspensión)</small>	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1 Sep 2023 <small>(Indicadas las suspensiones, indicar el mes y año)</small>
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. <small>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</small>	FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. <small>(Indique la reanudación)</small>
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: N/A	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 75,327,000.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0.00
INTERVENIENTE: N/A	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 75,327,000.00	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(N) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	% Ejecutado
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PRO-0000 - PR 55-0000	\$ 63,300.00	100.0%	98.80% \$62,541	% P \$ P \$ E % E	21 al 31 julio 2023 21.60% \$13,672.8 21.60%	Agosto 2023 77.20% \$48,867.6 77.20%	1 sept al 1 sept 2023 1.20% \$759.6	100%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$63,300	100.00%	98.80%					0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')								

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	21.60%	77.20%	1.20%
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (1)	%	21.60%	98.80%	100.00%
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	21.60%	77.20%	-
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (2)	%	21.60%	98.80%	-


* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.


PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
VALOR ACTUALIZADO			
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
\$	\$	-	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$	\$	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	\$	\$	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$63,300	\$62,541	98.80%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$63,300	\$62,541	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba 
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Aprueba Firma 
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2400 DE 2023

		TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒	ACTA No 2
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL ?:		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>795023</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-103-0-2401023-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$ 58,152,444.00</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	<u>\$ 58,152,444.00</u>

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

INGENIERO SUPERVISOR


Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 1	

Contrato No.	2400 DE 2023		Contratista	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS				
Acta No.	2	Valor básico	\$ 48,867,600.00	Período	AGOSTO - 2023
Valor incluido el Iva	\$ 58,152,444.00				
VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:					

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			\$ 58,152,444.00	\$ 58,152,444.00
2						
3						
4						
TOTALES					\$ 58,152,444.00	\$ 58,152,444.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	\$ 34,891,466.40	\$ 29,320,560.00
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	\$ 23,260,977.60	\$ 19,547,040.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 58,152,444.00	\$ 48,867,600.00
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -



Firma
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S


Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, ingeniero supervisor de la Territorial Casanare de Invias , certifico que la empresa MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3, durante el desarrollo del contrato N° 2400 DE 2023 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS y en cumplimiento de la cláusula décimo segunda: presentó los soportes de pago de los aportes parafiscales y seguridad social del personal que laboró durante el periodo: 1 AL 31 DE AGOSTO - 2023, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 2, del contrato de mantenimiento rutinario N° 2400 DE 2023


(Firma) 

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor, MAURICIO PULIDO representante legal de MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S certifica que la firma contratista MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3 en desarrollo del contrato N° 2400 DE 2023 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS y en cumplimiento de la cláusula décima segunda: presentó los soportes de pago de los aportes parafiscales y seguridad social del personal que laboró durante el periodo: 1 AL 31 DE AGOSTO - 2023, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 2, del contrato de mantenimiento rutinario N° 2400 DE 2023




(Firma)

MAURICIO PULIDO

C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá

REPRESENTANTE LEGAL

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																	
	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																												VERSIÓN	1																	
																													PÁGINA	1 DE 1																	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE																												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		FECHA		01 SEPT 2023															
CONTRATO DE OBRA No: 2400 DE 2023 MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2023 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° NA																												CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S		PROYECTO: RUTA 6513 PR 0+0000 - PR 55+0000		INTERVENTOR: N/A		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE													
VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Interventor de Pago (Ver Nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	Valor Cotizado EPS	No Planilla	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión		Valor Caja de Compensación	Valor SENA
1	DAIRO RAFAEL DOMINGUEZ BALDOVINO	9,132,598	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,121,334	\$ 78,100	V	NUEVA EPS	\$ 44,900	65837930	PORVENIR		\$ 179,500	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	Retiro	
2	MARLY YURLEY LLÁNES GARCÍA	1,007,704,068	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,121,334	\$ 78,100	V	NUEVA EPS	\$ 44,900	65837930	COLPENSIONES		\$ 179,500	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	Retiro	
3	CAMILO ANDRES CACERES LAVADO	1,007,765,132	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
4	SEGUNDO ABRAHAM BARRERA CHAPARRO	1,055,504,135	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
5	JOSE LIBARDO AGUIRRE CRUZ	1,118,564,517	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
6	JUAN CARLOS PIRATOBA GONZALEZ	1,118,572,692	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
7	PROSPERO CHAPARRO CHAPARRO	4,144,406	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	NUEVA EPS	\$ 31,000	65837930	COLPENSIONES		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
8	JUAN JOSE PIDIACHI YUNADO	74,865,337	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
9	RAMIRO INOCENCIO	4,284,504	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	EPS SANITAS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	MARTHA ANA DELIA LOPEZ MORA	47,430,854	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,121,334	\$ 78,100	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 44,900	65837930	PORVENIR		\$ 179,500	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	DIANA CAROLINA PIRABAN SALAMANCA	47,438,851	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,198,667	\$ 83,500	V	NUEVA EPS	\$ 48,000	65837930	PORVENIR		\$ 191,800	\$ 48,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	MARLENY LAVERDE VEGA	47,442,128	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,121,334	\$ 78,100	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 44,900	65837930	PORVENIR		\$ 179,500	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	EUDORO REYES GONZÁLEZ	5,842,544	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,121,334	\$ 78,100	V	NUEVA EPS	\$ 44,900	65837930	COLPENSIONES		\$ 179,500	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	EDILBERTO BARRERA CHAPARRO	61,820,098	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	NUEVA EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	JOSÉ LEONIDAS AFRICANO VARGAS	7,123,153	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	CAPRESOCAS EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	JULIÁN GUANARO MALDONADO	74,858,308	Operario	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 773,334	\$ 53,900	V	NUEVA EPS	\$ 31,000	65837930	PORVENIR		\$ 123,800	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	Retiro
#	NICOLÁS ALBARRACÍN CUTA	9,658,278	Controlador de tránsito	\$ 1,160,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,121,334	\$ 78,100	V	NUEVA EPS	\$ 44,900	65837930	PORVENIR		\$ 179,500	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	Retiro
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																															
El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																															
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																															
Firma  MAURICIO PULIDO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S																Firma  MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS INGENIERO SUPERVISOR Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE																															
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																															

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Yopal, 26 de agosto de 2022

CERTIFICADO

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **MULTIOBRAS DE LA ORINIQUIA SAS** identificado(a) con Nit numero **901005671** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS 026 PERSONA JURIDICA	36300003046	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA**.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6334656 ext 140 en nuestra sucursal Yopal Principal Ubicada en la Carrera 19 N° 7-59.

Atentamente.

BANCOLOMBIA
Yopal - Of. 363 Yopal

Asesor de servicios N° 357
Código 11881522
Merly Karina Rojas L.

Asesor Comercial Multisegmentos

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.


En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14835830162



(415)7707212489984(8020) 000001483583016 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 5 6 7 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 18 46

42. Correo electrónico

gerenciamultiabrasorinoquia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 4 1 4 5 5 1

45. Teléfono 2

6 3 2 8 6 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 8 3 0

Actividad secundaria

48. Código

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 8 3 0

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3 4 2 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 07 - 01 / 08 : 50: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre CHAPARRO BARRERA CAMILO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14835830162



(415)7707212489984(8020) 000001483583016 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 5 6 7 1 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 1 6 0 8 3 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 6 0 9 0 1

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 1 2 3 6 9 8

78. Departamento

8 5

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14835830162



(415)7707212489984(8020) 000001483583016 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 6 7 1 3 Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 1 0 7 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 9 5 2 5 5 2 6		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PULIDO	105. Segundo apellido	106. Primer nombre MAURICIO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 7 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 9 5 2 4 4 4 3		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido FONSECA	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre JAVIER		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14835830162



(415)7707212489984(8020) 000001483583016 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 0 0 5 6 7 1 3

Impuestos y Aduanas de Yopal

4 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 5 2 4 4 4 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido FONSECA	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre JAVIER	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 7 0 1	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

FECHA
04 - SEP - 2023

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2400 DE 2023

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° NA

INTERVENTOR N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2023	795023 (11-JUL-2023)	ADQUISICIÓN Y DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 75.327.000,00	\$ 903.924,00
TOTAL						\$ 75.327.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 75.327.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$ 13.672.800,00	\$ 2.597.832,00	\$ 16.270.632,00	N.A	\$ 16.270.632,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ 59.056.368,00	\$ 59.056.368,00				
2	PARCIAL	1 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$ 48.867.600,00	\$ 9.284.844,00	\$ 58.152.444,00	N.A	\$ 58.152.444,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ 903.924,00	\$ 903.924,00				
3 y Final	PARCIAL	1 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 759.600,00	\$ 144.324,00	\$ 903.924,00	N.A	\$ 903.924,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ -	\$ -				
TOTALES			\$ 63.300.000,00	\$ 12.027.000,00	\$ 75.327.000,00	N.A	\$ 75.327.000,00	N.A	\$ - \$ -						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 63.300.000,00	\$ 12.027.000,00	\$ 75.327.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 63.300.000,00	\$ 12.027.000,00	\$ 75.327.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
INGENIERO SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 - 77804 CND
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.
