

CONSTRUCCIONES MACARES SAS

NIT: 901178879-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

FCA SANTA BARBARA UNO VEREDA SIATOCA ABAJO, Chivatá, Boyacá, Colombia

Tel. 7455051

Email. macaresfo@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764060595346 válida desde 2023-11-24 hasta 2025-05-24 rango desde FE59 hasta FE100.

Cliente:

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT :

891802089

Dirección:

CL 8 6 48 BRR CENTRO, Cucaita, Boyacá, Colombia

Teléfono:

6087340127

Email:

contactenos@cucaita-boyaca.gov.co

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Instrumento no definido

Fecha de Pago:

13/06/2024

Total de Líneas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE68

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

13:43:05

FECHA FIRMADO:

13/06/2024 13:43:08

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	06	2024	13	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	42	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Alquiler de maquinaria amarilla con destino al mejoramiento de las vías rurales del municipio de Cucaita - Boyacá	WSD	1,00	\$11.272.000,00	IVA	19%	\$2.141.680,00	0.00	\$11.272.000,00

Subtotal:

\$11.272.000,00

Cargos:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

IVA:

\$2.141.680,00

Total:

\$13.413.680,00

tas:

SON: (trece millones cuatrocientos trece mil seiscientos ochenta pesos)

CUFE: 9c355a212effdd1713a9dc263ae52d1acc622714a06c40ba979e80f6b347482a8671e825a78b4ae711c4b00a01983a79


IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$11.272.000,00	19,00%	\$2.141.680,00

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA DE AHORROS 88294064812 A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES MACARES SAS

Firma Digital: SZ7gy986ZdaMA3uFtguHKJbTi6NZyYbLe7E37el+1Z9nvoPHXtcg69YgR6F+woMB
T+ROp3LvzApa dFPBCrggzyMyzN80x1P1zB1VZvvyWvjpc+9lt
uPMqTsD+GwEnQe +11RE3mybL0IK+DZzs+8uhhNT6DLKTghzSplDztVA+PoVOp9bsKlwabpM20M1b eEgXeM7uY1pRik4oUFCQpJ9ogKWCvKda0Kb6B
3QrRi91G7TjXSuiJWymQ6uJuing kGCqIfGIBOUzO6inuIgtgXwHhW3sesJCecMICgQlv6g//CPGXMT3EFqRp65Leb aQLCii94Bw7aSS0WgCf
1w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901178879	1	CONSTRUCCIONES MACARES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 68 8-59	TUNJA-BOYACA	7428772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	94580738	9468539562	E	2024/06/21	2024/06/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1,531,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$4,270,000	\$683,200			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$394,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$4,270,000	\$683,200			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$394,800		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$4,270,000	\$683,200			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$394,800		\$0	\$0	
1	CC 6761947	CARDENAL JOSE		0	\$0	\$0	EPS005	JOSE	\$1,400,000	\$56,000	CCF10	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$97,500	30	\$0	\$0	
2	CC 4080221	ESPINOSA CARLOS	230301	30	\$1,800,000	\$72,000	EPS037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF10	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0	
3	CC 7177908	RODRIGUEZ LUIS	230301	27	\$1,170,000	\$46,800	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF10	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$81,500	27	\$0	\$0	
4	CC 6776247	VARGAS JOSE	231001	30	\$1,300,000	\$52,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(4)					\$4,270,000	\$683,200			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$226,800			\$5,670,000	\$394,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901178879	1	CONSTRUCCIONES MACARES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 68 8-59	TUNJA-BOYACA	7428772	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	94580738	9468539562	E	2024/06/21	2024/06/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1.531.600


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$683,200	\$0	\$0	\$683,200
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301		800,224,808	8	2	\$475,200	\$0	\$0	\$475,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$394,800	\$0	\$0	\$394,800
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	4	\$394,800	\$0	\$0	\$394,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$226,800	\$0	\$0	\$226,800
COMFABOY	CCF10		891,800,213	8	4	\$226,800	\$0	\$0	\$226,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$226,800	\$0	\$0	\$226,800
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	2	\$118,800	\$0	\$0	\$118,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
TOTAL					4	\$1,531,600	\$0	\$0	\$1,531,600

INFORME DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA


Dia	Maquina	Horometro inicial	Horometro final	Total horas
05/06/2024	Motoniveladora	2333.2	2343.8	10.6
	Vibrocompactador	2333.9	2338.1	4.2

Se cuneteo, perfiló, se extendió material de recebo y se compacto en la vía del sector de la hacienda del rosario hasta la casa del señor Oscar Gómez en la vereda de Chipacata.

- Horometro inicial vibrocompactador.
- Horometro final motoniveladora.


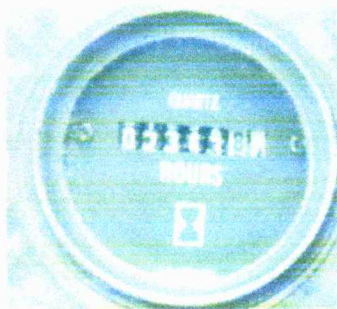


- Horometro inicial motoniveladora.

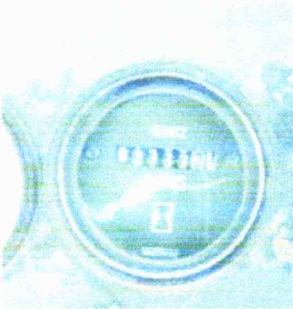

- Horometro final vibrocompactador.



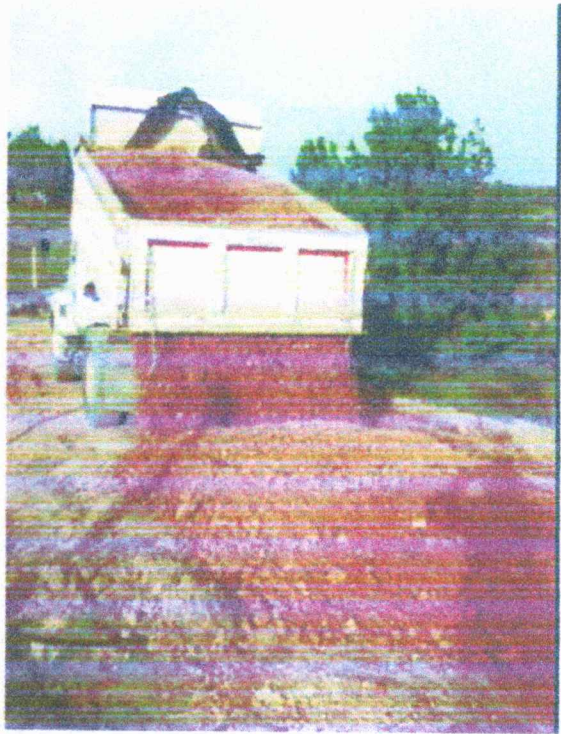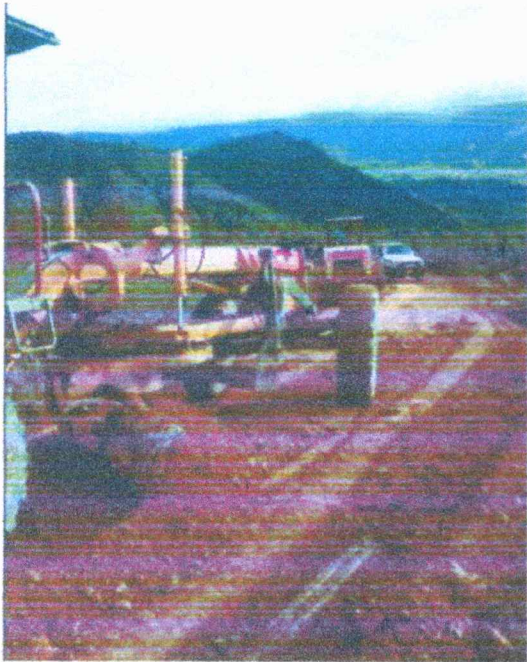



Día	Maquina	Horometro inicial	Horometro final	Total horas
06/06/2024	Motoniveladora	2343.8	2354.2	10.4
	Vibrocompactador	2338.1	2346.2	8.4

Se cuneteo, perfiló, se extendió material de recebo y se compacto de la casa del señor Oscar Gómez hasta el sector de las cruces vereda de Chipacata en el municipio de Cucaita Boyacá.

- Horometro inicial vibrocompactador.
- Horometro final motoniveladora.






- Horometro inicial motoniveladora.

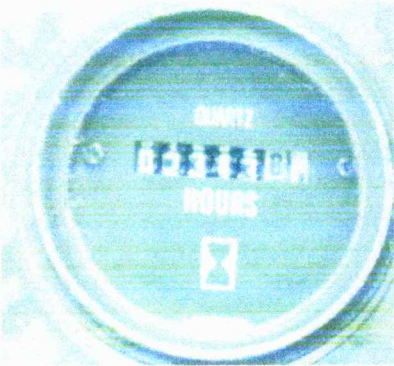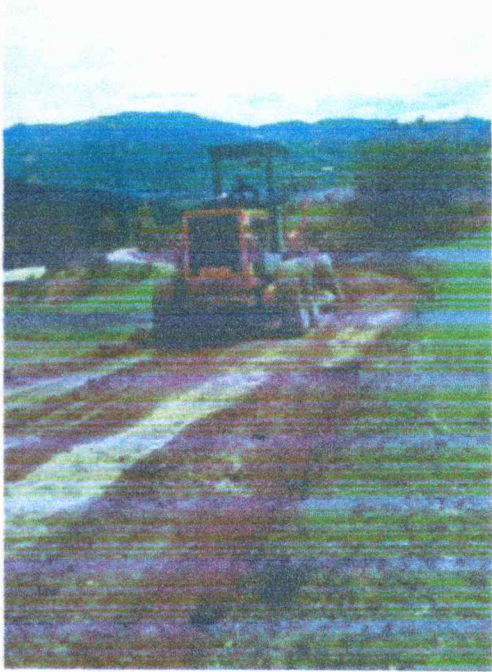

- Horometro final vibrocompactador.



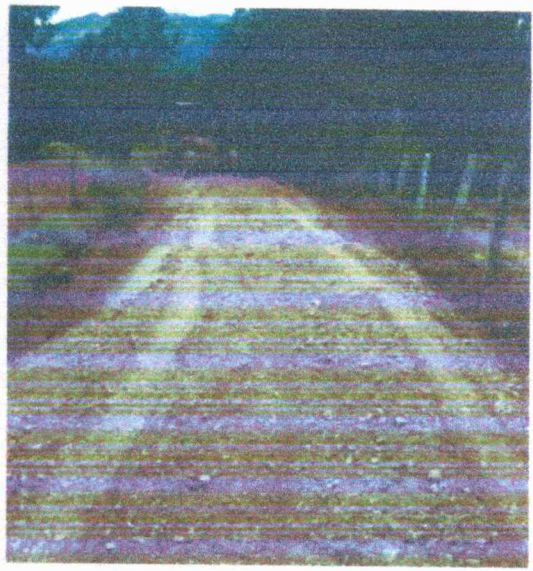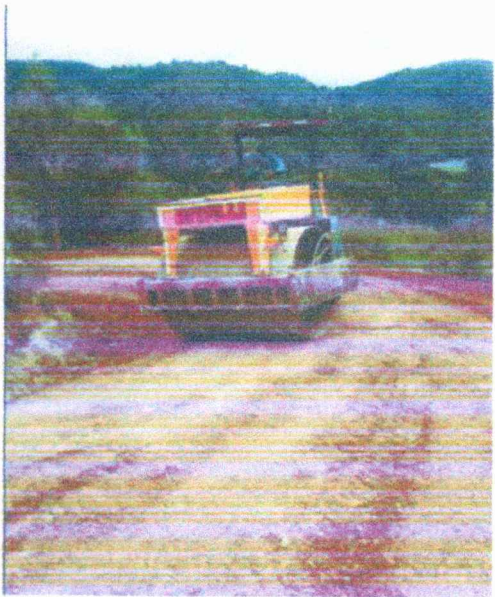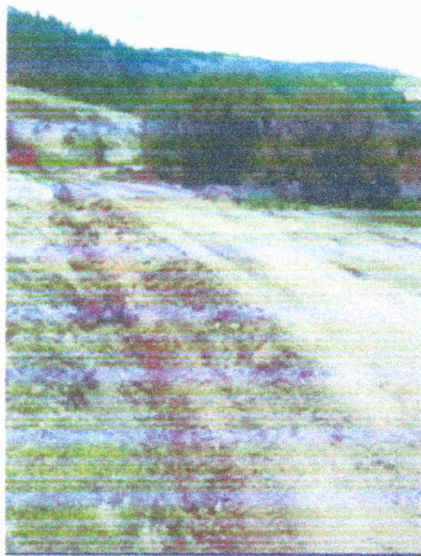


Dia	Maquina	Horometro inicial	Horometro final	Total horas
07/06/2024	Motoniveladora	2354.2	2365.3	11.1
	Vibrocompactador	2346.2	2355.2	9

Se cuneteo y se perfiló de la casa del señor Oscar Gómez hasta el sector de las cruces vereda de Chipacata en el municipio de Cucaita Boyacá, se trabajó con vibro compactador de la hacienda del Rosario al culio las cruces de la vereda de Chipacata.

- Horometro inicial vibrocompactador.



- Horometro final motoniveladora.

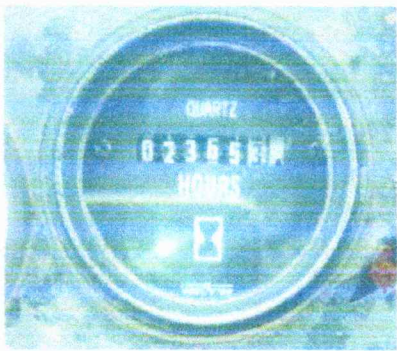


- Horometro inicial motoniveladora.



Horometro final vibrocompactador.



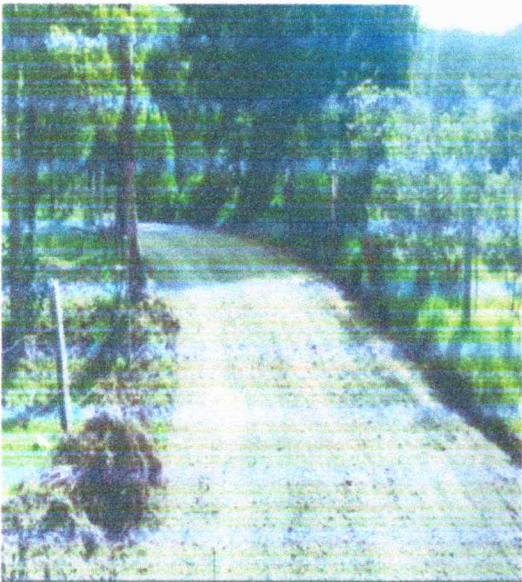

Dia	Maquina	Horometro inicial	Horometro final	Total horas
08/06/2024	Motoniveladora	2365.3	-	-
	Vibrocompactador	2355.2	2364.2	9

Se cuneteo se perfiló se extendió y se compacto material de recebo en la vía del sector de las cruces de la vereda de Chipacata hasta el sector de la baticola de la vereda de Iluviosos del municipio de Cucaita Boyacá.


- Horometro inicial vibrocompactador.



- Horometro final motoniveladora.



- Horometro inicial motoniveladora.

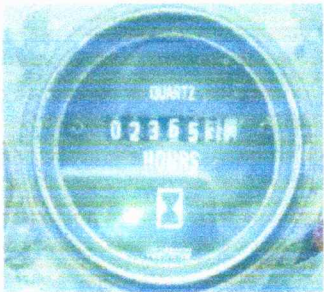

- Horometro final vibrocompactador.





Dia	Maquina	Horometro inicial	Horometro final	Total horas
11/06/2024	Motoniveladora	2365.3	2380.1	14.8
	Vibrocompactador	2364.2	2374.3	10.1

Se cuneteo y perfiló la vía del sector de las cruces de la vereda de Chipacata hasta los límites con el municipio de Samacá Boyacá.


- Horometro inicial vibrocompactador.



- Horometro final vibrocompactador.



- Horometro final motoniveladora.

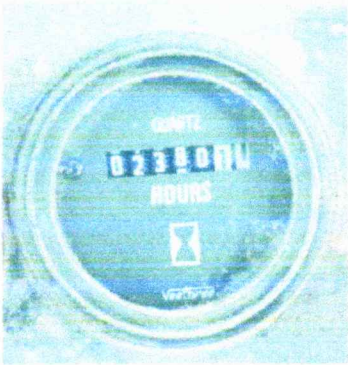



Atentamente:

Carlos Julio Espinosa Fonseca, Representante legal.

CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S.

NIT. 901178879-1.

Cel. 3144139769.

	ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA		
	NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1.0		F-CP-07	20-04-2021
ORDEN DE PAGO			Página 1 de 1

Cucaita, 21 de junio de 2024

Doctora
NELSY JOHANA BORDA NIÑO
Secretaria de Hacienda Cucaita

Respetada Doctora,

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$13.413.680,00) M/CTE, a CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S CON NIT 901.178.879-1 representado legalmente por CARLOS JULIO ESPINOSA FONSECA con numero de cedula 4.080.221 de Ciénega, por concepto de contrato No. MC-CMC-016-2024, cuyo objeto es "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ".

Sin otro particular,

Atentamente,

ING. MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIPAL

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ	ING. MARCOS DANIEL BORDA PARRA
CARGO	Apoyo Secretario De Planeación	Secretario De Planeación	Alcalde municipal

OK

	ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA		
	NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1.0	F-CP-01	20-04-2021
	SUPERVISIÓN		Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-016-2024

OBJETO

“ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ”.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S
NIT: 901.178.879-1
CARLOS JULIO ESPINOSA FONSECA
CC. 4.080.221 de Ciénega

SUPERVISOR

LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
Secretario de planeación

MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ
21 DE JUNIO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión resume las actividades ejecutadas en el marco del **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-016-2024**, cuyo objeto es: **“ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ”**. y el cual contiene los diferentes aspectos técnicos y de ejecución contratados.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

“ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

“ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ”.

ITEM	ITEM DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL SIN INCLUIR IVA
1.1	Motoniveladora (Potencia mínima 120 hp y máximo 250 hp)	HORA	45	\$ 167.200,00	\$ 31.768,00	\$ 7.524.000,00
1.2	Vibrocompactador (Igual o mayor a 7 TN, rodillo compactador)	HORA	40	\$ 93.700,00	\$ 17.803,00	\$ 3.748.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA						\$ 11.272.000,00
VALOR DE IVA						\$ 2.141.680,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						\$ 13.413.680,00

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S
	NIT: 901.178.879-1
	R/L: CARLOS JÚLIO ESPINOSA FONSECA
	CC. 4.080.221 Ciénega
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	125 – DE 12 DE MARZO DE 2024
	5363 24.02.0600 - Vía terciaria mejorada - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	380 DE 29/04/2024
	5360 24020600 1.2.1 - Vía terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada.
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$13.413.680,00) M/CTE
PLAZO/ DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES y/o hasta agotar presupuesto contados a partir de LUGAR DE EJECUCIÓN GARANTÍAS la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecución del contrato
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Veintinueve (29) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	SEIS (06) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2024

3.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Dentro de las actividades asignadas en el contrato se ejecutaron para el presente periodo las siguiente: Alquiler motoniveladora (potencia mínima 120 hp y máxima) Hp y vibro compactador (igual o mayor a 7 TN) Rodillo compactador.

4. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

FECHA	HITO DEL PROCESO	ANEXO/DESCRIPCIÓN
12/03/2024	EXPEDIR CDP	No. 126
18/04/2024	ANÁLISIS DEL SECTOR	Ver anexos
18/04/2024	ESTUDIOS PREVIOS	Ver anexos
29/04/2024	CONTRATO	Ver anexos
06/06/2024	ACTA DE INICIO	Ver anexos
17/06/2024	ACTA DE RECIBO FINAL	Ver anexos
21/06/2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Ver anexos

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	ITEM DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL SIN INCLUIR IVA
1.1	Motoniveladora (Potencia mínima 120 hp y máximo 250 hp)	HORA	45	\$ 167.200,00	\$ 31.768,00	\$ 7.524.000,00
1.2	Vibrocompactador (Igual o mayor a 7 TN, rodillo compactador)	HORA	40	\$ 93.700,00	\$ 17.803,00	\$ 3.748.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA						\$ 11.272.000,00
VALOR DE IVA						\$ 2.141.680,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						\$ 13.413.680,00

Dentro de los informes de los contratistas presentan registro fotográfico de las actividades realizadas y la cantidad del tiempo de ejecución del contrato.





6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	\$13.413.680,00
	* APORTE ALCALDÍA	\$ 00,00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	\$ 00,00
2	VALOR ADICIONADO	\$ 00,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$13.413.680,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$13.413.680,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 00,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	\$13.413.680,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	\$ 00,00

*Aplica solo para convenios.

7. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Se evidencia que el Contratista CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S, identificado NIT: 901.178.879-1, representado legalmente por CARLOS JULIO ESPINOSA FONSECA, con numero de cedula 4.080.221 Ciénega, viene cancelando lo correspondiente a seguridad social y aportes parafiscales, según planilla de pago adjunta al proceso contractual, verificado.

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Seis (06) de junio de 2024 hasta el diecisiete (17) de junio de 2024
	Fecha de pago	2024/06/20
	Nº de Planilla	9468539562
	Ingreso Base de Cotización	5.670.000,00
	Valor cotizado	226.800
	EPS	nueva eps,
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Seis (06) de junio de 2024 hasta el diecisiete (17) de junio de 2024
	Fecha de pago	2024/06/20
	Nº de Planilla	9468539562
	Ingreso Base de Cotización	\$4.270.000
	Valor cotizado	\$683.200
	Fondo de Pensiones	porvenir
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	Seis (06) de junio de 2024 hasta el diecisiete (17) de junio de 2024
	Fecha de pago	2024/06/20
	Nº de Planilla	9468539562
	Ingreso Base de Cotización	3.806.667

APORTE A CCF	Valor cotizado	265.100
	A.R.L.	SURA
	Periodo de cotización	Seis (06) de junio de 2024 hasta el diecisiete (17) de junio de 2024
	Fecha de pago	2024/06/20
	Nº de Planilla	9468539562
	Ingreso Base de Cotización	5.670.000,00
	Valor cotizado	226.800
PARAFISCALES	CCF	CONFABOY
	SENA	
	I.C.B.F.	
	COMFENALCO	

Es de aclarar que se anexa certificación por el contador del consorcio donde se indica que está al día en pagos de seguridad social, ARL y cajas de compensación familiar.

8. ANEXOS


Se anexan las correspondientes evidencias de la ejecución del contrato como lo son:

- Planillas de seguridad social
- Informe de contratista.
- RUT del contratista.
- Pólizas y aprobación de pólizas.
- Facturación electrónica.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se ejecutaron las actividades.
2. El contrato tuvo una ejecución del 100%.
3. El contratista da cumplimiento para el acta final y recibido a satisfacción del Seis (06) de junio de 2024 hasta el diecisiete (17) de junio de 2024, donde se contempla el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas.

El presente informe se firma a los veintiún (21) días del junio de 2024.


LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación
Supervisor del Contrato

	PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
CARGO	Apoyo Secretario de Planeación	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDIA MUNICIPAL CUCAITA		
	NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1.0		F-CP-21	20-04-2021
ACTA DE RECIBO FINAL			Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. MC-CMC-016-2024

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2024
OBJETO	“ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ”.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S NIT: 901.178.879-1 R/L: CARLOS JÚLIO ESPINOSA FONSECA CC. 4.080.221 Ciénega
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	125 – DE 12 DE MARZO DE 2024 5363 24.02.0600 - Vía terciaria mejorada - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	380 DE 29/04/2024 5360 24020600 1.2.1 - Vía terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada.
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$13.413.680,00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES y/o hasta agotar presupuesto contados a partir de LUGAR DE EJECUCIÓN GARANTÍAS la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecución del contrato
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Veintinueve (29) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	SEIS (06) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Cumple.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

En Cucaita, a los diecisiete (17) días Del mes Junio DE Dos Mil Veinticuatro (2024) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO No. MC-CMC-016-2024**.

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	\$13.413.680,00
	* APOORTE ALCALDÍA	\$ 0,00
	* APOORTE ENTIDAD CONVENIENTE	\$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	\$ 0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$13.413.680,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$13.413.680,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	\$13.413.680,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	\$ 0,00

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto,

	ALCALDIA MUNICIPAL CUCAITA		
	NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1.0		F-CP-21	20-04-2021
ACTA DE RECIBO FINAL			Página 2 de 2

se procede a cancelar la presente acta, y evidenciando las actividades realizadas en el siguiente cuadro.

ITEM	ITEM DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL SIN INCLUIR IVA
1,1	Motoniveladora (Potencia mínima 120 hp y máximo 250 hp)	HORA	45	\$ 167.200,00	\$ 31.768,00	\$ 7.524.000,00
1,2	Vibrocompactador (Igual o mayor a 7 TN, rodillo compactador	HORA	40	\$ 93.700,00	\$ 17.803,00	\$ 3.748.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA						\$ 11.272.000,00
VALOR DE IVA						\$ 2.141.680,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						\$ 13.413.680,00

En constancia se firma a los diecisiete (17) días Del mes Junio DE Dos Mil Veinticuatro (2024)


CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S
NIT: 901.178.879-1
R/L: CARLOS JÚLIO ESPINOSA FONSECA
CC. 4.080.221 Ciénega


LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ	LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
CARGO	Apoyo Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas
