

 ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
------------------------	------------------------------------

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-------------------------	-------------------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-124-2025
--------------------	---------------------

OBJETO	GARANTIZAR EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL MONITOREO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA ESTACIÓN REPETIDORA
---------------	--

NOMBRE CONTRATISTA	FABIO JOSE PARRA GARCIA
---------------------------	--------------------------------

FECHA DEL CONTRATO	6-mar-25
---------------------------	----------

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
---------------------------	-----

PRORROGA	90
-----------------	----

VALOR INICIAL	\$ 16.200.000,00
----------------------	------------------

VALOR ADICIÓN	\$ 8.100.000,00
----------------------	-----------------

FECHA INICIO	6-mar-25
---------------------	----------

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5-sep-25
-------------------------------------	----------

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	5-dic-25
-----------------------------------	----------

INTERVENTOR	ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
--------------------	-----------------------------

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	270
---------------------------	-----

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	265
----------------------------------	-----

AVANCE PORCENTUAL	98%
--------------------------	-----

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.300.000,00
--------------------	------------------

VALOR EJECUTADO	\$ 23.850.000,00
-----------------	------------------

PORCENTAJE EJECUTADO	98%
----------------------	-----

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE
--

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO 1	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00
PAGO 2	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 3	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 4	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 5	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 6	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 7	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 8	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
		\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 21.150.000,00	\$ 21.150.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.150.000,00	

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS



2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Revisión y mantenimiento de los equipos de televisión del canal institucional y señal Colombia.	8	\$ 2.700.000	20%
Revisión y mantenimiento de los equipos de televisión de Canal Uno y Teleantioquia.	8		20%
Acompañar y apoyar todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento de los equipos y dispositivos de comunicación que se encuentren ubicadas en la Estación repetidora del municipio.	18		44%
Apoyar las actividades de conservación de las zonas verdes y físicas de la estación repetidora.	7		17%
Las demás actividades concertadas con el supervisor del contrato, en competencia al objeto contractual y de las actividades propias del buen funcionamiento de los equipos de comunicación que se encuentran ubicadas en la estación repetidora del municipio.	-		0%
TOTAL	41		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
--

Certificar el cumplimiento de la seguridad social por el mes de noviembre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

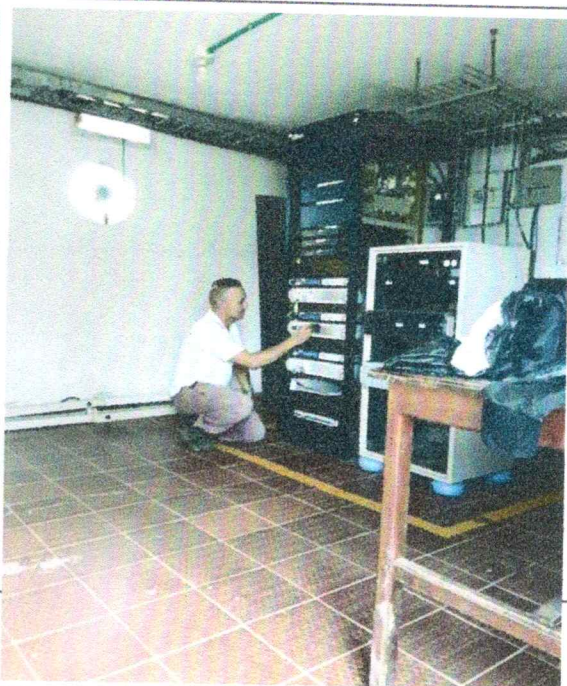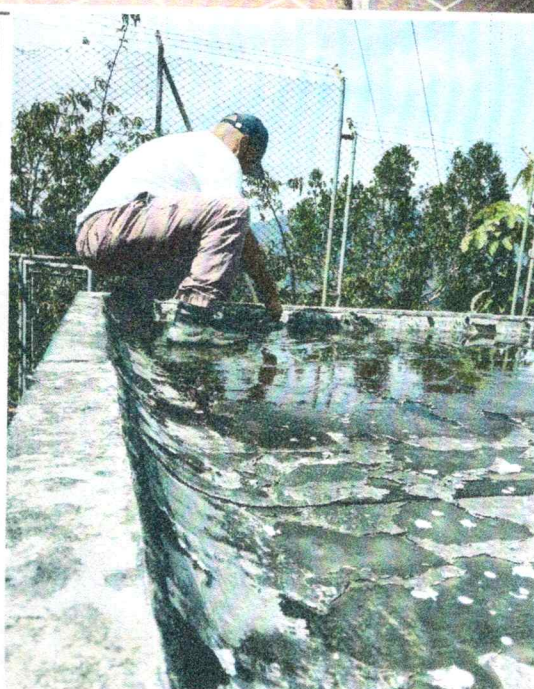

Andrés Felipe Hoyos Jiménez

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
AINTERVENTOR
