



ALCALDÍA MUNICIPAL
San Carlos, Antioquia

INFORME DE SUPERVISION

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

01

30/01/2016

PERIODO DE PAGO

DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025

TIPO DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO

CPS-124-2025

OBJETO

RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA A TRAVES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

NOMBRE CONTRATISTA

FABIO JOSE PARRA GARCIA

FECHA DEL CONTRATO

6-mar-25

PLAZO DE EJECUCIÓN

180

PRÓRROGA

N/A

VALOR INICIAL

\$ 16.200.000,00

VALOR ADICIÓN

N/A

FECHA INICIO

6-mar-25

FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL

5-sep-25

FECHA DE TERMINACIÓN
FINAL

N/A

INTERVENTOR

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN

180

TIEMPO TOTAL
TRANSCURRIDO

175

AVANCE PORCENTUAL

97%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO \$ 16.200.000,00

VALOR EJECUTADO \$ 15.750.000,00

PORCENTAJE EJECUTADO 97%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO 1	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00
PAGO 2	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 3	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 4	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
PAGO 5	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 13.050.000,00	\$ 13.050.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.150.000,00	

2. INFORME DEL CONTRATO**2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO**

MUNICIPIO DE SAN CARLOS



2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
institucional y señal Colombia.	5	\$ 2.700.000	12,82%
Uno y Teleantioquia.	3		7,69%
funcionamiento de los equipos y dispositivos de comunicación que	19		48,72%
de la estación repetidora.	12		30,77%
en competencia al objeto contractual y de las actividades propias	-		0,00%
TOTAL	39		100,00%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social por el mes de AGOSTO de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

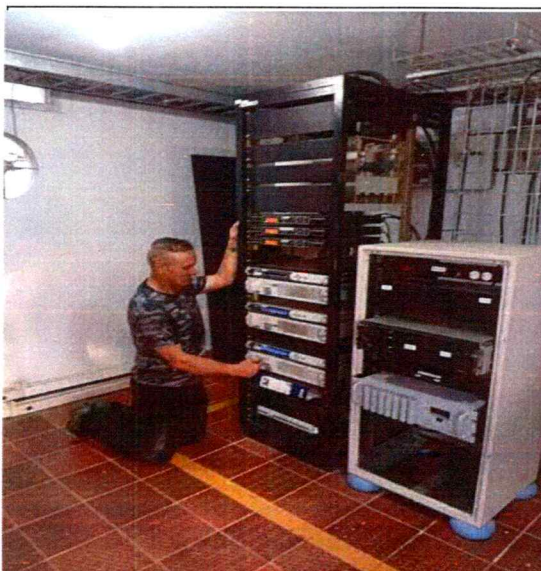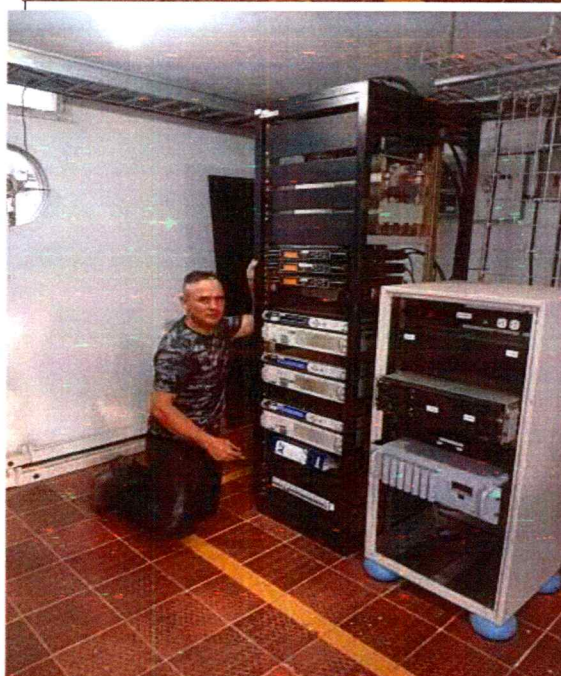



LFVLJ

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
FIRMA INTERVENTOR
