



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

Periodo 01 de enero al 31 de enero de 2024

**PUERTO ESCONDIDO
LOS CÓRDOBAS**



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4858 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS.

ENERO DE 2024

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los CórdobaS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Objeto del Proyecto	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías terciarias de los municipios de Puerto Escondido y Los CórdobaS.		
Contrato Interventoría	No. 4858 de 2023		
Interventor	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS		
Contratistas	OAC San José de Canalete OAC Martinez OAC Villa Esther OAC Morindo Santa Cruz	4313-2023 4081-2023 4122-2023 4578-2023	

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0	Versión original	Diciembre de 2023

	Nombre	Firma
Elaboró		
Revisó		
Aprobó		

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO

VERSION

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: Enero de 2024

FECHA: 31/01/2024
(Dia / Mes / AÑO)

CONVENIO No.: 4813 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALETE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PLAZO PRORROGADO: 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL: \$ 200.508.096.00

VALOR ADICIONALES: \$

VALOR ACUMULADO: \$ 200.508.096.00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

MANO DE OBRA GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Polideportivo de San José de Canalete. Inicio de socialización de proyecto.

Polideportivo de San José de Canalete. Desarrollo de la socialización.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

Polideportivo de San José de Canalete. Culminación de la socialización.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div></div> <div>Firma Nombre NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2520276797 CND</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PAGINA

FECHA31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Enero de 2024

CONVENIO No.: 4081 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN: 18 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : \$ 200.686.487,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 200.686.487,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: -

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Martinez. Inicio de socialización de proyecto.

Vereda Martinez. Desarrollo de la socialización.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

	Foto 4
Vereda Martínez. Culminación de la socialización.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
Firma Nombre NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2520276797 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:CORDOBA

PERIODO MES:Enero de 2024

CONVENIO No.:4122 - 2023

OBJETO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:4858 - 2023

INTERVENTOR:VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

PLAZO INICIAL:HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:20 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN:18 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO:4 MESES

VALOR INICIAL:\$200.688.487,00

VALOR ADICIONALES:\$-

VALOR ACUMULADO:\$200.688.487,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO:\$-

DESEMBOLSO AMORTIZADO:\$-

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$-

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

Corregimiento Villa Esther. Inicio de socialización de proyecto.

Corregimiento Villa Esther. Desarrollo de la socialización.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

	Foto 4
Corregimiento Villa Esther. Culminación de la socialización.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div></div><div>Firma NombreNELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.2520276797 CND</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PAGINA

FECHA31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Enero de 2024

CONVENIO No.: 4578 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : \$ 200.522.623,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 200.522.623,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: -

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Morindo Santa Cruz. Inicio de socialización

Vereda Morindo Santa Cruz. Desarrollo de socialización

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

	Foto 4
Vereda Morindo Santa Cruz. Culminación de la socialización	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div></div><div>Firma Nombre Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2520276797 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>	

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	15
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	16
2.1. LOCALIZACIÓN.....	16
2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	16
2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS	17
2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	18
2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	18
2.2.2. VEREDA MARTINEZ	19
2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	20
2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	21
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS.....	23
2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	24
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	26
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	26
3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS.....	29
3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	29
3.2.2. VEREDA MARTINEZ	30
3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	31
3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	32
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	33
3.4. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	33
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	34
4.1. RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	34
4.10. INFORMES SEMANALES.....	34
4.11. ACTAS DE COMITÉ.....	35
4.12. ACTAS DE REUNIÓN	35
5. CONCLUSIONES.....	35
6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	36

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido	17
Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.....	18
Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.....	19
Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martinez.....	20
Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther.	21
Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.	22
Ilustración 7. Espesores de la placa huella.....	24
Ilustración 8. Detalles técnicos de diseño de la placa huella (Cartilla de INVÍAS).	25
Ilustración 9. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.....	29
Ilustración 10. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez.	30
Ilustración 11. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.	31
Ilustración 12. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.	32

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete. 27

Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez..... 27

Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther. 27

Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz..... 28

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.	23
Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martinez.....	23
Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.....	24
Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.....	24
Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.....	25
Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.	26

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, adelantó el programa de Obra Pública denominado “CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”, considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte entre veredas y corregimientos, se constituye en una de las principales estrategias a adelantar.

La política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

En este sentido, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios interadministrativos con el municipio de Puerto Escondido del Departamento de Córdoba cuyo objeto es *“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS DIFERENTES JUNTAS DE ACCION COMUNAL SELECCIONADAS DENTRO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”*, para que a través de las juntas de acción comunal se adelantaran los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública con el fin de que las juntas de acción comunal realicen la ejecución de las obras consistentes en el *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, LA VEREDA MARTINEZ, EL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Y LA VEREDA MORINDO DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” (La subraya no es del texto)

Por lo anterior y con el fin de realizar las labores de control y seguimiento, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, adjudicando la Interventoría a VANEGAS DUMAR INGENIERIAS SAS, mediante contrato No 4858 de 2023, y quien realizará la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. Bajo el marco anterior a continuación se presenta control y seguimiento de los convenios No 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, el Municipio de Puerto Escondido y el municipio de Los Córdoba.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las administraciones de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Martínez, Villa Esther y Morindo Santa Cruz, del municipio de Puerto Escondido y Los Córdoba, aplicaron al programa de CAMINOS COMUNITARIO PARA LA PAZ TOTAL, con el fin de mejorar sus redes viales terciarias, razón por la cual se celebran los convenios No. 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, con el Instituto Nacional de Vías “INVIAS”.

Cabe resaltar que los convenios al ser de menor cuantía, las juntas de acción comunal deberán desarrollar el objeto los convenios en las vías terciarias ubicadas en cada zona de influencia correspondiente, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

Por lo anterior se realiza un proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, para adjudicar el contrato No 4858 de 2023, con el fin de seleccionar la interventoría, que se encargara de la adecuada vigilancia, control de las actividades consistentes y cumplimiento satisfactorio de cada uno de los convenios anteriormente mencionados.

Se establecen las siguientes fechas de inicio 19 de diciembre de 2023, 12 de diciembre de 2023, 20 de diciembre de 2023 y 2 de diciembre de 2023, correspondiente a los anteriores No de contratos. Para veracidad de lo anterior, estos documentos se anexarán en el presente informe.

2.1. LOCALIZACIÓN

2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO

Puerto Escondido es un municipio de Colombia perteneciente al departamento de Córdoba. Se encuentra ubicado a 62 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba. La principal actividad económica es la agricultura, y los productos que se cultivan en la región son: el plátano, el maíz, el arroz, el coco y los tubérculos (ñame y yuca). La segunda actividad económica en nivel de importancia del municipio es la ganadería, y luego la pesca, el comercio y la actividad turística, ya que en Puerto Escondido aproximadamente 1.135 personas dependen de las temporadas turísticas. No se puede dejar a un lado el gremio de artesanos, que son aproximadamente 30 familias que se dedican a esta actividad. El municipio tiene una extensión de 417 km² y posee 27 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe de los cuales solo 2.49 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana y 414.51 kilómetros cuadrados de zona rural por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Puerto Escondido se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 9°01'09"N

Longitud: 76°15'41"O

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		



Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido

2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS

Los Córdoba es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento de Córdoba. Se encuentra a una distancia 57 km de la capital departamental, Montería. Predominan las actividades económicas primarias como la ganadería, la agricultura y la pesca artesanal, predomina el cultivo del plátano, aunque en los últimos años se aprecia un crecimiento de la actividad turística. Tiene una extensión total de 430 Km cuadrados de los cuales solo 5,20 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Los Córdoba se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°53'43"N

Longitud: 76°21'17"O

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

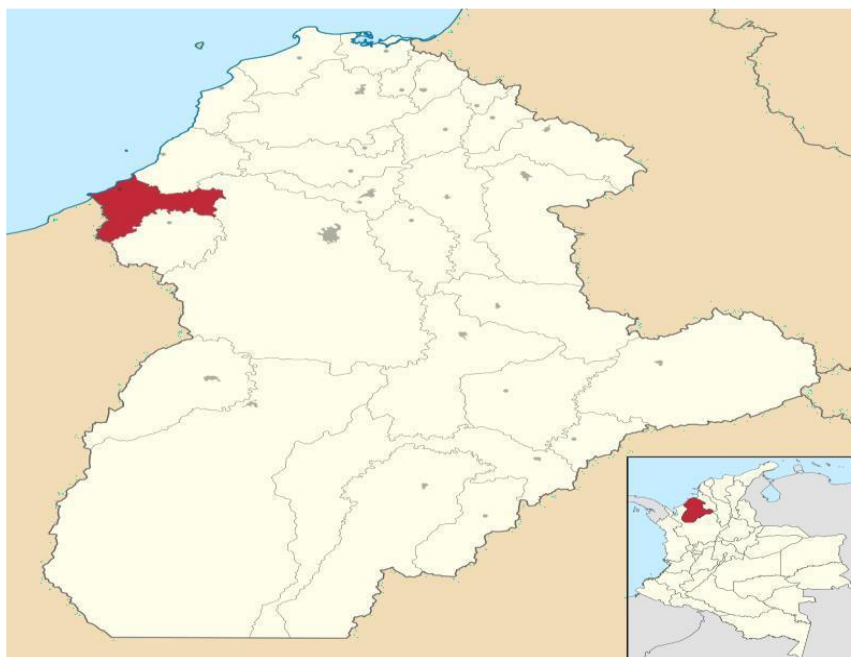


Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.

En ambos municipios las condiciones actuales de las vías rurales no son las óptimas, esto se da por la falta de intervención y la alta pluviosidad que se manifiesta en la zona, donde no se cuenta con cunetas ni obras hidráulicas que permitan controlar el factor erosionante provocado por la escorrentía del agua, siendo los nativos de estas zonas los que diariamente tienen que enfrentarse a las congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje que implica una limitación al derecho a la libre circulación, dando como consecuencia la baja comercialización de productos y afectando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos. Se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud, también inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios afectando el derecho a la educación, junto con un incremento de los precios de los productos de la región debido al aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros.

2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Las zonas de influencia directa de los proyectos, son las jurisdicciones territoriales de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Vereda Martinez, Villa Esther y Morindo de Santa Cruz.

2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Para poder ingresar al tramo a intervenir, debemos partir de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo dos punto ochenta y dos (2.82) kilómetros en dirección hacia el cruce ruta 74, por la vía nacional código 74CR08 INVIAS Puerto Escondido - Cruce Ruta 74, hasta llegar al PR2+820, para luego tomar dirección sur por la vía terciaria que conduce al corregimiento San José de Canalete.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

En el mencionado punto a 3 kilómetros, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°58'8.8"N y Longitud: 76°15'43.4"W; con punto de referencia final en el PR3+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°56'49.1"N y Longitud: 76°15'57.9"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

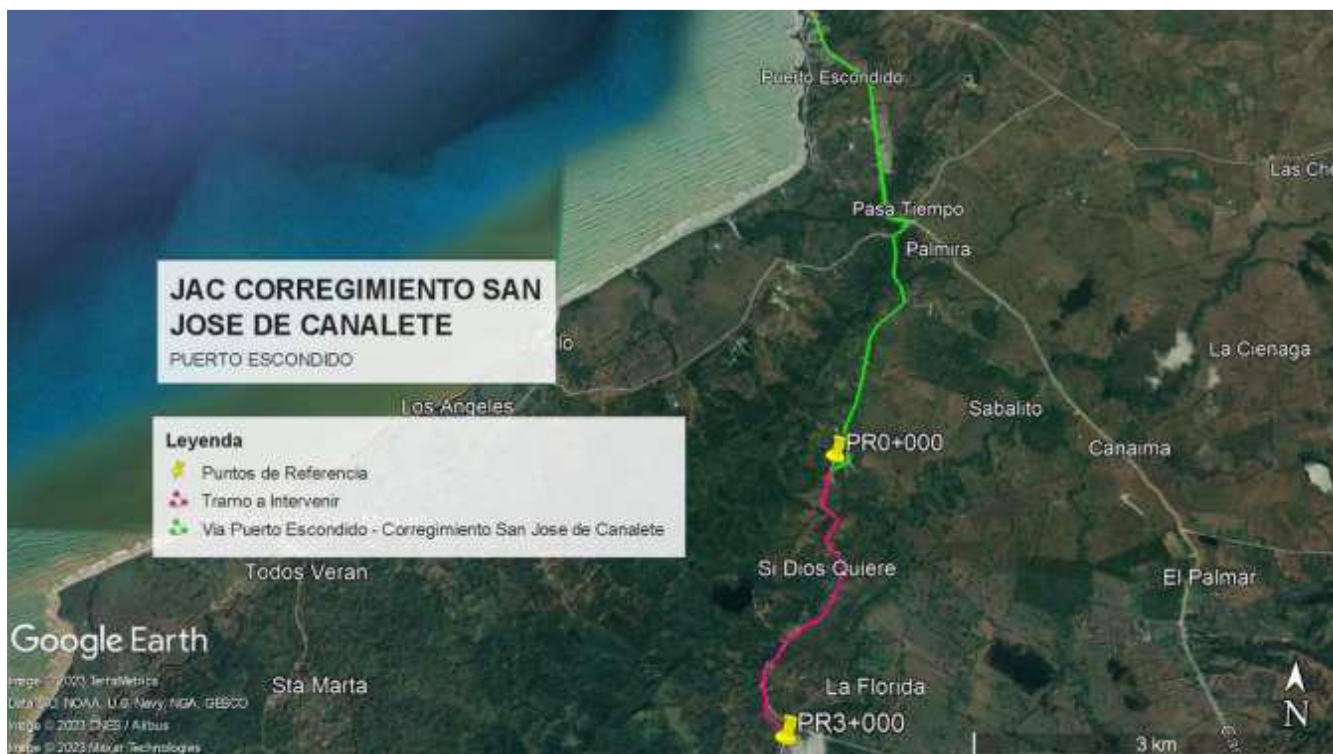


Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.

2.2.2. VEREDA MARTINEZ

En el caso de esta OAC, para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8.2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo ocho punto cinco (8.5) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, hasta la vereda Martínez.

En el mencionado punto, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'51.9"N y Longitud: 76°9'40.5"W; con punto de referencia final en el PR0+811 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°9'27.1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martínez.

2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Puerto Escondido del departamento de Córdoba, en el Corregimiento Villa Esther. Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8,2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo catorce punto seis (14,6) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, en la intersección dirección norte recorriendo uno punto catorce (1,14) kilómetros, encontramos la vía terciaria que conduce a la vereda Villa Esther .

En el mencionado punto, se ubica el PR1+700 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°3'39"N y Longitud: 76°7'48.2"O; con punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°7'35.5"O, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

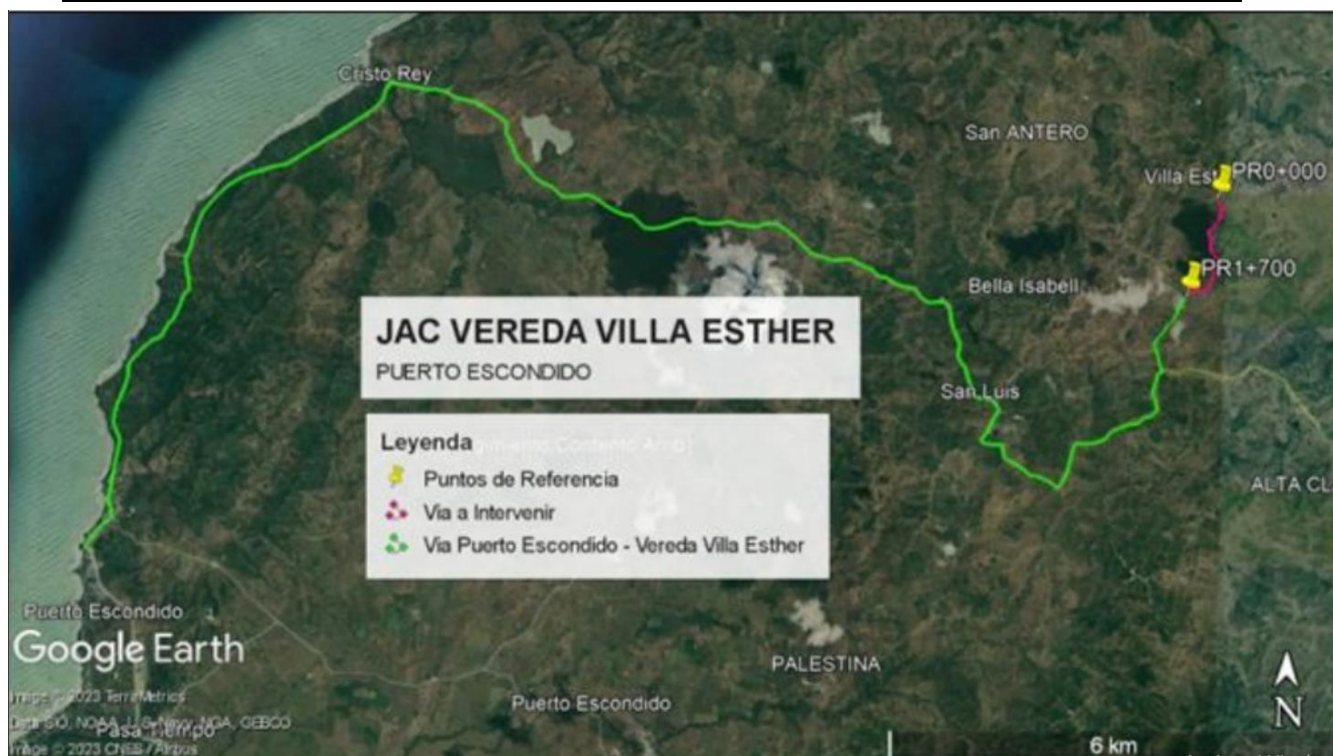


Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther.

2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

El tramo a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Los Córdoba del departamento de Córdoba, en la Vereda Morindo El Cielo. Para acceder a este, se parte de la cabecera municipal del municipio de Los Córdoba, recorriendo veinticuatro (24) kilómetros en dirección al municipio de Montería, por la vía nacional código 7401 INVIAS Puerto Rey - Montería hasta llegar al PR30+000, para luego tomar dirección Norte por la vía terciaria hacia la Vereda Morindo El Cielo.

En el mencionado punto a 2.8 kilómetros, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'7.4"N y Longitud: 76°8'47.3"W; con punto de referencia final en el PR0+830 con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'16.2"N y Longitud: 76°8'22.6"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

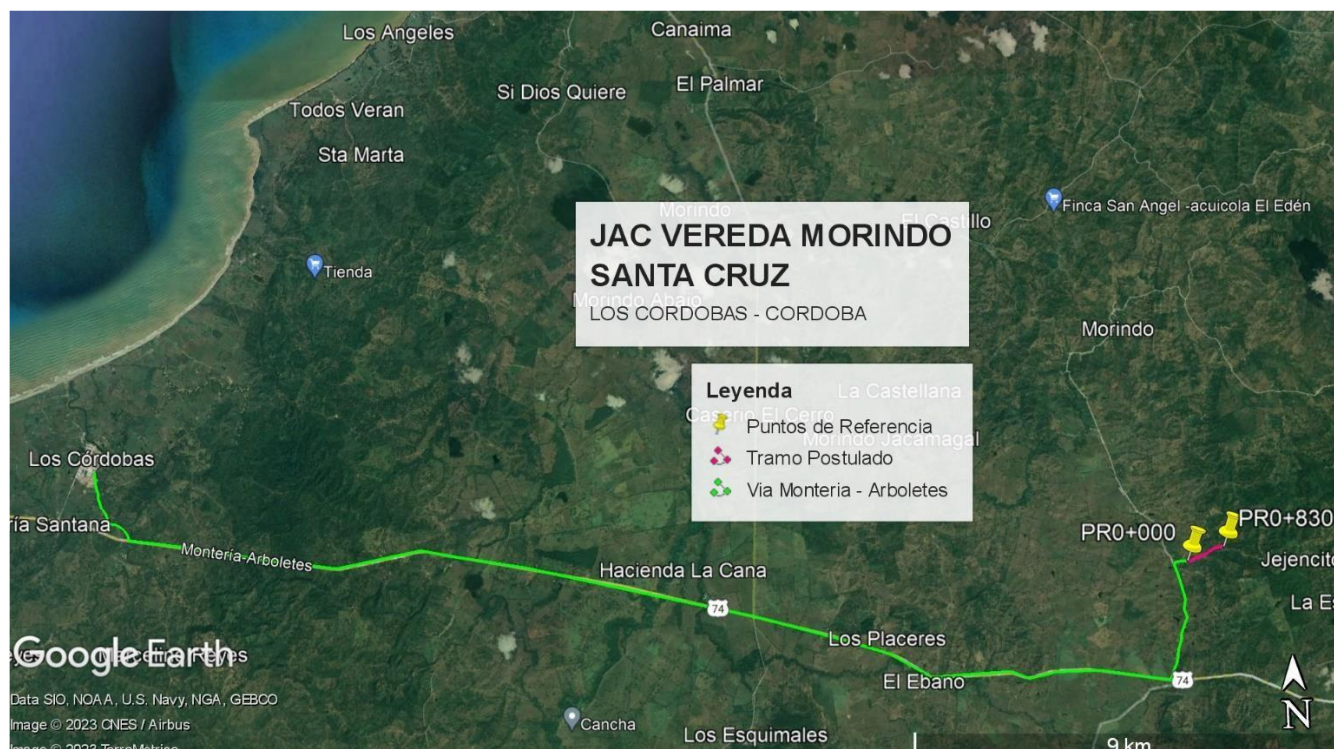


Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.

Las mejoras a estos tramos viales representan un gran desarrollo cultural, turístico y económico entre las regiones, permitiendo la comunicación de las veredas y corregimientos de municipio, así mismo como el acceso a las vías primarias del Departamento. Es importante recalcar que, durante el periodo de ejecución del proyecto, se generará empleo en las zonas de influencia del mismo, con la vinculación de personal que se haya en sus alrededores y que den cumplimiento con los perfiles que se requieran, teniendo en cuenta la necesidad de vinculación de profesionales y personal de mano de obra calificada y no calificada, de tal manera que está contribuyendo al desarrollo económico de esta zona del país.

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto el cual es *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN CUMNAL DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS SELECCIONADAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*, se busca realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados, con el fin de:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes poblaciones.
- Mayor integración y comunicación entre las comunidades.
- Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- Mejorar la competitividad y transitabilidad de los tramos a intervenir.
- Disminución de costos de transporte y comercialización agrícola.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS

El estado actual de los diferentes tramos es deficiente, pues no poseen ninguna superficie de rodadura que garantice confort al usuario y, por el contrario, la superficie de rodadura, fue construida sin consideraciones técnicas, puesto que se compone de suelos de la zona y afirmado.

Por lo anterior, las vías sufren de altas deformaciones y encharcamientos a causa del tránsito de vehículos, las altas precipitaciones que se presentan en la zona y la escorrentía de estas, lo que desencadena un remoldeo del material de la superficie de la vía, que con el pasar del tiempo empeora, hasta el punto volver intransitable y peligroso estos tramos.

A continuación, se mostrará el estado actual de los tramos:



Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.



Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martínez.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		



Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.



Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El diseño inicial de los espesores de la estructura de pavimento se realizó de manera estandarizada según el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad, lo cual un dinero preliminar de grosores.

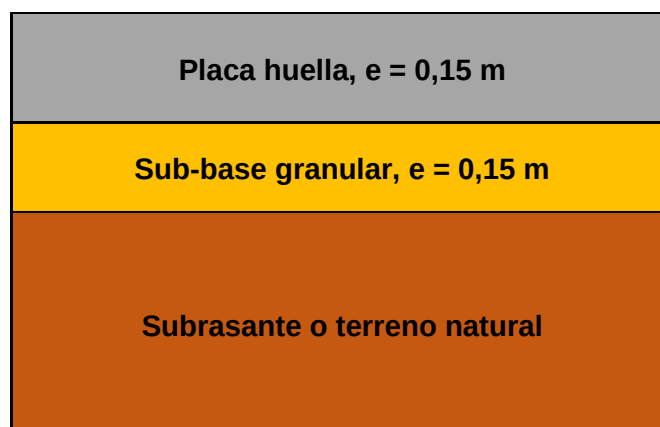


Ilustración 7. Espesores de la placa huella.

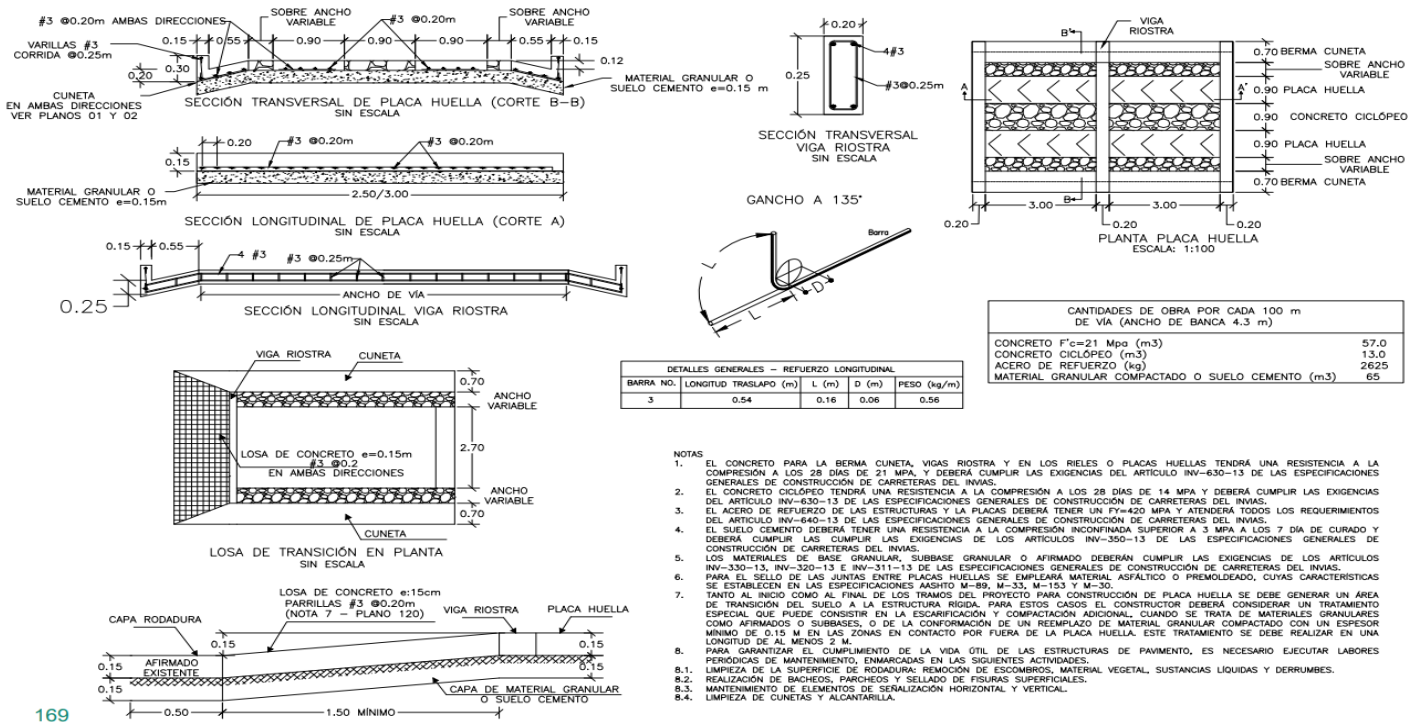
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)


Ilustración 8. Detalles técnicos de diseño de la placa huella (Cartilla de INVÍAS).

Es importante recordar que en algunos tramos no solo se habla de llevar a cabo, determinados metros de placa huella, si no que también se estableció realizar estructuras tales como Box-Culvert. Las tablas que se tuvieron en cuenta para el diseño preliminar son.



BOX COULVERT DE H1=1.00 m x B=2.00 m										
ALTURA DEL RELLENO (H)	ESPESORES		REFUERZO					CANTIDADES DE OBRA		
	T	TI	REF - 1	REF - 2	REF - 3	REF - 4	REF - 5	CONCRETO m ³ /m	SOLADO m ³ /m	ACERO Kg/m
0.00 - 0.30	0.30	0.35	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.29	0.13	213.08
0.30 - 0.60	0.30	0.30	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.16	0.13	210.27
0.60 - 1.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
1.00 - 1.50	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
1.50 - 2.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
2.00 - 2.50	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
2.50 - 3.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
3.00 - 4.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
4.00 - 5.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
5.00 - 6.00	0.25	0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	1.75	0.13	200.58
6.00 - 7.00	0.30	0.35	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.29	0.13	213.08
7.00 - 8.00	0.35	0.35	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	2.59	0.14	221.51

Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.


 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

GEOMETRÍA Y CANTIDADES DE OBRA																					
SECCIONES	GUARDARUEDAS		ALETAS					BASE ALETAS							REFUERZO				CANTIDADES DE OBRA		
	tg	tr	H externo	h1	h2	a1	tba	tbs	a2	a3	a4	a5	a6	a7	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	CONCRETO	SOLADO	ACERO
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m					m3	m3	kg
1.00 X 1.00	0.25	0.30	1.50	0.50	1.00	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55	1/2" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	2.77	0.41	156.96
1.50 X 1.50	0.25	0.30	2.00	0.70	1.30	2.00	0.25	0.25	1.15	2.32	0.32	0.58	1.15	0.95	1/2" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	5.19	0.87	285.81
2.00 X 2.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	1/2" Ø0.25	1/2" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	8.93	1.61	981.22
2.50 X 2.50	0.25	0.30	3.00	0.80	2.20	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.20	10.31	1.73	1418.18
3.00 X 3.00	0.25	0.30	3.50	1.30	2.20	3.00	0.25	0.25	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	13.26	2.33	2356.35
4.00 X 4.00	0.30	0.30	4.60	1.10	3.50	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.15	20.22	2.66	3682.08
2.00 X 3.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.20	10.06	1.85	1259.22
2.00 X 4.00	0.30	0.30	2.60	0.60	2.00	2.60	0.30	0.30	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	11.53	2.13	1853.08
3.00 X 4.00	0.30	0.30	3.60	1.30	2.30	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	16.29	2.66	2759.11
2.50 X 2.50 DOBLE	0.30	0.30	3.10	1.40	1.70	2.60	0.30	0.30	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.15	12.20	2.45	1615.47
3.00 X 3.00 DOBLE	0.30	0.30	3.60	1.30	2.30	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.15	16.70	3.30	2726.79
3.50 X 3.50 DOBLE	0.30	0.30	4.10	1.10	3.00	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	7/8" Ø0.25	7/8" Ø0.25	19.01	3.58	3322.75
4.00 X 4.00 DOBLE	0.30	0.30	4.60	1.10	3.50	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	7/8" Ø0.25	7/8" Ø0.20	20.99	3.87	3937.71

BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO



DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98



41

Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.

Es importante aclarar que estos diseños preliminares se realizaron aplicando suposiciones y sin ensayos en campo, por ello las juntas de acción comunal están en la obligación de realizar una revisión de estos, llevando a cabo todos los estudios pertinentes con sus respectivos profesionales, para poder ajustar a la realidad estas estructuras.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, la información general de los contratos solidarios.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-803-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4313-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	
Fecha de reanudación del contrato	
Prorroga del contrato	30 DE ABRIL DE 2024
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-671-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4081-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	12 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-694-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4122-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	20 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-970-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4578-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS

3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

								
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN			
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE	3,00	CÓRDOBA	03/08/2023			
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,20	\$ 21.819,00	\$ 91.640,00
2	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	108,50	\$ 166.800,50	\$ 18.114.534,00
3	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	75,10	\$ 866.784,80	\$ 64.344.538,00
4	630.1.7	630-13		Concreto Cíclopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33,00	\$ 391.013,60	\$ 12.903.449,00
5	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	3.491,00	\$ 5.872,00	\$ 20.499.152,00
							SUB-TOTAL	\$ 115.953.313,00
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT 2x1								
6	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	68,00	\$ 21.819,00	\$ 1.483.692,00
7	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	6,80	\$ 138.498,50	\$ 941.790,00
8	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	20,30	\$ 866.784,80	\$ 17.392.731,00
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,80	\$ 551.781,40	\$ 993.207,00
10	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	1758,00	\$ 5.872,00	\$ 10.322.976,00
							SUB-TOTAL	\$ 31.134.396,00
							SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	\$ 147.087.709,00
							PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.412.631,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 48.007.756,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 199.508.096,00
 Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matrícula Profesional: 22202223728COR				 Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC				

Ilustración 9. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

3.2.2. VEREDA MARTINEZ


								
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN			
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ	0,81	CÓRDOBA	3/08/2023			
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,10	\$ 21.819,00	\$ 111.277,00
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	133,00	\$ 186.002,50	\$ 24.738.333,00
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	92,00	\$ 876.932,20	\$ 80.677.762,00
4	630.1.7	630-22		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,50	\$ 409.624,80	\$ 16.589.804,00
5	640.1	640-22		Aceros de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.272,00	\$ 5.886,00	\$ 25.144.992,00
SUB-TOTAL								\$ 147.262.168,00
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA								\$ 147.262.168,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 4.417.865,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 48.008.454,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 199.688.487,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR Matricula Profesional: 22202223728COR</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</p> </div> </div>								

Ilustración 10. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA							
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN		
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER	1,70	CÓRDOBA	3/08/2023		
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2022 PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							
1	600.1.1	600-22	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,30	\$ 21.819,00	\$ 115.641,00
2	320.3	320-22	Subbase Granular Clase C	M3	137,80	\$ 174.268,00	\$ 24.014.130,00
3	630.1.4.1	630-22	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	92,50	\$ 865.739,00	\$ 80.080.858,00
4	630.1.7	630-22	Concreto Cidlopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,00	\$ 398.975,00	\$ 17.953.875,00
5	640.1	640-22	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.310,00	\$ 5.877,00	\$ 25.329.870,00
SUB-TOTAL							\$ 147.494.374,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA							\$ 147.494.374,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)							\$ 4.424.831,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS							\$ 48.009.382,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO							\$ 199.928.587,00
Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR Matrícula Profesional: 2202223728COR				Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC			

Ilustración 11. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

 <div>COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA</div>			 <div>CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div>			 <div>INVIAS</div>			
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CORDOBA		LOS CORDOBAS		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ		0,83		CÓRDOBA	1/09/2023
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2022	PARTICULAR						
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA									
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,30	\$ 21.819,00	\$ 115.641,00	
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	139,20	\$ 139.064,20	\$ 19.357.737,00	
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	105,40	\$ 827.683,10	\$ 87.237.799,00	
4	630.1.7	630-22		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,00	\$ 364.130,70	\$ 12.380.444,00	
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.836,00	\$ 5.852,00	\$ 28.300.272,00	
								SUB-TOTAL	\$ 147.391.893,00
								SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	\$ 147.391.893,00
								PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.421.757,00
								GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 48.008.973,00
								VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$ 199.822.623,00
<div><div><div>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR C/ AZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matricula Profesional: 2220223728COR</div></div><div><div>Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</div></div></div>									

Ilustración 12. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.

Los convenios establecen que, del presupuesto establecido, cada una de las juntas de acción comunal deben hacer un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor en cual se cuantifica monetariamente en **UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$ 1'000.000,00)**. Los presupuestos se realizaron teniendo en cuenta los diseños preliminares y metros lineales definidos como metas a alcanzar en cada uno de los proyectos, para el caso del corregimiento de San José de Canalete se estableció una meta de 129 ml de placa huella y un Box-Culvert de 2x1, para la vereda Martinez son 158 ml de placa huella, el corregimiento de Villa Esther 158 ml y la vereda de Morindo Santa Cruz 182 ml. Es importante resaltar que estos presupuestos deben de ser ajustados, puesto que los diseños serán acoplados a la realidad de cada caso y también los precios de los materiales, equipos, mano de obra y herramientas, que fueron cotizados el año pasado, deben ser actualizados al presente año. Por lo anterior, estos objetivos fijados al inicio de los convenios, se verán afectados.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

A continuación, describiremos las actividades realizadas en las diferentes juntas de acción comunal referente a los convenios, es importante aclarar que aun no se han iniciado actividades en campo, puesto que esta primera etapa de los proyectos es la etapa de revisión, la cual, según lo establecido en el contrato “La etapa de revisión tendrá un plazo total de cuarenta y cinco días **(45) DÍAS CALENDARIO**”.

Por lo anterior las tareas se han hecho en conjunto entre la interventoría y las juntas de acción comunal, para poder establecer todos los requerimientos necesarios para ejecutar los convenios de manera idónea.

En las 4 juntas de acción comunal, las actividades se han venido realizando conjuntamente y a la par, por lo cual, estas se consignan de manera general, puesto que el avance para las diferentes OACS, es el mismo.

En el periodo del 19 de diciembre de 2023 a 31 de febrero de 2024, se realizaron:

- Socialización del proyecto delante de la comunidad.
- Conformación del comité de participación.
- Elección del representante del comité de participación.
- Postulación del personal mínimo para la ejecución de la obra (Ingeniero residente, maestro y contador).
- Revisión de las hojas de vida y verificación de los requerimientos de este personal según lo establecidos en el contrato.
- Selección del personal mínimo.

Se establecen metas para las primeras semanas de febrero de 2024.

- Cambio de la firma del director territorial Córdoba de INVIAS por la de la representante legal de la interventoría, para tener las chequeras.
- Realización de la cotización de estudios de suelos y diseños (por lo menos tres).
- Realización del primer comité operativo, para elegir el contratista que realizará los estudios y diseños.
- Selección del resto de personal para ejecución de la obra (8 obreros).
- Realización de los exámenes médicos para los ingresos.
- Registro del personal a la seguridad social.
- Definición del plan ambiental.
- Cotización de la dotación para el personal.
- Cotización de materiales y equipos necesarios para la ejecución del convenio.

Se pactan estos compromisos con el fin de determinar el alcance real del proyecto y así poder definir el plan de inversión, el cronograma de compras e iniciar labores en campo.

3.4. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- La interventoría se compromete a enviar el debido papeleo a INVIAS y a los bancos donde cada una de las juntas de acción comunal, tienen sus cuentas, para hacer los cambios de firma, lo antes posible.
- Se compromete al igual a ayudarles con las cotizaciones de los estudios y diseños, puesto que ya se ha comentado que unos contratistas han pedido unos precios elevados

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)</p>		

por estos, los cuales se alejan del estimado que se estableció en el presupuesto inicial elaborado durante el contrato.

- La interventoría les ayudará en la cotización de los uniformes y elementos de dotación para los trabajadores.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Los reportes necesarios que se realizarán periódicamente para llevar a cabo el convenio, serán los consignados a continuación, estos se hacen al momento de entrar en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento, y como aun no hemos entrado en esta etapa, aun no se han diligenciado, pero al igual se consignaran aquí, los formatos, para tener constancia de ellos.

4.1. RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14

4.8. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Formato MEPI-MN1-IN-2-FR14

4.9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2

4.10. INFORMES SEMANALES

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

4.11. ACTAS DE COMITÉ

Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-1**

4.12. ACTAS DE REUNIÓN

Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-2**

5. CONCLUSIONES

- Hasta el momento los convenios han avanzado poco a poco, puesto que esto es un nuevo desafío para todas las juntas, la interventoría ha estado allí, para el apoyo de estas y brindándole acompañamiento en cada una de las actividades y metas planteadas, pero como son personas que tienen muy poca experticia en el tema, se han presentado demoras.
- Los alcances en metros lineales de placa huella y estructuras establecidas en los convenios, deben de ser reevaluados, puestos que estos se hacen a base de diseño preliminares que consideran datos hipotéticos, al igual que los presupuestos, que también se basan según estos supuestos y utilizan precios del año en que salió el convenio, es decir, están desactualizados y no consideran las condiciones de disponibilidad de materiales y equipos en la zona.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2 (01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)		

6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4313 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO



DESCRIPCIÓN:

Socialización del proyecto por parte del personal de interventoría.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4081 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ| MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO



DESCRIPCIÓN:

Socialización del proyecto por parte del personal de interventoría.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONVENIO SOLIDARIO 4122 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**



DESCRIPCIÓN:

Socialización del proyecto por parte del personal de interventoría.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 2
(01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4578 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO LOS CORDOBA S



DESCRIPCIÓN:

Socialización del proyecto por parte del personal de interventoría.
