



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4

Periodo 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2024

**PUERTO ESCONDIDO
LOS CÓRDOBAS**



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4858 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS.

MARZO DE 2024

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Objeto del Proyecto	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías terciarias de los municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba.		
Contrato Interventoría	No. 4858 de 2023		
Interventor	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS		
Contratistas	OAC San José de Canalete OAC Martinez OAC Villa Esther OAC Morindo Santa Cruz	4313-2023 4081-2023 4122-2023 4578-2023	

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0	Versión original	Diciembre de 2023

	Nombre	Firma
Elaboró		
Revisó		
Aprobó		



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



VANEGAS
DUMAR
INGENIERÍA S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PAGINA

FECHA
2/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Marzo de 2024

CONVENIO No.: 4313 - 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL: \$ 199.508.096,00

VALOR ADICIONALES:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO PRORROGADO: 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

4 MESES

VALOR ACUMULADO: \$ 200.508.096,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO:

DESEMBOLSO AMORTIZADO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALETE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación Mejoramiento		
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación Mejoramiento			
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8.474.501,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



Corregimiento San José de Canalete, K0+000 del tramo a intervenir. Toma de la muestra.



Corregimiento San José de Canalete, K0+100 del tramos a intervenir. Inicio de la excavación del apique.

Activar Windows
Ve a Configuración

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Cordobas. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

	
Corregimiento San José de Canalete, K0+100 del tramo a intervenir. Toma de la muestra.	Factura de la compra de los cascos para el personal.
	
Elaboración de la estructura para colocación de la valla.	Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Finalización del comité operativo.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.</div><div>NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div><div>2520276797 CND</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO

VERSION

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: Marzo de 2024

FECHA: 2/04/2024
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No.: 4081 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL: \$ 199.688.487.00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 200.688.487.00

DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 10.629.837.00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Activar Windk
Ve a Configuración



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Cordobas. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)



Establecimiento en el donde se compró la dotación.



Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Inicio del comité operativo.



Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Desarrollo del comité operativo.



Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Finalización del comité operativo.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma 
Nombre **NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520276797 CND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA2/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:CORDOBA

PERIODO MES:Marzo de 2024

CONVENIO No.:4128 - 2023

PLAZO INICIAL:HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:20 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN:16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO:4 MESES

OBJETO:ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:4858 - 2023

INTERVENOR:VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

VALOR INICIAL:199.688.487,00

VALOR ADICIONALES:

VALOR ACUMULADO:200.688.487,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO:

DESEMBOLSO AMORTIZADO:

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):\$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$10.629.837,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:2


EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:4

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Factura electrónica de la compra de la dotación del personal.





Activar Windows
Ve a Configuración

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

	
<p>Casco comparado para la protección del personal.</p>	<p>Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Inicio del comité operativo.</p>
	
<p>Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Desarrollo del comité operativo.</p>	<p>Establecimiento la fogata Puerto Escondido. Finalización del comité operativo.</p>
<p>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</p>	
<div> <div>  </div> <div> Firma Nombre NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 2520276797 CND </div> </div> <div> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</p> </div>	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO

VERSION

PAGINA

FECHA2/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:CORDOBA

PERIODO MES:Marzo de 2024

CONVENIO No.:4578 - 2023

OBJETO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA:4858 - 2023

INTERVENTOR:VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

PLAZO INICIAL:HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:22 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE REANUDACIÓN:16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO:4 MESES

VALOR INICIAL:\$199.822.623,00

VALOR ADICIONALES:\$

VALOR ACUMULADO:\$200.822.623,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO:\$

DESEMBOLSO AMORTIZADO:\$

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	
Estructuras		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):\$

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$8.453.110,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:2


TOTAL EMPLEOS GENERADOS:4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Factura de la compra de las botas para el personal.

Activar Windows
Ve a Configuración

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

 <p>Nuestros caminos comunitarios contribuyen a la paz total</p> <p>Mantenimiento y mejoramiento de corredor vial</p> <p>Vereda Morindo Santa Cruz, municipio de Los Córdoba, Córdoba</p> 	 
Impresión de la vialidad.	Factura de los exámenes de ingreso del personal.
	
Estadero billares Morindo Santa Cruz. Inicio del comité operativo.	Estadero billares Morindo Santa Cruz. Finalización del comité operativo.
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre</div><div>NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.</div><div>2520276797 CND</div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>	

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	16
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	17
2.1. LOCALIZACIÓN	17
2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO.....	17
2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS.....	18
2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.....	19
2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	19
2.2.2. VEREDA MARTINEZ	20
2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	21
2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	22
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS.....	24
2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	25
2.4. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	27
2.4.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	27
2.4.2. VEREDA MARTINEZ	28
2.4.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	29
2.4.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	30
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	31
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	31
3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS.....	33
3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	33
3.2.2. VEREDA MARTINEZ	34
3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	35
3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	36
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	37
3.3.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE	37
3.3.2. VEREDA MARTINEZ	38
3.3.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....	38

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

3.3.4.	VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....	39
3.4.	ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.....	41
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	41
4.1.	RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	41
4.10.	INFORMES SEMANALES	42
4.11.	ACTAS DE COMITÉ	42
4.12.	ACTAS DE REUNIÓN	42
5.	CONCLUSIONES.....	42
6.	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	43
7.	ANEXOS	47

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido.....	18
Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.....	19
Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.....	20
Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martinez	21
Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther	22
Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz	23
Ilustración 7. Espesores de la placa huella.....	25
Ilustración 8. Detalles técnicos de diseño de la placa huella (Cartilla de INVÍAS).	26
Ilustración 9. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.....	33
Ilustración 10. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez	34
Ilustración 11. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther	35
Ilustración 12. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz	36
Ilustración 13. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	37
Ilustración 14. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	38
Ilustración 15. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	39
Ilustración 16. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.....	40

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete. 31

Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez..... 31

Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther..... 32

Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz..... 32

Tabla 5. Fechas estimadas de inicio..... 41

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete	24
Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martinez.....	24
Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.....	25
Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.....	25
Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.....	26
Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.	27

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, adelantó el programa de Obra Pública denominado “CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”, considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte entre veredas y corregimientos, se constituye en una de las principales estrategias a adelantar.

La política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

En este sentido, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios interadministrativos con el municipio de Puerto Escondido del Departamento de Córdoba cuyo objeto es “*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS DIFERENTES JUNTAS DE ACCION COMUNAL SELECCIONADAS DENTRO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*”, para que a través de las juntas de acción comunal se adelantaran los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública con el fin de que las juntas de acción comunal realicen la ejecución de las obras consistentes en el *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, LA VEREDA MARTINEZ, EL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Y LA VEREDA MORINDO DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.*

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” (La subraya no es del texto)

Por lo anterior y con el fin de realizar las labores de control y seguimiento, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, adjudicando la Interventoría a VANEGAS DUMAR INGENIERIAS SAS, mediante contrato No 4858 de 2023, y quien realizará la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. Bajo el marco anterior a continuación se presenta control y seguimiento de los convenios No 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, el Municipio de Puerto Escondido y el municipio de Los Córdoba.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las administraciones de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Martínez, Villa Esther y Morindo Santa Cruz, del municipio de Puerto Escondido y Los Córdoba, aplicaron al programa de CAMINOS COMUNITARIO PARA LA PAZ TOTAL, con el fin de mejorar sus redes viales terciarias, razón por la cual se celebran los convenios No. 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, con el Instituto Nacional de Vías “INVIAS”.

Cabe resaltar que los convenios al ser de menor cuantía, las juntas de acción comunal deberán desarrollar el objeto los convenios en las vías terciarias ubicadas en cada zona de influencia correspondiente, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

Por lo anterior se realiza un proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, para adjudicar el contrato No 4858 de 2023, con el fin de seleccionar la interventoría, que se encargara de la adecuada vigilancia, control de las actividades consistentes y cumplimiento satisfactorio de cada uno de los convenios anteriormente mencionados.

Se establecen las siguientes fechas de inicio 19 de diciembre de 2023, 12 de diciembre de 2023, 20 de diciembre de 2023 y 22 de diciembre de 2023, correspondiente a los anteriores No de contratos. Para veracidad de lo anterior, estos documentos se anexarán en el presente informe.

2.1. LOCALIZACIÓN

2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO

Puerto Escondido es un municipio de Colombia perteneciente al departamento de Córdoba. Se encuentra ubicado a 62 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba. La principal actividad económica es la agricultura, y los productos que se cultivan en la región son: el plátano, el maíz, el arroz, el coco y los tubérculos (ñame y yuca). La segunda actividad económica en nivel de importancia del municipio es la ganadería, y luego la pesca, el comercio y la actividad turística, ya que en Puerto Escondido aproximadamente 1.135 personas dependen de las temporadas turísticas. No se puede dejar a un lado el gremio de artesanos, que son aproximadamente 30 familias que se dedican a esta actividad. El municipio tiene una extensión de 417 km² y posee 27 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe de los cuales solo 2.49 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana y 414.51 kilómetros cuadrados de zona rural por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Puerto Escondido se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 9°01'09"N

Longitud: 76°15'41"O

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		



Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido

2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS

Los Córdoba es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento de Córdoba. Se encuentra a una distancia 57 km de la capital departamental, Montería. Predominan las actividades económicas primarias como la ganadería, la agricultura y la pesca artesanal, predomina el cultivo del plátano, aunque en los últimos años se aprecia un crecimiento de la actividad turística. Tiene una extensión total de 430 Km cuadrados de los cuales solo 5,20 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Los Córdoba se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°53'43"N

Longitud: 76°21'17'O

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

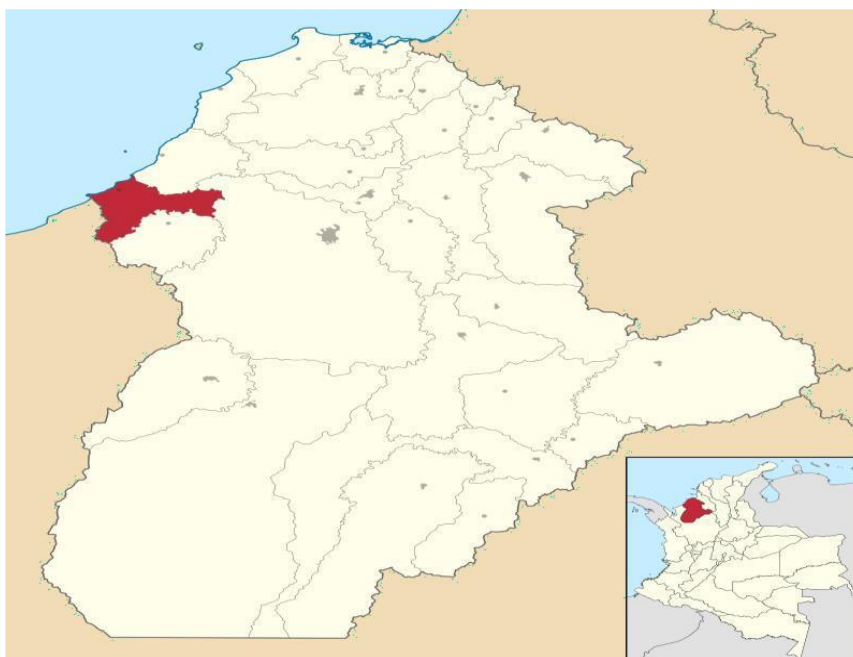


Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.

En ambos municipios las condiciones actuales de las vías rurales no son las óptimas, esto se da por la falta de intervención y la alta pluviosidad que se manifiesta en la zona, donde no se cuenta con cunetas ni obras hidráulicas que permitan controlar el factor erosionante provocado por la escorrentía del agua, siendo los nativos de estas zonas los que diariamente tienen que enfrentarse a las congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje que implica una limitación al derecho a la libre circulación, dando como consecuencia la baja comercialización de productos y afectando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos. Se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud, también inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios afectando el derecho a la educación, junto con un incremento de los precios de los productos de la región debido al aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros.

2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Las zonas de influencia directa de los proyectos, son las jurisdicciones territoriales de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Vereda Martinez, Villa Esther y Morindo de Santa Cruz.

2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Para poder ingresar al tramo a intervenir, debemos partir de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo dos punto ochenta y dos (2.82) kilómetros en

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

dirección hacia el cruce ruta 74, por la vía nacional código 74CR08 INVIAS Puerto Escondido - Cruce Ruta 74, hasta llegar al PR2+820, para luego tomar dirección sur por la vía terciaria que conduce al corregimiento San José de Canalete.

En el mencionado punto a 3 kilómetros, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°58'8.8"N y Longitud: 76°15'43.4"W; con punto de referencia final en el PR3+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°56'49.1"N y Longitud: 76°15'57.9"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

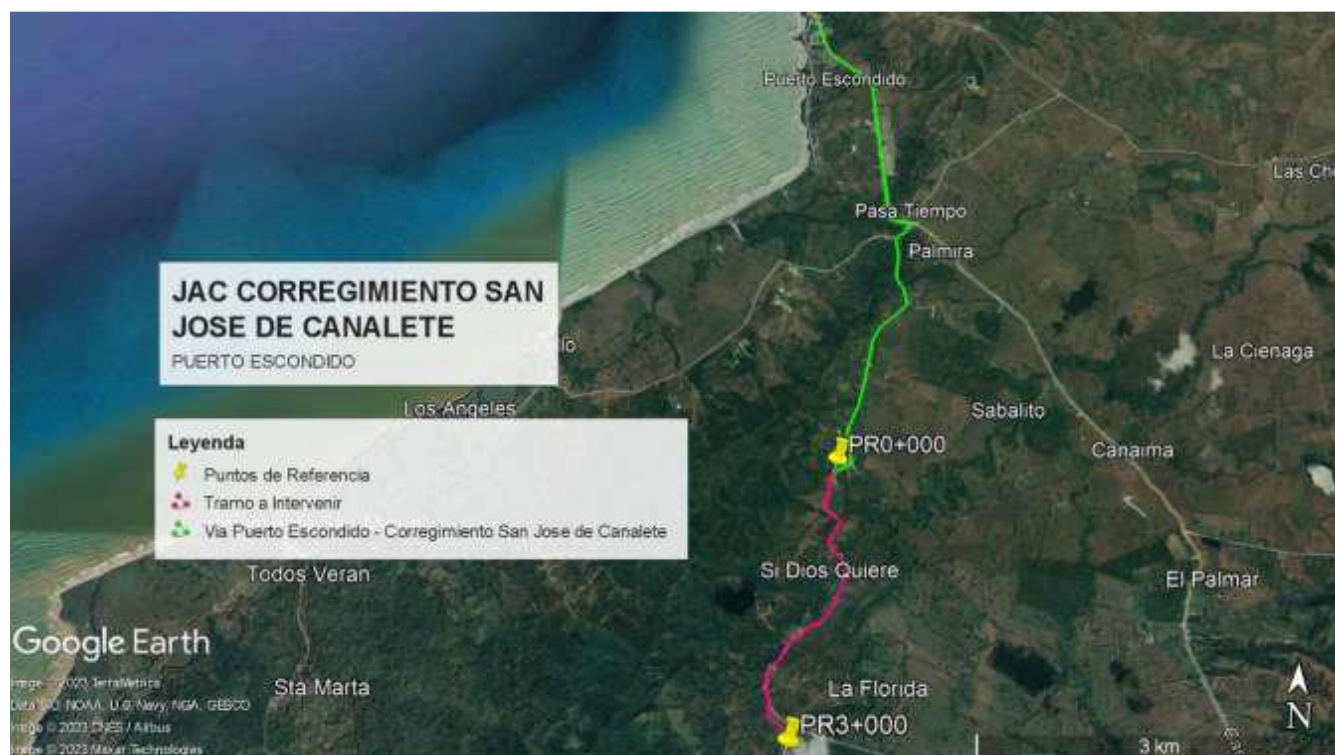


Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.

2.2.2. VEREDA MARTINEZ

En el caso de esta OAC, para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8.2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo ocho punto cinco (8.5) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, hasta la vereda Martínez.

En el mencionado punto, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'51.9"N y Longitud: 76°9'40.5"W; con punto de referencia final en el PR0+811 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°9'27.1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martinez.

2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Puerto Escondido del departamento de Córdoba, en el Corregimiento Villa Esther. Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8,2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo catorce punto seis (14,6) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, en la intersección dirección norte recorriendo uno punto catorce (1,14) kilómetros, encontramos la vía terciaria que conduce a la vereda Villa Esther .

En el mencionado punto, se ubica el PR1+700 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°3'39"N y Longitud: 76°7'48.2"O; con punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°7'35.5"O, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

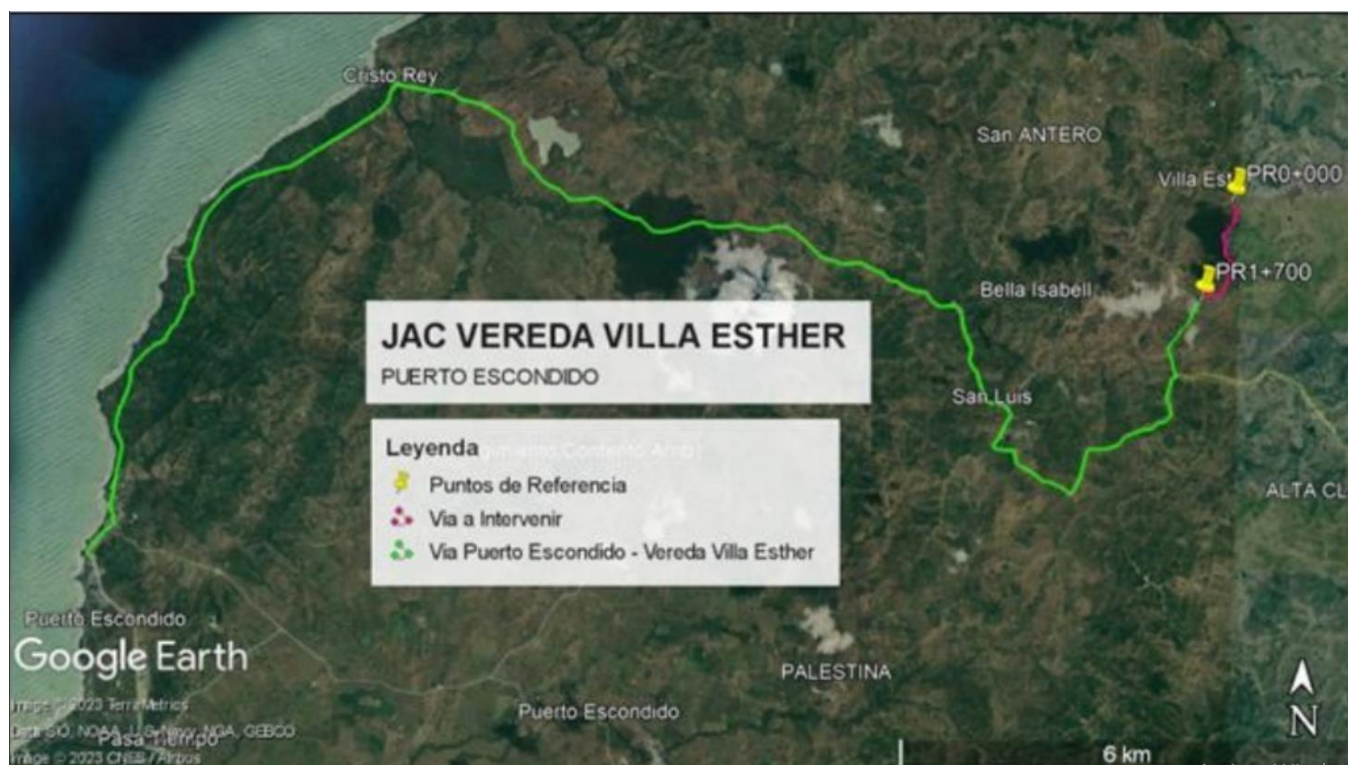


Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther.

2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

El tramo a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Los Córdoba del departamento de Córdoba, en la Vereda Morindo El Cielo. Para acceder a este, se parte de la cabecera municipal del municipio de Los Córdoba, recorriendo veinticuatro (24) kilómetros en dirección al municipio de Montería, por la vía nacional código 7401 INVIAS Puerto Rey - Montería hasta llegar al PR30+000, para luego tomar dirección Norte por la vía terciaria hacia la Vereda Morindo El Cielo.

En el mencionado punto a 2.8 kilómetros, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'7.4"N y Longitud: 76°8'47.3"W; con punto de referencia final en el PR0+830 con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'16.2"N y Longitud: 76°8'22.6"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

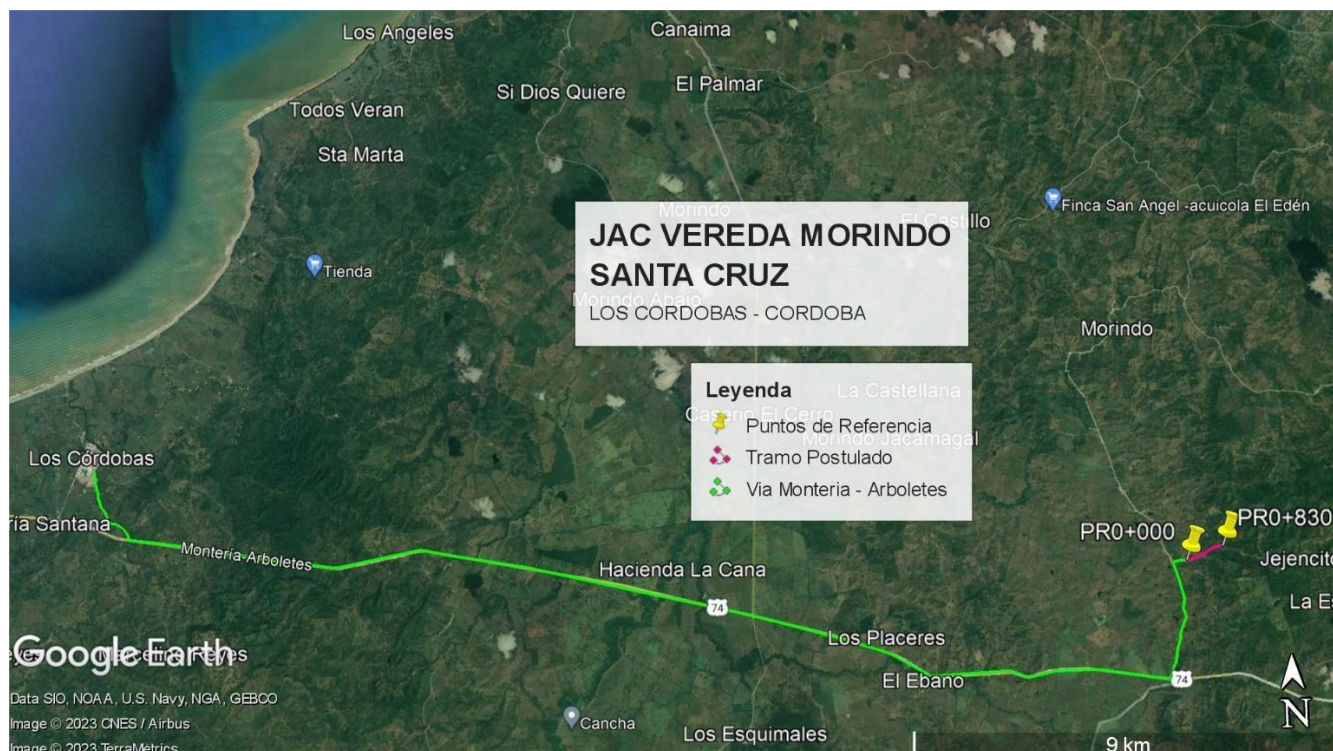


Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.

Las mejoras a estos tramos viales representan un gran desarrollo cultural, turístico y económico entre las regiones, permitiendo la comunicación de las veredas y corregimientos de municipio, así mismo como el acceso a las vías primarias del Departamento. Es importante recalcar que, durante el periodo de ejecución del proyecto, se generará empleo en las zonas de influencia del mismo, con la vinculación de personal que se haya en sus alrededores y que den cumplimiento con los perfiles que se requieran, teniendo en cuenta la necesidad de vinculación de profesionales y personal de mano de obra calificada y no calificada, de tal manera que está contribuyendo al desarrollo económico de esta zona del país.

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto el cual es *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS SELECCIONADAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*, se busca realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados, con el fin de:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes poblaciones.
- Mayor integración y comunicación entre las comunidades.
- Oportuno acceso a los servicios médicos y educativos.
- Mejorar la competitividad y transitabilidad de los tramos a intervenir.
- Disminución de costos de transporte y comercialización agrícola.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS

El estado actual de los diferentes tramos es deficiente, pues no poseen ninguna superficie de rodadura que garantice confort al usuario y, por el contrario, la superficie de rodadura, fue construida sin consideraciones técnicas, puesto que se compone de suelos de la zona y afirmado.

Por lo anterior, las vías sufren de altas deformaciones y encharcamientos a causa del tránsito de vehículos, las altas precipitaciones que se presentan en la zona y la escorrentía de estas, lo que desencadena un remoldeo del material de la superficie de la vía, que con el pasar del tiempo empeora, hasta el punto volver intransitable y peligroso estos tramos.

A continuación, se mostrará el estado actual de los tramos:



Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.



Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martinez.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		



Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.



Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El diseño inicial de los espesores de la estructura de pavimento se realizó de manera estandarizada según el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad, lo cual arroja un preliminar de grosores.

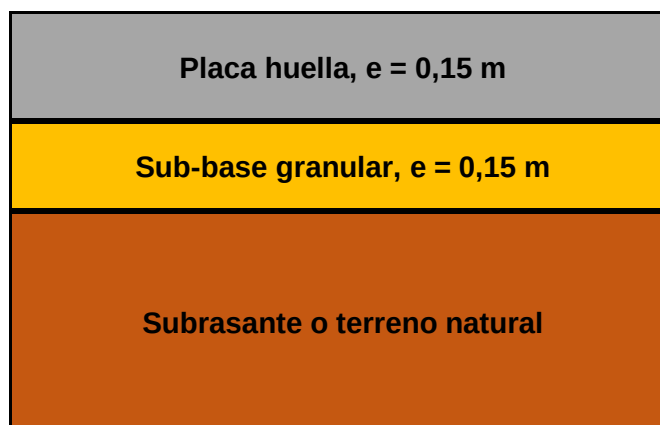




Ilustración 7. Espesores de la placa huella.

Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.


	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

GEOMETRÍA Y CANTIDADES DE OBRA																						
SECCIONES	GUARDARUELAS		ALETAS						BASE ALETAS							REFUERZO				CANTIDADES DE OBRA		
	tg	tr	H externo	h1	h2	a1	tba	tbs	a2	a3	a4	a5	a6	a7	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	CONCRETO	SOLADO	ACERO	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m					m ³	m ³	kg	
1.00 X 1.00	0.25	0.30	1.50	0.50	1.00	1.50	0.25	0.25	0.93	1.68	0.18	0.32	0.75	0.55	1/2" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	2.77	0.41	156.96	
1.50 X 1.50	0.25	0.30	2.00	0.70	1.30	2.00	0.25	0.25	1.15	2.32	0.32	0.58	1.15	0.95	1/2" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	3/8" Ø0.25	5.19	0.87	285.81	
2.00 X 2.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	1/2" Ø0.25	1/2" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	8.93	1.61	981.22	
2.50 X 2.50	0.25	0.30	3.00	0.80	2.20	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.20	10.31	1.73	1418.11	
3.00 X 3.00	0.25	0.30	3.50	1.30	2.20	3.00	0.25	0.25	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	13.26	2.33	2356.33	
4.00 X 4.00	0.30	0.30	4.60	1.10	3.50	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.15	20.22	2.66	3682.08	
2.00 X 3.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.20	10.06	1.85	1259.22	
2.00 X 4.00	0.30	0.30	2.60	0.60	2.00	2.60	0.30	0.30	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	11.53	2.13	1853.08	
3.00 X 4.00	0.30	0.30	3.60	1.30	2.30	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.20	16.29	2.66	2759.11	
2.50 X 2.50 DOBLE	0.30	0.30	3.10	1.40	1.70	2.60	0.30	0.30	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.15	12.20	2.45	1615.47	
3.00 X 3.00 DOBLE	0.30	0.30	3.60	1.30	2.30	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	5/8" Ø0.25	5/8" Ø0.25	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.15	16.70	3.30	2726.77	
3.50 X 3.50 DOBLE	0.30	0.30	4.10	1.10	3.00	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	7/8" Ø0.25	7/8" Ø0.25	19.01	3.58	3322.77	
4.00 X 4.00 DOBLE	0.30	0.30	4.60	1.10	3.50	3.00	0.30	0.30	1.37	3.40	0.40	1.25	2.00	1.95	3/4" Ø0.25	3/4" Ø0.25	7/8" Ø0.25	7/8" Ø0.20	20.99	3.87	3937.77	

BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO



DETALLES GENERALES - REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98



41

Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.

Es importante aclarar que estos diseños preliminares se realizaron aplicando suposiciones y sin ensayos en campo, por ello las juntas de acción comunal están en la obligación de realizar una revisión de estos, llevando a cabo todos los estudios pertinentes con sus respectivos profesionales, para poder ajustar a la realidad estas estructuras.

2.4. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Luego de realizar la toma de muestras, sus respectivos estudios y diseños obtuvimos los siguientes ajustes:

2.4.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Para el caso del presente corregimiento por retrasos en la realización de la toma de muestras, la revisión de estudios y diseños y su posterior aprobación, presentan demoras. El contratista encargado de realizar los estudios y diseños, se compromete, entregar estos, la primera semana de abril.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

2.4.2. VEREDA MARTINEZ

A partir de los estudios nos arrojaron lo siguiente:

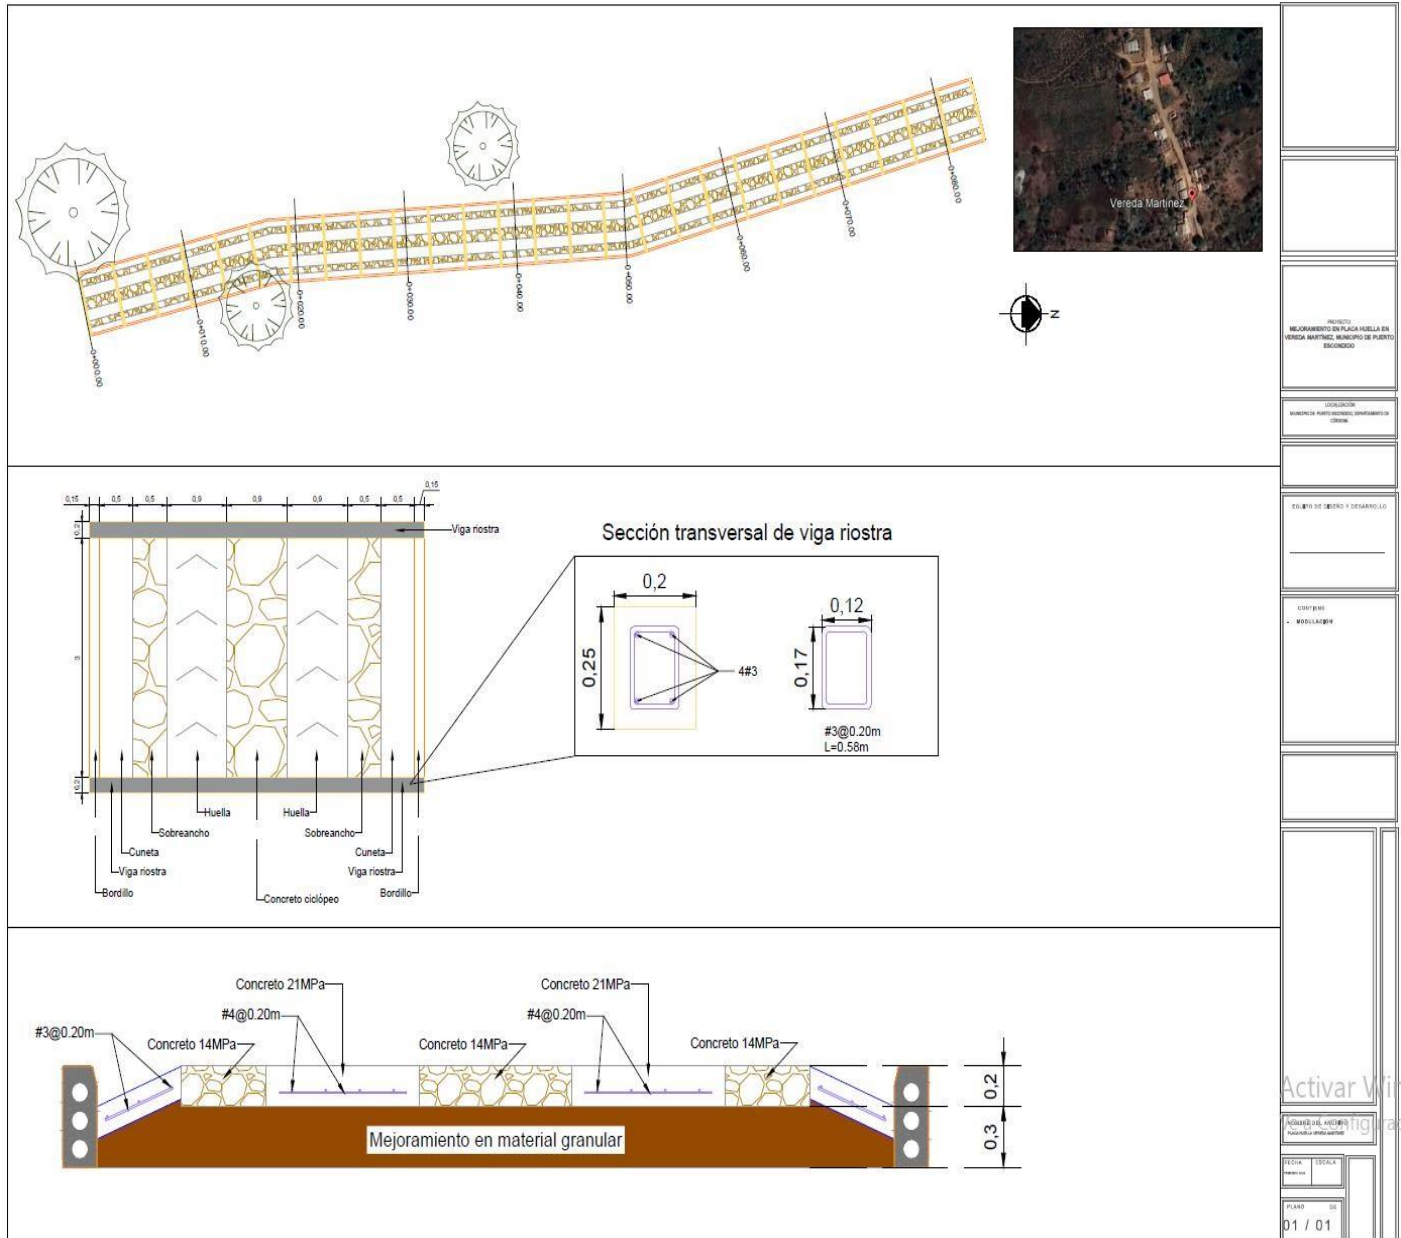


Ilustración 9. Diseño de la placa huella de la Vereda Martinez.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

2.4.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

Para este caso tenemos:

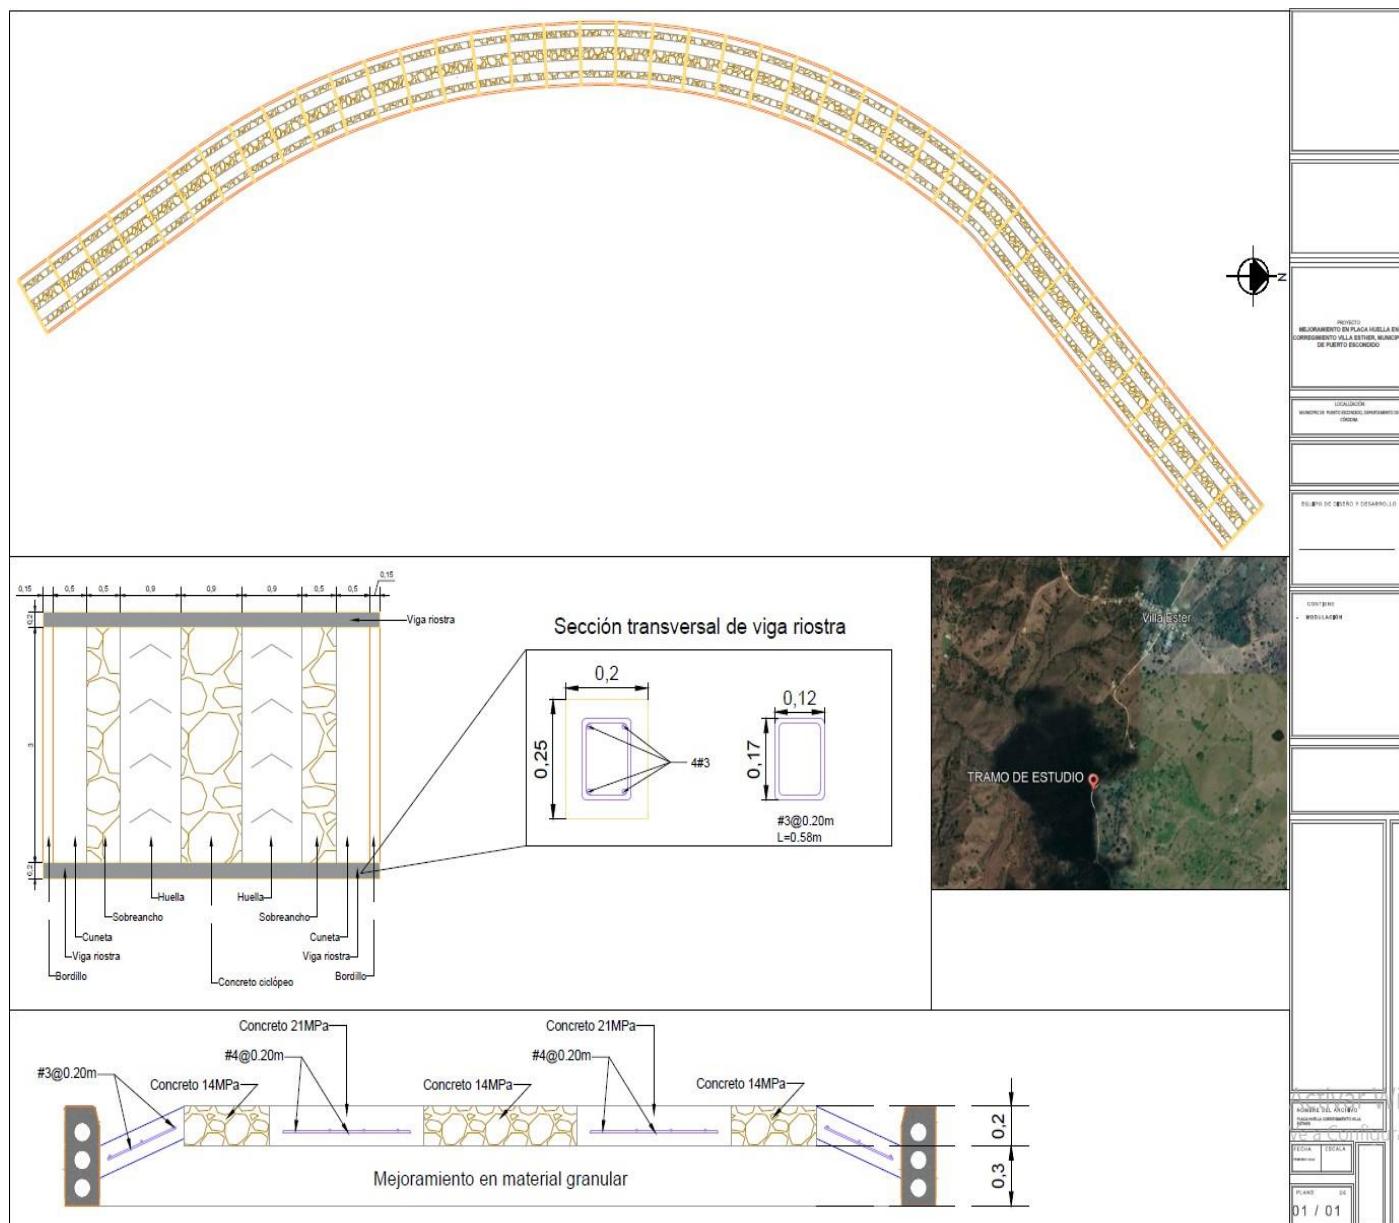


Ilustración 10. Diseño de la placa huella del corregimiento de Villa Esther.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdobas. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

2.4.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

Para esta junta tenemos el siguiente diseño:

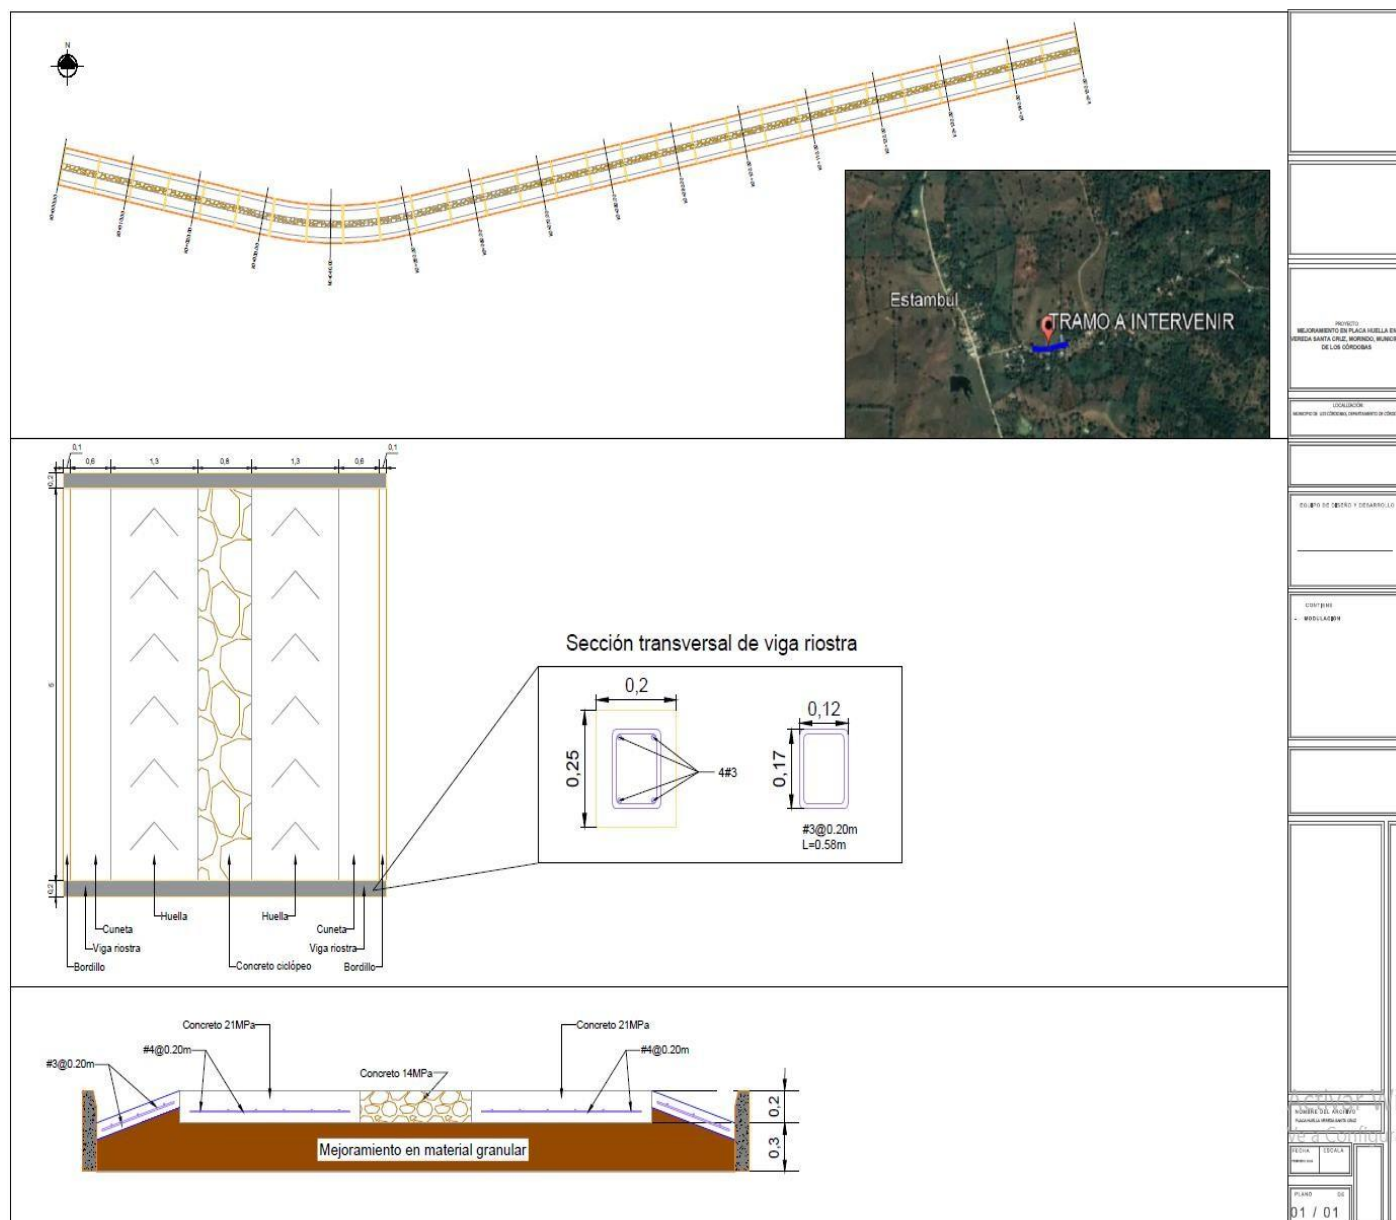


Ilustración 11. Diseño de la placa huella de la vereda de Morindo Santa Cruz.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, la información general de los contratos solidarios.

Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-803-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4313-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	
Fecha de reanudación del contrato	
Prorroga del contrato	30 DE ABRIL DE 2024
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-671-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4081-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	12 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-694-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4122-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	20 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz.

ID del contrato en SECOP	SPSC-CD-CS-970-2023
Versión del contrato	1
Estado del contrato	Firmado
Número del contrato	4578-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Tipo de contrato	Convenio
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio de contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de reanudación del contrato	16 DE ENERO DE 2024
Prorroga del contrato	
Fecha de vencimiento	30 DE ABRIL DE 2024
Plazo acumulado	4 Meses

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS

3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE


															
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA															
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL															
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN					
CORDOBA		PUERTO ESCONDIDO		JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE		3,00		CÓRDOBA		03/08/2023					
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															
No		ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
				GENERAL 2013		PARTICULAR									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO															
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA															
1		600.1.1		600-13		Excavaciones varias sin Clasificar		M3		4,20		\$ 21.819,00		\$ 91.640,00	
2		320.3		320-13		Subbase Granular Clase C		M3		108,60		\$ 166.800,50		\$ 18.114.534,00	
3		630.1.4.1		630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ		M3		75,10		\$ 856.784,80		\$ 64.344.538,00	
4		630.1.7		630-13		Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)		M3		33,00		\$ 391.013,60		\$ 12.903.449,00	
5		640.1		640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		KG		3.491,00		\$ 5.872,00		\$ 20.499.152,00	
												SUB-TOTAL		\$ 115.953.313,00	
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT 2x1															
6		600.1.1		600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar		M3		68,00		\$ 21.819,00		\$ 1.483.692,00	
7		610.1		610-13		Relleno para Estructuras con Suelo		M3		6,80		\$ 138.498,50		\$ 941.790,00	
8		630.1.4.1		630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ		M3		20,30		\$ 856.784,80		\$ 17.392.731,00	
9		630.1.6		630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ		M3		1,80		\$ 551.781,40		\$ 993.207,00	
10		640.1		640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa		M3		1758,00		\$ 5.872,00		\$ 10.322.976,00	
												SUB-TOTAL		\$ 31.134.396,00	
												SUB-TOTAL BASICO DE OBRA		\$ 147.087.709,00	
												PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ 4.412.631,00	
												GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 48.007.756,00	
												VALOR ESTIMADO CONVENIO		\$ 199.508.096,00	
<div><div> Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matricula Profesional: 22202223728COR</div><div> Revisó: Firma Lider Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Lider Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</div></div>															

Ilustración 12. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

3.2.2. VEREDA MARTINEZ


								
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN			
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ	0,81	CÓRDOBA	3/08/2023			
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,10	\$ 21.819,00	\$ 111.277,00
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	133,00	\$ 186.002,50	\$ 24.738.333,00
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	92,00	\$ 876.932,20	\$ 80.677.762,00
4	630.1.7	630-22		Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	40,50	\$ 409.624,80	\$ 16.589.804,00
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.272,00	\$ 5.886,00	\$ 25.144.992,00
SUB-TOTAL								\$ 147.262.168,00
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA								\$ 147.262.168,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 4.417.865,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 48.008.454,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 199.688.487,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR Matricula Profesional: 22202223728COR</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Revisó: Firma Lider Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Lider Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</p> </div> </div>								

Ilustración 13. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN		
CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER		1,70	CÓRDOBA	3/08/2023		
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,30	\$ 21.819,00	\$ 115.641,00
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	137,80	\$ 174.268,00	\$ 24.014.130,00
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	92,50	\$ 865.739,00	\$ 80.080.858,00
4	630.1.7	630-22		Concreto Cidlopeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,00	\$ 398.975,00	\$ 17.953.875,00
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.310,00	\$ 5.877,00	\$ 25.329.870,00
SUB-TOTAL								\$ 147.494.374,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 147.494.374,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)								\$ 4.424.831,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS								\$ 48.009.382,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO								\$ 199.928.587,00
<div><div></div><div>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matricula Profesional: 22202223728COR</div></div> <div><div></div><div>Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</div></div>								

Ilustración 14. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA			 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			 INVIAS					
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		LONGITUD DEL CORREDOR (Km)		DIRECCIÓN TERRITORIAL		FECHA ELABORACIÓN	
CORDOBA		LOS CORDOBAS		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ		0,83		CÓRDOBA		1/09/2023	
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
		GENERAL 2022	PARTICULAR								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA											
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,30	\$	21.819,00	\$	115.641,00	
2	320.3	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	139,20	\$	139.064,20	\$	19.357.737,00	
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	105,40	\$	827.683,10	\$	87.237.799,00	
4	630.1.7	630-22		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,00	\$	364.130,70	\$	12.380.444,00	
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4.836,00	\$	5.852,00	\$	28.300.272,00	
									SUB-TOTAL	\$	147.391.893,00
									SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	\$	147.391.893,00
									PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$	4.421.757,00
									GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	48.008.973,00
									VALOR ESTIMADO CONVENIO	\$	199.822.623,00
<div><div> Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR Matricula Profesional: 22202223728COR</div><div> Revisó: Firma Líder Zona Programa Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES Cargo: Líder Estructuración zona Norte Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</div></div>											

Ilustración 15. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.

Los convenios establecen que, del presupuesto establecido, cada una de las juntas de acción comunal deben hacer un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor en cual se cuantifica monetariamente en **UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$ 1'000.000,00)**. Los presupuestos se realizaron teniendo en cuenta los diseños preliminares y metros lineales definidos como metas a alcanzar en cada uno de los proyectos, para el caso del corregimiento de San José de Canalete se estableció una meta de 129 ml de placa huella y un Box-Culvert de 2x1, para la vereda Martinez son 158 ml de placa huella, el corregimiento de Villa Esther 158 mly la vereda de Morindo Santa Cruz 182 ml. Es importante resaltar que estos presupuestos debende ser ajustados, puesto que los diseños serán acoplados a la realidad de cada caso y también los precios de los materiales, equipos, mano de obra y herramientas, que fueron cotizados el año pasado, deben ser actualizados al presente año. Por lo anterior, estos objetivos fijados al inicio de los convenios, se verán afectados.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

A continuación, describiremos las actividades realizadas en las diferentes juntas de acción comunal referente a los convenios, es importante aclarar que aún no se han iniciado actividades en campo, las actividades realizadas hasta el momento hacen parte de la etapa de revisión, la cual tendría cuarenta y cinco **(45) DÍAS CALENDARIO**. Por lo anterior es importante aclarar que presentamos atrasos para la iniciación de trabajos en campo.

Por lo anterior la interventoría en conjunto con las juntas de acción comunal, establecen como meta para el mes de abril, iniciar ya trabajos en campo, puesto que, gracias al compromiso de las partes y la disposición de ambas de llevar a cabo los convenios, finalizamos para la última semana de marzo, el cumplimiento de los diferentes requerimientos para la realización idónea de los proyectos.

3.3.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Las actividades realizadas en el mes de marzo en esta JAC fueron:

- Toma de muestras para los estudios y diseños.
- Adquisición de la dotación del personal.
- Realización de los exámenes de ingreso para el personal.
- Recepción de los estudios y diseños.
- Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.087.709,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	8.474.501,00 6%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	- %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	- %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	- %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	- %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	- %
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
PERIODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	\$	-
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.		

Ilustración 16. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

3.3.2. VEREDA MARTINEZ

Las actividades adelantadas son:

- Recepción de estudios y diseños.
- Realización de los exámenes de ingreso para el personal.
- Adquisición de la dotación del personal.
- Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.
- Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.262.168,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	10.629.637,00	7%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.			

Ilustración 17. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

3.3.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

Las actividades realizadas en el mes fueron:

- Recepción de estudios y diseños.
- Realización de los exámenes de ingreso para el personal.
- Adquisición de la dotación del personal.
- Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

			OBRA
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.494.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	10.629.637,00	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%
		SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		☐	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:			
VALOR FACTURA:		\$	-
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.			

Ilustración 18. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

3.3.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

Las actividades acumuladas en el mes son:

- Recepción de estudios y diseños.
- Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.
- Adquisición de la dotación del personal.
- Realización de los exámenes de ingreso para el personal.
- Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	147.391.893,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	8.453.110,00	6%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI	NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: \$ _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité.			

Ilustración 19. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

De las metas establecidas para las primeras semanas de marzo de 2024, las cuales fueron:

- Selección del resto de personal para ejecución de la obra (8 obreros).
- Realización de los exámenes médicos para los ingresos.
- Registro del personal a la seguridad social.
- Definición del P.A.G.A
- Cotización de la dotación para el personal.
- Cotización de materiales y equipos necesarios para la ejecución del convenio.
- Realización del plan de compras, inversión y presupuesto del convenio.

De las anteriores se logro cumplir con cada una de ellas excepto la definición del P.A.G.A, puesto que no se habían definido los lineamientos generales a tener en cuenta para abarcar este tema, pero ya estos se definieron, por lo cual se llevará a cabo para el siguiente mes. Otra meta faltante fue el plan de inversión por parte de los residentes de las JAC, pero esto se definirá en las primeras semanas de abril, con el objetivo de cumplir con los objetivos pactados para el mes siguiente.

Recalcamos que la inversión ejecutada acumulada para las JAC de San José de Canalete y Morindo Santa Cruz, no varían con respecto a la del mes de febrero, porque no se han realizado más desembolsos. Mientras que para el caso de las JAC de Martínez y Villa Esther, estas van un poco mas adelantadas en cuestiones de las compras iniciales y realización de los ajustes de estudios y diseños, por lo cual se hace necesario realizar el desembolso del saldo restante, correspondiente a los estudios y diseños. Ambas JAC eligieron al mismo contratista para realizar dicha actividad (Ingeniero Robinson Martínez) por ende dicho saldo es igual para ambas y compete a \$ 2'535.000.

Para las primeras semanas de mes de abril de 2024, establecemos los siguientes compromisos:

- Definición del plan de inversión.
- Realización de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

- Inicio de actividades preliminares del proyecto.

3.4. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- La interventoría pacta con las JAC definir los proveedores de los materiales, maquinarias y equipos, con el fin tenerlos presentes, para realizar las consignaciones con tiempo, propiciando la mayor fluidez en obra.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	OAC	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRA
Puerto Escondido	4313	San José de Canalete	04/04/2024
Puerto Escondido	4081	Vereda Martinez	02/04/2024
Puerto Escondido	4122	Villa Esther	02/04/2024
Los Córdoba	4578	Morindo Santa Cruz	01/04/2024

Tabla 5. Fechas estimadas de inicio

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Los reportes necesarios que se realizarán periódicamente para llevar a cabo el convenio, serán los consignados a continuación, estos se hacen al momento de entrar en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento, y como aún no hemos entrado en esta etapa, aun no se han diligenciado, pero al igual se consignarán aquí, los formatos, para tener constancia de ellos.

4.1. RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**

4.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**

4.8. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Formato **MEPI-MN1-IN-2-FR14**

4.9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

Formato **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**

4.10. INFORMES SEMANALES

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

4.11. ACTAS DE COMITÉ

Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-1**

4.12. ACTAS DE REUNIÓN

Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-2**

5. CONCLUSIONES

- A pesar de que se han presentados retrasos para iniciar labores en obra, las juntas han adelantado lo necesario para que al momento de que se de inicio a trabajo en campo, todo fluya de manera continua y el proyecto se pueda realizar de manera idónea.

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p>	
<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)</p>		

6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS




REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONVENIO SOLIDARIO 4313 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**








DESCRIPCIÓN:

Realización de la toma de muestras para estudios y diseños, realización del segundo comité operativo y compras de dotación y valla.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4081 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO



DESCRIPCIÓN:

Realización del segundo comité operativo y compra de las compras de las dotaciones.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONVENIO SOLIDARIO 4122 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**



DESCRIPCIÓN:

Realización del segundo comité operativo y compra de las compras de la dotación.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO 4578 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBA S



Nuestros caminos comunitarios contribuyen a la paz total
Mantenimiento y mejoramiento de corredor vial
Vereda Morindo Santa Cruz, municipio de Los Córdoba, Córdoba



FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO
01/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
02/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
03/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
04/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
05/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
06/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
07/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
08/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
09/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
10/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
11/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
12/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
13/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
14/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
15/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
16/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
17/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
18/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
19/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
20/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
21/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
22/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
23/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
24/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
25/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
26/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
27/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
28/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
29/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
30/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
31/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO
01/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
02/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
03/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
04/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
05/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
06/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
07/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
08/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
09/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
10/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
11/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
12/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
13/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
14/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
15/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
16/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
17/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
18/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
19/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
20/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
21/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
22/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
23/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
24/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
25/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
26/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
27/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
28/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada
29/03/2024	Revisión de planos de mejoramiento	Vanegas Dumar	En curso
30/03/2024	Compra de materiales para el mejoramiento	Vanegas Dumar	Pendiente
31/03/2024	Reunión de la Junta de Acción Comunal	Juan Carlos Rodríguez	Finalizada



DESCRIPCIÓN:

Realización del segundo comité operativo y compra de las dotaciones.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

7. ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 4313 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALATE
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1253823		10	NACIÓN	4313 - 2023	\$ 200.508.096	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.508.096,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 8.474.501	\$ 8.474.501	\$ 8.474.501	\$ -	\$ -	1253823	\$ 192.033.595	\$ 192.033.595				SE LE HACE DESEMBOLO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 8.474.501	\$ 8.474.501	\$ 8.474.501				\$ 192.033.595	\$ 192.033.595				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: _____
Nombre: Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Nombre: Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MNT-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 4981 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	156623		10	NACIÓN	4313 - 2023	\$ 199.688.487	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.688.487.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 10.629.637	\$ 10.629.637	\$ 10.629.637	\$ -	\$ -	1253823	\$ 189.058.850	\$ 189.058.850				SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 10.629.637	\$ 10.629.637	\$ 10.629.637				\$ 189.058.850	\$ 189.058.850				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar V

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 4122 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	150023		10	NACIÓN	4122 - 2023	\$ 200.928.587	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.928.587,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 10.629.637	\$ 10.629.637	\$ 10.629.637	\$ -	\$ -	1253823	\$ 190.298.950	\$ 190.298.950				SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 10.629.637	\$ 10.629.637	\$ 10.629.637				\$ 190.298.950	\$ 190.298.950				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4
(01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 4578 - 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	158623		10	NACIÓN	4578 - 2023	\$ 199.822.623	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.822.623,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	COMITÉ	FEBRERO 2024		\$ 8.453.110	\$ 8.453.110	\$ 8.453.110	\$ -	\$ -	1253823	\$ 191.369.513	\$ 191.369.513				SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA.
TOTALES				\$ 8.453.110	\$ 8.453.110	\$ 8.453.110				\$ 191.369.513	\$ 191.369.513				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278797 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

7.1. ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DE LA VEREDA MARTINEZ

Montería, Marzo 18 de 2024

Señores:
 Banco Av Villas
 Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

Nombre	Junta de Acción Comunal VEREDA MARTINEZ Municipio de Puerto Escondido
	Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS
Nit	901.640.586-8
Cuenta Corriente	550082952

Transferir a:

Banco	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Nombre Titular	Nit/cc	Valor
Bancolombia	Ahorros	68041402800	ROBINSON ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL	11.002.312	\$ 2.535.000

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
 Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,
 Firmar autorizadas

Med: Ida Hara Perez Martinez
 Nombre: MEDILDA PEREZ MARTINEZ
 Representante Legal
 JAC Vereda Martínez
 C.C. 1.064.307.746

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
 Representante Legal Interventoría
 C.C. 50.907.967

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023	 VANEGAS DUMAR <small>INGENIERÍA S.A.S.</small>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 4 (01 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2024)		

7.2. ACTAS DE COMITÉ, COTIZACIONES Y CARTAS DE DESEMBOLSO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER

Montería, Marzo 19 de 2024

Señores:

Banco Av Villas
Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

Nombre	Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido
	Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS
Nit	901.605.175-6
Cuenta Corriente	550082986

Transferir a:

Banco	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Nombre Titular	Nit/cc	Valor
Bancolombia	Ahorros	68041402800	ROBINSON ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL	11.002.312	\$ 2.535.000

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,
Firmar autorizadas

Luis Angel Vargas m
Nombre: LUIS ANGEL VARGAS MADRID
 Representante Legal
 JAC Vereda Villa Esther
 C.C. 1.233.688.295

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
 Representante Legal Interventoría
 C.C. 50.907.967
