

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1. Apoyar la realización de diseños técnicos, de acuerdo con el área de su especialidad, con el fin de aportar a la secretaria de Infraestructura y Hábitat con la entrega de diseños, GDB esquemas y/o planos según sea requerido.	Se apoyo en la realización de diseños técnicos del componente geotécnico de los siguientes proyectos: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONSTRUCCIÓN DE LA SUB-ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCIO EN LA VEREDA DEL ESPEJO - VEREDA PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
2. Realizar la revisión técnica, de acuerdo con el área de su especialidad, de las consultorias radicadas y/o entregadas a la Secretaría de Infraestructura y Hábitat	Se realizó la revisión técnica del componente geotécnico de los siguientes proyectos: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA SUBRASANTE PARA LA PAVIMENTACION DE 1,7 KM DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO IQUEIMA AL AEROPUERTO SANTIAGO VILA, MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA. - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ZONA CENTRO MUNICIPIO DE ICONONZO	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
3. Realizar visitas técnicas a las emergencias, proyectos, convenios y/o contratos que se desarrollen y se ejecuten en la secretaria de Infraestructura y Hábitat, evidenciadas en informes que contengan recomendaciones técnicas y/o de diseño según se requiera en el marco del proyecto desarrollo e innovación de la infraestructura vial y puentes en el departamento del Tolima.	Se realizaron las siguientes visitas: - Visita técnica de inspección visual a los sitios críticos de la vereda pastales, la vega y casco urbano del corregimiento de villa restrepo en la ciudad de Ibagué, Tolima - Visita de inspección visual a la vía terciaria que del casco urbano de Ibagué conduce a las veredas Toche, Cural y la tigrera de la ciudad de Ibagué, Tolima.	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A

4. Realizar apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la dirección de infraestructura en donde haya sido delegado como supervisor, en el marco de las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente en el marco del proyecto desarrollo e innovación de la infraestructura vial y puentes en el departamento del Tolima	Se realizó el apoyo a la supervisión del contrato de consultoría No. 1404 de 2025, cuyo objeto es el siguiente: - CONTRATAR LA EJECUCION DE INVESTIGACIONES DE CAMPO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA SUELOS REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
5. Brindar apoyo técnico de acuerdo con el área de su especialidad a los municipios, cuando estos lo requieran para el desarrollo de los procesos que se adelanten con la secretaria de infraestructura y hábitat	En el periodo comprendido desde el 27 de abril de 2025 y 26 de mayo de 2025, No fueron requeridas la ejecución de actividades sobre la obligación.	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
6. Digitar y preparar las respuestas a oficios para la firma del director de infraestructura y/o secretario(a) de infraestructura y hábitat según lo asignado.	Se realizó la proyección de los siguientes oficios: - COD. 200 – OFICIO No. 656, cuyo objeto que la Remisión de observaciones técnicas a los entregables producto del contrato de Consultoría de referencia	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
7. Presentar informes de actividades al supervisor del contrato cuando le sean solicitadas	En el periodo comprendido desde el 27 de mayo de 2025 y 25 de junio de 2025, se realizó el informe técnico de: - Actividades del contrato No. 0195 de 2025. - De la visita técnica de inspección visual a los sitios críticos de la vereda pastales, la vega y casco urbano del corregimiento de villa restrepo en la ciudad de Ibagué, Tolima - De la visita de inspección visual a la vía terciaria que del casco urbano de Ibagué conduce a las veredas Toche, Cural y la tigrera de la ciudad de Ibagué, Tolima. -	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
8. Hacer parte del comité evaluador de los procesos contractuales de la dirección de infraestructura, que le sean asignados por el secretario de Infraestructura y Hábitat	En el periodo comprendido desde el 27 de mayo de 2025 y 25 de junio de 2025, No fueron requeridas la ejecución de actividades sobre la obligación.	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
9. Presentar informe final de procesos de supervisión a cargo (contratos o convenios) y procesos precontractuales en el formato establecido por la Secretaría	Se participó en las siguientes reuniones y/o comités técnicos por solicitud de la secretaria: - Comité técnico gobernación y alcaldía de Ibagué para el proyecto de pavimentación de la vía El Salado, del municipio de Ibagué, departamento del Tolima. - Comité técnico vías urbanas Icononzo en compañía de la alcaldía municipal y Consultor.	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A
10. Presentar informe final de procesos de supervisión a cargo (contratos o convenios) y procesos precontractuales en el formato establecido por la Secretaría	Se brindo apoyo en los ajustes requeridos por la oficina de contratación a los documentos precontractuales del proyecto cuyo objeto es: CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DEL PUNTO CRITICO SECTOR TIENDA NUEVA EN LA VÍA IBAGUÉ ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	Informe de actividades	informe de supervision secop II	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el	Se asigna como supervisor del contrato No. 0195 de 24 de enero 2025 a JULIO CESAR GALLO ORTIZ	No.0195 de 24 de enero 2025	Plataforma del Secop II	N/A
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se verifico la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	INFORME SUPERVISION	Plataforma del Secop II	N/A
3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniaras a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se verifico los pagos por medio de sus documentos de soporte	Informe de Supervision	Plataforma del Secop II	N/A
5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se realiza los tramites pertinentes	Informe de Supervision	Plataforma del Secop II	N/A

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

FIRMA:

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :

JULIO CESAR GALLO ORTIZ


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-015
			Versión: 01
			Vigente desde: 24/11/2010
			Pág. 1 de 16

INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. 0195 del 27 de enero de 2025		
OBJETO:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	
PERIODO DEL INFORME:	27 DE MAYO DE 2025 AL 25 DE JUNIO DE 2025	FECHA DEL INFORME : 25 DE JUNIO DE 2025

AVANCE						
Estimación Actual		Realidad Actual		% Avance a la fecha		
Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado	Avance Real	Avance Real %
27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025		83.33%	83.33 %
Observaciones:						
ETAPAS	Estimación Actual		AVANCE REAL		% Avance a la fecha	
	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado	Avance Real
1. Apoyar la realización de diseños técnicos, de acuerdo con el área de su especialidad, con el fin de aportar a la secretaría de Infraestructura y Hábitat con la entrega de diseños, GDB esquemas y/o planos según sea requerido.	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%
						Se apoyo en la realización de diseños técnicos del componente geotécnico de los siguientes proyectos:
						- CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL DEPARTAMENTO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-015
			Versión: 01
	Informe de Actividades		Vigente desde: 24/11/2010
			Pág. 2 de 16

							NTO DEL TOLIMA. CONSTRU CIÓN DE LA SUB- ESTRUCTU RA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCIO EN LA VEREDA DEL ESPEJO VEREDA PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAM ENTO DEL TOLIMA.
2. Realizar la revisión técnica, de acuerdo con el área de su especialidad, de las consultorías radicadas y/o entregadas a la Secretaría de Infraestructura y Hábitat	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%	Se realizó la revisión técnica del componente geotécnico de los siguientes proyectos: - ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA SUBRASANTE PARA LA



3. Realizar visitas técnicas a las emergencias, proyectos, convenios y/o contratos que se desarrollen y se ejecuten en la secretaría de Infraestructura y Hábitat, evidenciadas en informes que contengan recomendaciones técnicas y/o de diseño según se requiera en el marco del proyecto.	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%	<p>PAVIMENTACION DE 1,7 KM DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO IQUEIMA AL AEROPUERTO SANTIAGO VILA, MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA. MEJORAMIENTO O Y PAVIMENTACION DE VIAS ZONA CENTRO MUNICIPIO DE ICONONZO.</p> <p>- Se realizaron las siguientes visitas:</p> <p>- Visita técnica de inspección visual a los sitios críticos de la vereda pastales, la vega y casco urbano del corregimiento de villa restrepo en la ciudad de Ibagué, Tolima. Visita de inspección visual</p>
--	------------	------------	------------	------------	--------	--------	--

desarrollo de la innovación de la infraestructura vial y puentes en el departamento de Tolima.							a la vía terciaria que del casco urbano de Ibagué conduce a las veredas Toche, Cural y la tigrera de la ciudad de Ibagué, Tolima.
4. Realizar apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la dirección de infraestructura en donde haya sido delegado supervisor, en el marco de las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de acuerdo con lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente en el marco del proyecto de desarrollo ...	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%	Se realizó el apoyo a la supervisión del contrato de consultoría No. 1404 de 2025, cuyo objeto es el siguiente: - CONTRATAR LA EJECUCION DE INVESTIGACIONES DE CAMPO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA SUELOS REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-MC-015

Versión: 01

Vigente desde:
24/11/2010

Pág. 5 de 16

Informe de Actividades

INFRAESTRUC TURA Y HABITAT DEL DEPARTAMENT O DEL TOLIMA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-MC-015

Versión: 01


Vigente desde:
24/11/2010

Pág. 6 de 16

Informe de Actividades

8. Hacer parte del comité evaluador de los procesos contractuales de la dirección de infraestructura, que le sean asignados por el	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%	En el periodo comprendido desde el 27 de mayo de 2025 y 25 de junio de 2025, No fueron requeridas la ejecución de
	<p>informe técnico de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Actividades del contrato No. 0195 de 2025.- De la visita técnica de inspección visual a los sitios críticos de la vereda pastales, la vega y casco urbano del corregimiento de villa restrepo en la ciudad de Ibagué, Tolima- De la visita de inspección visual a la vía terciaria que del casco urbano de Ibagué conduce a las veredas Toche, Cural y la tigra de la ciudad de Ibagué, Tolima.						


secretario de Infraestructura y Hábitat.	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%	actividades sobre la obligación.
9. Asistir a los comités técnicos que programe el secretario de Infraestructura y Hábitat.						83.33%	Se participó en las siguientes reuniones y/o comités técnicos por solicitud de la secretaria: <ul style="list-style-type: none"> - Comité técnico gobernanción y alcaldía de Ibagué para el proyecto de pavimentación de la vía El Salado, del municipio de Ibagué, departamento del Tolima. - Comité técnico vías urbanas Icononzo en compañía de la alcaldía municipal y Consultor.
10. Presentar informe final de procesos de supervisión a cargo o (contratos convenios) y procesos precontractuales en el formato establecido por la Secretaría.	27/01/2025	25/07/2025	27/05/2025	25/06/2025	83.33%	83.33%	Se brindo apoyo en los ajustes requeridos por la oficina de contratación a los documentos precontractuales del proyecto cuyo objeto es: CONTRATAR LA CONSULTORIA



ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERÍODO EVALUADO					responsable
Nº	actividades				
1	<p>SE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS DEL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.</p> <p>HTTPS://NA01.SAFELINKS.PROTECTION.OUTLOOK.COM/?URL=HTTPS%3A%2F%2F1DRV.MS%2FF%2FC%2FE2C76169C08D4EC3%2FEH6SNZQJ2HDMN4-3-MDXU6QQBTS2JFQFRYH5QKHMWQ6CEW%3FE%3DODBAKR&DATA=05%7C02%7C%7C3664A43A8E7E48A46DC808DD9E3CCE6A%7C84DF9E7FE9F640AFB435AAAAAAAAAAAA%7C1%7C0%7C638840706172926801%7CUNKNOWN%7C7WFPBGZSB3D8EYJFBXB0EU1HCGKIONRYDWUSILYIOIWLJAUMDAWMCISILATOIJXAW4ZMIISIKFOIJOITWFPBCISILDUIJOYFQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&SDATA=AFIVRFINIHTKL5ZXNM5NKO%2F900C9JZZJOIYDEKZA7Z1M%3D&RESERVED=0</p>				LEIDY CAMIL A HERN ANDE Z CARRILLO
2	<p>SE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS DEL COMPONENTE GEOTÉCNICO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA SUB-ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCIO EN LA VEREDA DEL ESPEJO - VEREDA PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.</p>				LEIDY CAMIL A HERN ANDE Z CARRILLO


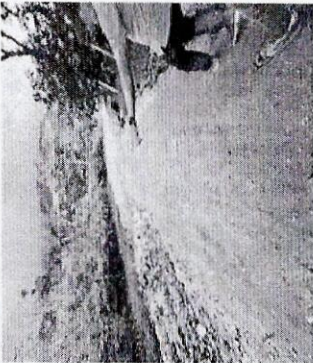
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-015
	Informe de Actividades		Versión: 01
			Vigente desde: 24/11/2010
			Pág. 9 de 16

3	<p>COMPONENTE GEOTECNIA - PUENTE PIEDRA GRANDE DE FRESNO</p> <p>leidy camila hernandez carrillo Para: vanessamartinez@gmail.com CC: leidy@virogmatas.com@gmail.com Cco: Secretaría de Infraestructura, Direccion de Infraestructura</p> <p>COMPONENTE GEOTECNIA-20 9/10/10</p> <p>Buenos dias Ing. Vanessa.</p> <p>Te adjunto el componente de Geotecnica del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA SUB-ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCIO EN LA VEREDA DEL ESPEJO - VEREDA PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.</p> <p>Adjunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTUDIO DE SUELOS - ANEXOS - ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO - MEMORIA Y DOCUMENTOS PROFESIONALES <p>SE REALIZÓ LA REVISIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE GEOTÉCNICO DEL SIGUIENTE PROYECTO: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA SUBRASANTE PARA LA PAVIMENTACION DE 1,7 KM DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO IQUEIMA AL AEROPUERTO SANTIAGO VILA, MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.</p> <p>VIA AEROPUERTO FLANDEZ - REVISION GEOTECNICA Y GEOLOGICA</p> <p>Informe REL.VI.pdf</p> <p>leidy camila hernandez carrillo Para: Maria Praga CC: Direccion de Infraestructura</p> <p>Informe REVISION GEOTECNIA ... 210 KB</p> <p>Informe REVISION GEOTECNIA ... 210 KB</p> <p>2 archivos adjuntos (420 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo</p> <p>Buenos dias Ing. Salome,</p> <p>Te adjunto la revisión geotécnica y geológica del proyecto denominado ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA SUBRASANTE PARA LA PAVIMENTACION DE 1,7 KM DE LA VIA QUE CONDUCE DEL BARRIO IQUEIMA AL AEROPUERTO SANTIAGO VILA, MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.</p> <p>Quedo atento a lo que requieras adicional y a la confirmación de la hora de la mesa técnica del día martes</p>	LEIDY CAMILA HERNANDEZ CARRILLO
4	SE REALIZÓ LA REVISIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE GEOTÉCNICO DEL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y	LEIDY

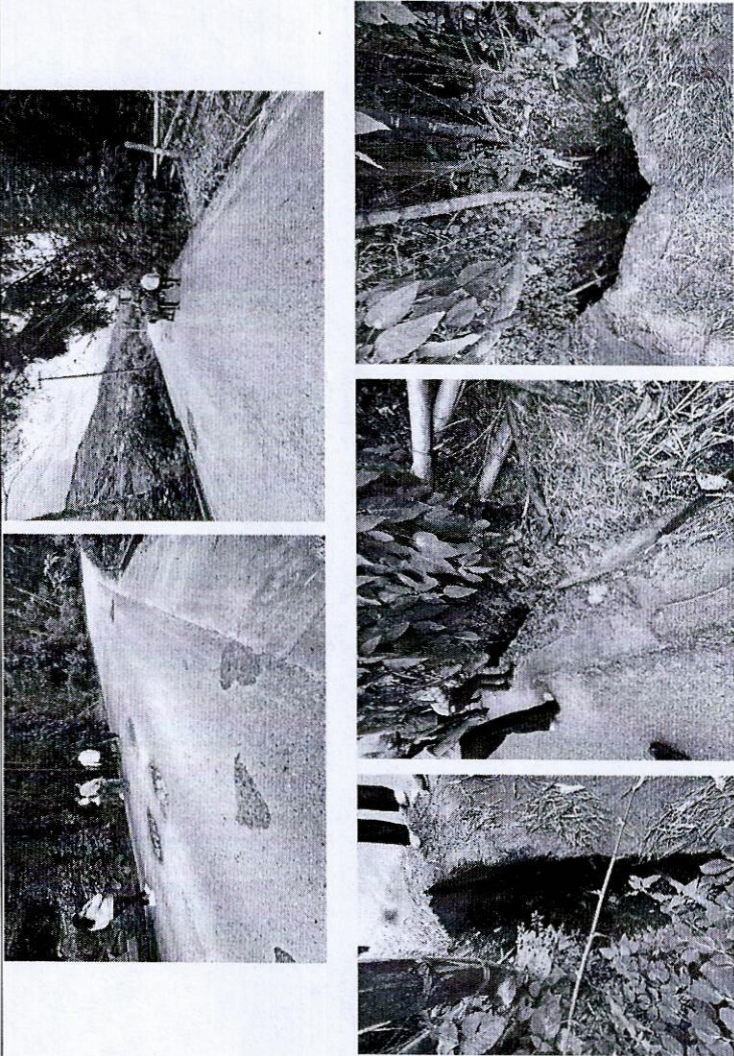



	<p>PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ZONA CENTRO MUNICIPIO DE ICONONZO</p> <div>  leidy.camila.hernandez.carrillo </div> <p>Para: Usted; Wilfer Tovar</p> <p>Cco: Dirección de Infraestructura</p> <p> INFORME SEGUNDA REVISIÓN DEL... 712 KB</p> <p>Buenas tardes Ing. Wilfer,</p> <p>Realizo el envío de las observaciones técnicas y presupuestales de la SEGUNDA REVISIÓN del componente geotécnico del proyecto denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ZONA CENTRO MUNICIPIO DE ICONONZO.</p> <p>Quedo atenta</p> <p>Cordialmente,</p>	<div> <div>Responder</div> <div>Responder a todos</div> <div>Repetir</div> <div>Lun 16 Jul 2018 4:10 PM</div> </div>	CAMILA HERNÁNDEZ CARRILLO
5	<p>SE REALIZARON LA SIGUIENTE VISITA: VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL A LA VÍA TERCIARIA QUE DEL CASCO URBANO DE IBAGUÉ CONDUCE A LAS VEREDAS TOCHE, CURAL Y LA TIGRERA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, TOLIMA.</p> <div>  </div>	<div> <div>LEIDY CAMILA HERNÁNDEZ CARRILLO</div> <div>MBA Magister en Ingeniería Civil</div> <div>Celular: 3203728166</div> </div>	LEIDY CAMILA HERNÁNDEZ CARRILLO


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-015
			Versión: 01
	Informe de Actividades		Vigente desde: 24/11/2010
			Pág. 11 de 16

6	    	LEIDY CAMIL A HERN ANDE Z CARRI LLO
	SE REALIZARON LA SIGUIENTE VISITA: VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN VISUAL A LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VEREDA PASTALES, LA VEGA Y CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA RESTREPO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, TOLIMA.	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-015
			Versión: 01
	Informe de Actividades		Vigente desde: 24/11/2010
			Pág. 12 de 16

7		SE REALIZO LA PROYECCIÓN DE LOS SIGUIENTES OFICIOS: COD. 200 – OFICIO NO. 656, CUYO OBJETO QUE LA REMISIÓN DE OBSERVACIONES TÉCNICAS A LOS ENTREGABLES PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE REFERENCIA	LEIDY CAMIL A HERN ANDE Z

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-015
	Informe de Actividades		Versión: 01
			Vigente desde: 24/11/2010
			Pág. 13 de 16

8	<p>  </p> <p> 4 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo </p> <p> Buenas tardes señ, porfa podrias enviar el contenido de este correo a proyectomunicipal@servu@gmail.com </p> <p> Ibagué (Tolima), 25 de junio de 2025 COD. 200 – OFICIO No. 656 </p> <p> Señores CERBA GROUP S.A.S, NIT. 901750970-5, RL JOHAN MAURICIO CARDONA CORTES Ciudad </p> <p> Ref.: contrato de Consultoría No. 3672 del 7 de noviembre de 2024, cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DEL PUNTO CRITICO EN EL SECTOR PUERTO PERU SOBRE LA VIA IBAGUE – JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” </p>	CARRILLO
	<p> SE REALIZO LA PROYECCIÓN DE LOS SIGUIENTES OFICIOS: DE LA VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN VISUAL A LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VEREDA PASTALES, LA VEGA Y CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA RESTREPO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, TOLIMA. </p>	LEIDY CAMILA A HERNANDEZ CARRILLO



Informe de Actividades

Código: FOR-MC-015

Versión: 01

Vigente desde:
24/11/2010

Pág. 14 de 16

 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p>	<p>GOBERNACIÓN DEL TOLEMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NIT: 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT</p>	 <p>www.tolema.gob.mx</p>	<p>Pág. 1 de 20</p>
---	---	---	---------------------

INFORME DE VISITA
VISITA DE LA INSPECCIÓN VISUAL Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DEL ESTADO ACTUAL DE DISTINTOS PUNTOS ENTRE LOS CUALES SE DESTACA EL PUENTE UBICADO SOBRE LA QUEDRADA LA PLAYA EN EL CORREGIMIENTO DE PASTALES, PUENTE EN VILLA RESTREPO Y PUNTO CRÍTICO SECTOR PUERTO PERU EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ -TOLIMA.

Fecha:	12	De	JUNIO	De	2025
--------	----	----	-------	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DE LA VISITA.	DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	ASISTENTES
Realizar la inspección visual y diagnóstica preliminar del estado actual de las obras de la vía de acceso al Complejo de la Virgen de la Llaneta, en la zona alta del casco urbano del municipio de Baguete, en la vía maestra y punto crítico sector Puente Pico en el municipio de Baguete.	Un acuerdo con el Decreto 0117 del 26 de enero del 2022 los idios juveniles se encuentran sobre la vía con un ancho de 4,01(102) Baguete - Villavieja. El Municipio de Trinité ordena un conchaleo de 20 X 7m.	Ing. Carlos Hernández Ing. Generalista SH Ledy Carina Hernández Ing. Generalista SH Carlos Andres Dominguez - Ing. Hidráulico SH Karen Oliveros Morales - Ing. Estructural SH Josepht Gonzalez - concejal de Baguete

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

2.1. GENERALIDADES

1. Pavimento sobre la vereda La Vega (\$1)
2. Puente en la vereda La María (\$2)
3. Alcántara sobre sacos Tres esquinas (\$3)
4. Pórtico vereda llantos (\$1)
5. Alcantara sobre el sector Puerto Perú (\$5)
6. Puntón Modular sobre la quebrada La Paja en la vereda Pasajeros (\$6).

	<p>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NIT: 900 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT INFORME DE VISITA TÉCNICA</p>	 <p>Www.gobtolima.gub.pe</p>
<p>Pág. 2 de 20</p>		

7. Puente sobre el Río Combeima en el corregimiento de Villa Rosaura (S7).

2.2. LOCALIZACIÓN



Figura 7. Localizações das estações de amostragem no rio São Francisco, no município de São Paulo, SP.

SITIO	COORDENADAS
1	Panorama sobre la vertiente La Virgen
2	Panorá en la vertiente La Mula
3	Acantilado sobre sector Tiras Esquinas
4	Panorá sobre sector Tiras Esquinas
5	Acantilado sobre el sector Puerto Peño
6	Panorá Modular sobre la quebrada La Palu en la vertiente Occidental
7	Panorá sobre el Confinamiento


Confidence Intervals for the Probability of a Success in a Single Trial

Edificio Gobernación del Tellinga - Carrera 3 entre calle 10 y 11

U

SE REALIZO LA PROYECCIÓN DE LOS SIGUIENTES OFICIOS: DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL A LA VÍA TERCARIA
QUE DEL CASCO URBANO DE IBAGUÉ CONDUCE A LAS VEREDAS TOCHE, CURAL Y LA TIGRERA DE LA CIUDAD DE
IBAGUÉ, TOIIMA

LEIDY
CAMIL
A
HERN
ANDE
Z
CARRI
LLO



Pág. 15 de 16

Informe de Actividades

<div data-bbox="391 1134 409 1568"> <p>FW: INFORME TÉCNICO DE VISTA - VÍAS VEREDAS TUNELES, TIGRERA, EL CUBRAL - IBAGUE</p> </div> <div data-bbox="427 1289 443 1568"> <p>📎 INFORME_VIA_VIC.pdf 📎 PRESENTACION.pdf</p> </div> <div data-bbox="470 1377 487 1568"> <p>👤 leidy.camilia@embarcador.com</p> </div> <div data-bbox="496 1360 514 1568"> <p>Para: sebastianortiz@gmil.com</p> </div> <div data-bbox="531 1203 558 1568"> <p>📧 INFORME VISTA TÉCNICA E DE AL... 7 MB</p> </div> <div data-bbox="566 1203 592 1568"> <p>📧 PRESENTACIÓN.pdf 4 MB</p> </div> <div data-bbox="602 1203 620 1568"> <p>📧 2 archivos adjuntos (11 KB) 📧 Guardar todos en OneDrive 📧 Descargar todos</p> </div> <div data-bbox="646 1463 664 1568"> <p>Buenos días Ing.</p> </div> <div data-bbox="672 627 690 1568"> <p>Adjunto el informe técnico de la vista realizada a la vía que conduce a las veredas LOS TUNELES, EL CUBRAL y LA TIGRERA de la ciudad de Ibagué. Así mismo, adjunto la presentación del informe para socializar el día de hoy 20 de junio en mesa técnica.</p> </div> <div data-bbox="708 1482 724 1568"> <p>Cordialmente,</p> </div>	<p>SE PARTICIPÓ EN LAS SIGUIENTES REUNIONES Y/O COMITÉS TÉCNICOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARÍA: COMITÉ TÉCNICO GOBERNACIÓN Y ALCALDÍA DE IBAGÜÉ OMITÉ TÉCNICO VÍAS URBANAS ICONONZO EN COMPAÑÍA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DE LA ALCAIDA MUNICIPAL Y CONSULTOR SALADO, DEL MUNICIPIO DE IBAGÜÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.</p>	<div data-bbox="917 1272 1234 1883"> </div> <div data-bbox="917 470 1234 1081"> </div> <div data-bbox="971 210 1216 296"> <p>LEIDY CAMILIA A HERNANDEZ ANDEZ CARRILLO</p> </div>
---	---	--
