



INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATO SA-006-2025

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JULIO DE 2025

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre



1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Sucre suscribió con la empresa LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S el CONTRATO No 006-2025 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

El presente informe presenta el resumen del estado técnico, legal, presupuestal y administrativo del Contrato. Igualmente, se comentan las actividades relevantes desarrolladas durante la ejecución del contrato.

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

2. INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO

Información general	
Contrato	SA-006-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Partes que intervienen en el contrato - Marco legal	
Contratante	Departamento de Sucre
Contratista	LAG Construcciones Integrales S.A.S/ R.L Lizeth Martínez Jurado
Supervisión	Jeiny Emiliani Ruiz - Subsecretaria de Recursos Físicos
Fechas y plazos	
Inicio del Contrato	13 de Junio de 2025
Plazo inicial	1 mes
Fecha de terminación del contrato	13 de Julio de 2025
Avance Físico	
Avance ejecutado	57,02%
Estado actual	En ejecución
Estado financiero	
Inversión Contratada	\$118.492.160
Valor pagado del anticipo	\$ 0
Valor a pagar Acta Parcial No 1	\$67.566.258

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación se detallan las cantidades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES EJECUTADAS
1	PARQUEADERO		
1,1	PINTURA ZONA DE PARQUEADEROS	M2	1000,00
2,0	ZONAS EXTERIORES		
2,1	LIMPIEZA Y DESMANCHE PISO	M2	
2,2	PINTURA REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	
2,3	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	48,00
2,4	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UN	400,00
2,5	IMPERMEABILIZACION Y ENCHAPE DE ALBERCA SUBTERRANEA	M2	

Lizeth Martinez Jurado
LIZETH ESTHER MARTINEZ JURADO
LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT: 900.711.495-8
Representante Legal

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre


4. REGISTRO FOTOGRAFICO

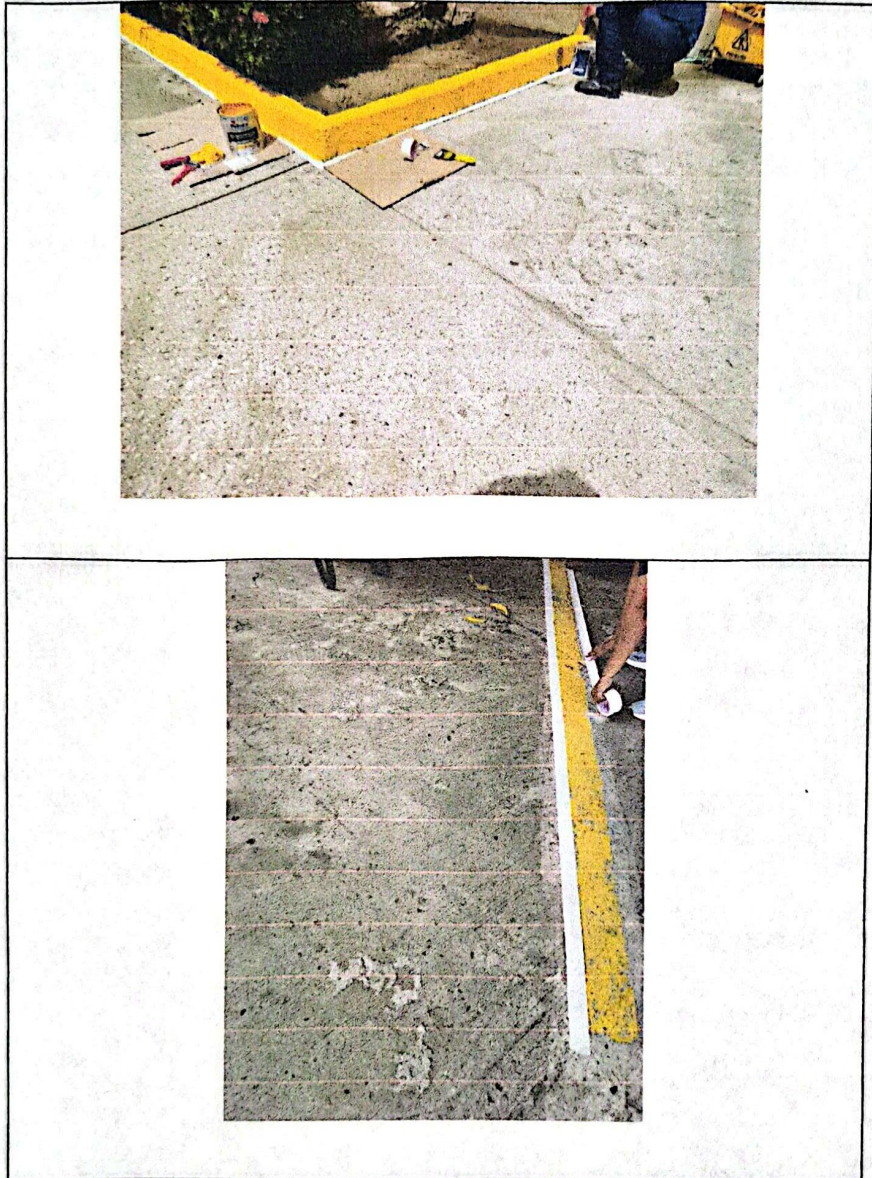


Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre



Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

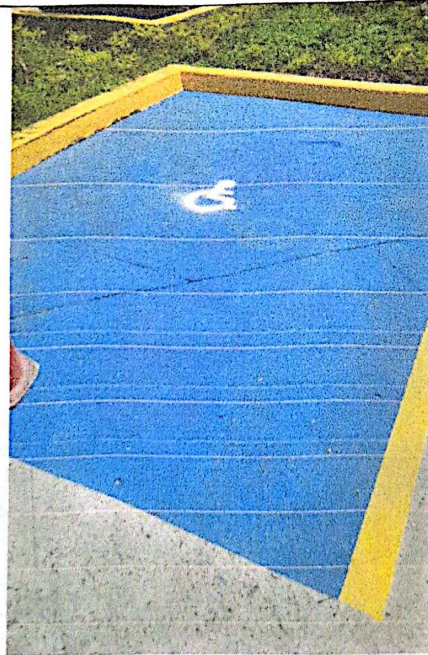



Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

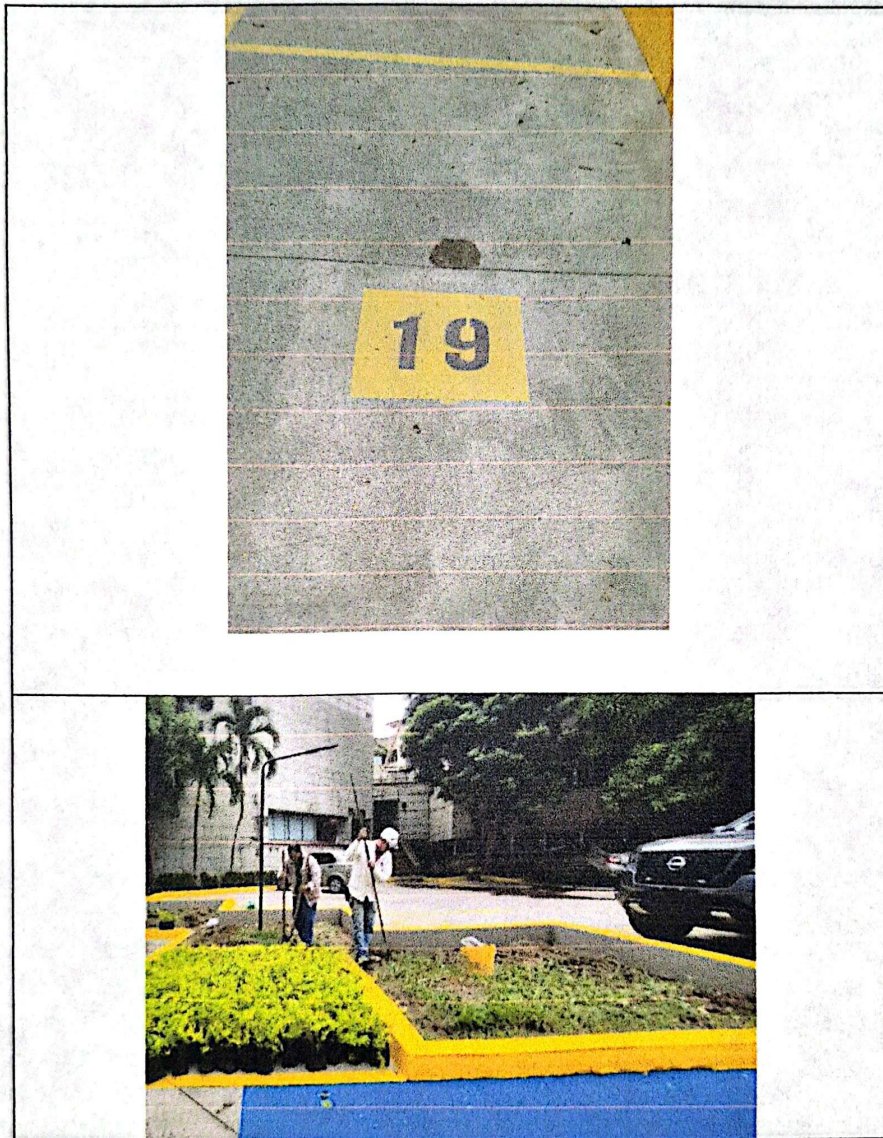

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre



Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

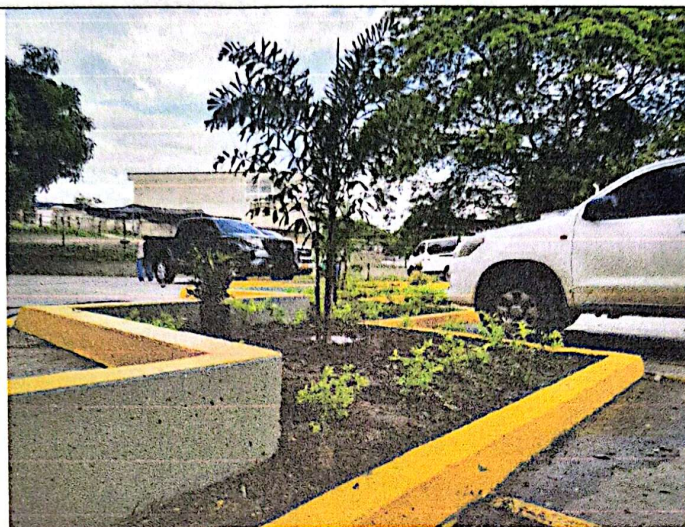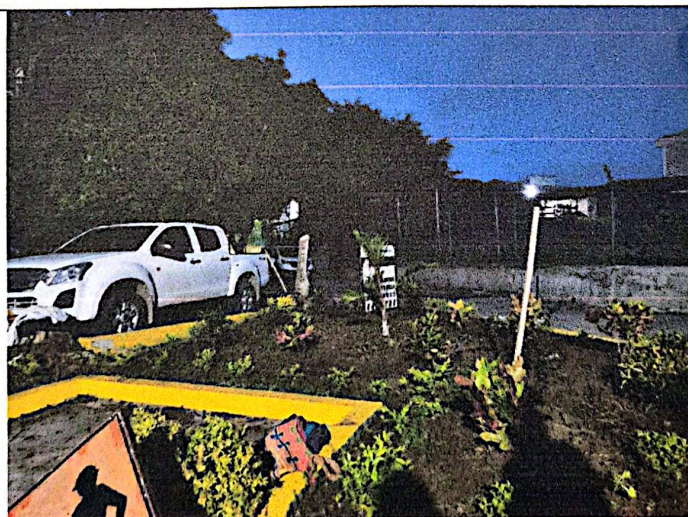

Dirección: Carrea 20 Nro. 27 - 87 OFICINA 304
Teléfono: 300-6266109
E-Mail: amconstrucciones1622@hotmail.com
Sincelejo - Sucre
