



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

Manizales (Caldas), 19 de septiembre de 2021

Arquitecta
VALENTINA ESPITIA GALVIS
Supervisora
Secretaría del Deporte
La Ciudad

ASUNTO: INFORME FINALIZACION Y ENTREGA DE OBRAS, CONTRATO DE OBRA N° 2104080385

Cordial saludo

Se realiza informe de las obras finalizadas en relación al **CONTRATO DE OBRA N° 2104080385**, el registro a continuación descrito, en cantidades y por áreas intervenidas, se soportan por con su respectivo archivo fotográfica.

TABLA 1 RESUMEN AREAS INTERVENIDAS

NECESIDAD	ZONA INTERVENIDA	AREAS FINALIZADAS
1. CAMERINO A	X	X
2. CAMERINO B	X	X
3. CAMERINO C	X	X



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

4. CAMERINO D	X	X
5. CUERPO TECNICO B-D	X	X
6. ILUMINACION ZONAS COMUNES	X	X
7. CONMEBOL	X	X
8. CAMERINO ARBITROS	X	X
9. MUROS	X	X
10. ACABADOS DE PINTURA	X	X
11. GENERAL ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	X	X
12. PISOS ESPECIALES	X	X
13. BANCO DE SUPLENTE	x	X
14. RECOGEBOLAS	x	X
15. LAVANDERIA	x	X

1 CAMERINO A, B, C, D, CAMERINO ARBITROS Y RECOGEBOLAS

Finalización de actividades en camerinos A – B – C - D

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA CAMERINO A – B – C - D



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.





ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.





ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.






ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

ACABADOS Y TERMINACIONES DE LOS BAÑOS EN CAMERINOS

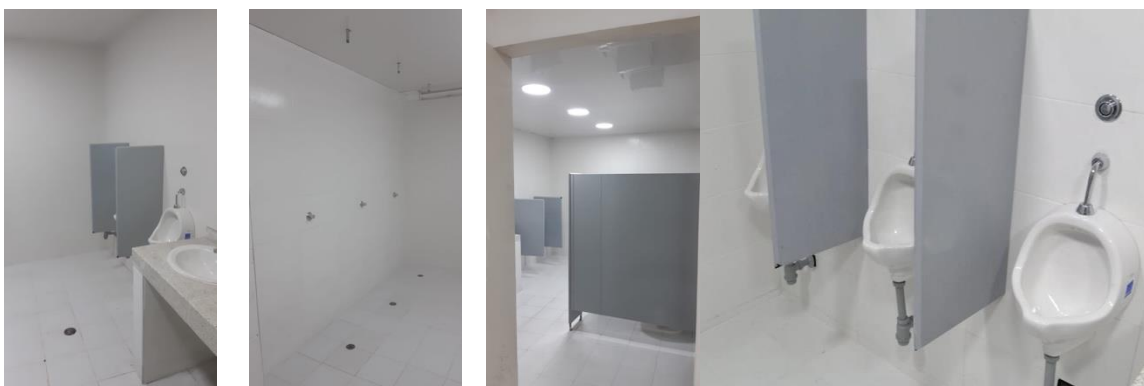

Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

1.ACTIVIDADES Y CANTIDADES CAMERINO A

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.5	DEMOLICIÓN MURO O ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	2,98
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS	M2	32,75
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS	M2	87,25
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	17,00
1.10	DESMONTE CIELO RASO	M2	32,75
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	20,00
1.12	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3,00
1.13	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑOS - CUALQUIER MATERIAL	M2	13,50
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	13,50
4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	13,50
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	8,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	9,00
4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA ELONGADA, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE BOTÓN ANTIVANDÁLICO Y MUEBLE - IGUAL O SIMILAR A: TAZA: MARCA CORONA DE BAJO CONSUMO	UND	3,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	5,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	3,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4"	UND	13,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	9,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	3,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	5,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	3,00
5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	14,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	1,00
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUOPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	32,75
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EUROCERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	87,25
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	32,75
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	120,00
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TV CN INCLUYE CORDON TV BLANCO + TAPA	UND	1,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

13.4	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS Cat 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK RJ45 ROJO/AZUL	UND	1,00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	15,00
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE SOBREPONER HERMETICA 48 WATTS	UND	2,00
13.10	INSTALACION SIN SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑOS EXISTENTES INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y REPARACION DE PASADORES Y OTROS A LOS QUE HAYA LUGAR PARA SU OPTIMA OPERATIVIDAD	M2	13,50

2.ACTIVIDADES Y CANTIDADES CAMERINO B

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.5	DEMOLICIÓN MURO O ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	3,29
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS	M2	30,13
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MUROS	M2	86,86
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	17,00
1.10	DESMONTE CIELO RASO	M2	30,13
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	20,00
1.12	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3,00
1.13	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑOS - CUALQUIER MATERIAL	M2	13,57
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	13,50
4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	13,50
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	8,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	9,00
4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA ELONGADA, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE BOTÓN ANTIVANDÁLICO Y MUEBLE - IGUAL O SIMILAR A: TAZA: MARCA CORONA DE BAJO CONSUMO	UND	3,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	5,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	3,00
4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con cosco - Ref. C-6"x4"	UND	13,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	9,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	3,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	4,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	3,00
5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	11,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	1,00
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUOPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	30,13
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EUROCERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	86,86
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	30,13



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	116,99
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TV CN INCLUYE CORDON TV BLANCO + TAPA	UND	1,00
13.4	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS Cat 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK RJ45 ROJO/AZUL	UND	1,00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	15,00
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE SOBREPONER HERMETICA 48 WATTS	UND	2,00
13.10	INSTALACION SIN SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑOS EXISTENTES INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y REPARACION DE PASADORES Y OTROS A LOS QUE HAYA LUGAR PARA SU OPTIMA OPERATIVIDAD	M2	13,50

3.ACTIVIDADES Y CANTIDADES CAMERINO C

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.5	DEMOLICIÓN MURO O ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	3,29
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS	M2	31,27
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS	M2	86,94
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	17,00
1.10	DESMONTE CIELO RASO	M2	31,27
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	20,00
1.12	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3,00
1.13	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑOS - CUALQUIER MATERIAL	M2	13,64
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	12,75
4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	12,75
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	8,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	9,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA

Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA ELONGADA, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE BOTÓN ANTIVANDÁLICO Y MUEBLE - IGUAL O SIMILAR A: TAZA: MARCA CORONA DE BAJO CONSUMO	UND	3,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	5,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	3,00
4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4"	UND	13,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	9,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	3,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	4,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	4,00
5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	14,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	1,00
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUOPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	31,27



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EUROCERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	86,94
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	31,27
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	118,21
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TV CN INCLUYE CORDON TV BLANCO + TAPA	UND	1,00
13.4	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS Cat 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK RJ45 ROJO/AZUL	UND	1,00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	15,00
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE SOBREPONER HERMETICA 48 WATTS	UND	2,00
13.10	INSTALACION SIN SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑOS EXISTENTES INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y REPARACION DE PASADORES Y OTROS A LOS QUE HAYA LUGAR PARA SU OPTIMA OPERATIVIDAD	M2	13,64

4.ACTIVIDADES Y CANTIDADES CAMERINO D

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.5	DEMOLICIÓN MURO O ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	3,26
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS	M2	31,44
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS	M2	87,02
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	17,00
1.10	DESMONTE CIELO RASO	M2	31,44
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	20,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

1.12	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3,00
1.13	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑOS - CUALQUIER MATERIAL	M2	13,50
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	14,80
4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	14,80
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	8,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	9,00
4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA ELONGADA, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE BOTÓN ANTIVANDÁLICO Y MUEBLE - IGUAL O SIMILAR A: TAZA: MARCA CORONA DE BAJO CONSUMO	UND	3,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	5,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	3,00
4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4"	UND	13,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	9,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	3,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	4,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	2,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	13,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	1,00
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUOPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	31,44
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EUROCERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	87,02
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	31,44
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	118,46
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TV CN INCLUYE CORDON TV BLANCO + TAPA	UND	1,00
13.4	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS Cat 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK RJ45 ROJO/AZUL	UND	1,00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	15,00
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE SOBREPONER HERMETICA 48 WATTS	UND	2,00
13.10	INSTALACION SIN SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑOS EXISTENTES INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y REPARACION DE PASADORES Y OTROS A LOS QUE HAYA LUGAR PARA SU OPTIMA OPERATIVIDAD	M2	13,50



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9


MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

5. ADECUACIÓN ZONA CUERPO TECNICO B-D

Finalización de actividades adecuación de oficinas del cuerpo técnico

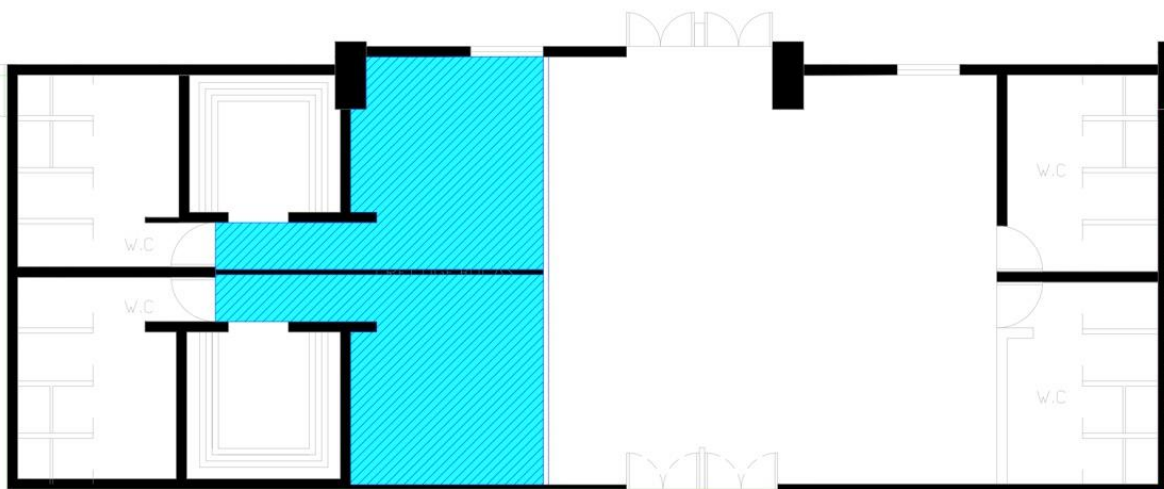

PLANTA ZONIFICACION CUERPO TECNICO B-D

REGISTRO FOTOGRAICO ZONA CUERPO TECNICO B - D





ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

TERMINACION DE PISOS CUERPO TECNICO B - D



ACTIVIDADES Y CANTIDADES CUERPO TÉCNICO B-D

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS	M2	5,36
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MUROS	M2	25,19
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	2,00
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	3,00
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	4,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA

Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	2,00
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	3,00
4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO Tipo Institucional Bajo Consumo 1.6 litros por descarga, color blanco para conexión por detrás, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (Incluye asiento sanitario comodor Blanco, Marca Grival+ BOTÓN ANTIVANDÁLICO Tipo DOCOL.	UND	1,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	1,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	1,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	1,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1,00
5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	2,00
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUROPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	5,36
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EURO CERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	25,19
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	5,36
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	30,55
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	2,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

6. ILUMINACION ZONAS COMUNES

Finalización de actividades de iluminación de áreas comunes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD LUMÍNICA DE LOS ESPACIOS



ZONA DE ACCESOS Y CIRCULACIÓN ALEDAÑA



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES ILUMINACION ZONAS COMUNES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	PRELIMINARES		
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	115,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	16,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	16,00
5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	32,00
5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE COBRE THWN #12	ML	137,80
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	51,90
13	NO PREVISTOS		
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	74,00
13.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 30X120 48 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	8,00
13.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 60X60 48 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	24,00
13.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REFLECTOR LED MULTIPUNTO 100 WATTS IP65 (INTEMPERIE) LUZ BLANCA CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO Y VIDRIO TEMPLADO INCLUYE SOPORTE, CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA AEREA	UND	9,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería




CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

7. CONMEBOL

Se finalizan las actividades relacionadas a Conmebol.

PROPUESTA ZONA CONMEBOL

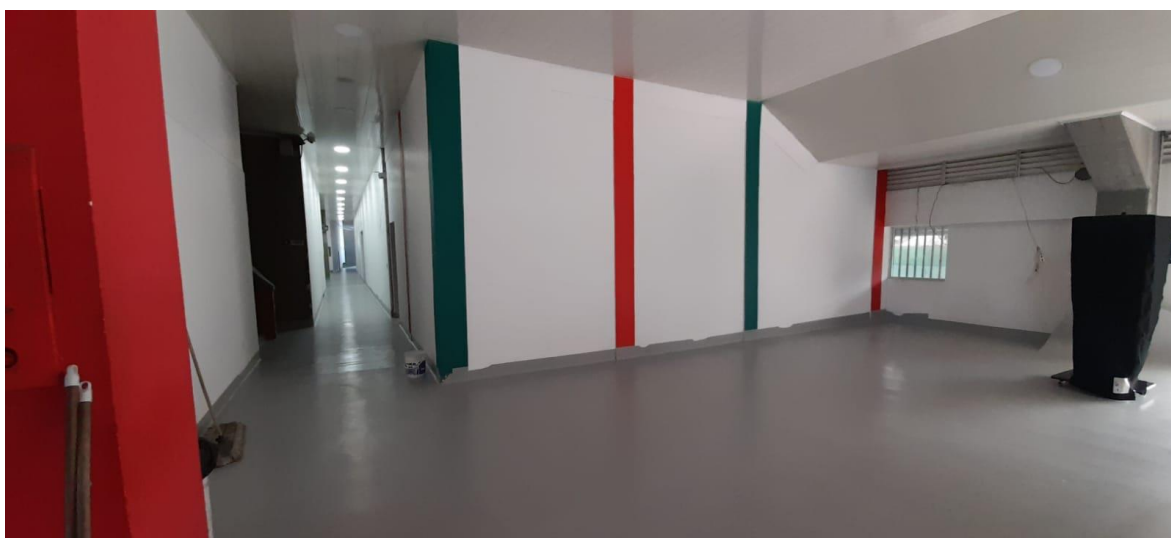

Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500




ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

REGISTRO FOTOGRAFICO ADECUACION DE BAÑO

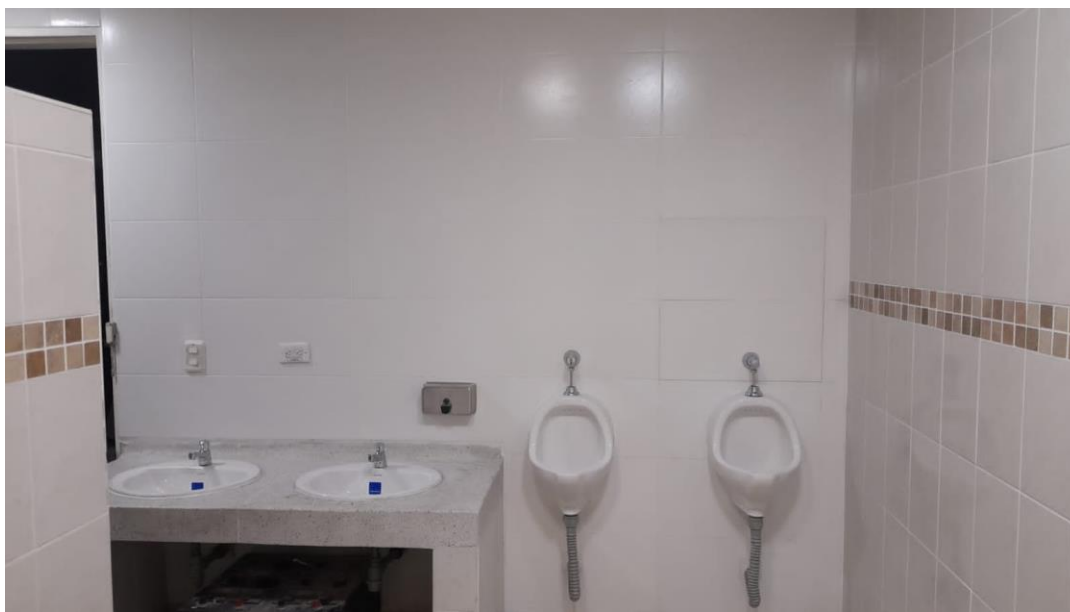

Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.



Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONMEBOL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.5	DEMOLICIÓN MURO O ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	5,90
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS	M2	1,00
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MUROS	M2	12,63
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	9,00
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	6,00
1.12	DESMONTE DE ESPEJO	M2	1,10
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	8,30
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	4,00
4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO Tipo Institucional Bajo Consumo 1.6 litros por descarga, color blanco para conexión por detrás, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (Incluye asiento sanitario comodor Blanco, Marca Grival+ BOTÓN ANTIVANDÁLICO Tipo DOCOL.	UND	2,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	2,00
4.17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	0,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	2,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	6,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	2,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	9,00
5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE COBRE THWN #12	ML	38,10
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	11,70
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	12,30
7	MUROS		
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	59,63
7.4	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERÍOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4,27
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUROPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	1,00
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EUROCERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	11,32
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	20,51
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	9,00
13.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	363,97



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

8.CAMERINO ARBITROS

Finalización de actividades en camerino de árbitros

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES Y CANTIDADES CAMERINO ARBITROS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS	M2	15,07
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS	M2	62,13



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	7,00
1.10	DESMONTE CIELO RASO	M2	15,07
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	7,00
1.12	DESMONTE DE ESPEJO	M2	2,02
1.13	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑOS - CUALQUIER MATERIAL	M2	3,49
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	4,00
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	6,00
4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	12,00
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	3,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	6,00
4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA ELONGADA, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE BOTÓN ANTIVANDÁLICO Y MUEBLE - IGUAL O SIMILAR A: TAZA: MARCA CORONA DE BAJO CONSUMO	UND	2,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	2,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	2,00
4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4"	UND	4,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	3,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	2,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	7,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	3,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	17,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	2,00
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUOPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	15,07
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EUROCERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	62,13
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	15,07
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	77,20
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TV CN INCLUYE CORDON TV BLANCO + TAPA	UND	1,00
13.4	SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS Cat 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK RJ45 ROJO/AZUL	UND	2,00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	3,00
13.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 60X60 48 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	4,00
13.10	INSTALACION SIN SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑOS EXISTENTES INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y REPARACION DE PASADORES Y OTROS A LOS QUE HAYA LUGAR PARA SU OPTIMA OPERATIVIDAD	M2	3,49



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería





CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

9. MUROS

Finalización de actividades Muros

REGISTRO FOTOGRAFICO

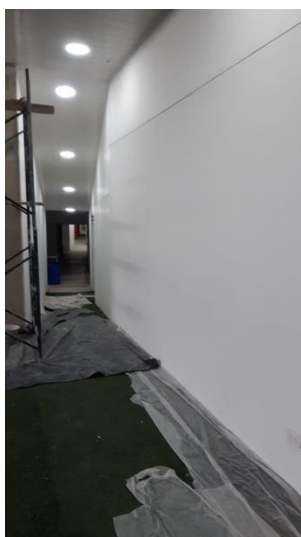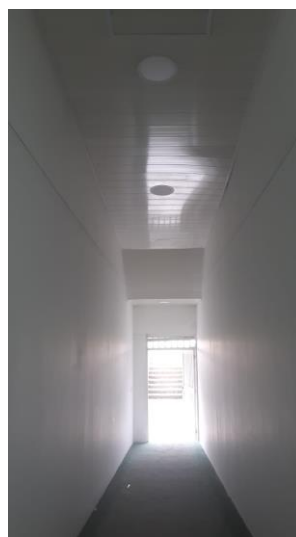



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES MUROS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.8	DEMOLICION MURO EN DRY WALL	M2	80,45
6	CONCRETOS		
6.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	156,00
7	MUROS		
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	18,12
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	63,27
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	ML	44,26
7.4	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERÍOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATAIONES)	M2	98,11
13	NO PREVISTOS		
13.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	130,08



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

10.ACABADOS DE PINTURA

Finalización de acabados de pintura

REGISTRO FOTOGRÁFICO






ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

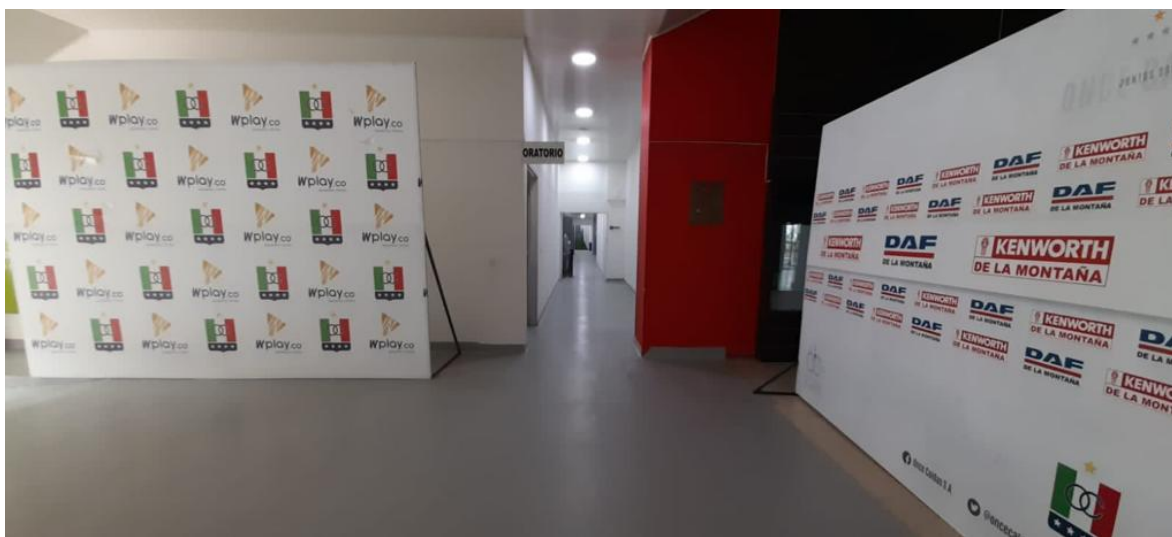

ACTIVIDADES ACABADOS DE PINTURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	20,80
1.2	DESMONTE Y RETIRO DE CUALQUIER PUBLICIDAD GRÁFICA ADHERIDA A SUPERFICIES	M2	471,50

Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

7	MUROS		
7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERÍOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	51,69
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE HIDROLAVADO PARA CIELO RASO - INCLUYE DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADABLE DESENGRASANTE INDUSTRIAL	M2	796,34
10	PINTURA		
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR. INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES. COLOR SEGÚN DISEÑO TIPO VINILTEX PINTUCO O SIMILAR	M2	233,96
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	0,00
10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	1893,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

Finalización de actividades de aseo y retiro de escombros






ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

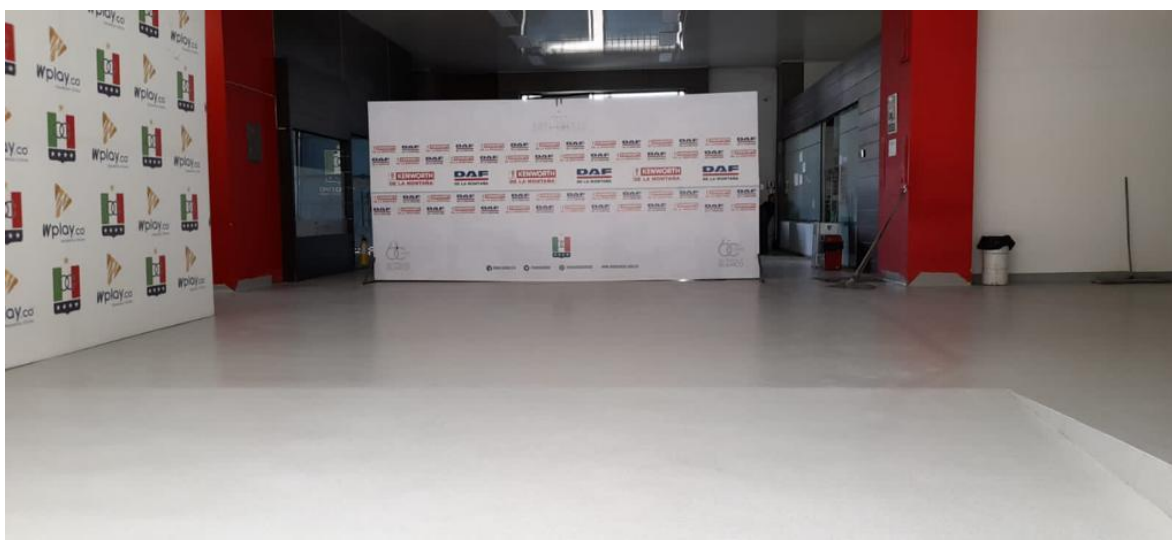



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.






ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

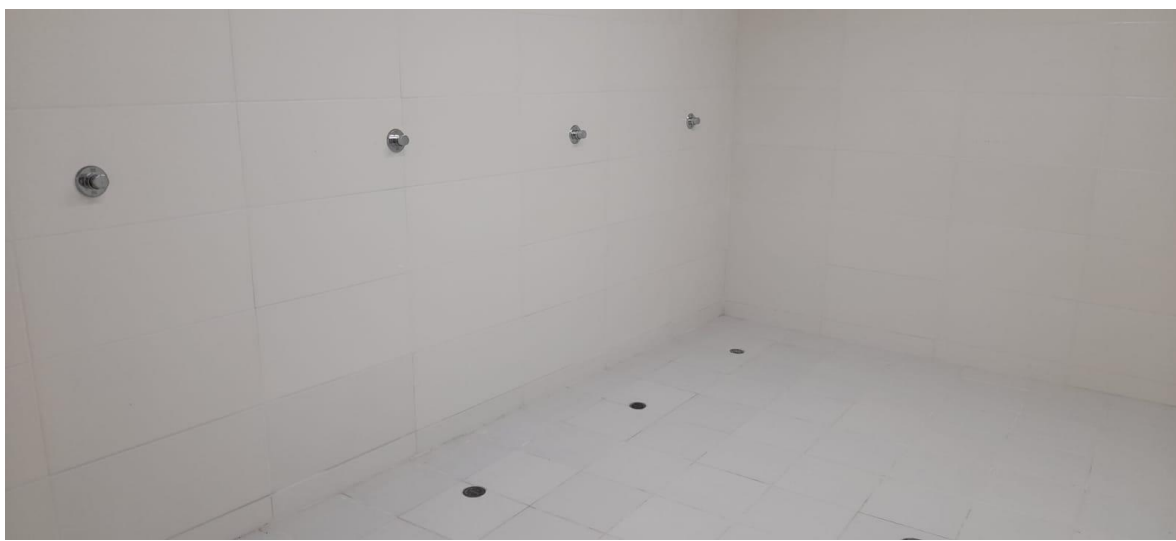



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.



Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.



ACTIVIDADES Y CANTIDADES ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.3	DESMONTE, TRASLADO MANUAL Y REUBICACIÓN DE TODO TIPO DE ENSERES O ELEMENTOS SIN FIJACIÓN	M3	69,00
1.14	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	45,00
11	VARIOS		
12	PB-0000003 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	UN	1,00

Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

12. PISOS ESPECIALES

Se finalizan actividades de pisos las cuales se registran a continuación.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.






ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

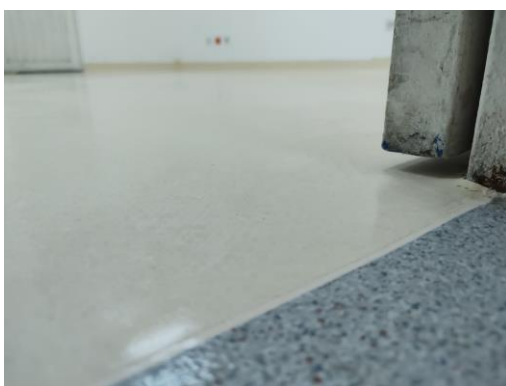



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.






ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

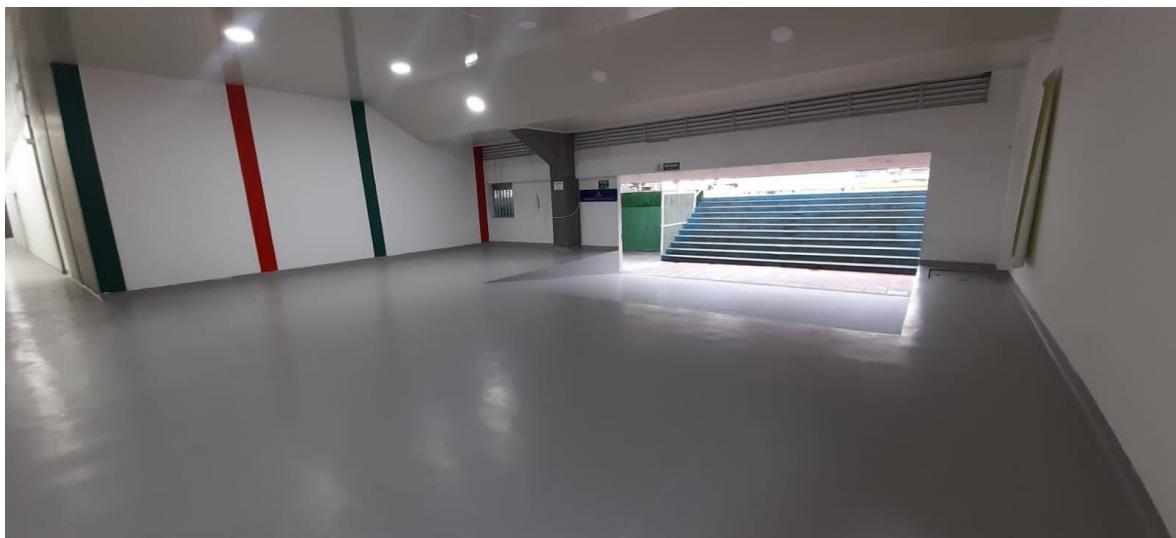



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.





ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.



Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.



ACTIVIDADES Y CANTIDADES PISOS ESPECIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.4	RETIRO DE TAPETE	M2	657,82
8	PISOS Y ENCHAPES		
8.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA MANUAL CON ESPÁTULA Y GRATA METÁLICA, RESANE CON SIKATOP 122, RESANES DE BACHES CON MORTERO ACRÍLICO, REPARACIÓN DE JUNTAS Y SELLO CON POLIURETANO Y FACTOR FORMA CON SIKA ROOD DE 3/8.	M2	1217,54
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BOCEL MEDIA CAÑA PVC, PARA UNIÓN PISO Y PARED	ML	704,90
8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARCACIÓN DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70%, RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	160,66
13	NO PREVISTOS		
13.2	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	369,22



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE PARA PASILLOS Y OTRAS ÁREAS, IGUAL O SIMILAR A: TIPO DRACOL EPDM NO GRANULADO - COLOR SEGÚN DISEÑO - ESPESOR 4 MM, ANCHO DE ROLLO 1 M	M2	0,00
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO EN GOMA VINILO ANTIDESLIZANTE DE 2 MM CON PISO BASE SUAVIZANTE DE 5 MM, PARA CAMERINOS Y ALGUNAS ÁREAS, IGUAL O SIMILAR A: TIPO EMEFLEX WL HOMOGENEOUS - COLORES SEGÚN DISEÑO - ESPESOR 2 MM, ANCHO DE ROLLO 2 M - INCLUYE SELLO DE JUNTAS EN CALIENTE	M2	1095,00

13. BANCO DE SUPLENTES

Se hace entrega del banco de suplentes en relación a las actividades contractuales.

REGISTRO FOTOGRAFICO



	<p align="center">ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA INGENIERIA NIT: 73.126.045 - 9</p>	<p align="center">MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniería</p> 
---	--	---

CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES BANCO DE SUPLENTE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
6	CONCRETOS		
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	4,00
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	KG	4,00
6.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	200,00
6.4	CORTE MECANIZADO DE ANDÉN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	20,00
11	VARIOS		
11.1	ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN A TODO COSTO DE BANCO DE SUPLENTE CON CUBIERTA EN ACRÍLICO, DOS LÍNEAS DE SILLAS, FOSO, ETC - SEGÚN DISEÑO	UN	2,00

14.RECOGEBOLAS

Se finalizan actividades en área de Recogebolas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Crespo Cra 5 A Edificio PRAIA # 67-130 APTO 306
Teléfonos: 666 6005 Cel.: (311) 401 9500



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA

Ingeniería



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES RECOGE BOLAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.6	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS	M2	5,36
1.7	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MUROS	M2	25,19
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	2,00
1.11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	3,00
4	RED, INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS		
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fría (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	4,00
4.5	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ELÉCTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	2,00
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	3,00
4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO Tipo Institucional Bajo Consumo 1.6 litros por descarga, color blanco para conexión por detrás, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (Incluye asiento sanitario comodor Blanco, Marca Grival+ BOTÓN ANTIVANDÁLICO Tipo DOCOL.	UND	1,00
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	1,00
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERÍA, VÁLVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO. IGUAL O SIMILAR A: CORONA REF. 088621001	UND	1,00
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	1,00
5	RED ELÉCTRICA		
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1,00
5.8	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	2,00
8	PISOS Y ENCHAPES		



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO DUROPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGÚN DISEÑO). TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES.)	M2	5,36
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm, IGUAL O SIMILAR A: MARCA EURO CERÁMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	25,19
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	5,36
13	NO PREVISTOS		
13.1	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	30,55
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	2,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
 Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

15.LAVANDERIA

Se finalizan actividades en zona de lavandería.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.9	DESMONTE LÁMPARAS	UN	7,00



ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
INGENIERIA
NIT: 73.126.045 - 9

MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Ingenieria



CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 PROCESO MC-005-2021.

1.10	DESMONTE CIELO RASO	M2	38,28
9	CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS		
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	38,29
13	NO PREVISTOS		
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 24 WATTS LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	7,00

Con el objeto de dar finalización a las obras del **CONTRATO DE OBRA N° 2104080385** el presente informe registra, la culminación de las actividades relacionadas.

Siempre atentos

EQUIPO DE TRABAJO
ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
CONTRATISTA
