



**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES**

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO 73 DE 2022**

**“SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES CON FÁCIL
ADAPTACIÓN AL MEDIO URBANO, REQUERIDOS POR LA GESTORA
URBANA EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES Y LA CALIDEZ DEL PAISAJE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”-**

**AGOSTO 2023
IBAGUÉ-TOLIMA**



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVO	4
1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	5
2.1 LIMPIEZA GENERAL EN LAS ZONAS A INTERVENIR LOCALIZADAS EN EL PREDIO LA PISTA.	5
2.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE 2200 ÁRBOLES.....	6
2.3 PREPARACIÓN Y CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL A SEMBRAR.....	6
2.4 PROCEDIMIENTO DE SIEMBRAS.	6
a. Establecimiento de la reforestación	6
b. Limpieza general	6
c. Trazado.....	7
d. Plateo	7
e. Ahoyado	7
f. Plantación.....	7
g. fertilización	8
h. Control fitosanitario.....	8
i. Hidroretenedor	8
j. Plaqueo y georreferenciación de los individuos establecidos.	8
k. Visitas de control y seguimiento	9
3. PRIMER MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA LAS PLANTACIONES DE LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS	24
3.1 LIMPIEZA GENERAL	24
3.2 RIEGO	24
3.3 PLATEO.....	24
3.4 CONTROL FITOSANITARIO.....	25
3.5 PODAS DE FORMACIÓN	25
3.6 FERTILIZACIÓN.....	25

	<p align="center"> INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES </p>
---	---

3.7 REPOSICIÓN DEL 10%.....	25
3.8 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES A REALIZAR.....	25
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.....	26
5. SEGUNDO MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA LAS PLANTACIONES DE LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS	37
5.1 LIMPIEZA GENERAL.....	37
5.2 RIEGO	37
5.3 PLATEO.....	37
5.4 CONTROL FITOSANITARIO	37
5.5 PODAS DE FORMACIÓN	38
5.6 FERTILIZACIÓN.....	38
5.7 REPOSICIÓN DEL 10%.....	38
5.8 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES A REALIZAR.....	38
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.....	39
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	46

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS SOFOR INGENIEROS LTDA NIT 800082101-9</p>	<p align="center">INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES</p>
--	--

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto presentar el informe final de actividades ejecutadas por parte de nuestra firma SOFOR INGENIEROS SAS con el fin de dar a conocer el alcance del contrato número 73 que tiene como objeto el “SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES CON FÁCIL ADAPTACIÓN AL MEDIO URBANO, REQUERIDOS POR LA GESTORA URBANA EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CALIDEZ DEL PAISAJE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”.


OBJETIVO

- Describir en el informe final las actividades ejecutadas para el contrato número 73 de 2022 el cual tiene como objeto contratar las obras de suministro, siembra y mantenimiento de árboles con fácil adaptación al medio urbano, requeridos por la gestora urbana en el marco de protección de los recursos naturales y la calidez del paisaje de la ciudad de Ibagué

1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El establecimiento se realizó en un área que dispuso la gestora urbana de Ibagué, esta zona era apta y cumplía con las condiciones de siembra. Se ubicó el área y se procedió por medio del GPS a tomar las coordenadas para lograr su localización más fácil.

El predio se encuentra en las coordenadas: N 4° 26' 03.57" W 75° 09' 27.92"

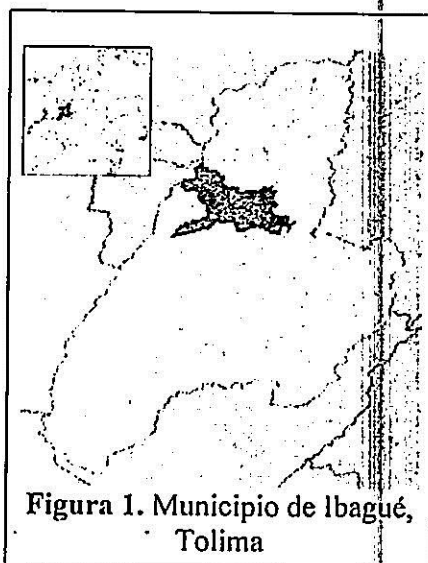

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas en el proyecto y descritas en el presente informe fueron: **SUMINISTRO Y SIEMBRA DE 2200 ÁRBOLES CON FÁCIL ADAPTACIÓN AL MEDIO URBANO, PRIMER MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS SUMINISTRADOS Y ESTABLECIDOS ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO**, cada una de las actividades se describen a continuación:

2.1 LIMPIEZA GENERAL EN LAS ZONAS A INTERVENIR LOCALIZADAS EN EL PREDIO LA PISTA.

Esta actividad comprendió las labores de la limpia del lote a reforestar, las cuales se realizaron mediante el uso de machete y guadaña, eliminando toda la vegetación de rastrojo que pudiera causar efectos negativos en el desarrollo de la plantación y dejando los latizales

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES</p>
---	--

y fustales de las especies arbóreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

2.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE 2200 ÁRBOLES

Una vez definidas con el Supervisor del Contrato las zonas de descargues de material de siembra y tierra abonada, se procedió al suministro del material forestal protector de conformidad con los tiempos de siembra programados.

2.3 PREPARACIÓN Y CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL A SEMBRAR

El material vegetal establecido se encontraba en perfectas condiciones fisiológicas y sanitarias, buena conformación de fuste y copa. El material a sembrar fueron especies forestales protectoras como: Samán, Ocobo, Igua, Guamo de río, Guácimo, Caracolí, Orejero, Vainillo, Gualanday, Ceiba, Carbonero, Guamo macheto, Yopo, Bucaro, Casco de vaca, Ceiba, Cedro rosado, Payande, matarratón, especies tenidas en cuenta debido a su adaptabilidad a las condiciones del sitio, además de la aprobación de la supervisión. Se manejó material vegetal con (altura mínima de 1 m), además se verificó que las plántulas tuvieran un buen sistema radicular, asegurando que no se presentaran defectos, problemas de plagas o enfermedades, que no estuviesen bifurcados, delgados, dañados, torcidos o muy pequeños. El bloque de tierra negra de las plántulas tenía mínimo 50 centímetros de diámetro y las bolsas plásticas se manejaron con medidas mínimas de 60 cm de altura y 40 cm de diámetro. Se realizó El transporte menor y mayor de las plántulas hasta el sitio del establecimiento, este último se realizó técnicamente, de forma tal que el material no sufriera daño. Para El transporte menor se utilizaron, carretillas y canastillas.

2.4 PROCEDIMIENTO DE SIEMBRAS.

Delimitada el área de trabajo en la forma descrita y preparado el material en la forma convenida, se adelantaron las siembras del material forestal protector previstas, por parte de los operarios asignados para esta labor, realizando el siguiente procedimiento:

a. Establecimiento de la reforestación

La reforestación se hizo de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas. Para el proyecto se tuvo en cuenta y se ejecutó el establecimiento de 2200 árboles con alturas mínima de 1 m, con las especies que se adapten a la zona para ser sembrados de acuerdo a las exigencias requeridas. Revisar inciso 2.3

b. Limpieza general

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES**

Esta actividad comprendió las labores de limpia del lote a reforestar, la cuales se realizaron mediante el uso de machete y guadaña, eliminando toda la vegetación de rastrojo que pudiese causar efectos negativos en el desarrollo de la plantación y dejando los latizales y fustales de las especies arbóreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

c. Trazado

El trazado se hizo utilizando el sistema o método de siembra a tres bolillos, la distancia de siembra será de 3x3 metros con una densidad de siembra de 2200 árboles. Se utilizó el anterior sistema debido a que brinda:

- ✓ Sombreado del suelo.
- ✓ Protección de la vida microbiana y benéfica.
- ✓ Retención de la humedad que se encuentra en el suelo.
- ✓ Menor cantidad de maleza en el cultivo debido al sombreado.
- ✓ Control de escorrentías por la inclinación de la pendiente

d. Plateo

Esta labor es de gran importancia para el desarrollo de la plantación; se realizó un plato de un metro de diámetro en cada sitio marcado en el trazo, con el fin de eliminar toda la vegetación rastrera que pueda competir con el árbol, esta labor se ejecutó con ayuda del azadón.

e. Ahoyado

En los puntos marcados se abrieron hoyos de dimensiones 30 x 30 x 30 Cm como mínimo, y se repico en el fondo para buscar un mejor desarrollo de la raíz y por consiguiente mejor adaptación y rápido prendimiento de la plántula.

f. Plantación

El establecimiento se hizo con especies nativas aptas a la zona donde se ejecutó el proyecto y bajo recomendaciones técnicas, además de aprobación de la supervisión. Antes de proceder a la siembra se aplicó al terreno 100 gramos de cal al hoyo para disminuir la acidez del suelo; 500 gramos de abono orgánico, y demás fertilizantes químicos menores y mayores; y 5 gramos de hidroretenedor, este último es el encargado de conservar y suministrar humedad a la plántula, posteriormente se relleno cada hoyo con suelo proveniente del horizonte A, para que la plántula disponga de suficiente materia orgánica en su periodo de adaptabilidad; una vez realizada esta actividad se procedió a la siembra de cada una de las plántulas, para lo cual

	<p align="center">INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES</p>
---	---

se quitó la bolsa que cubre el pan de tierra, al retirar esta, y se colocó en el centro del hoyo y se procedió a apisonar alrededor de la plántula sembrada.

g. fertilización

Para la fertilización de los árboles se aplicaron 500 gramos de abono orgánico por plántula como se mencionó anteriormente. Además, se aplicaron 50 gramos/plántula de fertilizante químico triple 15 como elementos básicos requeridos para un buen desarrollo de las plántulas.

h. Control fitosanitario

Para el control fitosanitario se desarrollaron labores de control de agentes patógenos y entomológicos que amenazarán con el buen desarrollo de la reforestación. (Control de hormiga arriera, minador en las hojas de las plántulas etc.)

i. Hidroretenedor

Se aplicaron 5 gr de hidroretenedor por árbol; debido a que se encontraba en época de lluvias al momento del establecimiento este se aplicó en seco (sin ser activado), en cada hoyo, esto con el fin de brindar humedad a la plántula. Durante el Proceso de Siembra, se tuvo presente lo siguiente: La base del tallo del árbol establecido, quedo al mismo nivel del suelo cuidando que las raíces estén completamente cubiertas. El suelo alrededor del bloque del árbol o planta sembrada, fue moderadamente compactado (compactación manual) con el objeto de eliminar bolsas de aire y buscando que el árbol conserve su posición vertical original de la bolsa.

La Recolección de los residuos sólidos y disposición se hizo en el área autorizada. Todos los residuos que dejo la actividad de plantación fueron recogidos y dispuestos adecuadamente, entre éstos se manejaron sustrato sobrante, bolsas plásticas, hierbas, basura entre otros, los cuales fueron recogidos y entregados a la empresa de aseo de Ibagué (interaseo).

j. Plaqueo y georreferenciación de los individuos establecidos.

Para conocer a futuro y realizar el seguimiento continuo de los individuos establecidos, además para conocer la ubicación precisa de estos, de un área determinada, y sus características, así como su estado fitosanitario, es necesario posicionarlos; para ello, se deben conocer los elementos básicos para su recolección de puntos, por medio del sistema geoposicionador (GPS), y los aspectos fundamentales del llenado de plantillas que apoyen a dicho levantamiento. Es importante realizar los censos del arbolado urbano mediante su ubicación en campo por ende la ubicación de los árboles establecidos fue tomada con ayuda

de un instrumento tecnológico (GPS). Por esto se realizó la georreferenciación de cada individuo establecido, esto con el fin de llevar un seguimiento de estos individuos a futuro.

k. Visitas de control y seguimiento

Para mantener los árboles o plantas ornamentales en buen estado de vigor y sanitario, se realizó un monitoreo continuo visual de los individuos sembrados, con el fin de detectar a tiempo agentes patógenos o daños causados de forma biótica y abiótica. Las Inspecciones se realizaron una vez por semana, informando a la supervisión de lo encontrado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SUMINISTRO Y LA SIEMBRA DE INDIVIDUOS



Foto 1. Recorrido por el predio a intervenir



Foto 2. Reconocimiento del predio a intervenir



Foto 3. Material vegetal en vivero

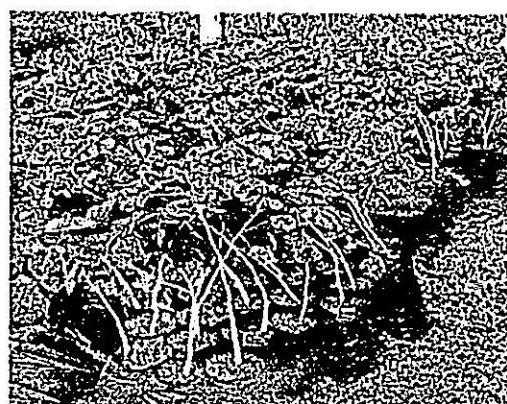


Foto 4. Material vegetal para ser llevado a campo



Foto 5. Transporte mayor del material



Foto 6. Transporte y suministro del material vegetal



Foto 7. Descargue del material



Foto 8. Material vegetal para siembra



Foto 9. Limpia general con guadaña

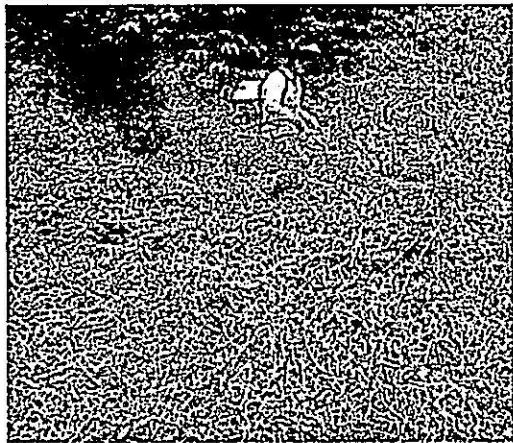


Foto 10. Limpia del predio para siembra

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

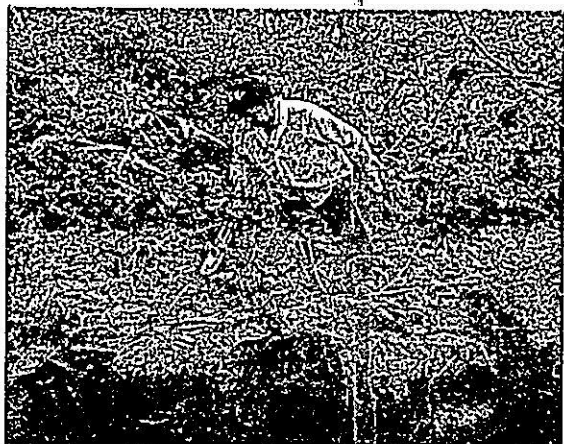


Foto 11. Limpia con machete



Foto 12. Limpia de maleza con machete

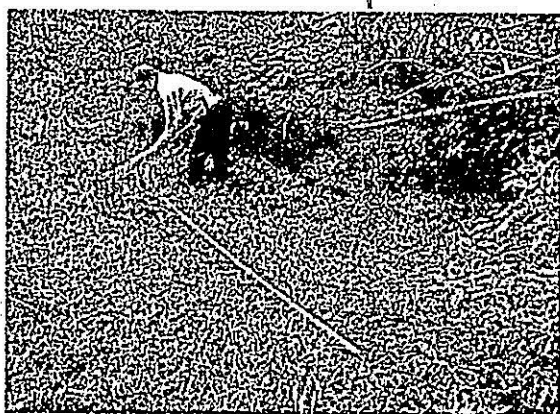


Foto 13. Trazado a tres bolillos cada 3 metros

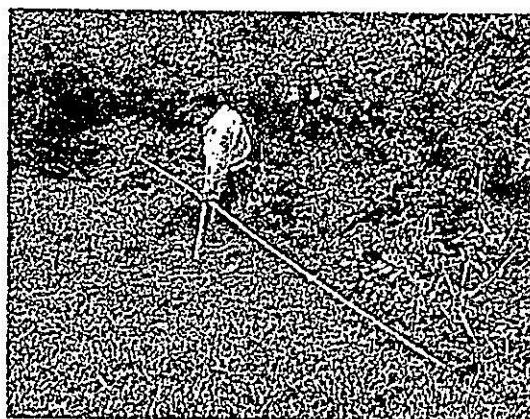


Foto 14. Trazado para siembra

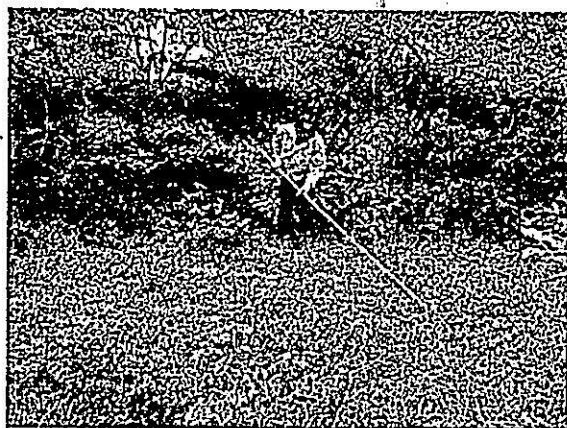


Foto 15. Trazado con ayuda de lúbos de pvc

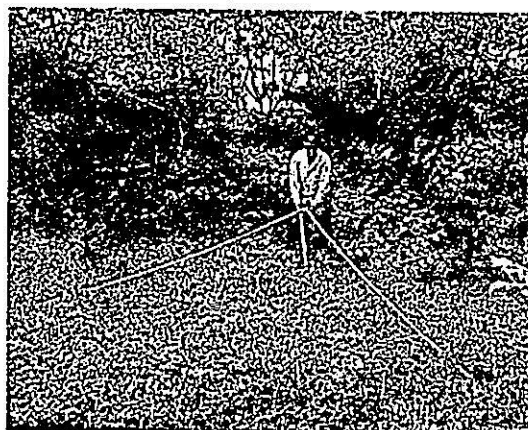


Foto 16. Trazado cada 3 metros



Foto 17. Platos de 1 metro de circunferencia para siembra

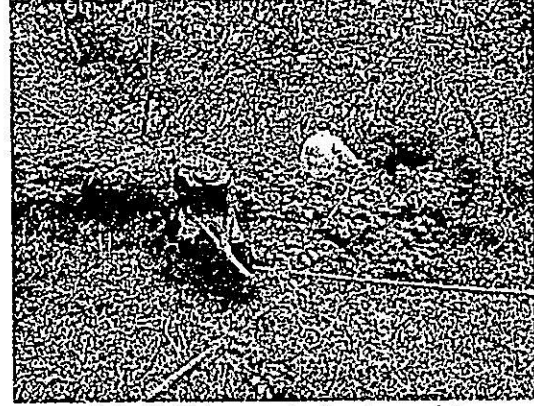


Foto 18. Plateo para siembra de especies



Foto 19. Demarcación y plateo



Foto 20. Demarcación de platos para siembra



Foto 21. Plateo para siembra de especies



Foto 22. Demarcación de platos

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES



Foto 23. Actividades de ahoyado



Foto 24. Hoyo para siembra



Foto 25. Ahoyado



Foto 26. Actividades de ahoyado con ayuda de ahoyadora



Foto 27. Aplicación de hidroretendor



Foto 28. Adecuación del hoyo



Foto 29. Aplicación de materia orgánica



Foto 30. Aplicación de 500 gramos de materia orgánica

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ARBOLES

SOFOR INGENIEROS LTDA
NIT 800082101-9

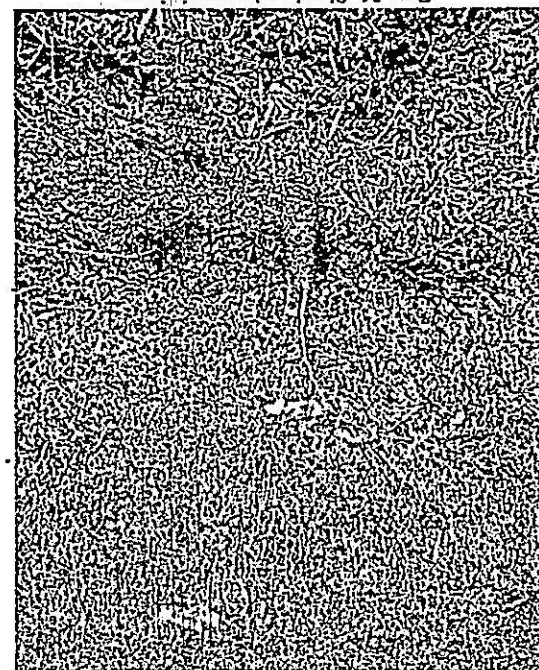


Foto 31. Siembra de especie igua

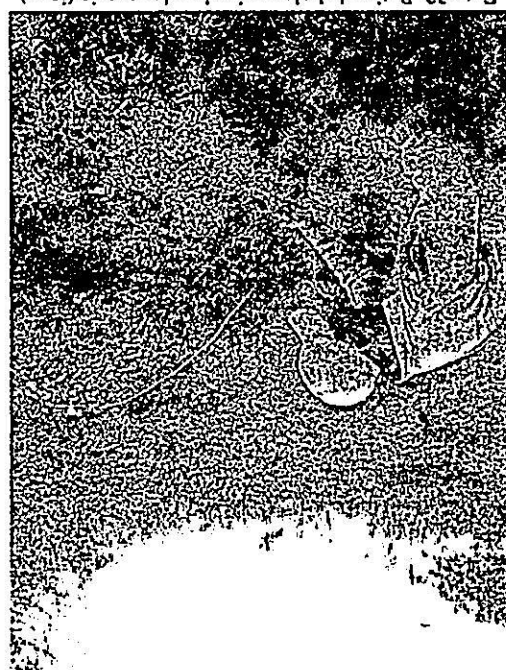


Foto 32. Retiro de bolsa y siembra de especie (igua)

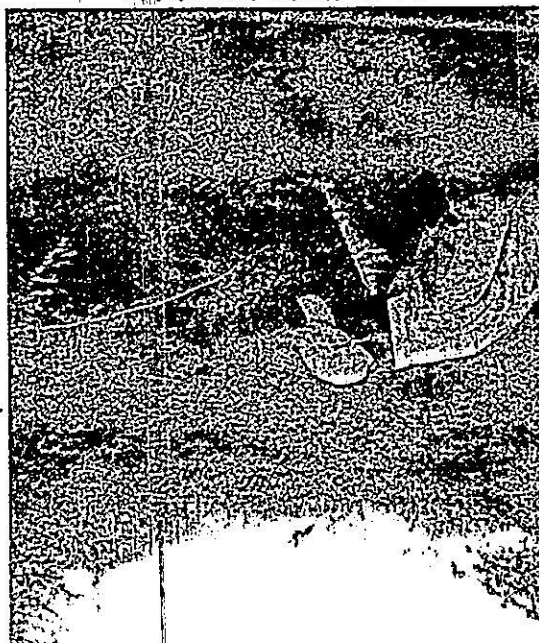


Foto 33. Siembra de especie igua

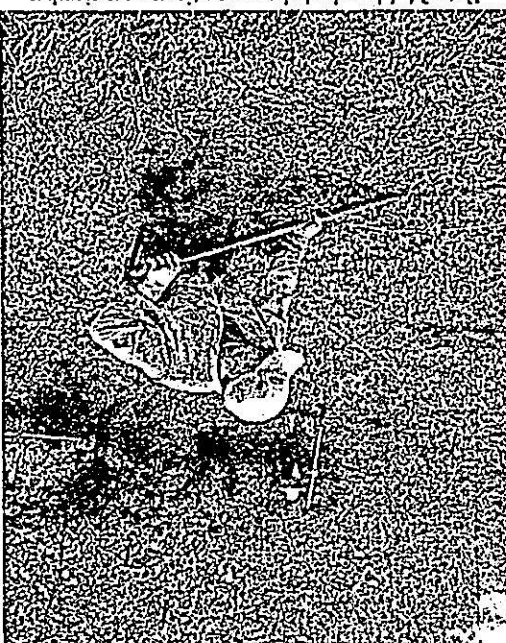


Foto 34. Llenado de hoyo con tierra para siembra

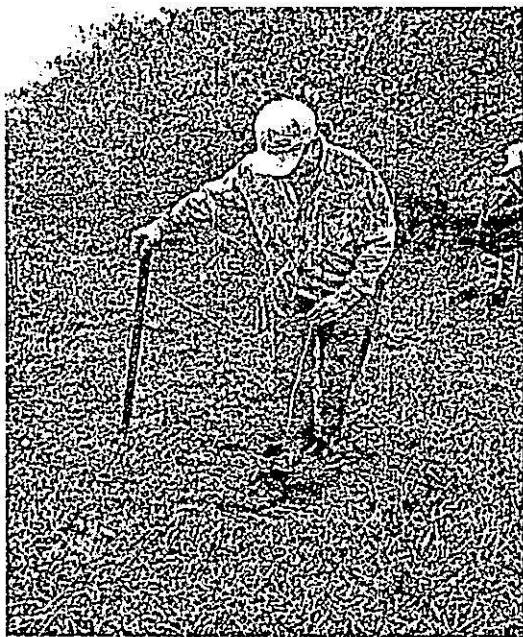


Foto 35. Compactación del suelo alrededor del hoyo



Foto 36. Siembra de árbol de igua de más de 1 metro

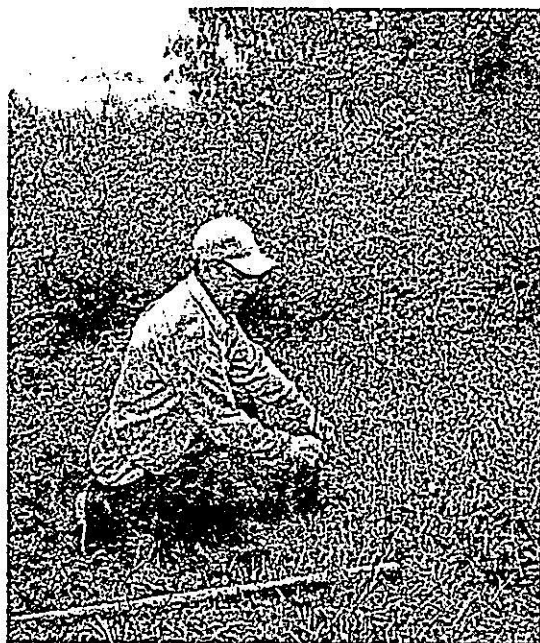


Foto 37. Retiro de bolsa para siembra



Foto 38. Siembra de especie gualanday

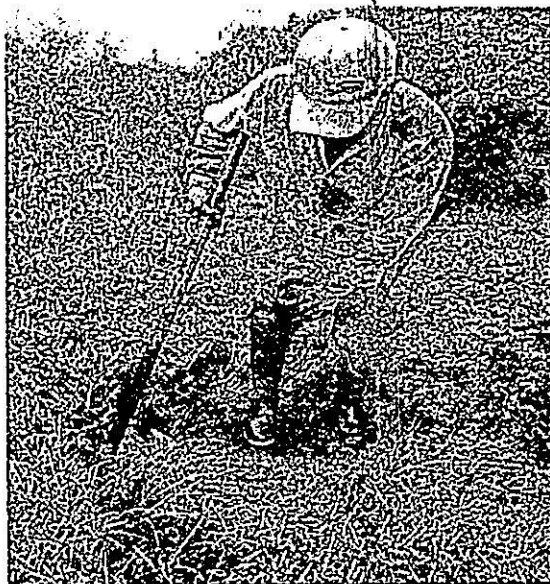


Foto 39. Compactación de tierra para terminar siembra

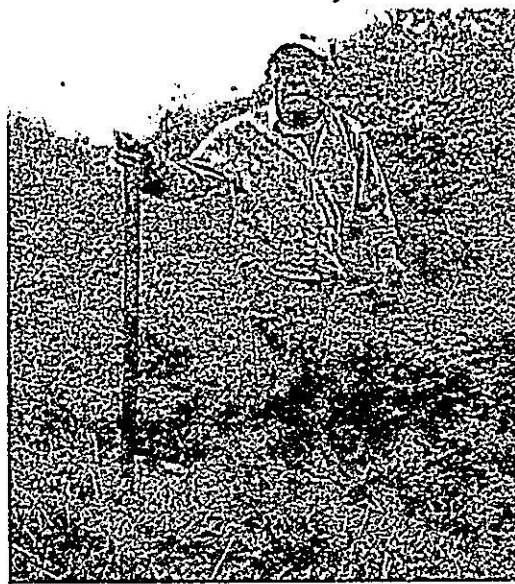


Foto 40. Gualanday establecido

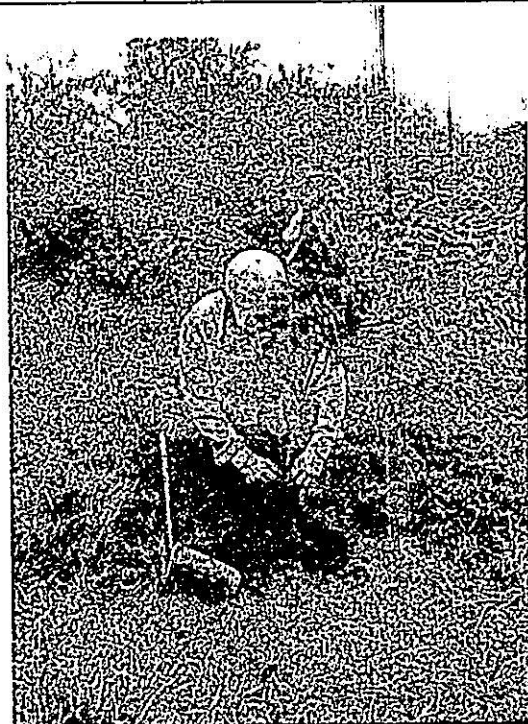


Foto 41. Retiro de bolsa para siembra de especie igua



Foto 42. Siembra de igua



SOFOR INGENIEROS LTDA
NIT 800082101-9

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES



Foto 43. Ubicación del individuo en el hoyo



Foto 44. Planteo y llenando del hoyo

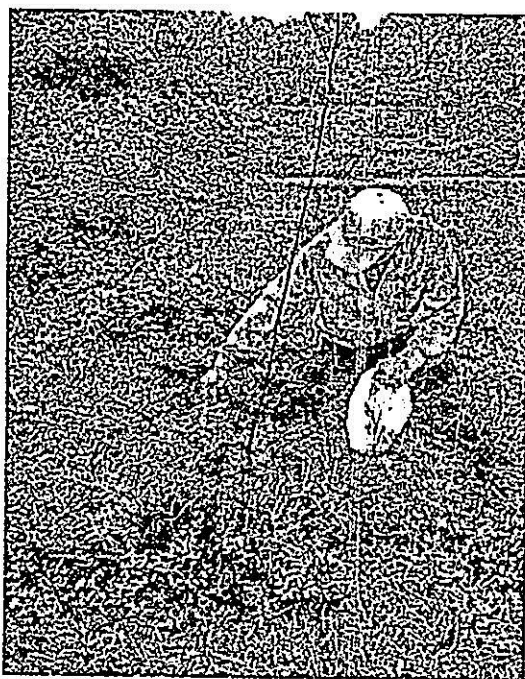


Foto 45. Aplicación de fertilizantes



Foto 46. Aplicación de fertilizantes

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES**



Foto 47. Fertilización



Foto 48. Aplicación de fertilizantes a especie establecida



Foto 49. Aplicación de fertilizantes en corona


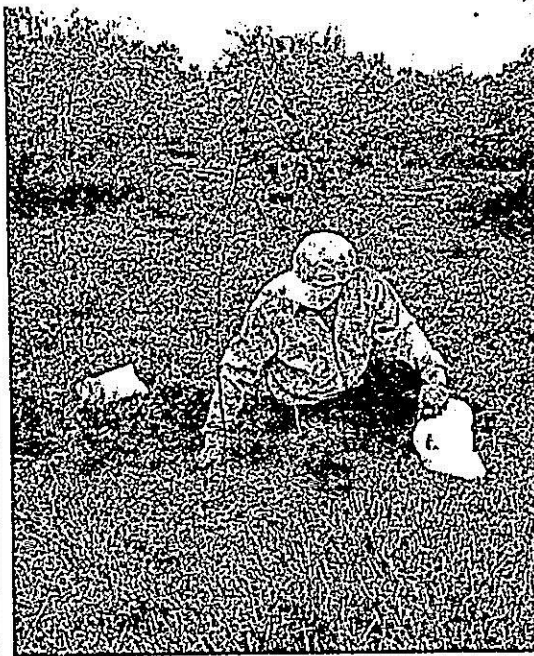


Foto 50. Aplicación de abono orgánico



SOFOR
INGENIEROS SAS

SOFOR INGENIEROS LTDA
NIT 800082101-9

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

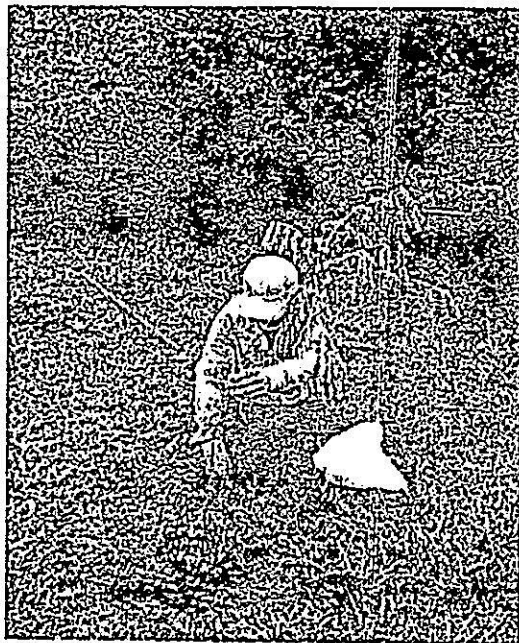


Foto 51. Fertilización de igua



Foto 52. Aplicación de triple 15



Foto 53. Aplicación de abono orgánico a gualanday

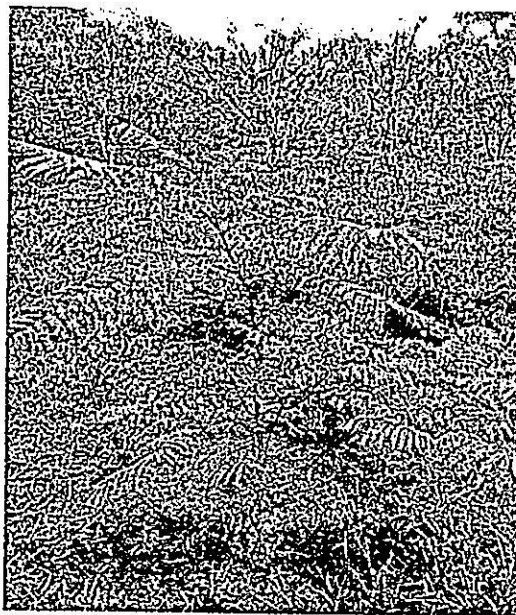


Foto 54. Aplicación de fertilización



Foto 55. Aplicación de fertilización a samán

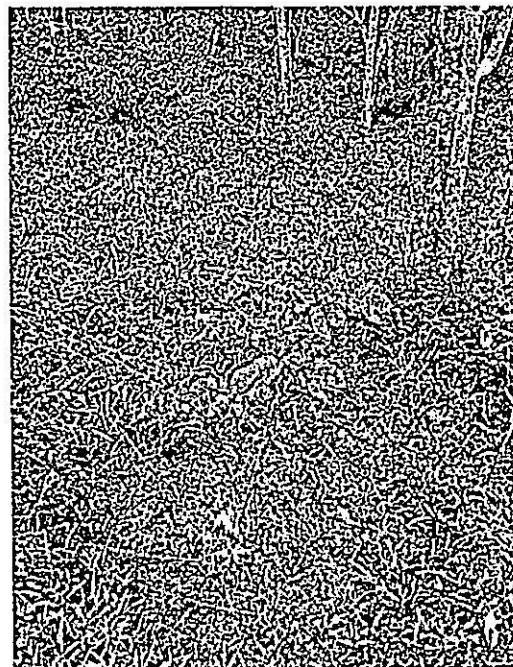


Foto 56. Samán fertilizado

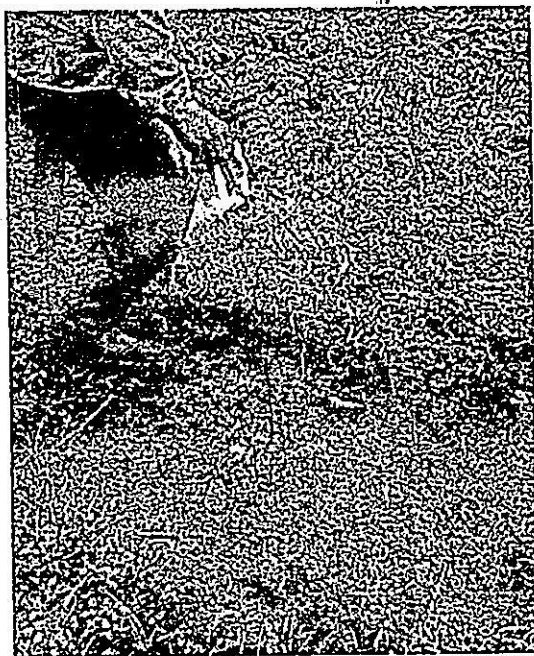


Foto 57. Especie gualanday con su plateo y debidamente fertilizado

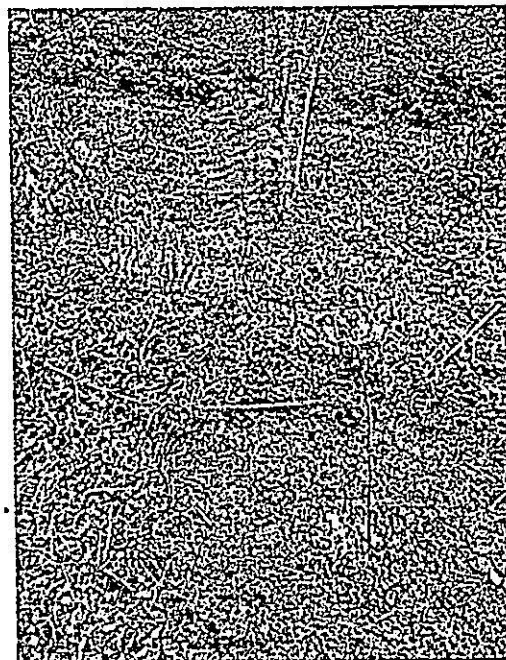


Foto 58. Gualanday fertilizado



Foto 59. Aplicación de fertilizantes



Foto 60. Fertilización a casco de vaca

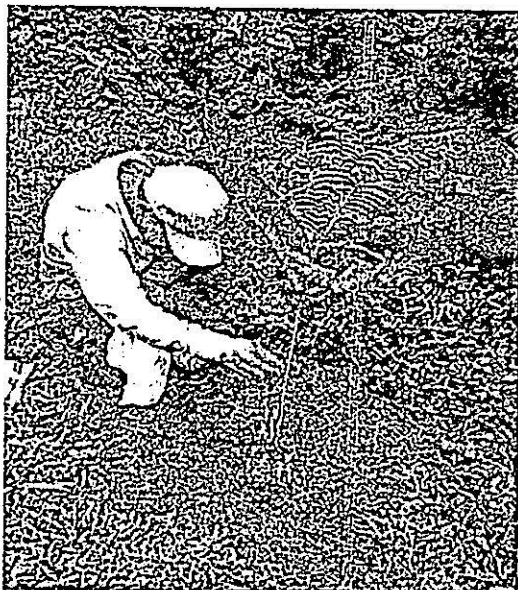


Foto 61. Aplicación de triple 15



Foto 62. Fertilización de ceiba

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

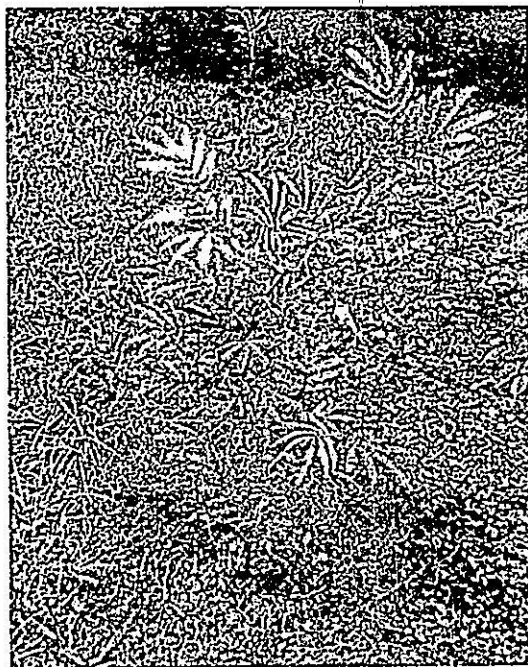


Foto 63. Aplicación fertilización a orejero

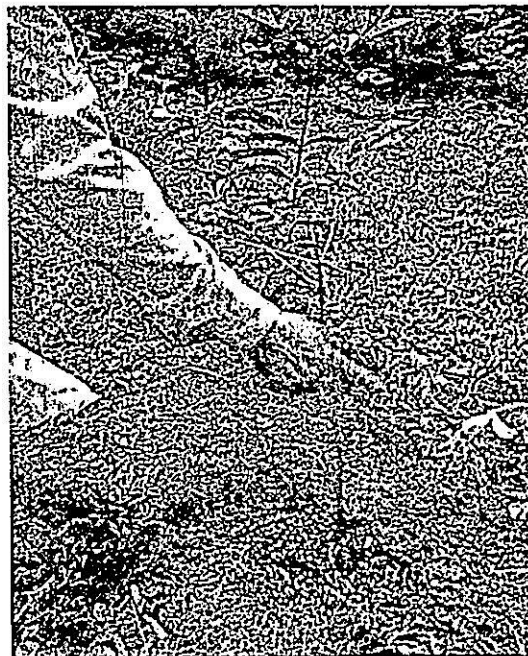


Foto 64. Aplicación de fertilización especie ocobo

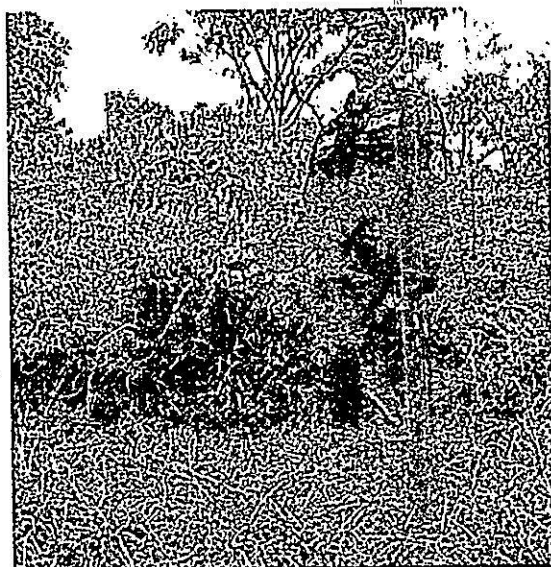


Foto 65. Georreferenciación de los individuos

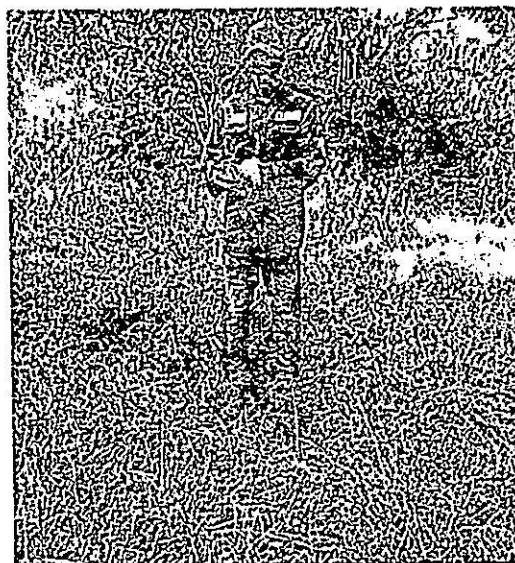


Foto 66. Paqueteo y georreferenciación

 <p>SOFOR INGENIEROS SAS SOFOR INGENIEROS LTDA NIT 800082101-9</p>	<p align="center">INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES</p>
--	--

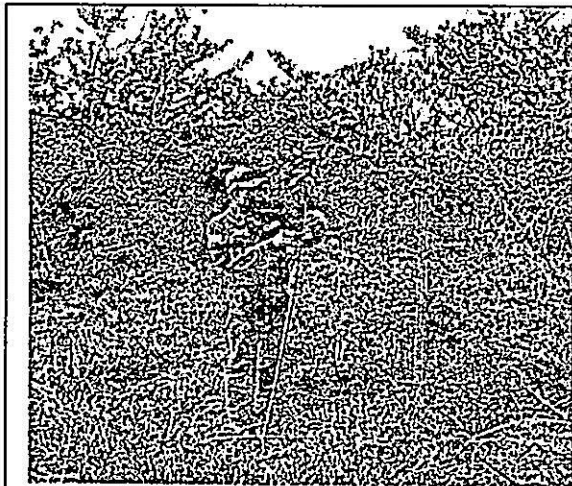


Foto 67. Colocación de plaquetas a los individuos



Foto 68. Georreferenciación mediante gps.

3. PRIMER MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA LAS PLANTACIONES DE LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS

las actividades ejecutadas en el primer mantenimiento a los 2.200 árboles localizados en las zonas verdes a intervenir fueron las siguientes:

3.1 LIMPIEZA GENERAL

Esta actividad comprendió las labores de limpia del lote a reforestar, la cuales se realizaron mediante el uso de machete y guadaña, eliminando toda la vegetación de rastrojo que pudiese causar efectos negativos en el desarrollo de la plantación y dejando los latizales y fustales de las especies arbóreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

3.2 RIEGO

Debido a que la temporada de lluvia fue muy larga no se requirió riego, más sin embargo diariamente se llevaba un control de aquellos días donde hacía sol y realizar riegos de forma intercaladas, en época de invierno de acuerdo a las precipitaciones y necesidades en el terreno; además se realizaron surcos, formando una batea alrededor de cada planta para sostener el agua de tal forma que esta pudiese penetrar hasta el fondo de las raíces.

3.3 PLATEO



**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES**

Esta labor es de gran importancia para el desarrollo de la plantación; se realizó un plato de un metro de diámetro en cada sitio marcado en el trazo, con el fin de eliminar toda la vegetación rastrera que pueda competir con el árbol, esta labor se ejecutará con azadón.

3.4 CONTROL FITOSANITARIO

Para el control fitosanitario se desarrollaron labores de control de agentes patógenos y entomológicos que amenacen el buen desarrollo de la reforestación. (Control de hormiga arriera, minador en las hojas de las plántulas etc.); esto efectuado por aplicación de insecticidas, fungicidas y herbicidas: Se realiza la aplicación de venenos contra cualquier blanco biológico, se desarrollarán mensualmente o según necesidad. La aplicación de insecticida para las principales plagas, entre ellas las hormigas, comején, gusanos y palometa; La aplicación de herbicidas se realizó para el control de maleza en zonas comunes y la aplicación del fungicida es con el fin de evitar hongos en plantas, arboles, palmas y cubre suelo, esto se realizó con lersban para controlar la hormiga

3.5 PODAS DE FORMACIÓN

Esta actividad estuvo concentrada a los árboles que la necesiten para mejorar su estructura ya que son árboles Jóvenes con el fin de asegurar y de establecer un tronco fuerte y con ramas. estructurales suficientemente robustas, por lo general orientadas hacia el exterior en todas direcciones y adecuadamente espaciadas a lo largo.

3.6 FERTILIZACIÓN

Se aplicaron 50 gramos/plántula de fertilizante químico triple 15 para un buen desarrollo de las plántulas, al igual que insecticidas y fungicidas (biológicos) y /o Fertilización de grama, arboles, palmas, arbustos y cubre suelos: en donde se les suministra a las plantas, árboles, palmas y cubre suelo los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo y crecimiento.

3.7 REPOSICIÓN DEL 10%

Se realizó la resiembra del 10% de las plántulas establecidas en total 210 plántulas fueron resembradas cumpliendo la cantidad de reposición, manejando las mismas especies que fueron establecidas.

3.8 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES A REALIZAR.

Este mantenimiento fue ejecutado en los días necesarios, después de haber realizado el establecimiento de los 2200 individuos, hasta terminar todas las actividades que se llevarán

a cabo, conforme a las labores de mantenimiento especificadas. Todas las labores y actividades serán realizadas en cada uno de los árboles determinados para mantenimiento.

**4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN
EL PRIMER MANTENIMIENTO**

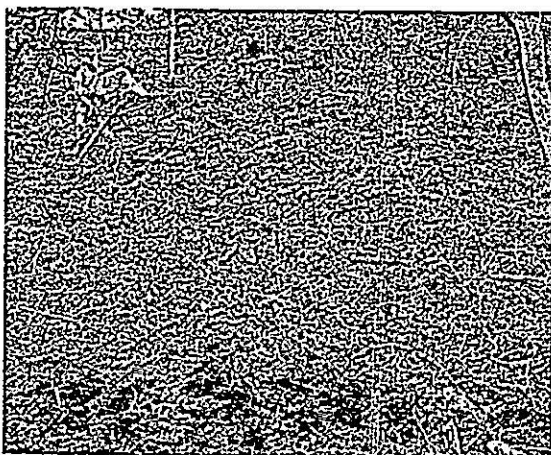


Foto 69. Limpia general del terreno

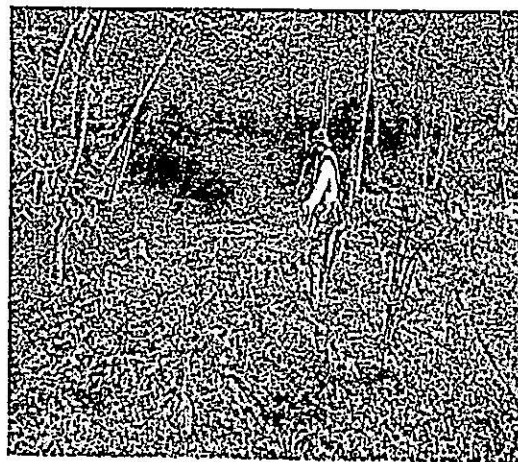


Foto 70. Limpia con guadaña

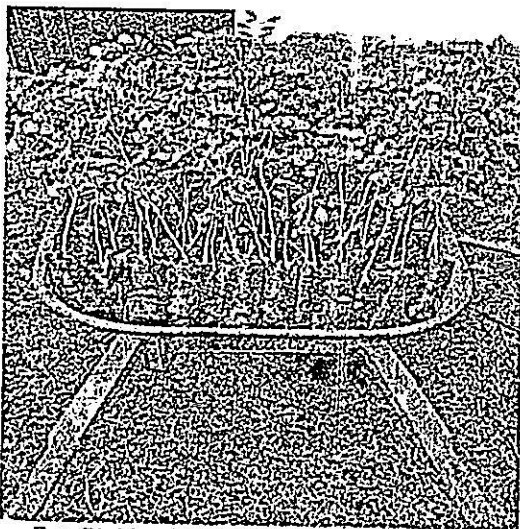


Foto 71. Material vegetal para resiembra del 10%



Foto 72. Material vegetal para llevar a campo

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

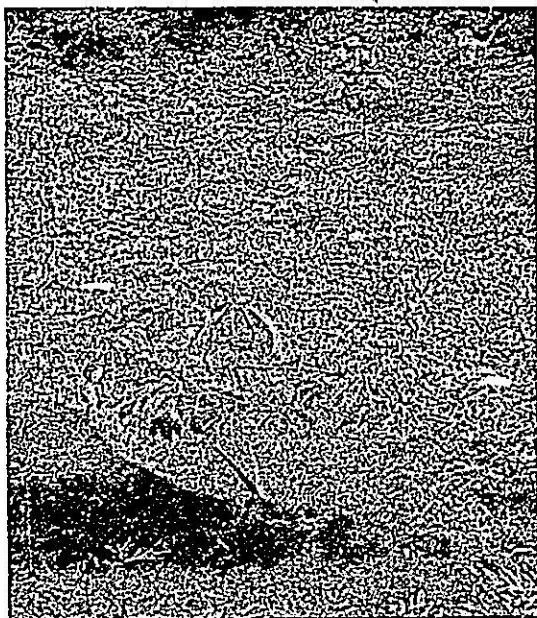


Foto 73. Plateo de especies

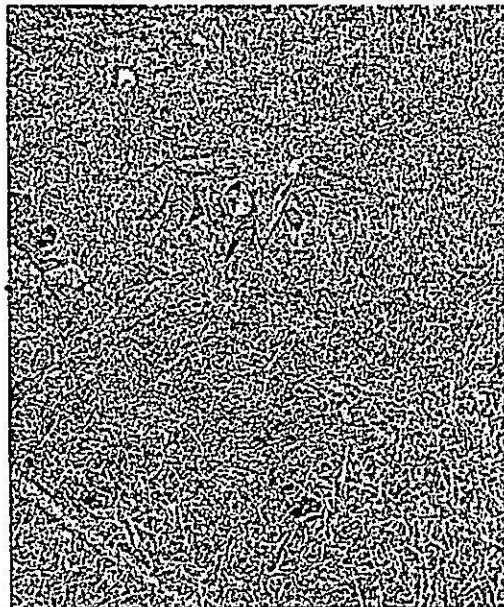


Foto 74. Mantenimiento de especies establecidas en la
siembra total (plateo)

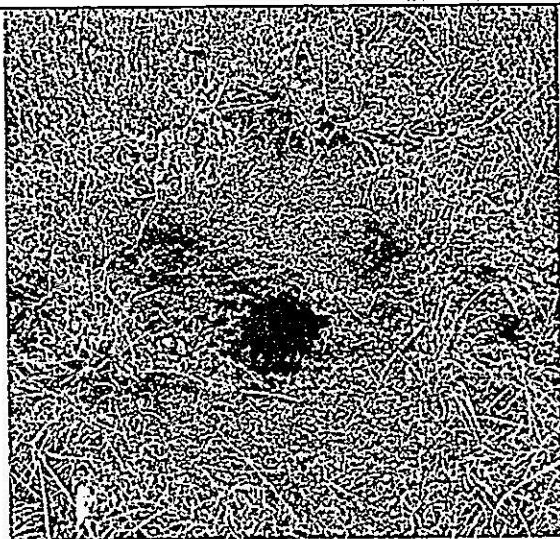


Foto 75. Ahoyado para resiembra y plateo

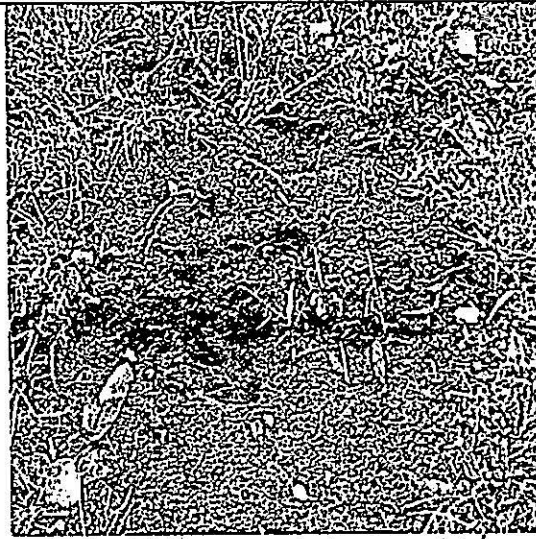


Foto 76. Hoyo para resiembra con su plato

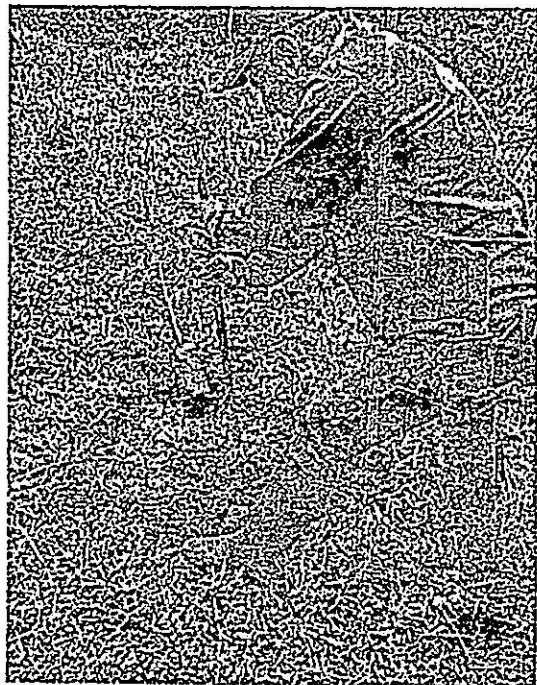


Foto 77. Actividades de ahoyado para resiembra

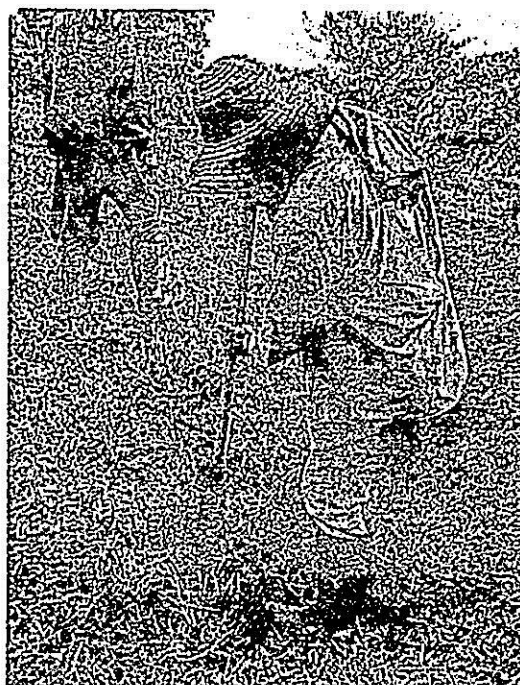


Foto 78. Ahoyado

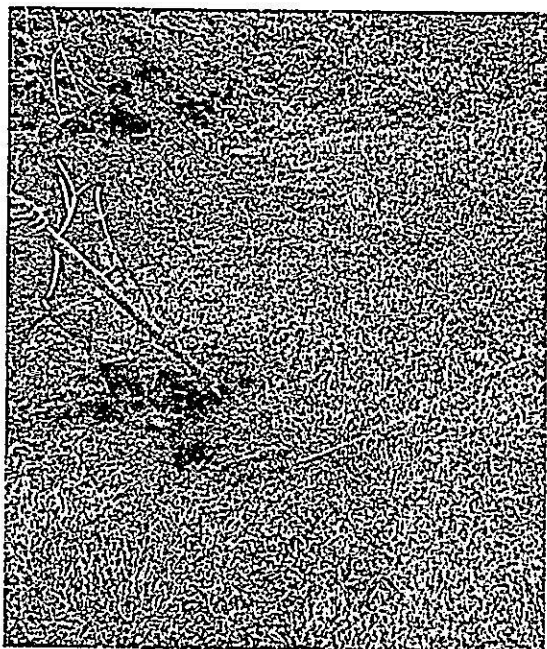


Foto 79. Ahoyado para resiembra

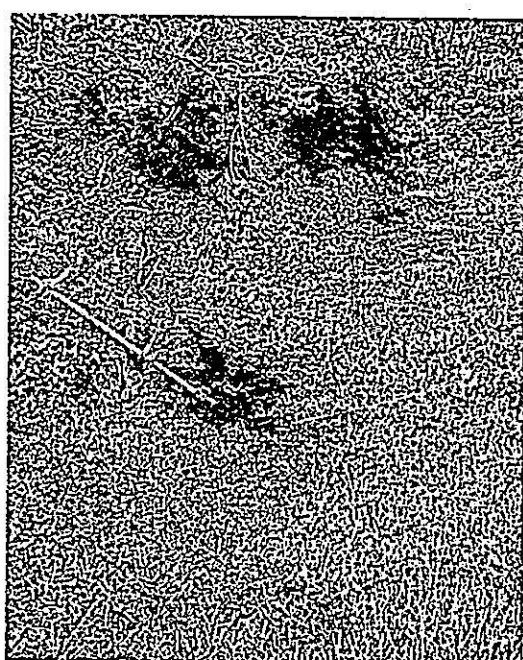


Foto 80. Actividades con ahoyadora

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES



Foto 81. Ahoyado para reposición de especies



Foto 82. Labores de ahoyado

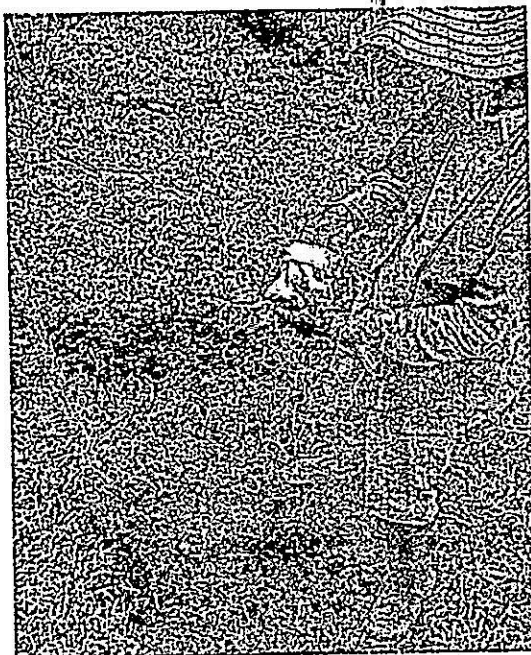


Foto 83. Aplicación hidrorretenedor y cal al hoyo

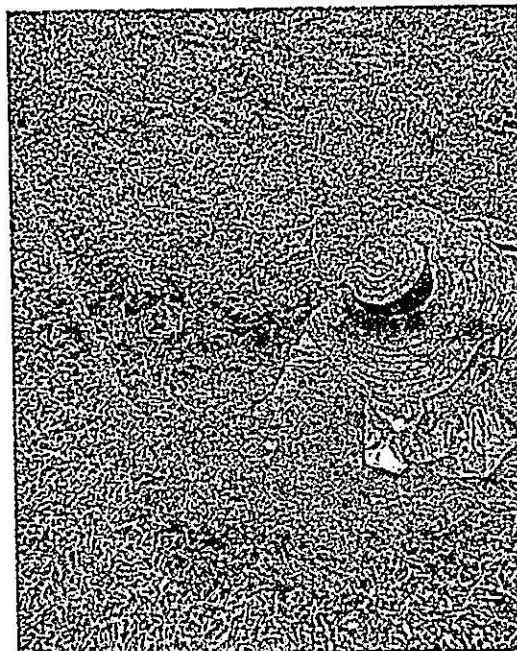


Foto 84. Adecuación del hoyo materia orgánica,
hidrorretenedor y cal

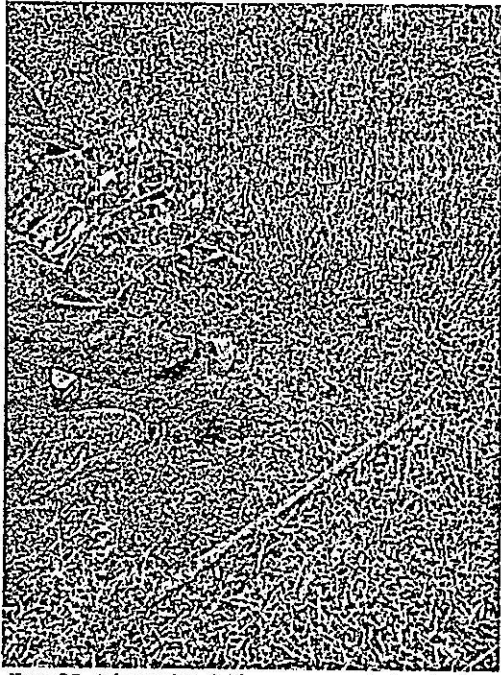


Foto 85. Adecuación del hoyo para posterior siembra

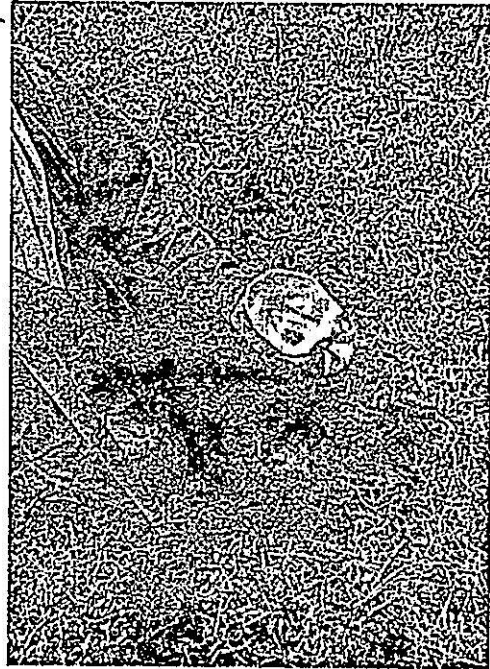


Foto 86. Aplicación de gallos

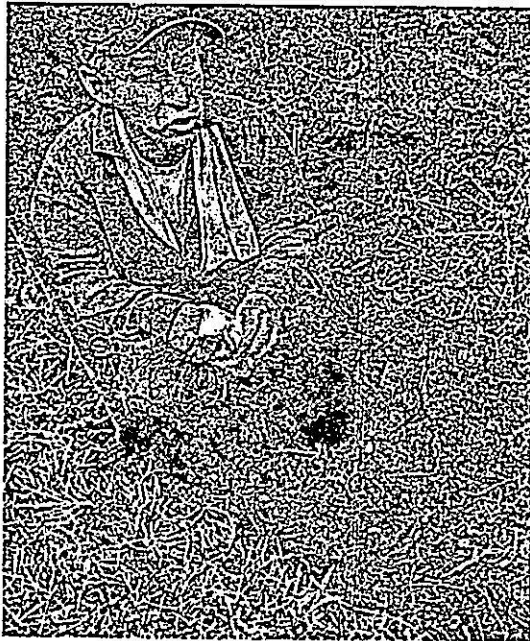


Foto 87. Adecuación del hoyo

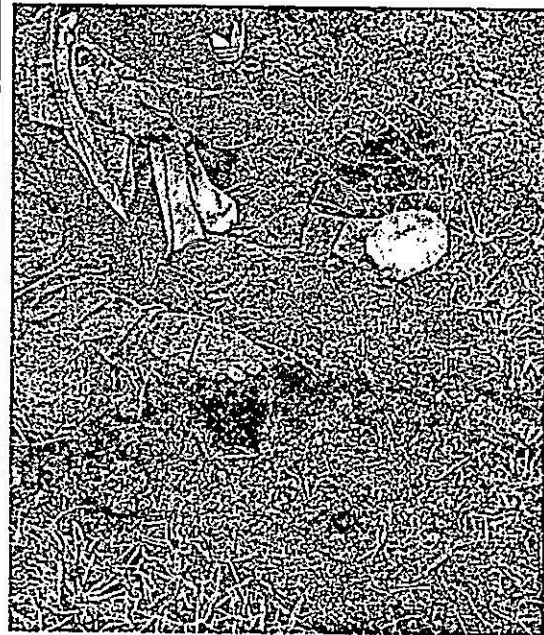


Foto 88. Hoyo para resiembra

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ARBOLES

SOFOR INGENIEROS LTDA
NIT 800082101-9

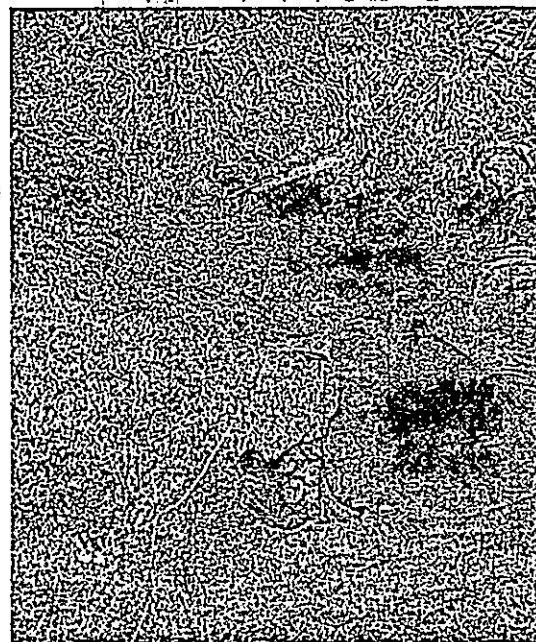


Foto 89. Resiembra de especie igua

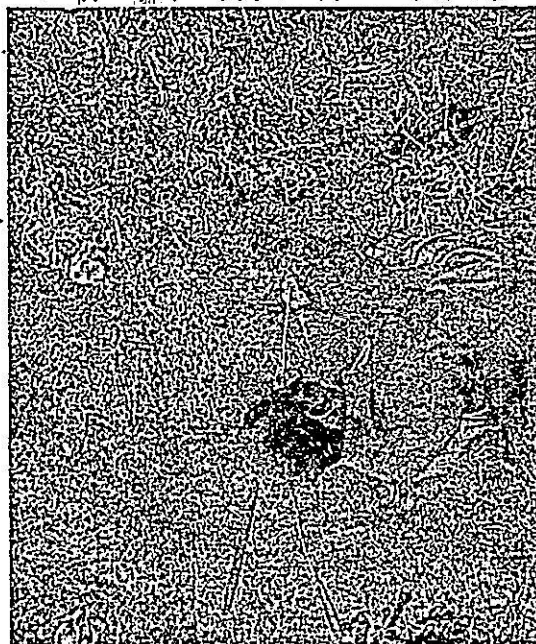


Foto 91. Ingreso del material de resiembra al hoyo

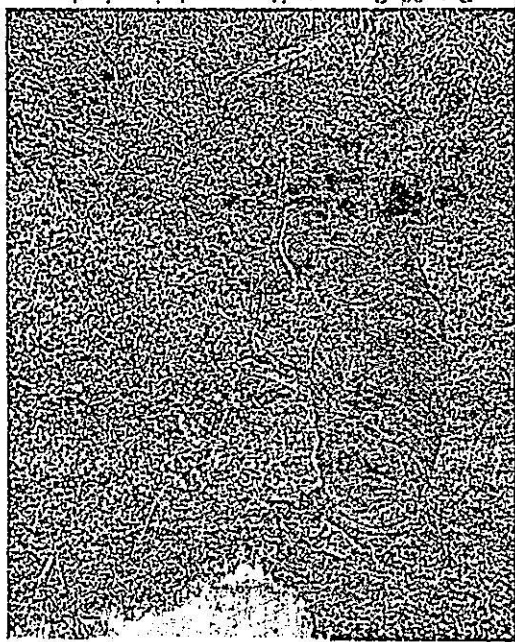


Foto 90. Compacción para culminar siembra

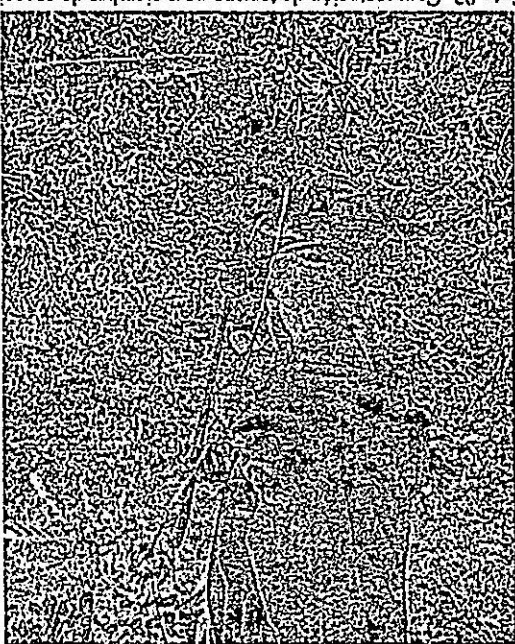


Foto 92. Compacción de terreno para siembra de especie igua

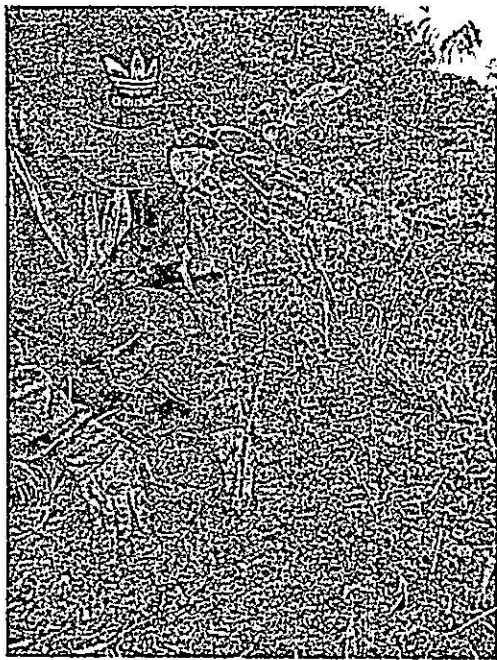


Foto 93. Resiembra con ocobo

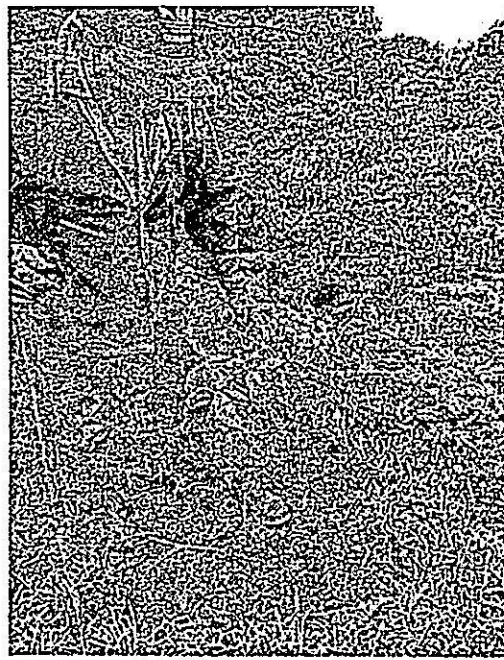


Foto 94. Ocobo reseñado

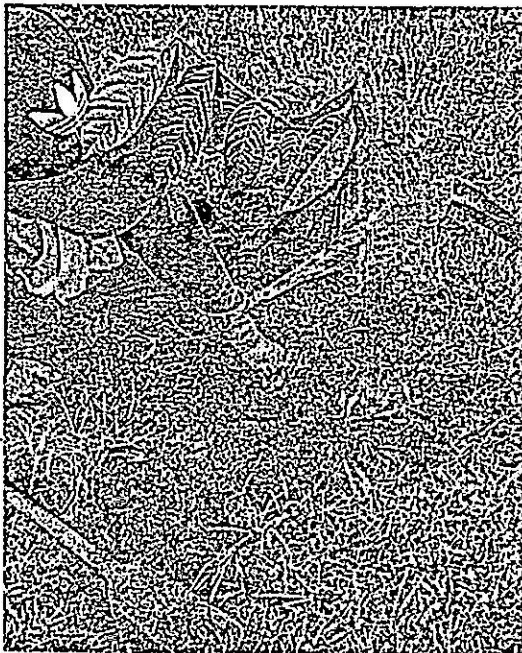


Foto 95. Resiembra con guamo

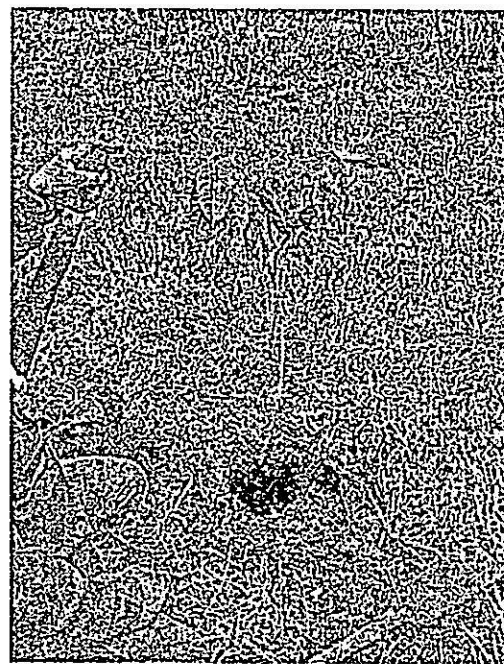


Foto 96. Reposición de guamo

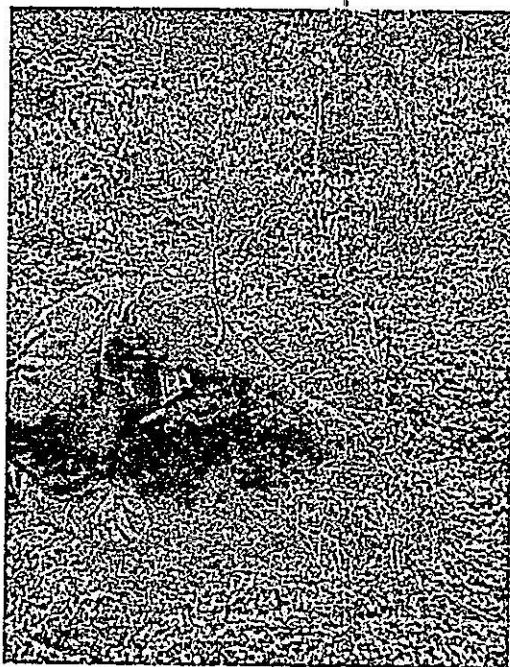


Foto 97. Reposición de especies

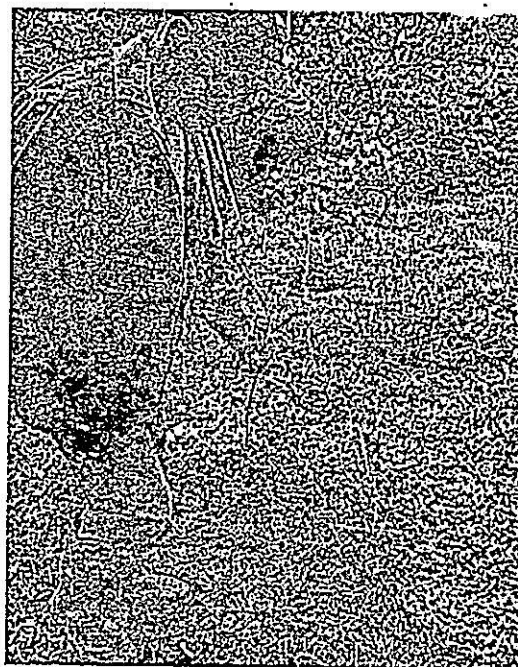


Foto 98. Especie establecida

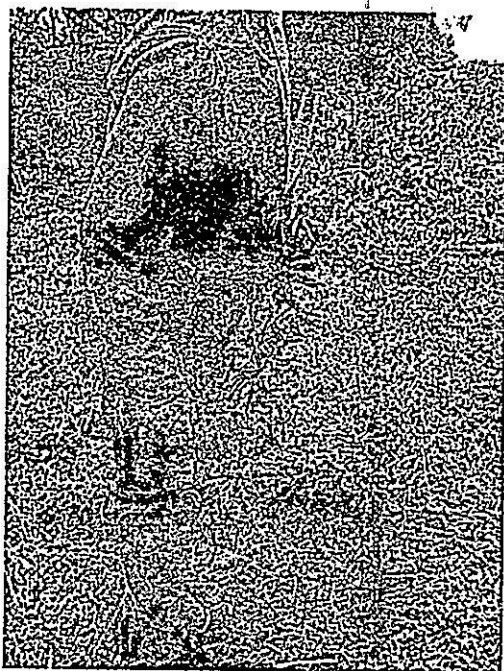


Foto 99. Compactación del suelo especie orejero

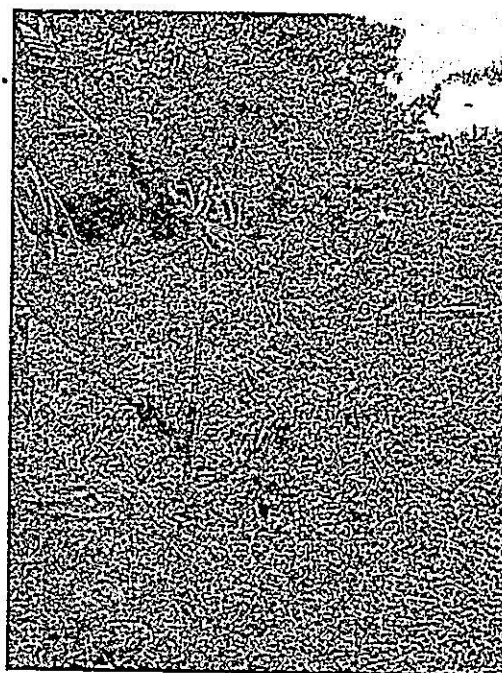


Foto 100. Resiembra de especie

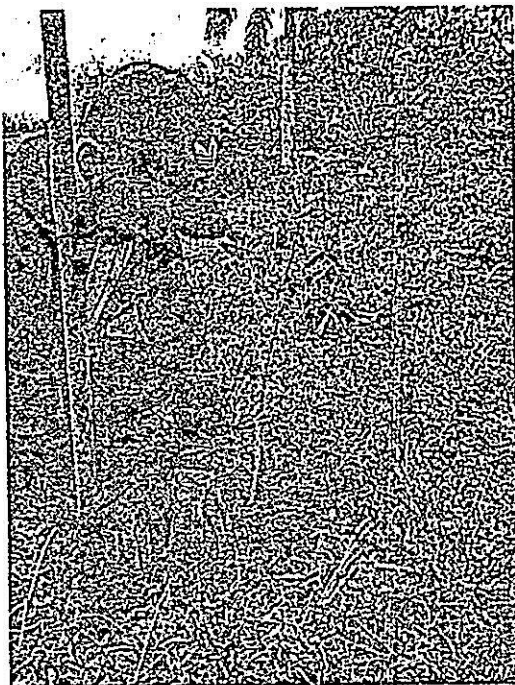


Foto 101. Resiembra de samán

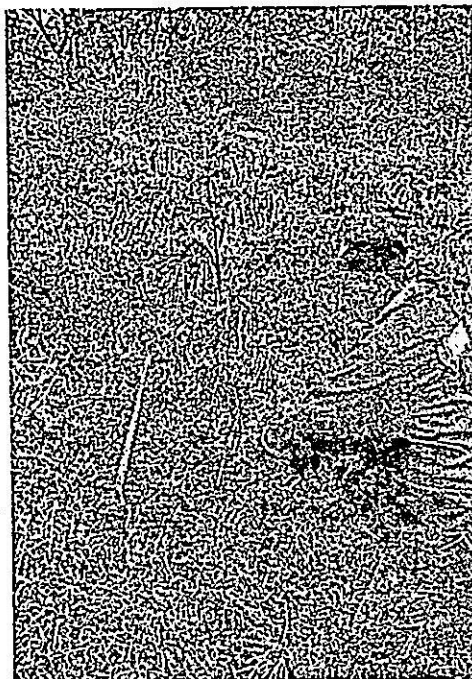


Foto 102. Resiembra de individuo

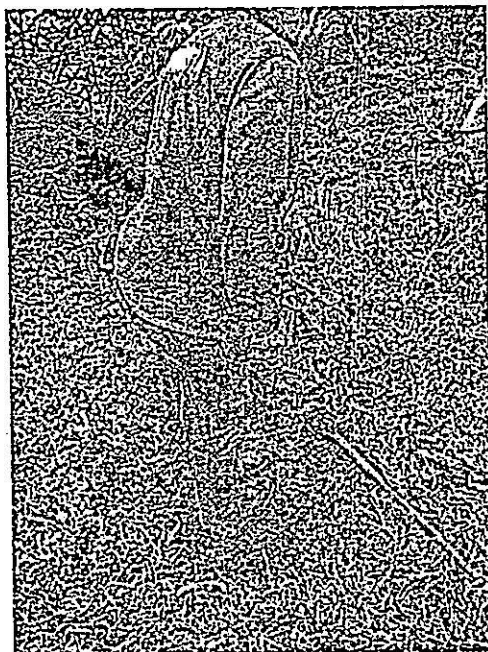


Foto 103. Compactación para resiembra

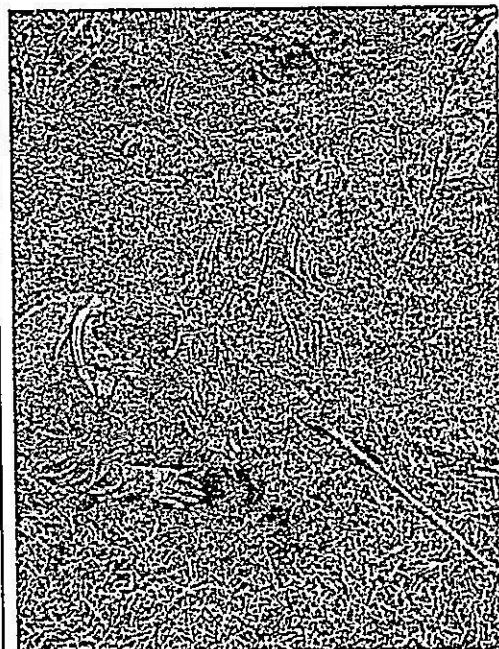


Foto 104. Orejero resembrado

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

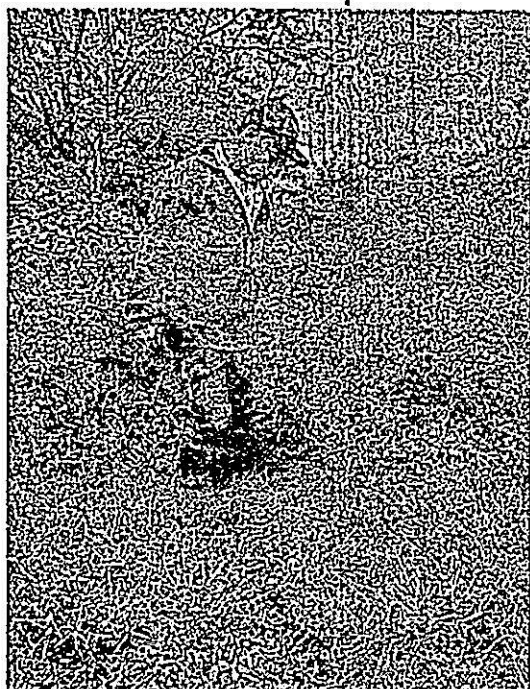


Foto 105. Individuo vivo

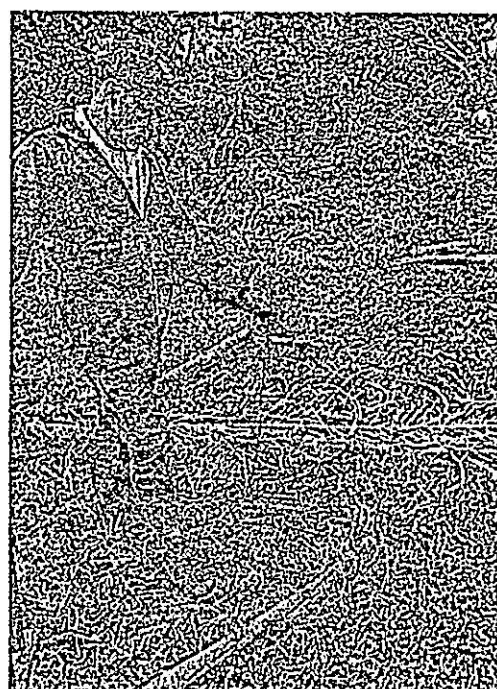


Foto 106. Individuo vivo desde el establecimiento

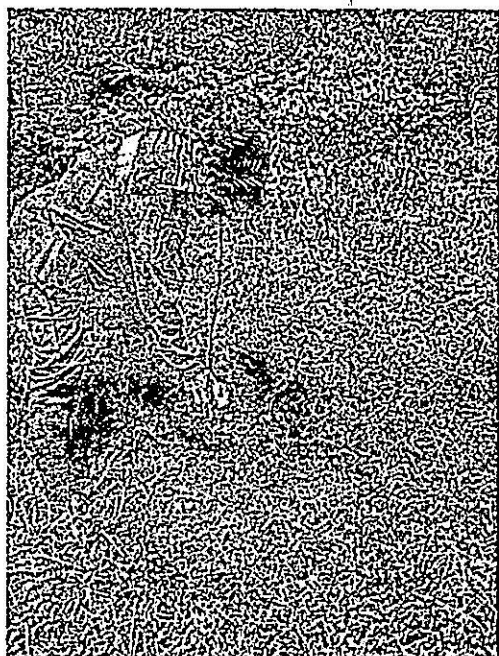


Foto 107. Aplicación de fertilizantes

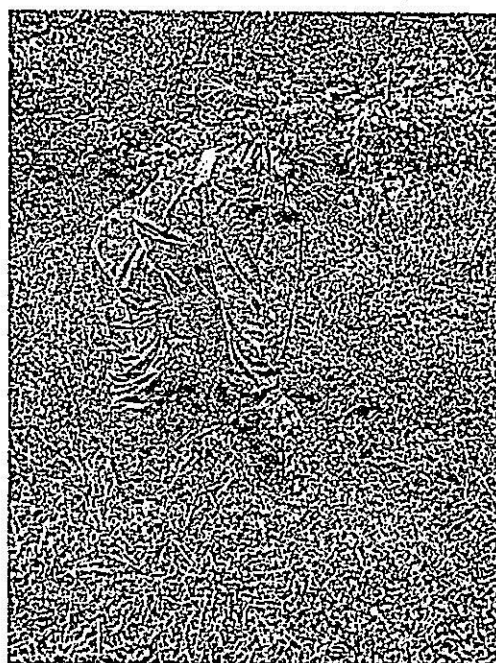


Foto 108. Fertilización de individuos

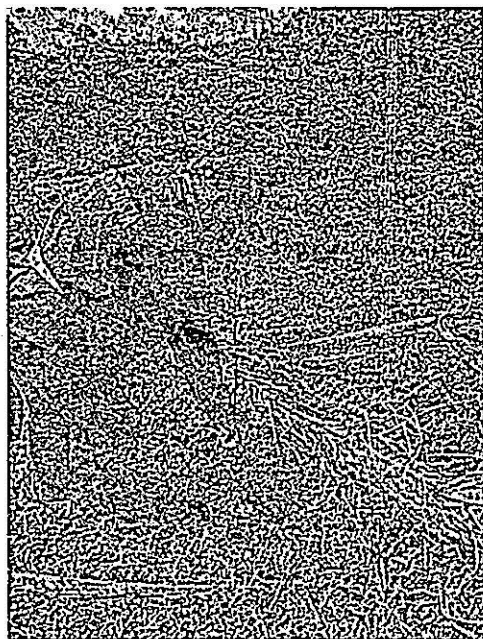


Foto 109. Fertilización

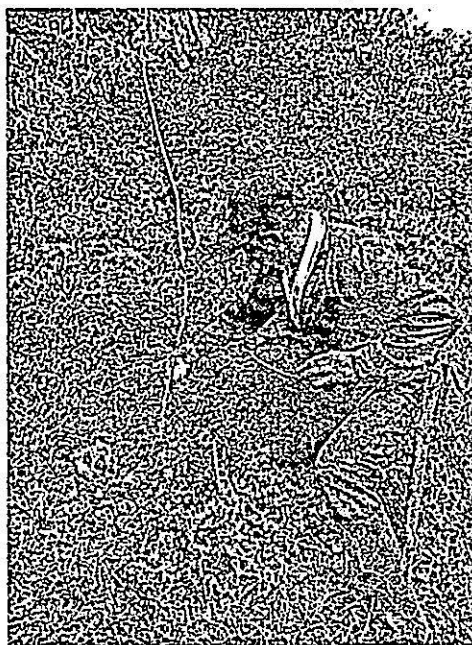


Foto 110. Aplicación de fertilizantes



**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES**

**5. SEGUNDO MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA
SUPERVIVENCIA LAS PLANTACIONES DE LAS ESPECIES
FORESTALES PROTECTORAS**

El segundo mantenimiento se ejecutó 3 meses después del primer mantenimiento esto con el fin de dar un tiempo considerable a las plántulas y verificar aquellas especies que tuvieron buen prendimiento además se ejecutó en estación invernal esto con el fin de que las plántulas sembradas tuvieran todas las condiciones. Por otro lado, se verificó la mortalidad que hubo y se realizó la reposición para los 2.200 árboles localizados en el área de influencia, mediante una reposición del 10% del total a intervenir, las actividades ejecutadas para el segundo mantenimiento fueron las siguientes:

5.1 LIMPIEZA GENERAL

Esta actividad comprendió las labores de limpieza del lote a reforestar, las cuales se realizaron mediante el uso de machete y guadaña, eliminando toda la vegetación de rastrojo que pudiese causar efectos negativos en el desarrollo de la plantación y dejando los latizales y fustales de las especies arbóreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

5.2 RIEGO

Para el segundo mantenimiento realizado, a las plántulas de reposición se les aplicó hidroretenedor debido a que se había presentado en la zona un fenómeno de calor intenso por lo cual se tomó esta medida.

5.3 PLATEO

Esta labor es de gran importancia para el desarrollo de la plantación; se realizó un plato de un metro de diámetro en cada sitio marcado en el trazo, con el fin de eliminar toda la vegetación rastrera que pueda competir con el árbol, esta labor se ejecutará con azadón.

5.4 CONTROL FITOSANITARIO

Para el control fitosanitario se desarrollaron labores de control de agentes patógenos y entomológicos que amenacen el buen desarrollo de la reforestación. (Control de hormiga arriera, minador en las hojas de las plántulas etc.); esto efectuado por aplicación de insecticidas, fungicidas y herbicidas: Se realiza la aplicación de venenos contra cualquier blanco biológico, se desarrollarán mensualmente o según necesidad. La aplicación de insecticida para las principales plagas, entre ellas las hormigas, comején, gusanos y palometa; La aplicación de herbicidas se realizó para el control de maleza en zonas comunes y la

	<p align="center">INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES</p>
---	---

aplicación del fungicida es con el fin de evitar hongos en plantas, arboles, palmas y cubre suelo, esto se realizó con lersban para controlar la hormiga

5.5 PODAS DE FORMACIÓN

Esta actividad estuvo concentrada a los árboles que la necesiten para mejorar su estructura ya que son árboles Jóvenes con el fin de asegurar y de establecer un tronco fuerte y con ramas. estructurales suficientemente robustas, por lo general orientadas hacia el exterior en todas direcciones y adecuadamente espaciadas a lo largo.

5.6 FERTILIZACIÓN

Se aplicaron 50 gramos/plántula de fertilizante químico triple 15 para un buen desarrollo de las plántulas, al igual que insecticidas y fungicidas (biológicos) y /o Fertilización de grama, arboles, palmas, arbustos y cubre suelos: en donde se les suministra a las plantas, árboles, palmas y cubre suelo los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo y crecimiento.

5.7 REPOSICIÓN DEL 10%

Se realizó la resiembra del 10% y algo más, en total 300 plántulas fueron sembradas cumpliendo la cantidad de reposición, manejando las mismas especies que fueron establecidas.

REPOSICIÓN DEL 10% SEGUNDO MANTENIMIENTO	
ESPECIE	CANTIDAD
Igua	200
Samán	70
Orejero	30
TOTAL	300

5.8 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES A REALIZAR.

Este mantenimiento fue ejecutado con un tiempo considerable luego de ser realizado el primer mantenimiento de los 2200 individuos. Todas las labores y actividades fueron realizadas en cada uno de los árboles determinados para mantenimiento.

**6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN
EL PRIMER MANTENIMIENTO**

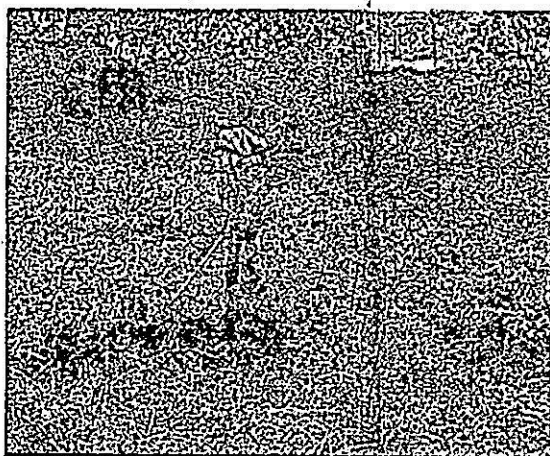


Foto 111. Limpia general del terreno

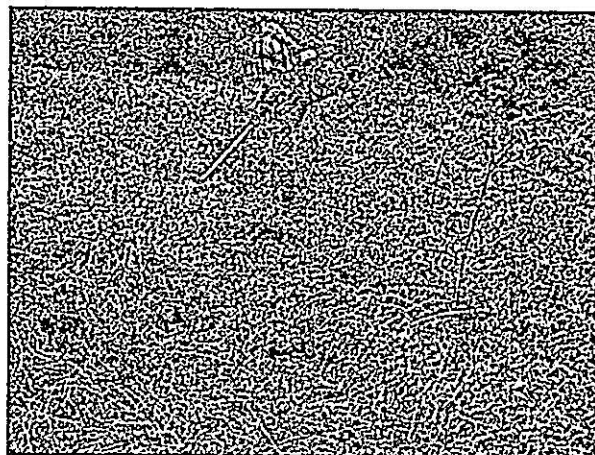


Foto 112. Limpia con guadaña

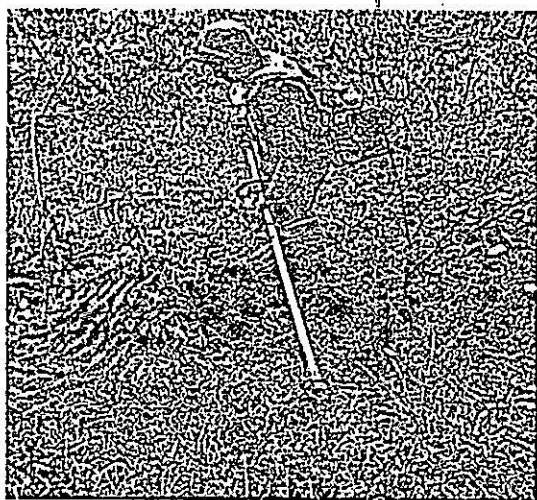


Foto 113. Limpia del predio

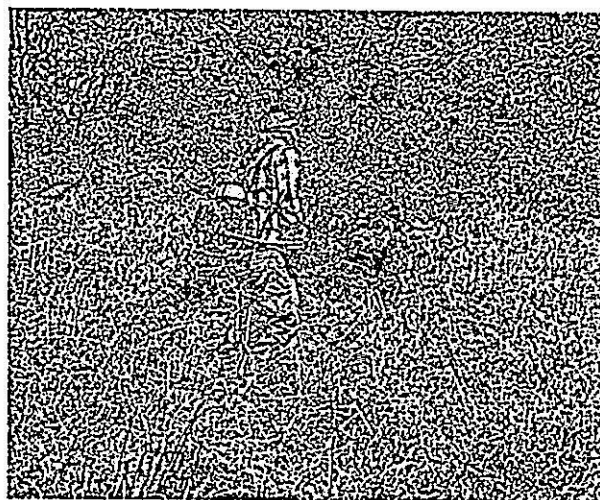


Foto 114. Actividades de limpia

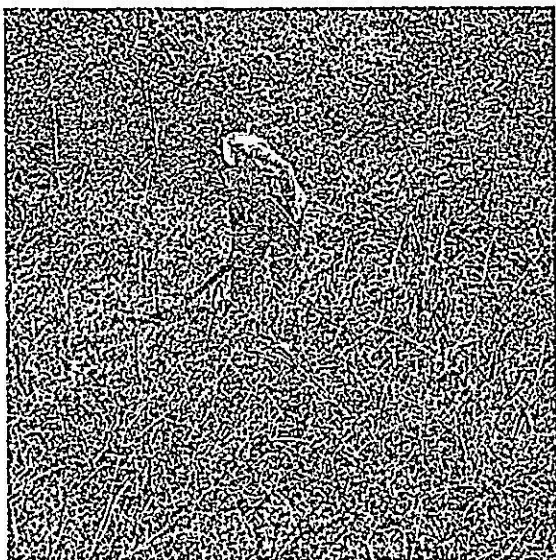


Foto 115. Plateo de especies

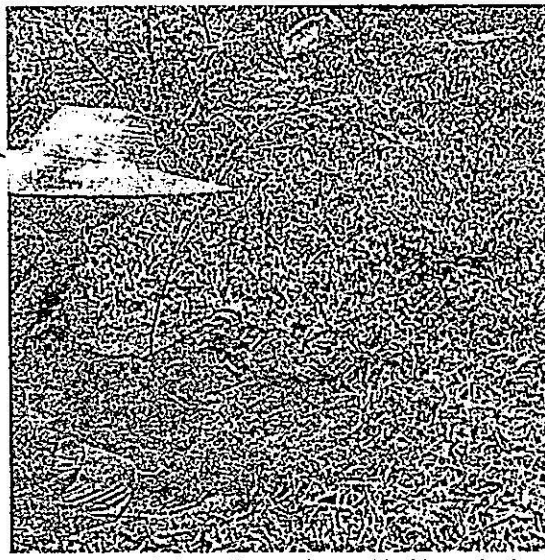


Foto 116. Mantenimiento de especies establecidas en la siembra total (plateo)

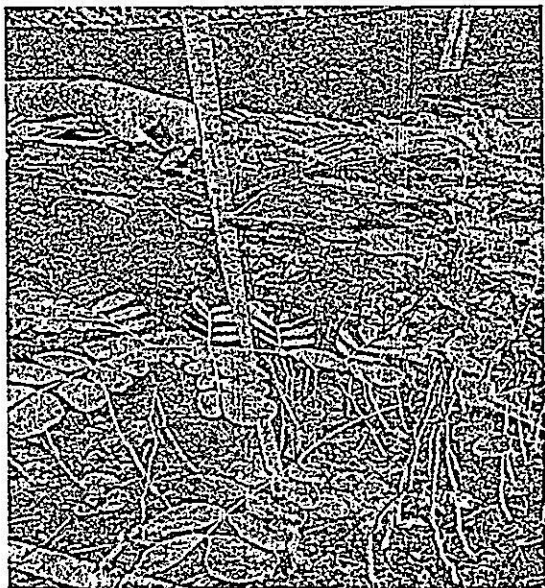


Foto 117. Material vegetal de resiembra para ser llevado en el segundo mantenimiento

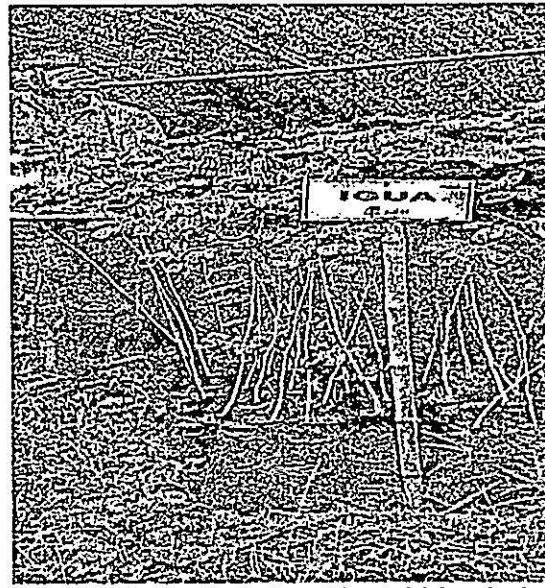


Foto 118. Verificación de altura del material de resiembra

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES



Foto 119. Ahoyado para resiembra y pláteo

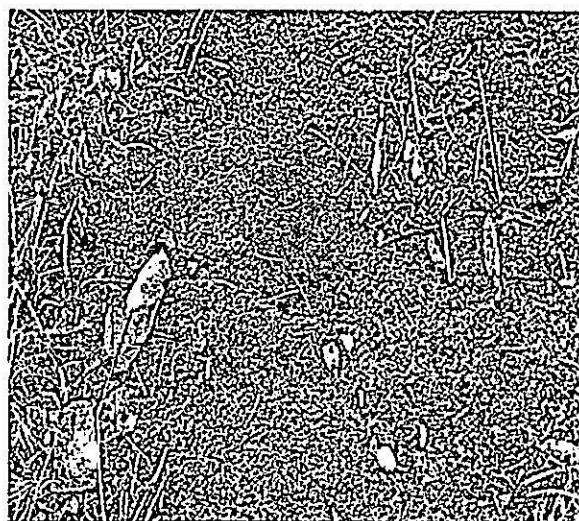


Foto 120. Hoyo para resiembra con su plato

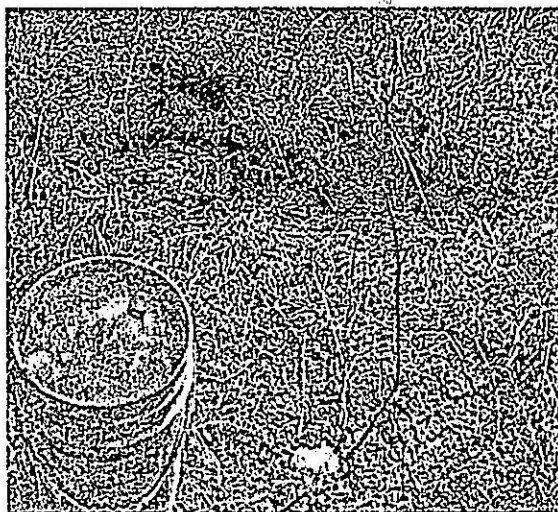


Foto 121. Aplicación de hidrorretenedor



Foto 122. Hidrorretenedor activo para hidratación de la plántula

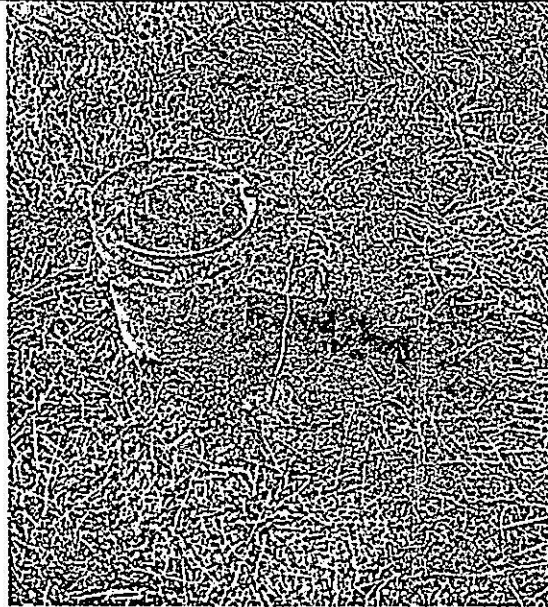


Foto 123. Hidroretenedor activo a especie establecida en el segundo mantenimiento

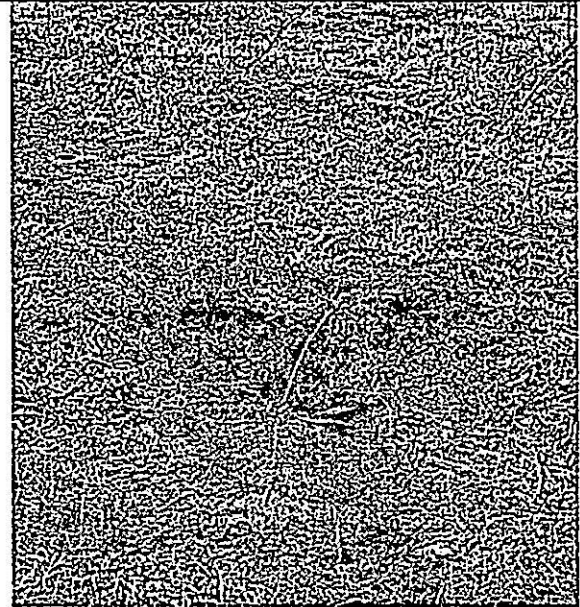


Foto 124. Especie establecida de resiembra con el hidroretenedor activo

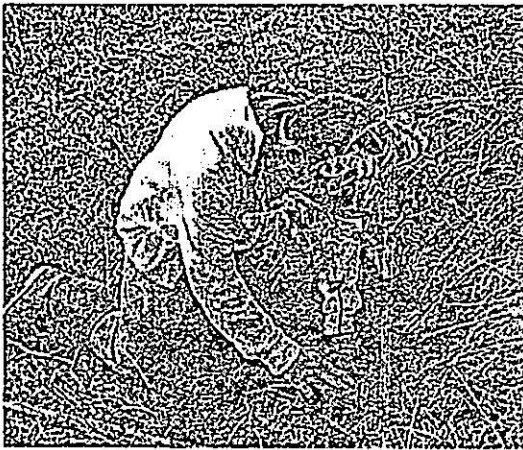


Foto 125. Actividades de resiembra

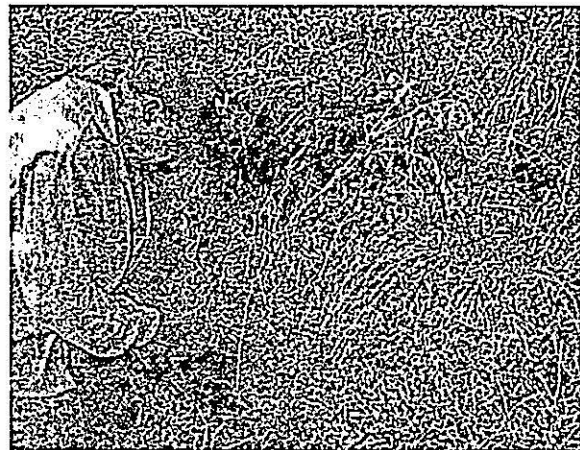


Foto 126. Resiembra de especie igua con altura de más de 1 metro

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ÁRBOLES

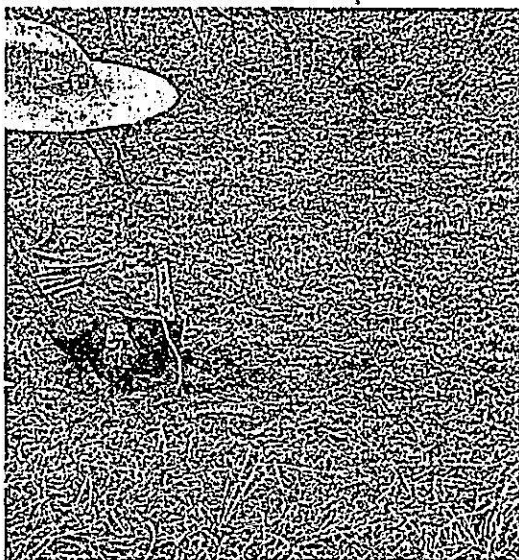


Foto 127. Compactación del terreno donde se sembró el material vegetal

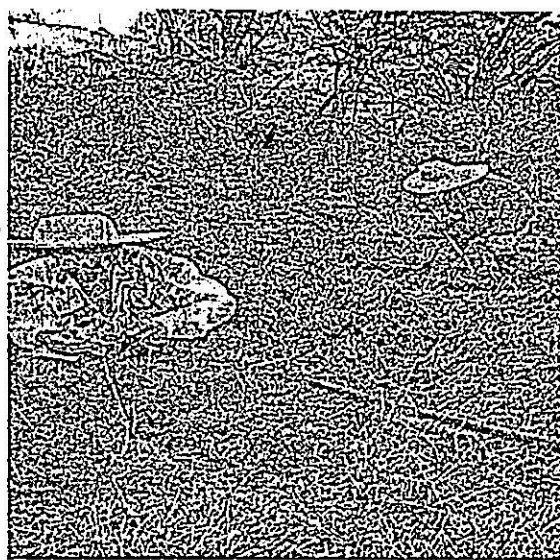


Foto 128. Actividades de siembra y ahoyado para resiembra

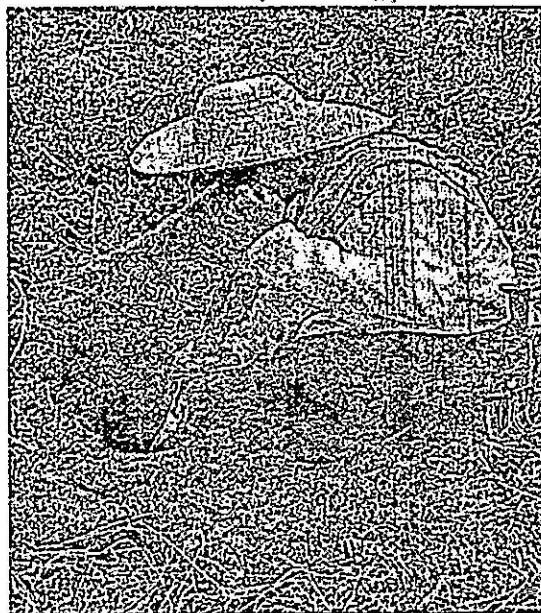


Foto 129. Actividades de ahoyado para resiembra

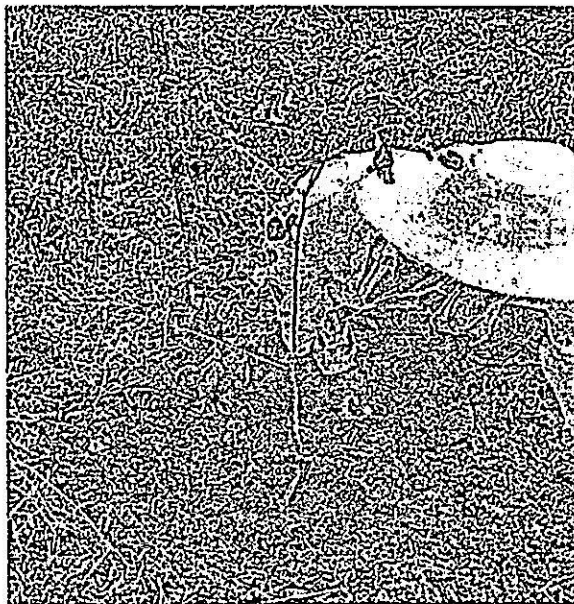


Foto 130. Actividades de resiembra y adecuación del hoyo

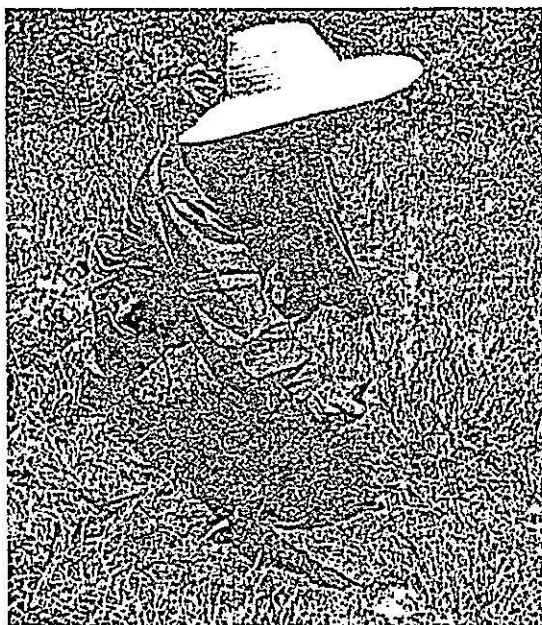


Foto 131. Actividades de ahoyado para resiembra

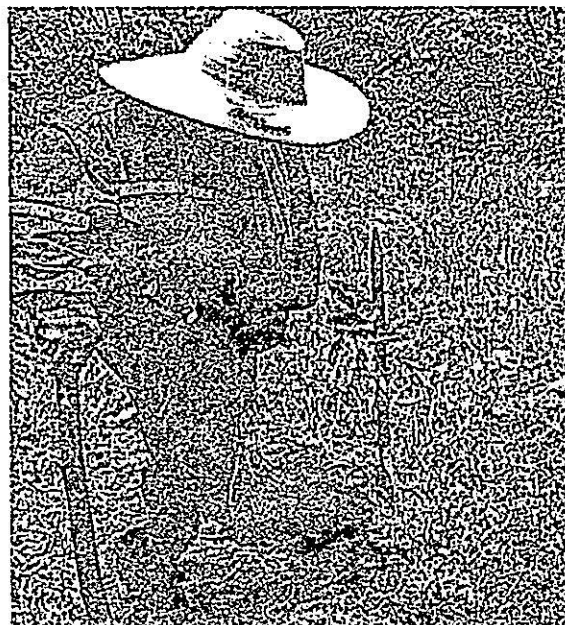


Foto 132. Actividades de resiembra especie igua

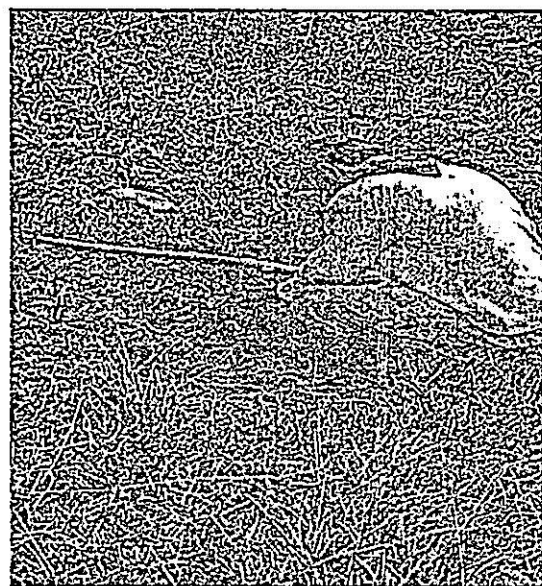


Foto 133. Siembra de igua

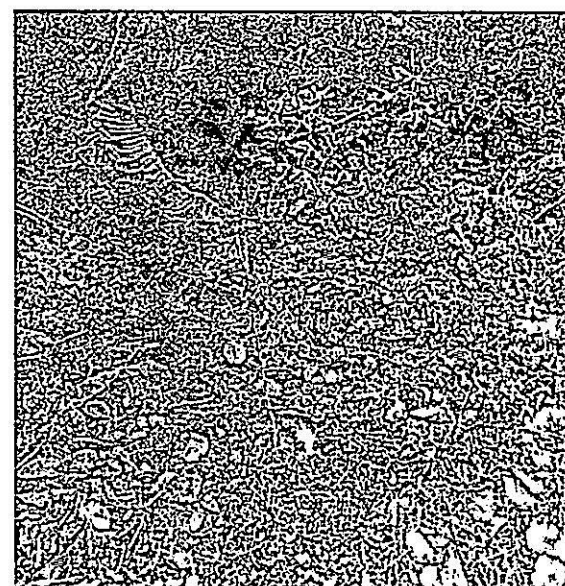


Foto 134. Labores de fertilización

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO N.º 73-2022
SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ARBOLES

SOFOR
INGENIEROS SAS

SOFOR INGENIEROS LTDA
NIT 800082101-9


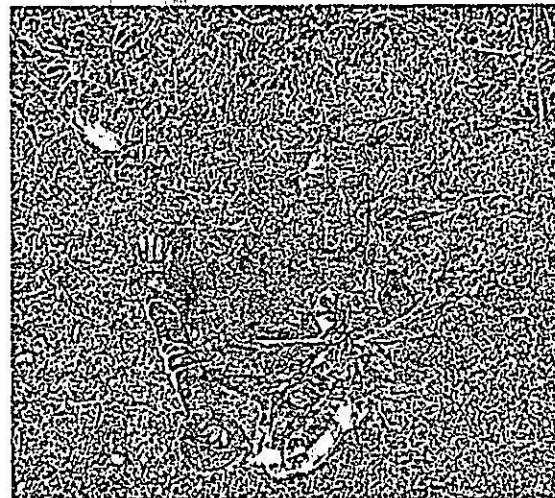



Foto 135. Actividades de fertilización en las especies

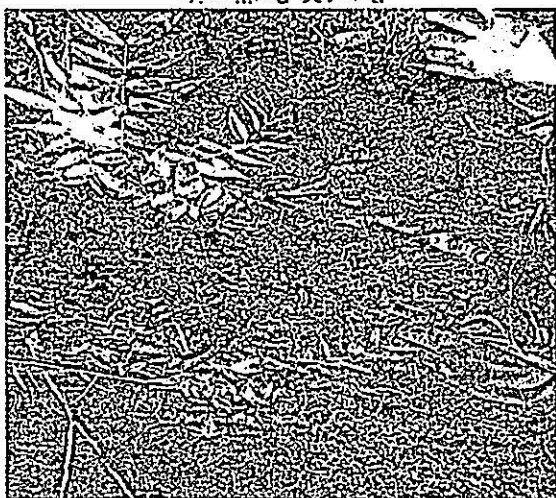


Foto 136. Fertilización



Foto 137. Fertilización de individuos

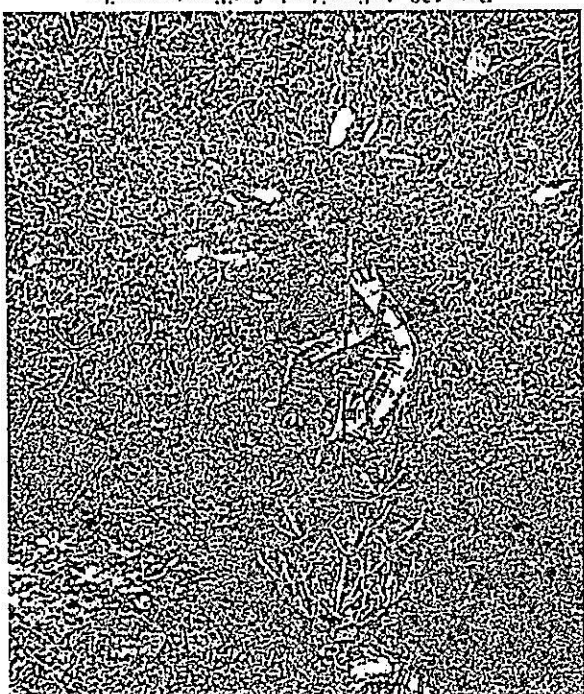


Foto 138. Aplicación de fertilizantes a ceba

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO N.º 73-2022 SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES</p>
---	--

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se dio cumplimiento a las actividades de suministro y siembra de 2200 árboles, con dos mantenimientos para cumplir parte del contrato número 73 de año 2022.
- Se le recomienda a la entidad seguir realizando mantenimientos debido a que en la zona en la que se establecieron los individuos es un relleno y esto puede generar a futuro algún tipo de daño en los individuos esto con el fin de asegurar el óptimo crecimiento del material vegetal.
- Las plántulas tuvieron un buen prendimiento en la zona establecida. Asegurando más del 90% de supervivencia de las especies establecidas.
- Se le informo a la entidad contratante sobre la presencia de semovientes (ganado) en el área de influencia del proyecto y las cuales han afectado gran cantidad de individuos establecidos, los cuales toco reponer, se le solicita al contratante tomar medidas con respecto a los semovientes en el predio debido a que si se vuelve frecuente es probable que se presente una mortalidad de la mayoría de individuos establecidos y caso en el cual nosotros como firma no somos responsables.
- Para el establecimiento y la resiembra se sembraron más arboles de los 2200, esto con el fin de tener una margen de más del 10% de los individuos del contrato.
- La especie que mejor adaptabilidad tuvo fue el igua.
