



REPORTE DE SERVICIOS INSTALADOS CONTRATO 197-2023



VITACOM DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 156-80. Bogotá, Colombia
PBX: (+57) 1 7452741

Octubre 10 de 2023

REPORTE DE SERVICIOS INSTALADOS CONTRATO 197-2023

INFORME DE VISITA DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 197 DE 2023

Tabla de Contenido

OBJETIVOS	5
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	6
2. METODOLOGÍA APLICADA	6
3. EQUIPOS UTILIZADOS	7
4. TRABAJOS REALIZADOS	7
5. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD	7
6. Equipos de generación	8
7. ACTIVIDADES REALIZADAS	10
Transformadores de Corriente CT's	10
Instalación de Medidor	11
Instalación del Sistema de Comunicación	12
Instalación de Puesta Tierra	12
8. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO	13
9. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACIÓN EN EL MEDIDOR	14
10. SEGUIMIENTO SGSST	15
Aportes Parafiscales	15
ANÁLISIS DE INDICADORES	16
11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL	25
12. PERSONAL TECNICO	25
13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES	25
14. CONCLUSIONES	25
15. DOCUMENTACIÓN	26
16. Diagrama Unifilar	33
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	33

Tabla de Imágenes

Imagen 1 Ubicación geográfica Balsita (choco)	6
Imagen 2. Instalación física de la planta	8
Imagen 3. Planta eléctrica	8
Imagen 4. Salida de potencia del generador	9
Imagen 5. Placa del generador	9
Imagen 6. Gabinete instalado	10
Imagen 7. Placa de características de CT's	10
Imagen 8. Medidor Landis Gyr	11
Imagen 9. Antena	12
Imagen 10. Puesta a tierra	12
Imagen 11. Medidas Voltaje	13
Imagen 12. Equipos en funcionamiento	13
Imagen 13. Configuración del medidor	14
Imagen 14. Prueba de telemetría	15
Imagen 15. SG-SST	16
Imagen 16. Índice de frecuencia	18
Imagen 17. Índice de incapacidad	20
Imagen 18. Índice de severidad	22
Imagen 19. Personal técnico	23
Imagen 20. Inspección de trabajo seguro	24
Imagen 21. Ficha técnica de Equipos medidor de energía	26
Imagen 22. Ficha técnica de Equipos transformador de medida	27
Imagen 23. Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones	28
Imagen 24. Hoja de vida de equipos	29
Imagen 25. Acta de instalación equipos de telemetría 1	30
Imagen 26. Acta de instalación equipos de telemetría 2	31
Imagen 27. Orden de servicio	32
Imagen 28. Diagrama Balsita	33

OBJETIVOS

- A. Cumplir con lo estipulado en el contrato 197 de 2023, referente la instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema de medición de energía eléctrica en la localidad de Balsita.
- B. Realizar visita al municipio de Balsita departamento de Rio Sucio Choco para realizar instalación del sistema de telemetría para los consumos de energía en la planta de generación de la localidad.
- C. Realizar gestión necesaria para ejecutar el trabajo de instalación en la localidad de Balsita departamento de Rio Sucio dando cumplimiento con el RETIE, normas NTC e IPSE.
- D. Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos instalados con las pruebas necesarias y así mismo tomar evidencias de los equipos en sitio.
- E. Realizar cumplimiento del SG-SSTA, acatando recomendaciones e instrucciones de IPSE.
- F. Diligenciar documentación y cumplir a cabalidad todas las recomendaciones para la ejecución de las actividades en sitio, dadas por la entidad.
- G. Plasmar fallas e inconvenientes encontrados durante la ejecución en el presente informe.

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Balsita es una localidad al norte del Choco dentro del municipio de Rio sucio.

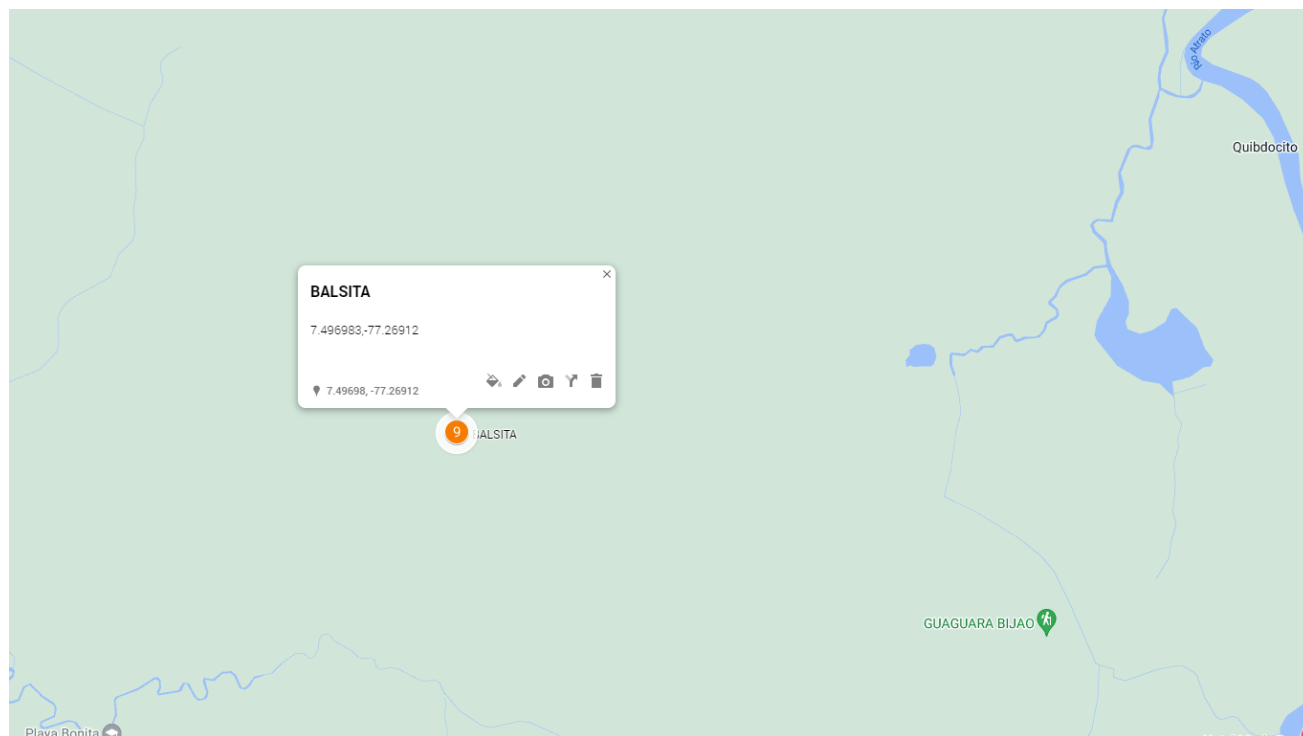


Imagen 1 Ubicación geográfica Balsita (choco)

2. METODOLOGÍA APLICADA

Durante la actividad para realizar la instalación en la localidad se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Se realiza revisión del estado físico del sitio para diagnosticar las obras requeridas para ejecutar el montaje de los equipos.
- Se realiza verificación del estado de los cables y ductería, con el fin de garantizar la instalación sin que se presente ningún inconveniente.
- Se realiza el componente ambiental considerando que las zonas presentan condiciones ambientalmente adversas, para determinar que los materiales implementados sean acorde a las conexiones del sitio y soporten el impacto ambiental.

- Se revisa el funcionamiento y pruebas de los equipos, se confirma que los equipos quedan instalados de forma correcta funcionando de manera óptima.
- Se realizan pruebas de funcionamiento mediante software verificando la información y el funcionamiento de los medidores.
- Se realiza validación de medidas, seriales y conexiones del sistema de medida para verificar la información obtenida.

3. EQUIPOS UTILIZADOS

- Computador portátil con Software de Programación y lectura
- Ponchadora de cable eléctrico
- Ponchadora de cable de datos
- Pinza voltiamperimétrica
- Multímetro
- Equipo protección contra caídas

4. TRABAJOS REALIZADOS

El día 09 de octubre se realiza visita al sitio Balsita (Riosucio - Choco), para realizar la instalación de telemetría, sistema de medida en baja tensión y sistema comunicación para tele medición de la planta de generación de energía instalada en la localidad mencionada.

5. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD

La planta de generación se encuentra ubicada dentro del casco urbano del corregimiento, las instalaciones están compuestas por una estructura en madera y techo en teja de fibrocemento.



Imagen 2. Instalación física de la planta

6. Equipos de generación



Imagen 3. Planta eléctrica

En la planta de generación de Balsita se encuentra instalado un generador con las siguientes especificaciones:

MARCA	MODELO	SERIE	CAPACIDAD	ESTADO
FUAN HENGSHAN	LGLL18		60	NO OPERANTE

En el proceso de la instalación se realiza validación del funcionamiento del equipo.



Imagen 4. Salida de potencia del generador

En la planta de generación se encuentra instalado actualmente 1 generador a Diesel sobre el que relacionamos las características, se adjuntan las placas:



Imagen 5. Placa del generador

7. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el traslado de los equipos requeridos para el montaje por vía terrestre desde Bogotá hasta el municipio de Riosucio y desde allí en lancha se desplazaron hasta las instalaciones de la central de generación de Balsita.

En el rack se instalaron los equipos de comunicaciones, medidores, transformadores de medida, estabilizador, breaker, regulador de energía.



Imagen 6. Gabinete instalado

Transformadores de Corriente CT's



Imagen 7. Placa de características de CT's

MODELO	RELACION	CLASE	SERIAL
HS600	400/5 AMP	0,5S	2109947-1
HS600	400/5 AMP	0,5S	2109935-1
HS600	400/5 AMP	0,5S	2109908-1

Instalación de Medidor

Se realizó la instalación del medidor en la pared del gabinete y se realizó el tendido de la tubería EMT que lleva las señales de los transformadores de corriente y de las comunicaciones del medidor. Se realizó el montaje del medidor marca Landys Gyr E570 con serial 60715275 en la celda de medida con su respectivo bloque de prueba.



Imagen 8. Medidor Landis Gyr

MEDIDOR			
MARCA	MODELO	CLASE	SERIAL
LANDIS GYR	E570	0,5S	60715275

Instalación del Sistema de Comunicación



Imagen 9. Antena

Dentro del sistema de comunicación se instaló una antena de 0.90 m, un modem satelital, LNB. Se realiza proceso de verificación donde se ubica la antena.

Instalación de Puesta Tierra

La instalación del sistema de puesta tierra se compone por tres varillas de cobre, protección contra sobrecargas, disponiendo como lugar de instalación una zona exterior a la construcción donde se ubica la planta eléctrica.



Imagen 10. Puesta a tierra



Imagen 11. Medidas Voltaje

8. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO

A continuación, se relacionan equipos instalados y en funcionamiento dentro del sistema de medición:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SERIE	ESTADO
1	Medidor de energía	1	60715275	OK
2	Bornera de conexión	1	N/A	OK
3	Transformador de corriente 400/5 BLOX	1	2109947-1	OK
4	Transformador de corriente 400/5 BLOX	1	2109908-1	OK
5	Transformador de corriente 400/5 BLOX	1	2109935-1	OK
6	Interfaz de comunicación	1	N/A	OK
7	Regulador de voltaje Powest	1	N/A	OK
8	LNB	1	205504978	OK
9	Conversor Satelital	1	N/A	OK

Imagen 12. Equipos en funcionamiento

Relación de Transformación
CT: $400/5 = 80$

OBIS	Value	Unit	Designation	Group 
0-0:96.4.0	23		State of internal control signals	Diagnostics
0-0:96.5.0	1052866		Internal operating status	Diagnostics
0-0:96.6.0	4	min	Battery use time	Diagnostics
0-0:96.8.0	19380	min	Operating time	Diagnostics
0-0:96.8.1	0	min	Operating time rate 1	Diagnostics
0-0:96.8.2	0	min	Operating time rate 2	Diagnostics
0-0:96.8.3	0	min	Operating time rate 3	Diagnostics
0-0:96.8.4	0	min	Operating time rate 4	Diagnostics
0-0:96.8.5	0	min	Operating time rate 5	Diagnostics
0-0:96.8.6	0	min	Operating time rate 6	Diagnostics
0-0:96.2.7	----- --:--:-- (--)		Activation date of passive calendar (TOU)	Diagnostics
0-0:0.2.0	V841415		Active firmware identifier	Identification Numbers
1-0:0.2.0	V841423		Active firmware identifier	Identification Numbers
1-0:0.2.1	84-0191a		Parameterisation ID	Identification Numbers
1-0:0.2.8	1717A897		Active firmware signature	Identification Numbers
1-1:0.2.0	V841527		Active firmware identifier channel 1	Identification Numbers
1-0:0.2.2	ACTIVE		Active calendar name (active TOU ID)	Identification Numbers
1-0:0.2.7			Passive calendar name (passive TOU ID)	Identification Numbers
0-0:96.90	M33C2C20XRO59NXIQ		Configuration ID	Identification Numbers
0-0:96.14.0	RATE3		Currently active tariff	Identification Numbers
0-0:96.91.0	A30.0		Remote Communication ID	Identification Numbers
0-0:22.0.0	6286		HDLC device address	Communication
0-1:22.0.0	6286		HDLC device address channel 1	Communication
0-2:22.0.0	6286		HDLC device address channel 2	Communication
0-3:22.0.0	6286		HDLC device address channel 3	Communication
0-4:22.0.0	6286		HDLC device address channel 4	Communication
1-0:0.4.2	80,000		Current transformer ratio	Constants
1-0:0.4.3	1,000		Voltage transformer ratio	Constants

Imagen 13. Configuración del medidor

9. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACIÓN EN EL MEDIDOR

Se realiza montaje de los equipos y se procede a realizar una descarga de datos del medidor para verificar que se encuentra configurado correctamente y se obtienen datos reales.

Se puede extraer de manera remota mediante la plataforma, la información solicitada por el IPSE, en dicha prueba se puede validar las cadenas de medición, toma de datos y comunicación en conjunto.

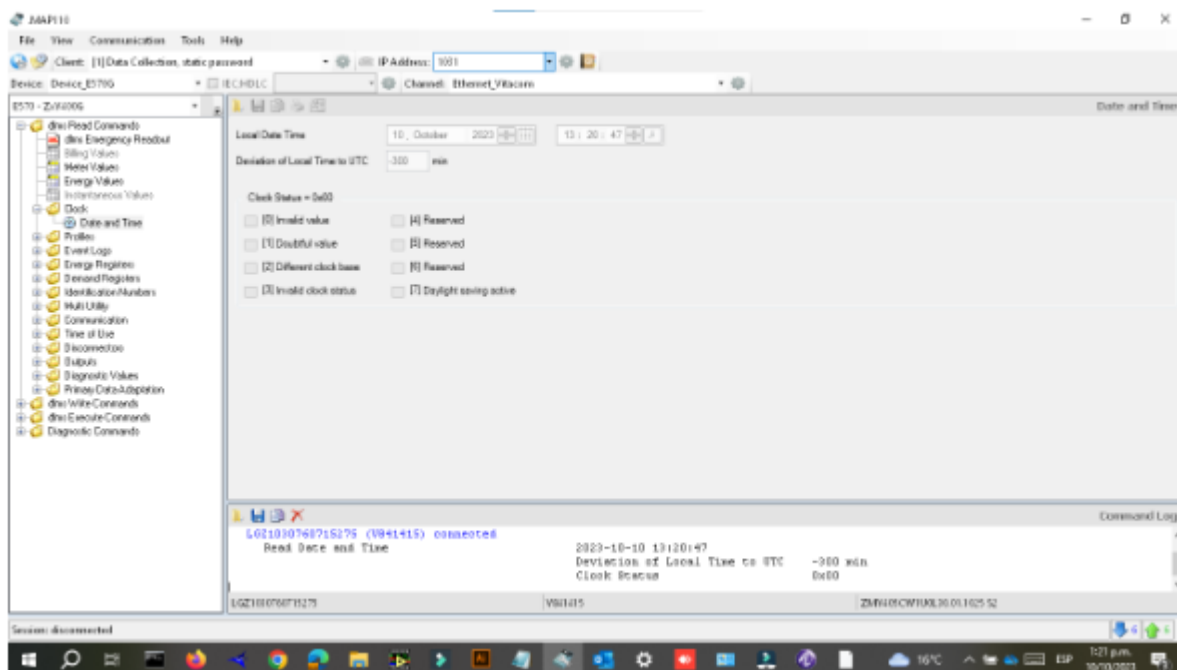


Imagen 14. Prueba de telemetría

10. SEGUIMIENTO SGSST

En la ejecución de las actividades se aplicaron las recomendaciones sugeridas por el SISO, en salud ocupacional y la prioridad del equipo de trabajo, fue garantizar la seguridad del personal de Telemetría, se contactó al operador de la planta, se le informó los trabajos que se realizarían en el sitio y los posibles riesgos que se podían presentar, se realizó la demarcación correspondiente en el sitio. El personal en sitio acató las indicaciones dadas con respecto al uso de los EPP (se adjuntan evidencias).

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de septiembre del año 2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores y la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza una revisión mensual de los aportes generados a cada entidad de EPS, AFP y ARL, según validación de afiliación inicial.

ANÁLISIS DE INDICADORES

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite expresar en cifras relativas las características de accidentalidad de la actividad que se desarrolló, según la tasa de accidentalidad (0) a continuación, se evidencia el resultado.

		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Cod.: PRG-SST-09											
		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SSTA										Fecha de elaboración: 17/07/2023											
												Versión: 001											
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA																							
Incentivar el desarrollo de capacitaciones, campañas y charlas que permitan destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, mediante la entrega de conocimientos para promover la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral de manera que se contribuya al mejoramiento del sistema de gestión SST y la prestación de los servicios.																							
2. ALCANCE																							
El Programa de Capacitación, promoción y prevención SSTA aplica para todo el personal de VITACOM que se encuentre laborando en el proyecto de IPSE.																							
3. METAS																							
CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 90% de las actividades del programa de capacitación, promoción y prevención SSTA.																							
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:		Director de operaciones y Responsable SG-SSTA																					
FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:		4. CRONOGRAMA																					
		Agosto a octubre del 2023																					
ACTIVIDAD		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		% CUMPLIMIENTO A-DICIEMBRE PASADO	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES								
		III SEM	IV SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM												
FASE 1. PLANEAR	Definición de objetivos y metas del programa de capacitación, promoción y prevención.	1										100%	Vija SSTA Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención									
	Establecer los requisitos de capacitación, promoción y prevención.	1										100%	Vija SSTA Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención									
	Inducción en SSTA	1						1					100%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia								
FASE 2. HACER	Uso y cuidado de los elementos de protección personal	1						1				100%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Uso de herramientas manuales	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Orden y aseo	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Campaña de higiene personal	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Trabajo seguro en alturas	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Control de riesgo eléctrico	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Control de riesgo público	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Medio Ambiente	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Campaña hábitos saludables en los entornos laborales	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Campaña de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Campaña promoción de la salud mental	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Como actuar en caso de una emergencia	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Como prestar un primer auxilio	1						1				9%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	Manejo de edificios	1						1				100%	Vija SSTA Tabaladores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia									
	FASE 3. VERIFICAR	Seguimiento a indicadores y planes de acción establecidos en el programa	1						1		1		9%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención								
Revisión, validación y ajuste del programa de capacitación, promoción y prevención.		1						1				100%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención									
FASE 4. ACTUAR	Cierre de los planes de acción, análisis de tendencias e indicadores del programa	1						1		1		9%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención									
P= Programado E= Ejecutado																							
5. RECURSOS ASIGNADOS																							
Humanos:		Personal calificado para el desarrollo del Programa (Vija SSTA, Director de operaciones y Responsable del SG-SSTA)																					
Económicos:		Disponibilidad del tiempo necesario para la ejecución del programa																					
Financieros:		Asignación en el presupuesto																					
Técnicos:		Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos, equipo de cómputo, uso de plataformas tecnológicas.																					
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO																							
NOMBRE		CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA																					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL											
		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T												
		SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM												
FORMULA	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas) *100	2	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	2										
	Ejecutadas	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7										
	Resultado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	0%	0%	0%	33%									
Meta		00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%										
ANÁLISIS DE DATOS																							
Septiembre: Las actividades del Programa para el mes de agosto se cumplieron en un 100% superando la meta establecida, se continuará con el seguimiento del cronograma para continuar con la tendencia actual.																							
Octubre:																							
7. PLAN DE ACCIÓN																							
HALLAZGO		RESPONSABLE										FECHA PROGRAMADA											
Septiembre: De acuerdo con los datos arrojados en el mes de septiembre no se requiere realizar ningún plan de acción.																							
Octubre:																							
Noviembre:																							

Imagen 15.SG-SST

 <p>Comunicación sin límites</p>	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Código: FT-SST-016		
	Formato Indicadores del SG-SSTA										Versión: 2		
												Vigencia: 28/04/2023	
Frecuencia de Accidentalidad													
Definición del Indicador	Nombre	Meta	Indicador (formula)						Fuente de información				
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Frecuencia de accidentalidad	0	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100						FURAT Investigaciones de accidentes de trabajo Estadísticas de accidentalidad ARL				
Tipo de indicador	Resultado		Interpretación		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes XXX, se presentaron XXX Accidentes de trabajo								
Frecuencia medición	Mensual		Personas a informar		Gerente General, Dirección Administrativa y COPASST								
Responsable:		Responsable sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente											
DATOS 2023													
Formula	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Número de trabajadores en el mes	7	7	7	7	7	7	11	7	7				
RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENDENCIA DEL INDICADOR													
<p style="text-align: center;">FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD</p>  <p style="text-align: center;">■ RESULTADO ■ META</p>													

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de enero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Septiembre, se presentaron 0 Accidentes de trabajo		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 16. Índice de frecuencia

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Código: FT-SST-016		
	Formato Indicadores del SG-SSTA										Versión: 2		
											Vigencia: 28/04/2023		
Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante													
Definición del Indicador	Nombre	Meta	Indicador (formula)							Fuente de información			
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes con tiempo perdido	Frecuencia de accidentes de trabajo con lesión incapacitante	0	(Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "2" / Número promedio de trabajadores en el periodo "2") * 100							FURAT Investigaciones de accidentes de trabajo Estadísticas de accidentalidad ARL			
Tipo de indicador	Resultado		Interpretación		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes XXX, se presentaron XXX Accidentes de trabajo con lesión incapacitante								
Frecuencia medición	Mensual		Personas a informar		Gerente General, Dirección Administrativa y COPASST								
Responsable:	Responsable sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente												
DATOS 2023													
Formula	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Número promedio de trabajadores en el periodo "2"	7	7	7	7	7	7	11	7	7				
RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENDENCIA DEL INDICADOR													
<p>Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante</p> 													

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en enero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en febrero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en marzo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en abril, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en mayo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en junio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en julio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en agosto, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en septiembre, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 17. Índice de incapacidad

<

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de cumplimiento	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes enero, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes febrero, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes marzo, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes abril, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes mayo, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes junio, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes julio, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes agosto, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes septiembre, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 18. Índice de severidad



Imagen 19. Personal técnico

vitatcom		Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente Autoridad del Trabajo Seguro (ATS)		Código Fecha Hoja No. 1																																		
NOMBRE DEL TALLERISTA O CONSULTOR		NOMBRE DEL EMPLAQUEADO																																				
Instalación Sistema de Telemetría y Comunicaciones		ubicación del taller																																				
NOMBRE DEL TALLERISTA O CONSULTOR																																						
Walter Bogallo Robinson Pérez																																						
NOMBRE DEL EMPLAQUEADO																																						
AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA																																						
NOMBRE DEL EMPLAQUEADO		NOMBRE DEL TALLERISTA O CONSULTOR		OTRO																																		
AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA (Firmar los formatos de Registro de Trabajo Seguro)																																						
FIRMAS, NOMBRES Y EQUIPO A UTILIZAR																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>RECURSOS MATERIALES</th> <th>RECURSOS DE CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Verificación de Permisos ingreso a sitio</td> <td>1. Hoja de ruta</td> <td>1. Diagrama de ruta</td> </tr> <tr> <td>2) Toma registro fotografico inicial</td> <td>2. Hoja de ruta</td> <td>2. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>3) Verificación de equipo generador</td> <td>3. Hoja de ruta</td> <td>3. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>4) Instalación de equipo de Telemetría</td> <td>4. Hoja de ruta</td> <td>4. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>5) Instalación de equipo de Telecomunicaciones</td> <td>5. Hoja de ruta</td> <td>5. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>6) Instalación de mapa puesta a Tierra</td> <td>6. Hoja de ruta</td> <td>6. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>7) Pruebas de conectividad y equipo de medición</td> <td>7. Hoja de ruta</td> <td>7. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>8) Fotos finales</td> <td>8. Hoja de ruta</td> <td>8. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>9) Asesoramiento de Residuos</td> <td>9. Hoja de ruta</td> <td>9. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>10) Entrega a cliente</td> <td>10. Hoja de ruta</td> <td>10. Hoja de ruta</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS DE CONTROL	1) Verificación de Permisos ingreso a sitio	1. Hoja de ruta	1. Diagrama de ruta	2) Toma registro fotografico inicial	2. Hoja de ruta	2. Hoja de ruta	3) Verificación de equipo generador	3. Hoja de ruta	3. Hoja de ruta	4) Instalación de equipo de Telemetría	4. Hoja de ruta	4. Hoja de ruta	5) Instalación de equipo de Telecomunicaciones	5. Hoja de ruta	5. Hoja de ruta	6) Instalación de mapa puesta a Tierra	6. Hoja de ruta	6. Hoja de ruta	7) Pruebas de conectividad y equipo de medición	7. Hoja de ruta	7. Hoja de ruta	8) Fotos finales	8. Hoja de ruta	8. Hoja de ruta	9) Asesoramiento de Residuos	9. Hoja de ruta	9. Hoja de ruta	10) Entrega a cliente	10. Hoja de ruta	10. Hoja de ruta
ITEM	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS DE CONTROL																																				
1) Verificación de Permisos ingreso a sitio	1. Hoja de ruta	1. Diagrama de ruta																																				
2) Toma registro fotografico inicial	2. Hoja de ruta	2. Hoja de ruta																																				
3) Verificación de equipo generador	3. Hoja de ruta	3. Hoja de ruta																																				
4) Instalación de equipo de Telemetría	4. Hoja de ruta	4. Hoja de ruta																																				
5) Instalación de equipo de Telecomunicaciones	5. Hoja de ruta	5. Hoja de ruta																																				
6) Instalación de mapa puesta a Tierra	6. Hoja de ruta	6. Hoja de ruta																																				
7) Pruebas de conectividad y equipo de medición	7. Hoja de ruta	7. Hoja de ruta																																				
8) Fotos finales	8. Hoja de ruta	8. Hoja de ruta																																				
9) Asesoramiento de Residuos	9. Hoja de ruta	9. Hoja de ruta																																				
10) Entrega a cliente	10. Hoja de ruta	10. Hoja de ruta																																				
FIRMAS, NOMBRES Y EQUIPO A UTILIZAR																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>RECURSOS MATERIALES</th> <th>RECURSOS DE CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Verificación de Permisos ingreso a sitio</td> <td>1. Hoja de ruta</td> <td>1. Diagrama de ruta</td> </tr> <tr> <td>2) Toma registro fotografico inicial</td> <td>2. Hoja de ruta</td> <td>2. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>3) Verificación de equipo generador</td> <td>3. Hoja de ruta</td> <td>3. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>4) Instalación de equipo de Telemetría</td> <td>4. Hoja de ruta</td> <td>4. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>5) Instalación de equipo de Telecomunicaciones</td> <td>5. Hoja de ruta</td> <td>5. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>6) Instalación de mapa puesta a Tierra</td> <td>6. Hoja de ruta</td> <td>6. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>7) Pruebas de conectividad y equipo de medición</td> <td>7. Hoja de ruta</td> <td>7. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>8) Fotos finales</td> <td>8. Hoja de ruta</td> <td>8. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>9) Asesoramiento de Residuos</td> <td>9. Hoja de ruta</td> <td>9. Hoja de ruta</td> </tr> <tr> <td>10) Entrega a cliente</td> <td>10. Hoja de ruta</td> <td>10. Hoja de ruta</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS DE CONTROL	1) Verificación de Permisos ingreso a sitio	1. Hoja de ruta	1. Diagrama de ruta	2) Toma registro fotografico inicial	2. Hoja de ruta	2. Hoja de ruta	3) Verificación de equipo generador	3. Hoja de ruta	3. Hoja de ruta	4) Instalación de equipo de Telemetría	4. Hoja de ruta	4. Hoja de ruta	5) Instalación de equipo de Telecomunicaciones	5. Hoja de ruta	5. Hoja de ruta	6) Instalación de mapa puesta a Tierra	6. Hoja de ruta	6. Hoja de ruta	7) Pruebas de conectividad y equipo de medición	7. Hoja de ruta	7. Hoja de ruta	8) Fotos finales	8. Hoja de ruta	8. Hoja de ruta	9) Asesoramiento de Residuos	9. Hoja de ruta	9. Hoja de ruta	10) Entrega a cliente	10. Hoja de ruta	10. Hoja de ruta
ITEM	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS DE CONTROL																																				
1) Verificación de Permisos ingreso a sitio	1. Hoja de ruta	1. Diagrama de ruta																																				
2) Toma registro fotografico inicial	2. Hoja de ruta	2. Hoja de ruta																																				
3) Verificación de equipo generador	3. Hoja de ruta	3. Hoja de ruta																																				
4) Instalación de equipo de Telemetría	4. Hoja de ruta	4. Hoja de ruta																																				
5) Instalación de equipo de Telecomunicaciones	5. Hoja de ruta	5. Hoja de ruta																																				
6) Instalación de mapa puesta a Tierra	6. Hoja de ruta	6. Hoja de ruta																																				
7) Pruebas de conectividad y equipo de medición	7. Hoja de ruta	7. Hoja de ruta																																				
8) Fotos finales	8. Hoja de ruta	8. Hoja de ruta																																				
9) Asesoramiento de Residuos	9. Hoja de ruta	9. Hoja de ruta																																				
10) Entrega a cliente	10. Hoja de ruta	10. Hoja de ruta																																				

Imagen 20. Inspección de trabajo seguro

11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL

Durante la instalación en la localidad de Balsita no se generaron residuos peligrosos que deban ser tratados, los residuos corresponden a empaques de cartón y plástico en los que se transportaron los equipos fueron llevados al punto donde la comunidad tiene el reciclaje.

12. PERSONAL TECNICO

Walter Bogallo
Técnico Comunicaciones

Yeferson Pérez
Contratista Eléctrico

13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES

En el proceso de instalación no se presentó ninguna novedad, los procedimientos se realizan acorde a lo programado, se realizan pruebas desde la plataforma de Telemetría con resultados exitosos.

14. CONCLUSIONES

- Se logra documentar todo lo referente al sistema de alimentación eléctrica de la sede.
- Durante la instalación de los equipos se realizan verificaciones del estado de funcionamiento óptimo de los equipos instalados en sitio y el nuevo capex a instalar.
- Se instala gabinete de medida y sistema de puesta a tierra, acorde a normatividad vigente. De igual manera sistema de comunicación, se hacen pruebas con el NOC vía remota para las lecturas de telemetría.
- No se presenta incidentes ni accidentes durante la ejecución de las actividades


15. DOCUMENTACIÓN

ipse		FICHA TECNICA DE EQUIPOS		Código	Página
				IPSE-GI-F10	1/1
				Fecha	10/10/2023
EQUIPO: MEDIDOR DE ENERGIA					
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN					
LOCALIDAD	BALSITA	CIRCUITO	Rio Suao / Choco		
FECHA:	10/10/2023				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS					
MARCA	MODELO/TIPO	TIPO DE ENERGIA QUE MIDE		NÚMERO DE SERIE	
Landys Gyr	E 570	ACTIVA	X	REACTIVA	X
					60715275
CALSE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	CONEXIÓN ELEM. 3- ELEM	2- FRECUENCIA	AÑO DE FABRICACIÓN
(22) Cl.0.5s (23) Cl.2	3x58/100 - 277/480 V	1 (10) A		60Hz	2023
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN					
DIMENSIONES:	ALTO	25,5 cm	ANCHO	17,5 cm	PROFUNDIDAD
					7,5 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		HUMEDAD:			
- 40° / 70° C.		IP54			
BATERIA		PUERTOS DE SALIDA			
		RS-232		PULSOS	10000
CALIBRACION	No.	LABORATORIO			
ESTADO INICIAL					
BUENO	X	REGULAR		MALO	
ESTADO FINAL DEL EQUIPO. Se instala equipo en buen estado.					
VIDA UTIL ESTIMADA Segun informacion entregada por el fabricante.					
OBSERVACIONES:					
Se instala equipo en buen estado y funcionamiento					
EJECUTADO POR. Jefferson Pérez					

Imagen 21.Ficha técnica de Equipos medidor de energía

		FICHA TECNICA DE EQUIPOS		Código IPSE-GI-F10	Página 1/1
				Fecha 10/10/2023	
EQUIPO: TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE					
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN					
LOCALIDAD	BALSITA		CIRCUITO	Rio Sucio / Chaco	
FECHA:	10/10/2023				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS					
MARCA	MODELO/TIPO		RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL	
Blox	HS - 600		400/5A	5 VA	
TENSION MAXIMA	TIPO DE USO		NUMERO DE SERIE	CLASE DE EXACTITUD	
	INTERIOR EXTERIOR			0,5 S	
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN					
DIMENSIONES:		ALTO	8,5 cm	ANCHO	8 cm
				PROFUNDIDAD	4 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:			HUMEDAD:		
- 5° / 40° C.			80 IP		
PESO:			FRECUENCIA:		
			60Hz		
CALIBRACION	16/06/2023	No. 302302	LABORATORIO		
	21/06/2023	303503	Metrobit LTDA		
	21/06/2023	303513			
ESTADO INICIAL					
BUENO		☒	REGULAR	☐	MALO
ESTADO FINAL DEL EQUIPO. se instala en Buen estado					
VIDA UTIL ESTIMADA segun informacion entregada por el fabricante.					
OBSERVACIONES:					
Se instala equipo en Buen funcionamiento y Buen estado					
EJECUTADO POR. Yeferson Pérez					

Imagen 22.Ficha técnica de Equipos transformador de medida

		FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS		Código	Página
				IPSE-GLF10	1/1
				Fecha	04/01/2011

EQUIPO: INTERFAZ DE COMUNICACIONES					
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN					
LOCALIDAD	BALSITA		CIRCUITO		
FECHA:					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERÍSTICAS					
MARCA	MODELO/TIPO		PUERTOS DE SALIDA	NÚMERO DE SERIE	
PUSR	USR - TCP 232 - 302		Ethernet		
CALSE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	FRECUENCIA	AÑO DE FABRICACIÓN	
	100 - 240 V	1 A	50 / 60 Hz		
FUENTE				TIPO	
SERIAL	VOLTAJE		CORRIENTE		
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN					
DIMENSIONES:		ALTO	5 cm	ANCHO	6,5 cm
				PROFUNDIDAD	2,5 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN			HUMEDAD:		
CALIBRACIÓN		No.	LABORATORIO		
ESTADO INICIAL					
BUENO	☒	REGULAR	☐	MALO	☐
ESTADO FINAL DEL EQUIPO: BUENO					
VIDA ÚTIL ESTIMADA					
OBSERVACIONES:					
EJECUTADO POR: WALTER BOGALLO					

Imagen 23.Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones

	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA	Código	Página
		IPSE-GI-F11	1/1
		Fecha	10/10/2023

HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

TIPO DE INSTRUMENTO:

MEDIDOR DE ENERGÍA ☒ TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE ☒ TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE TENSIÓN ☐

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MEDIDORES DE ENERGÍA

MARCA	MODELO/TIPO	TIPO DE ENERGÍA QUE MIDE		CONSTANTE E. ACTIVA	CONSTANTE E. REACTIVA
LANDYS Gyr	E 570	ACTIVA ☒	REACTIVA ☒	10000	10000
CLASE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE		TIPO (No De fases e hilos)	NÚMERO DE SERIE
(22) Cl. 0.5s (23) Cl. 2	3x56/100 - 277/480 V	1 (10) A		3 Fases 4 Hilos	00715275

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE CORRIENTE

MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL
Blox	HS - 600	400/5A	5 VA
CLASE DE EXACTITUD	NÚMERO DE SERIE	CLASE DE EXACTITUD	
-5/40°	25TH	0.5 S	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN

MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL
PUSR	USR - TCP 232 - 302		
TENSIÓN MÁXIMA	TIPO DE USO	NÚMERO DE SERIE	CLASE DE EXACTITUD
	INTERIOR EXTERIOR		

ITEM	REGISTRO DE UBICACIONES DEL INSTRUMENTO	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE RETIRO
1	BALSITA	10/10/2023	

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN EN SITIO	DOCUMENTO (INFORME DE CALIBRACIÓN)	PROVEEDOR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO (INFORME DE MANTENIMIENTO)	PROVEEDOR

Imagen 24. Hoja de vida de equipos

	ACTA DE INSPECCION Y/ O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA	Código	Página			
		IPSE-GI-F12	1/2			
		FECHA				
MANTENIMIENTO:						
LOCALIDAD: BALSITA	• Localización geográfica 7.496983, -77.26912		FECHA:	HORA DE INICIO:	INFORME No.	
NIVEL DE TENSION	MEDIDA EN: 2 ELEMENTOS	3 ELEMENTOS	TIPO DE MEDIDA	INTERIOR	EXTERIOR	tipo de comunicacion
EQUIPOS ENCONTRADOS*						
MEDIDOR		LECTURA		HORA :		
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
TRANSFORMADOR DE MEDIDA						
MARCA		MODELO		SERIE		RELACION
OBSERVACIONES						
INTERFAZ DE COMUNICACIONES						
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
OTROS						
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
EQUIPOS INSTALADOS*						
MEDIDOR		LECTURA		HORA :		
MARCA Landis		MODELO E 570		SERIE 60715275		TIPO
OBSERVACIONES						
TRANSFORMADOR DE MEDIDA						
MARCA Blox		MODELO HS - 600		SERIE 2109947-1		RELACION 400/5A
OBSERVACIONES						
MARCA Blox		MODELO HS - 600		SERIE 2109908-1		RELACION 400/5A
OBSERVACIONES						
MARCA Blox		MODELO HS - 600		SERIE 2109935-1		RELACION 400/5A
OBSERVACIONES						
INTERFAZ DE COMUNICACIONES						
MARCA PUSR		MODELO USR - TCP 232 - 302		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
OTROS						
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
OBSERVACIONES GENERALES						
EJECUTADO POR						
REVISADO POR						

	ACTA DE INSPECCION Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA				Código	Página
					IPSE-01-F12	1/2
					FECHA	
DATOS DE TRABAJADORES						
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ESTADO DE SALUD	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	
WALTER BOGALLO	72193051	TÉCNICO	BUENO	27	[Firma]	
YEFFERSON PÉREZ	1033763594	TÉCNICO	BUENO	27	[Firma]	
JOHAN TELLEZ	80239940	TÉCNICO	BUENO	27	[Firma]	
CHARLA DE CAPACITACION						
TEMA: <u>INSTALACION SISTEMA DE TELEMETRAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION</u>						
EXPOSITOR: <u>YEFFERSON PÉREZ</u>						
LOS ARRIBA FIRMANTES CERTIFICAMOS QUE HEMOS RECIBIDO LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DESCRITO Y QUE ENTENDEMOS LOS RIESGOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS				MINUTOS: <u>15</u>		
ASPECTOS HSEQ						
ACCIDENTES: <u>NINGUNO</u>						
INCAPACIDADES: <u>NINGUNA</u>						
INCIDENTES: <u>NINGUNO</u>						
DESCRIPCION:						
ASPECTOS AMBIENTALES						
MANEJO DE RESIDUOS: <u>LOS DESHECHOS SE ENTREGAN A LA COMUNIDAD, ELLOS DISPONDRA SU INCINERACION.</u>						
OTROS ASPECTOS AMBIENTALES						
OBSERVACIONES GENERALES						
ELABORO:						
NOMBRE: <u>WALTER BOGALLO</u>		REVISO:		OPERADOR/USUARIO:		
FIRMA: [Firma]		NOMBRE:		NOMBRE:		
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		

Imagen 26. Acta de instalación equipos de telemetría 2

vitacom
DE COLOMBIA S.A.S.
Nit: 800.250.325-2

Gra. 7 No. 156 - 80 OF. 1302 México, D.F. • (55) 5694 4304
PBX: 745 2741
Bogotá, D.C. • Colombia
www.vitacom.com.co

ORDEN DE SERVICIO

No. de Servicio

Cliente

IPSE

Contacto Local

YUBAN VARGAS GARCIA

Sitio

BALSITA

Teléfono y Ext.

3115749442

Fecha y Hora de Llegada

9/10/2023 14:00

Fecha y Hora de Salida

10/10/2023 17:00

Horas Laboradas

27

Propósito del Viaje

Instalación sistema de telemetría

Resultado de las Pruebas y Observaciones

Pruebas de conectividad OK, registro medidor OK.

Observaciones: La planta eléctrica está fuera de servicio hace 14 meses el operador ENCOEN no ha realizado la reparación, ni el suministro de combustible durante este periodo. La comunidad indica que la planta será reparada siempre que otro operador se comprometa en el mantenimiento de los equipos y suministre el combustible necesario. La comunidad manifiesta el interés de la normalización de la energía de la cual están haciendo uso en este momento, dicha energía fue conectada por autogestión.

Status:

Terminado ☒ Pendiente: ☐

Observaciones:

Equipos Retirados	No. ARM	No. Tracking	No. Parte	No. Serie
/	/	/	/	/

Equipos Instalados

MOJEM AYECKA	AD4502003095
TRANSUNCE	205504978
MEDIDOR	60715275

Tipo de Servicio

Garantía ☐ Contrato de Mantenimiento ☐ Cargo al Cliente ☐

Representante de VITACOM (nombre y firma)

WALTER BAZALLO *[Firma]*

Representante del Cliente (nombre y firma)

YUBAN VARGAS *[Firma]*

9-CC12001756

Imagen 27.Orden de servicio

Nombre Contacto	Teléfono
Yuban Vargas Garcia	3115749442

16. Diagrama Unifilar


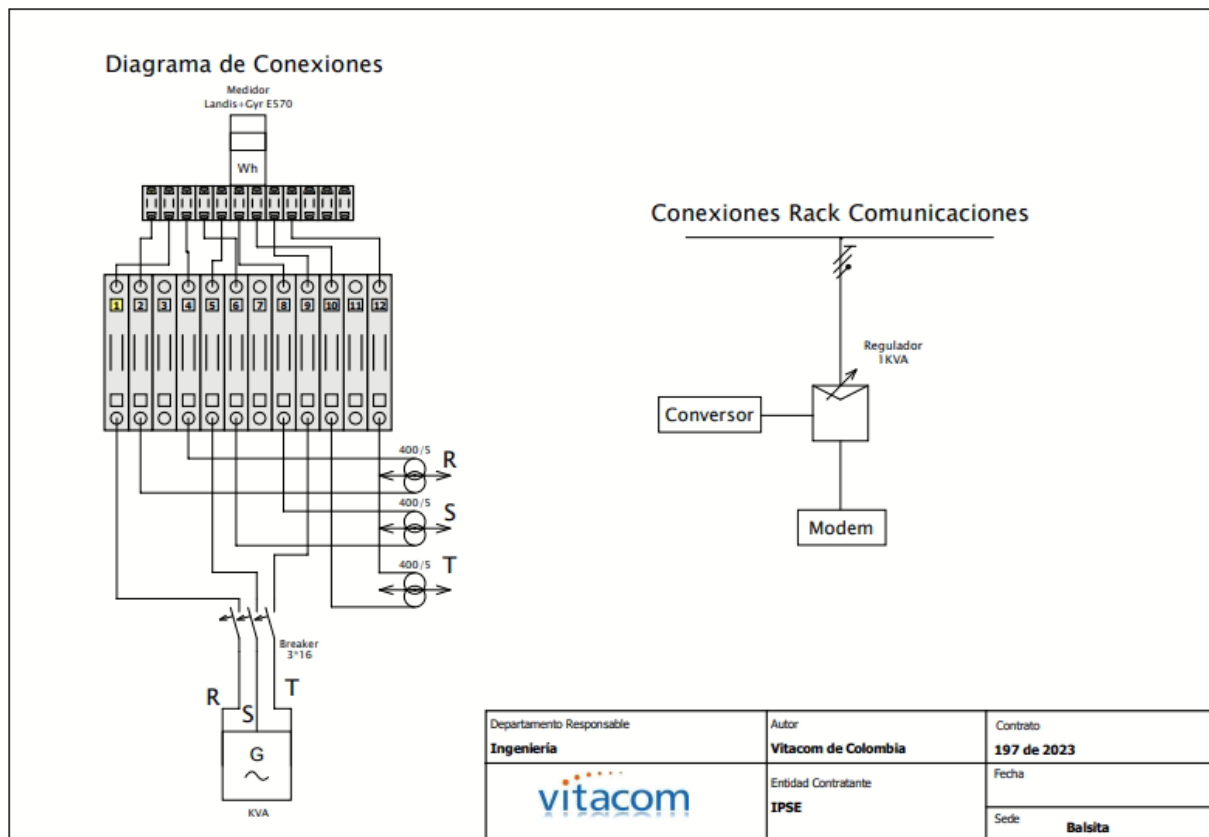


Imagen 28. Diagrama Balsita

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

CERTIFICADO MEDIDOR
FICHA TÉCNICA MEDIDOR
CERTIFICADO CTS
FICHA TÉCNICA CTS
REGISTRO FOTOGRAFICO



Yimmy Londoño
Ingeniero Eléctrico



José Buitrago Gasca
Coordinador de Proyecto
