



REPORTE DE SERVICIOS INSTALADOS CONTRATO 197-2023



VITACOM DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 156-80. Bogotá, Colombia
PBX: (+57) 1 7452741

Noviembre 7 de 2023

REPORTE DE SERVICIOS INSTALADOS CONTRATO 197-2023

INFORME DE VISITA DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 197 DE 2023

Tabla de Contenido

OBJETIVOS.....	5
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	6
2. METODOLOGIA APLICADA.....	6
3. EQUIPOS UTILIZADOS	7
4. TRABAJOS REALIZADOS.....	7
5. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD.....	7
Equipos de generación	8
ACTIVIDADES REALIZADAS	9
Transformadores de Corriente CT's.....	10
Instalación de Medidor	10
Instalación del Sistema de Comunicación.....	11
Instalación Sistema Puesta a Tierra	12
6. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO.....	12
7. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACIÓN EN EL MEDIDOR.....	13
8. SEGUIMIENTO SGSST	14
9. Aportes Parafiscales.....	15
10. ANÁLISIS DE INDICADORES.....	15
11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL.....	24
12. PERSONAL TECNICO	24
13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES.....	24
14. CONCLUSIONES.....	24
15. DOCUMENTACIÓN	25
16. Diagrama Unifilar	32
DOCUMENTACION ADJUNTA	32

Índice Imágenes

Imagen 1 Ubicación geográfica Cabo de la Vela (La Guajira).....	6
Imagen 2 Instalación física de la planta	7
Imagen 3 Planta eléctrica	8
Imagen 4 Salida de potencia del generador	8
Imagen 5 Placa del generador	9
Imagen 6 Gabinete instalado.....	9
Imagen 7 Placa de características de CT's	10
Imagen 8 Medidor Landis+Gyr	11
Imagen 9 Antena	11
Imagen 10 Puesta a tierra	12
Imagen 11 Medidas Voltaje	12
Imagen 12 Equipos en funcionamiento.....	13
Imagen 13 Configuración del medidor	13
Imagen 14 Prueba de telemetría.....	14
Imagen 15 SG-SST	16
Imagen 16 Índice de frecuencia	18
Imagen 17 Índice de incapacidad.....	20
Imagen 18 Índice de severidad.....	22
Imagen 19 Personal técnico	22
Imagen 20 Inspección de trabajo seguro.....	23
Imagen 21 Ficha técnica de Equipos medidor de energía.....	25
Imagen 22 Ficha técnica de Equipos transformador de medida	26
Imagen 23 Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones.....	27
Imagen 24 Hoja de vida de equipos	28
Imagen 25 Acta de instalación equipos de telemetría 1	29
Imagen 26 Acta de instalación equipos de telemetría 2.....	30
Imagen 27 Orden de servicio	31
Imagen 28 Diagrama Cabo de la Vela	32

OBJETIVOS

- A. Cumplir con lo estipulado en el contrato 197 de 2023, referente la instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema de medición de energía eléctrica en la localidad de Cabo de la Vela.
- B. Realizar visita al municipio de Uribia departamento de La Guajira para realizar instalación del sistema de telemetría para los consumos de energía en la planta de generación de la localidad.
- C. Realizar gestión necesaria para ejecutar el trabajo de instalación en la localidad de Cabo de la Vela departamento de La Guajira dando cumplimiento con el RETIE, normas NTC e IPSE.
- D. Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos instalados con las pruebas necesarias y así mismo tomar evidencias de los equipos en sitio.
- E. Realizar cumplimiento del SG-SSTA, acatando recomendaciones e instrucciones de IPSE.
- F. Diligenciar documentación y cumplir a cabalidad todas las recomendaciones para la ejecución de las actividades en sitio, dadas por la entidad.
- G. Plasmar fallas e inconvenientes encontrados durante la ejecución en el presente informe.

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Cabo de la Vela es una localidad al occidente de La Guajira dentro del municipio de Uribia.

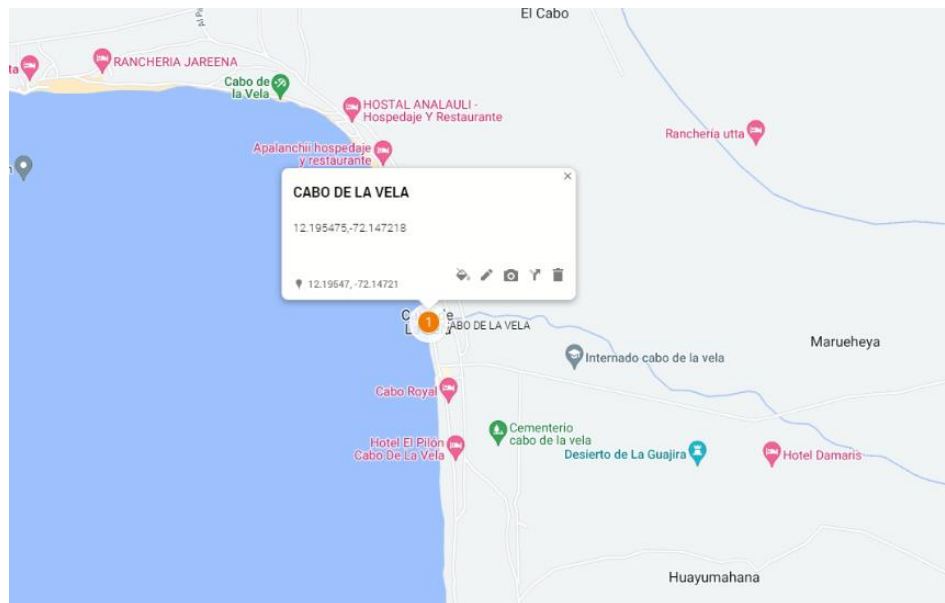


Imagen 1 Ubicación geográfica Cabo de la Vela (La Guajira)

2. METODOLOGIA APLICADA

Durante la actividad para realizar la instalación en la localidad se tienen en consideración los siguientes aspectos:

- Se realiza revisión del estado físico del sitio para diagnosticar las obras requeridas para ejecutar el montaje de los equipos.
- Se realiza verificación del estado de los cables y ducteria, con el fin de garantizar la instalación sin que se presente ningún inconveniente.
- Se realiza el componente ambiental considerando que las zonas presentan condiciones ambientalmente adversas, para determinar que los materiales implementados sean acorde a las conexiones del sitio y soporten el impacto ambiental.
- Se revisa el funcionamiento y pruebas de los equipos, se confirma que los equipos quedan instalados de forma correcta funcionando de manera óptima.
- Se realizan pruebas de funcionamiento mediante software verificando la información y el funcionamiento de los medidores.
- Se realiza validación de medidas, seriales y conexiones del sistema de medida para verificar la información obtenida.

3. EQUIPOS UTILIZADOS

- Computador portátil con Software de Programación y lectura
- Ponchadora de cable eléctrico
- Ponchadora de cable de datos
- Pinza voltiamperimétrica
- Multímetro

4. TRABAJOS REALIZADOS

El día 3 de octubre se realiza visita al sitio Cabo de la Vela (Uribia – La Guajira), para realizar la instalación de telemetría, sistema de medida en baja tensión y sistema comunicación para tele medición de la planta de generación de energía instalada en la localidad mencionada.

5. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD

La planta de generación se encuentra ubicada dentro del casco urbano del corregimiento, las instalaciones están compuestas por una estructura en concreto y techo en teja de eternit.



Imagen 2 Instalación física de la planta

Equipos de generación



Imagen 3 Planta eléctrica

En la planta de generación de Cabo de la Vela se encuentran instalados 2 generadores con las siguientes especificaciones:

MARCA	MODELO	SERIE	CAPACIDAD	ESTADO
PARTNER	No se evidencia	C6MO383035	200 KVA	OPERATIVO
PERKINS	P-500	B13180D	hasta 1000 m.s.n.m	OPERATIVO

En el proceso de la instalación se realiza validación del funcionamiento del equipo.



Imagen 4 Salida de potencia del generador

En la planta de generación se encuentran instalados actualmente 2 generadores a Diesel sobre el que relacionamos las características, se adjuntan las placas:

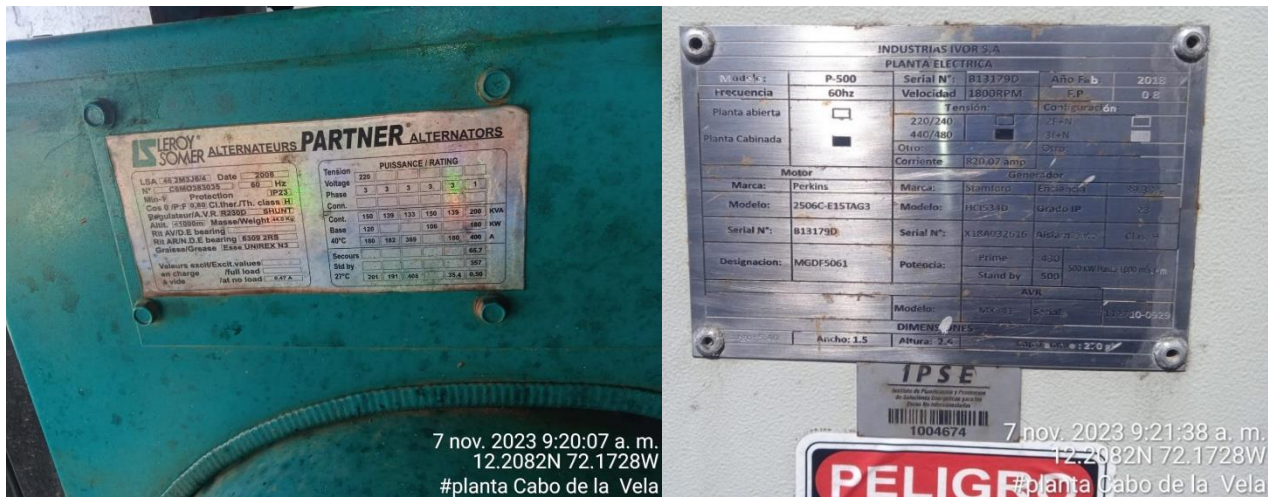


Imagen 5 Placa del generador

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el traslado de los equipos requeridos para el montaje por vía terrestre desde Bogotá hasta el municipio de Riohacha y desde allí en expreso terrestre se desplazaron hasta las instalaciones de la central de generación de Cabo de la Vela.

En el rack se instalaron los equipos de comunicaciones, medidores, transformadores de medida, estabilizador, breaker, regulador de energía.



Imagen 6 Gabinete instalado

Transformadores de Corriente CT's



Imagen 7 Placa de características de CT's

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE			
MARCA	RELACION	CLASE	SERIAL
TAC	3500/5 AMP	0,5S	2302510001
TAC	3500/5 AMP	0,5S	2302510002
TAC	3500/5 AMP	0,5S	2302510003

Instalación de Medidor

Se realizó la instalación del medidor en la pared del gabinete y se realizó el tendido de la tubería EMT que lleva las señales de los transformadores de corriente y de las comunicaciones del medidor. Se realizó el montaje del medidor marca Landis+Gyr E570 con serial 60715239 en la celda de medida con su respectivo bloque de prueba.



Imagen 8 Medidor Landis+Gyr

MEDIDOR			
MARCA	MODELO	CLASE	SERIAL
LANDIS+GYR	E570	0,5S	60715239

Instalación del Sistema de Comunicación



Imagen 9 Antena

Dentro del sistema de comunicación se instaló una antena de 0.90 m, un modem satelital, LNB. Se realiza proceso de verificación donde se ubica la antena.

Instalación Sistema Puesta a Tierra

La instalación del sistema de puesta tierra se compone por tres varillas de cobre, protección contra sobrecargas, disponiendo como lugar de instalación una zona exterior a la construcción donde se ubica la planta eléctrica.



Imagen 10 Puesta a tierra

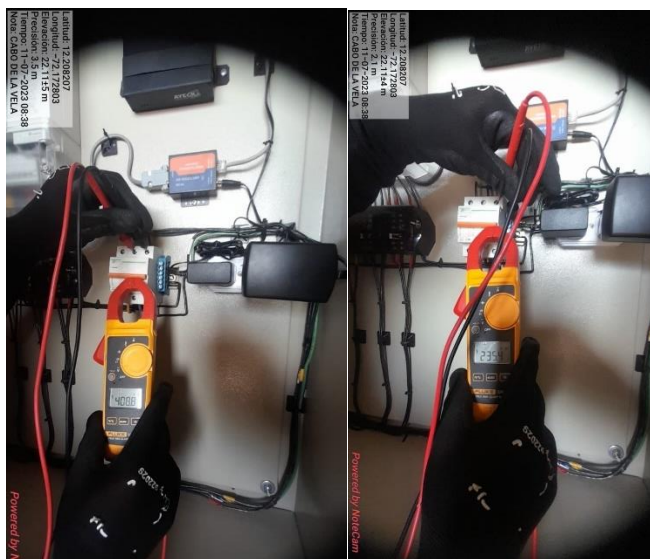


Imagen 11 Medidas Voltaje


6. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO

A continuación, se relacionan equipos instalados y en funcionamiento dentro del sistema de medición:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	ESTADO
1	Medidor de Energía	1	60715239	OK
2	Bornera de Conexión	1	N/A	OK
3	Transformador de Corriente 3500/5 BLOX	1	2302510001	OK
4	Transformador de Corriente 3500/5 BLOX	1	2302510002	OK
5	Transformador de Corriente 3500/5 BLOX	1	2302510003	OK
6	Interfaz de Comunicación	1	N/A	OK
7	Regulador de Voltaje Powest	1	N/A	OK
8	LNB	1	205505022	OK
9	Convertor Satelital	1	N/A	OK

Imagen 12 Equipos en funcionamiento

Relación de Transformación
CT: 3500/5 = 700

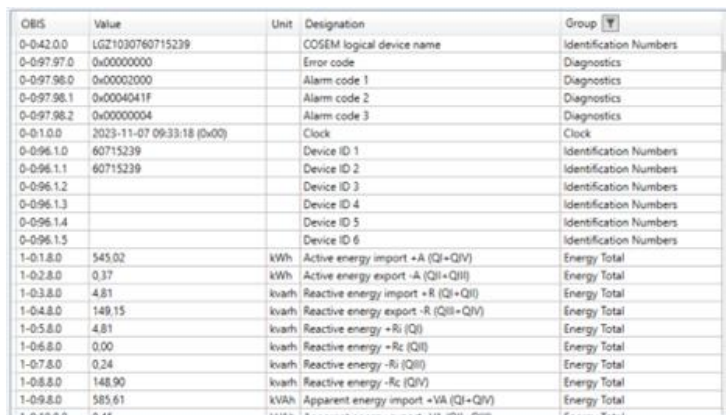

OBIS	Value	Unit	Designation	Group
0-042.0.0	LGZ1030760715239		COSEM logical device name	Identification Numbers
0-097.97.0	0x00000000		Error code	Diagnostics
0-097.98.0	0x00002000		Alarm code 1	Diagnostics
0-097.98.1	0x0004041F		Alarm code 2	Diagnostics
0-097.98.2	0x00000004		Alarm code 3	Diagnostics
0-010.0.0	2023-11-07 09:33:18 (0x00)		Clock	Clock
0-096.1.0	60715239		Device ID 1	Identification Numbers
0-096.1.1	60715239		Device ID 2	Identification Numbers
0-096.1.2			Device ID 3	Identification Numbers
0-096.1.3			Device ID 4	Identification Numbers
0-096.1.4			Device ID 5	Identification Numbers
0-096.1.5			Device ID 6	Identification Numbers
1-018.0.0	545.02	kWh	Active energy import +A (QI+QIV)	Energy Total
1-028.0.0	0.37	kWh	Active energy export -A (QII+QIV)	Energy Total
1-038.0.0	4.81	kvarh	Reactive energy import +R (QI+QII)	Energy Total
1-048.0.0	149.15	kvarh	Reactive energy export -R (QII+QIV)	Energy Total
1-058.0.0	4.81	kvarh	Reactive energy +Ri (QI)	Energy Total
1-068.0.0	0.00	kvarh	Reactive energy +Rc (QII)	Energy Total
1-078.0.0	0.24	kvarh	Reactive energy -Ri (QII)	Energy Total
1-088.0.0	148.90	kvarh	Reactive energy -Rc (QIV)	Energy Total
1-098.0.0	585.61	kVAh	Apparent energy import +VA (QI+QIV)	Energy Total

Imagen 13 Configuración del medidor

7. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACIÓN EN EL MEDIDOR

Se realiza montaje de los equipos y se procede a realizar una descarga de datos del medidor para verificar que se encuentra configurado correctamente y se obtienen datos reales.

Se puede extraer de manera remota mediante la plataforma, la información solicitada por el IPSE, en dicha prueba se puede validar las cadenas de medición, toma de datos y comunicación en conjunto.

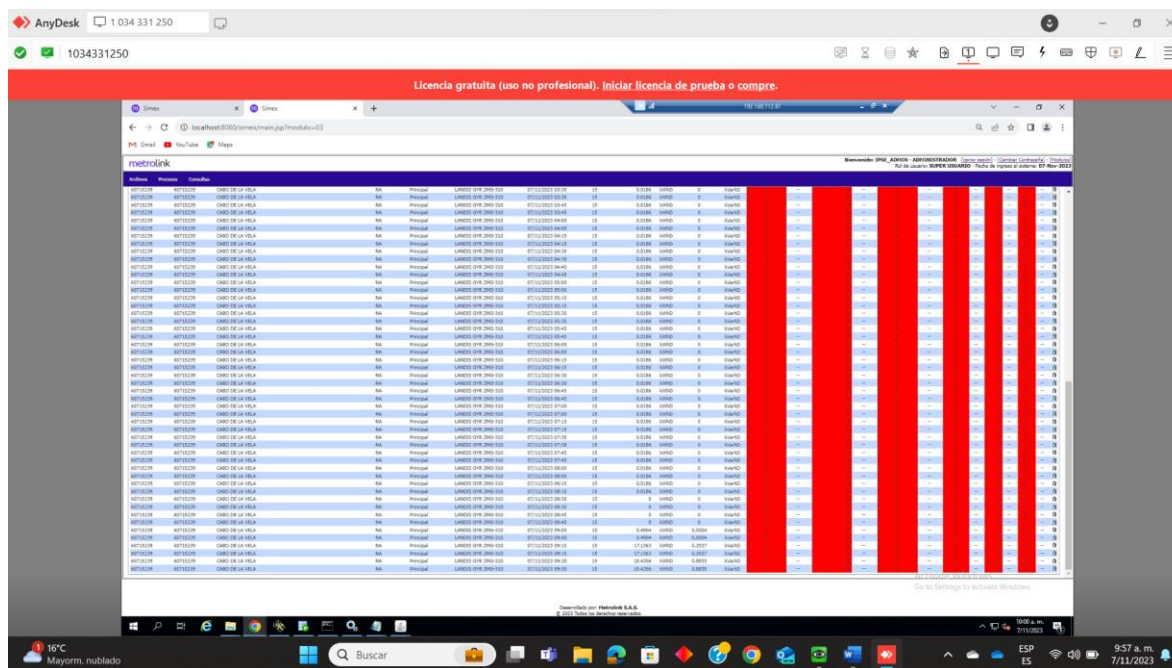


Imagen 14 Prueba de telemetría

8. SEGUIMIENTO SGSST

En la ejecución de las actividades se aplicaron las recomendaciones sugeridas por el SISO, en salud ocupacional y la prioridad del equipo de trabajo, fue garantizar la seguridad del personal de Telemetría, se contactó al operador de la planta, se le informo los trabajos que se realizarían en el sitio y los posibles riesgos que se podían presentar, se realizó la demarcación correspondiente en el sitio. El personal en sitio acato las indicaciones dadas con respecto al uso de los EPP (se adjuntan evidencias).

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de septiembre del año 2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores y la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Durante el mes de octubre del 2023, se realizó las siguientes actividades de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y ambientales asegurando inspecciones en herramientas, inspección de elementos de protección personal e inspección gerencial con el propósito de verificar las condiciones y estado actual de las herramientas, EPP y entorno locativo en donde se lleva a cabo el proyecto se realiza capacitación de higiene Postural, trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico, control de riesgo público, uso de herramientas manuales, orden y aseo, se llevaron registro de los indicadores del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza una revisión mensual de los aportes generados a cada entidad

de EPS, AFP y ARL, según validación de afiliación inicial con el fin de asegurar que se encuentren cubiertos y sin ninguna novedad.

9. Aportes Parafiscales


Con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza una revisión mensual de los aportes generados a cada entidad de EPS, AFP y ARL, según validación de afiliación inicial.

10. ANÁLISIS DE INDICADORES

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite expresar en cifras relativas las características de accidentalidad de la actividad que se desarrolló, según la tasa de accidentabilidad (0) a continuación, se evidencia el resultado.


		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE												Cód.: PRG- SST-09					
		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SSTA												Fecha de elaboración: 17/07/2023					
														Versión: 001					
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA																			
Incentivar el desarrollo de capacitaciones, campañas y charlas que permitan destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, mediante la entrega de conocimientos para promocionar la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral de manera que se contribuya al mejoramiento del sistema de gestión SST y la prestación de los servicios.																			
2. ALCANCE																			
El Programa de Capacitación, promoción y prevención SSTA aplica para todo el personal de VITACOM que se encuentre laborando en el proyecto de IPSE.																			
3. METAS																			
CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 86% de las actividades del programa de capacitación, promoción y prevención SSTA.																			
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:		Director de operaciones y Responsable SG-SSTA																	
4. CRONOGRAMA																			
FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:		Agosto a Octubre del 2023																	
ACTIVIDAD		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		%		RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES			
		III SEM	IV SEM	SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	SEM	II SEM				III SEM	IV SEM	
FASE 1. PLANEAR	Definición de objetivos y metas del programa de capacitación, promoción y prevención.	1												100%	Viga SSTA Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención			
	Establecer las necesidades de capacitación, promoción y prevención.	1												100%	Viga SSTA Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención			
FASE 2. HACER	Inducción en SSTA							1						100%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Uso y cuidado de los elementos de protección personal							1						100%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Uso de herramientas manuales								1					0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Orden y aseo								1					0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Campaña de higiene postural								1					0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Trabajo seguro en alturas									1				0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Control de riesgo eléctrico									1				0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Control de riesgo publico									1				0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Medio Ambiente										1			0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Campaña hábitos saludables en los entornos laborales											1		0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Campañas de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas											1		0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Campaña promoción de la salud mental											1		0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Como actuar en caso de una emergencia											1		0%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Como prestar un primer auxilio									1						Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia		
	Manejo de extintores									1					100%	Viga SSTA- Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia		
	FASE 3. VERIFICAR	Seguimiento a Indicadores y planes de acción establecidos en el Programa										1			0%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención		
Revisión, validación y ajuste del programa de capacitación, promoción y prevención.										1				100%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención			
FASE 4. ACTUAR	Cierre de los planes de acción, análisis de tendencias e indicadores del programa													0%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención			
P*= Programado E*= Ejecutado																			
5. RECURSOS ASIGNADOS																			
Humanos:		Personal calificado para el desarrollo del Programa (Viga SSTA, Director de operaciones y Responsable del SG-SSTA)																	
Económicos:		Disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del programa																	
Financieros:		Asignado en el presupuesto																	
Técnicos:		Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos, equipo de cómputo, uso de plataformas tecnológicas.																	
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO																			
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA																			
NOMBRE	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	VARIABLES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL	GRAFICA					
			III SEM	IV SEM	SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	SEM	II SEM	III SEM	IV SEM				SEM	II SEM	III SEM	IV SEM
FORMULA	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas) *100	Programadas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	3	2	0	2	21
		Ejecutadas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	7
		Resultado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
		Meta	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
ANÁLISIS DE DATOS																			
Septiembre: Las actividades del Programa para el mes de agosto se cumplieron en un 100% superando la meta establecida, se continuara con el seguimiento del cronograma para continuar con la tendencia actual.																			
Octubre:																			
8. PLAN DE ACCIÓN																			
HALLAZGO												RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA		FECHA DE EJECUCIÓN			
Septiembre: De acuerdo con los datos arrojados en el mes de septiembre no se requiere realizar ningún plan de acción.																			
Octubre:																			
Noviembre:																			

Imagen 15 SG-SST

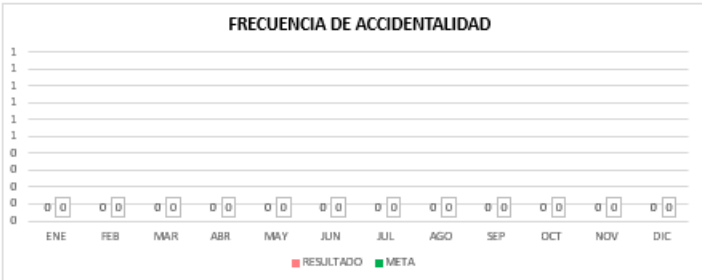	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Código: FT-SST-016	
	Formato Indicadores del SG-SSTA										Versión: 2 Vigencia: 28/04/2023	
Frecuencia de Accidentalidad												
Definición del Indicador	Nombre	Meta	Indicador (formula)						Fuente de información			
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Frecuencia de accidentalidad	0	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100						FURAT Investigaciones de accidentes de trabajo Estadísticas de accidentalidad ARL			
Tipo de indicador	Resultado		Interpretación		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes XXX, se presentaron XXX Accidentes de trabajo							
Frecuencia medición	Mensual		Personas a informar		Gerente General, Dirección Administrativa y COPASST							
Responsable:	Responsable sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente											
DATOS 2023												
Formula	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Numero de trabajadores en el mes	7	7	7	7	7	7	11	7	7			
RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENDENCIA DEL INDICADOR												
<p style="text-align: center;">FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD</p> 												

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de enero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Septiembre, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 16 Índice de frecuencia

 <p>Comunicación sin límites</p>	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Código: FT-SST-016		
	Formato Indicadores del SG-SSTA										Versión: 2		
											Vigencia: 28/04/2023		
Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante													
Definición del Indicador	Nombre	Meta	Indicador (formula)							Fuente de información			
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes con tiempo perdido	Frecuencia de accidentes de trabajo con lesión incapacitante	0	(Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z" / Número promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100							FURAT Investigaciones de accidentes de trabajo Estadísticas de accidentalidad ARL			
Tipo de indicador	Resultado		Interpretación		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes XXX, se presentaron XXX Accidentes de trabajo con lesión incapacitante								
Frecuencia medición	Mensual		Personas a informar		Gerente General, Dirección Administrativa y COPASST								
Responsable:	Responsable sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente												
DATOS 2023													
Formula	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z"	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Número promedio de trabajadores en el periodo "Z"	7	7	7	7	7	7	11	7	7				
RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENDENCIA DEL INDICADOR													
<p>Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante</p> 													

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en enero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en febrero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en marzo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en abril, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en mayo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en junio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en julio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en agosto, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en septiembre, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 17 Índice de incapacidad

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de cumplimiento	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes enero, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes febrero, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes marzo, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes abril, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes mayo, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes junio, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes julio, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes agosto, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes septiembre, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 18 Índice de severidad



Imagen 19 Personal técnico

vitacom Comunicación sin Fronteras		Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente Análisis de Trabajo Seguro (ATS)		Formulario Fecha 5/05/2023 Versión 2
CONTRATISTA: Instalación de telemita Antena Intelitel Sistema A tierra		FECHA DE ELABORACIÓN: CABO DE LA VELA		
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN:				
SIMON RODRIGUEZ ALFONSO ROSAS EDUARDO GARCIA				
ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR				
TRABAJO EN CALIENTE	☒	TRABAJO EN ALTURAS	☒	OTRO: ☐ Descripción
ACTIVIDADES CRÍTICAS: Organizar los Formatos de Permiso de Trabajo Seguro				
ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR				
PASOS (límites que se dividan el trabajo)				
<p>Se llega al sitio el 6 de noviembre 2023 se reune planta y lugar de trabajo luego se trasladan los equipos y materiales a instalar</p> <p>Se instala gabinete</p> <p>Se instala sistema a tierra</p> <p>Se instala antena</p> <p>Se instala CTS</p> <p>Se instala cable de alimentación del gabinete</p> <p>Se realizan pruebas de conexión satelital</p> <p>Se realizan pruebas de CTS y medidos de tensiones</p> <p>Se prueba en General la telemita</p> <p>Se hace Aseo General en sitio</p> <p>Se capacita personal en sitio sobre la telemita</p> <p>Se finaliza el día 7 de noviembre entregando a todos el trabajo</p>				
RIESGOS POTENCIALES				
<p>1. Exposición a ruido</p> <p>2. Iluminación inadecuada</p> <p>3. Contacto superficies calientes</p> <p>4. Deficiencias de ventilación</p> <p>5. Exposición a vibraciones</p> <p>6. Proyección de partículas y fragmentos</p> <p>7. Mecanismos en movimiento</p> <p>8. Manejo de herramientas</p> <p>9. Caídas de alturas</p> <p>10. Exposición en espacios confinados</p> <p>11. Levantamiento de cargas</p> <p>12. Caída de objetos</p> <p>13. Atrapamientos por debajo o entre objetos</p> <p>14. Contacto directo y/o indirecto con electricidad</p> <p>15. Instalaciones eléctricas en mal estado</p> <p>16. Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas</p> <p>17. Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas</p> <p>18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas</p> <p>19. Explosión y/o incendios</p> <p>20. Emisión de gases explosivos</p> <p>21. Exposición a vectores transmisores de enfermedades</p> <p>22. Contaminación biológica</p> <p>23. Movimientos repetitivos</p> <p>24. Posturas inadecuadas de trabajo</p> <p>25. Exposición a vibraciones</p> <p>26. Accidente o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial</p> <p>27. Movimiento de equipo pesado en el sitio de trabajo</p> <p>28. Colisión y volcamiento de vehículos</p> <p>29. Atropellamientos de personas</p> <p>30. Superficies resacas, irregulares, húmedas u obstruidas</p> <p>31. Techos, muros, pisos o paredes en mal estado</p> <p>32. Derames</p> <p>33. Espectro reducido de trabajo</p> <p>34. Probabilidad de Lluvia</p> <p>35. Caídas del mismo nivel</p> <p>36. Otros</p>				
ACCIONES DE CONTROL				
<p>1. Delimitar y señalizar el área de trabajo</p> <p>2. Solicitar permisos de trabajo</p> <p>3. Disponer de elementos de protección personal EPP</p> <p>4. Efectuar conexión a tierra de equipos</p> <p>5. Equipos y herramientas en buen estado</p> <p>6. Realizar corte de ruidos</p> <p>7. Realizar medición de la concentración de gases en el área</p> <p>8. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos</p> <p>9. Disponer pantallas protectoras</p> <p>10. Inspeccionar áreas adyacentes</p> <p>11. Disponer de sistemas de comunicación</p> <p>12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo</p> <p>13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro</p> <p>14. Prevenir y/o contener derrames</p> <p>15. Implementar ventilación mecánica permanente</p> <p>16. Disponer un vigía en el estator</p> <p>17. Humedecer con agua el área</p> <p>18. Separar y disponer residuos líquidos</p> <p>19. Cubrimientos de maderas</p> <p>20. Adecuada disposición de residuos</p> <p>21. Equipos de protección caldos adecuados para labor específica</p> <p>22. Uso de desinfectantes para equipos</p> <p>23. Disponer de sistemas de comunicación</p> <p>24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas</p> <p>25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS</p> <p>26. Identificación de los productos químicos</p> <p>27. Almacenamiento correcto de materiales</p> <p>28. Disponer de equipos de extinción del fuego</p> <p>29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb</p> <p>30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras</p> <p>31. Empleo de sistemas de acceso como andamios</p> <p>32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas</p> <p>33. Otros</p>				
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD				
Extintores	☐	Kit para derrames	☐	Escalera tipo tijera
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores
Boliquín y Camilla	☒	Grúas con cadena	☐	Otros
FIRMAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ATS				
Nombre	Registro-CC	Fecha		
SIMON RODRIGUEZ	79211720	5/05/2023		
APROBACIÓN				
Nombre	Registro-CC	Fecha		

Imagen 20 Inspección de trabajo seguro

11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL

Durante la instalación en la localidad de Cabo de la Vela no se generaron residuos peligrosos que deban ser tratados, los residuos corresponden a empaques de cartón y plástico en los que se transportaron los equipos fueron llevados al punto donde la comunidad tiene el reciclaje.

12. PERSONAL TECNICO

Jesús Eduardo Cárdenas
Técnico Comunicaciones

Luis Alfonso Rojas
Contratista Eléctrico

Simón Rodríguez
Técnico Comunicaciones

13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES

En el proceso de instalación no se presentó ninguna novedad, los procedimientos se realizan acorde a lo programado, se realizan pruebas desde la plataforma de Telemetría con resultados exitosos.

14. CONCLUSIONES

- Se logra documentar todo lo referente al sistema de alimentación eléctrica de la sede.
- Durante la instalación de los equipos se realizan verificaciones del estado de funcionamiento óptimo de los equipos instalados en sitio y el nuevo capex a instalar.
- Se instala gabinete de medida y sistema de puesta a tierra, acorde a normatividad vigente. De igual manera sistema de comunicación, se hacen pruebas con el NOC vía remota para las lecturas de telemetría.
- No se presenta incidentes ni accidentes durante la ejecución de las actividades.

15. DOCUMENTACIÓN

	FICHA TECNICA DE EQUIPOS	Código	Página
		IPSE-GI-F10	1/1
		Fecha	

EQUIPO: MEDIDOR DE ENERGIA							
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN							
LOCALIDAD	CABO DE LA VELA		CIRCUITO				
FECHA:	Noviembre 7 del 2023						
REGISTRO FOTOGRAFICO							
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS							
MARCA	MODELO/TIPO	TIPO DE ENERGIA QUE MIDE				NÚMERO DE SERIE	
Landys Gyr	E 570	ACTIVA	X	REACTIVA	X	60715239	
CALSE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	CONEXIÓN	2- FRECUENCIA	AÑO DE FABRICACION		
(22) Cl.0.5s (23) Cl.2	3x58/100 - 277/480 V	1 (10) A	ELEM. 3- ELEM		2023		
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN							
DIMENSIONES:	ALTO	25,5 cm	ANCHO	17,5 cm	PROFUNDIDAD	7,5 cm	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN			HUMEDAD:				
- 40° / 70° C.							
BATERIA			PUERTOS DE SALIDA				
			RS-232	X	PULSOS		
CALIBRACION		No.	LABORATORIO				
ESTADO INICIAL							
BUENO	X	REGULAR		MALO			
ESTADO FINAL DEL EQUIPO. Excelente estado							
VIDA UTIL ESTIMADA							
OBSERVACIONES:							
EJECUTADO POR. Alfonso Rojas R. 							

Imagen 21 Ficha técnica de Equipos medidor de energía

	FICHA TECNICA DE EQUIPOS	Código	Página
		IPSE-GI-F10	1/1
		Fecha	

EQUIPO: TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE			
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN			
LOCALIDAD	CABO DE LA VELA	CIRCUITO	
FECHA:	Noviembre 7 del 2023		
REGISTRO FOTOGRAFICO			
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS			
MARCA Blox	MODELO/TIPO HS - 600	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 3500/5A	POTENCIA NOMINAL 5 VA
TENSIÓN MÁXIMA	TIPO DE USO INTERIOR EXTERIOR	NUMERO DE SERIE (2302510002) (2302510001) (2302510003)	CLASE DE EXACTITUD 0,5 S
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN			
DIMENSIONES:	ALTO	25,5 cm	ANCHO 25,5 cm PROFUNDIDAD 7,5 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: - 5° / 40° C.		HUMEDAD:	
PESO:		FRECUENCIA: 60 HZ.	
CALIBRACION	No.	LABORATORIO	
ESTADO INICIAL			
BUENO	☒	REGULAR	☐
MALO ☐			
ESTADO FINAL DEL EQUIPO. Excelente estado			
VIDA UTIL ESTIMADA			
OBSERVACIONES:			
EJECUTADO POR. Alfonso Rojas R 			

Imagen 22 Ficha técnica de Equipos transformador de medida

	FICHA TECNICA DE EQUIPOS	Código	Página
		IPSE-GI-F10	1/1
		Fecha	04/01/2011

EQUIPO: INTERFAZ DE COMUNICACIONES					
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN					
LOCALIDAD	CABO DE LA VELA	CIRCUITO			
FECHA:	Noviembre 7 del 2023				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS					
MARCA	MODELO/TIPO	PUERTOS DE SALIDA	NUMERO DE SERIE		
PUSR	USR - TCP 232 - 302	Ethernet			
CALSE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	FRECUENCIA	AÑO DE FABRICACION	
	100 - 240 V	1 A	50 / 60 Hz		
FUENTE	TIPO				
SERIAL	VOLTAJE	CORRIENTE			
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN					
DIMENSIONES:	ALTO	5 cm	ANCHO	6,5 cm	PROFUNDIDAD
					2,5 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		HUMEDAD:			
CALIBRACION		No.	LABORATORIO		
ESTADO INICIAL					
BUENO	☒	REGULAR	☐	MALO	☐
ESTADO FINAL DEL EQUIPO. Excelente estado					
VIDA UTIL ESTIMADA					
OBSERVACIONES:					
EJECUTADO POR. Alfonso Rojas R 					

Imagen 23 Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones

	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA	Código	Página
		IPSE-GI-F11	1/1
		Fecha	7-11-2023

HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

TIPO DE INSTRUMENTO:

MEDIDOR DE ENERGÍA



TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE



TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE TENSIÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MEDIDORES DE ENERGÍA

MARCA	MODELO/TIPO	TIPO DE ENERGÍA QUE MIDE	CONSTANTE E. ACTIVA	CONSTANTE E. REACTIVA
LANDYS Gyr	E 570	ACTIVA ☒ REACTIVA ☒	10000	10000
CALSE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	TIPO (No De fases e hilos)	NUMERO DE SERIE
(22) Cl 0,5s (23) Cl 2	3x58/100 - 277/480 V	1 (10) A	3 Fases 4 Hilos	60715239

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE CORRIENTE

MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL
Blox	HS - 600	3500/5A	5 VA
I. TÉRMICA (kA)	I. DINÁMICA	NUMERO DE SERIE	CLASE DE EXACTITUD
		(2302510002) (2302510001) (2302510003)	0,5 S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN

MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL
PUSR	USR - TCP 232 - 302		
TENSIÓN MÁXIMA	TIPO DE USO	NUMERO DE SERIE	CLASE DE EXACTITUD
	INTERIOR ☒ EXTERIOR		

ITEM	REGISTRO DE UBICACIONES DEL INSTRUMENTO	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE RETIRO
1	CABO DE LA VELA	4-11-2023	

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN EN SITIO	DOCUMENTO (INFORME DE CALIBRACIÓN)	PROVEEDOR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO (INFORME DE MANTENIMIENTO)	PROVEEDOR

Imagen 24 Hoja de vida de equipos

	ACTA DE INSPECCION Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA				Código	Página
					IPSE-GI-F12	1/2
					FECHA	
				7-11-2023		
MANTENIMIENTO:						
LOCALIDAD: CABO DE LA VELA		Localización geográfica 12.195475, -72.147218		FECHA: 7-11-23	HORA DE INICIO:	INFORME No.
NIVEL DE TENSION 240/440		MEDIDA EN: 2 ELEMENTOS 3 ELEMENTOS		TIPO DE MEDIDA: INTERIOR EXTERIOR	HORA FIN	tipo de comunicacion
						satelital gprs
ACTIVIDADES REALIZADAS						
ITEM	DESCRIPCION					
1	Inspección planta					
2	Traslado equipos y herramientas					
3	Implementación sistema de puesta a tierra					
4	Instalación antena satelital					
5	Ubicación gabinete de telemetría					
6	Intervención cables de red eléctrica y ubicación cts					
7	Pruebas de apuntamiento satelital					
8	Pruebas de telemetría					
9	Entrega Bitio operativo					
EQUIPOS ENCONTRADOS*						
MEDIDOR		LECTURA		HORA:		
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
TRANSFORMADOR DE MEDIDA						
MARCA		MODELO		SERIE		RELACION
OBSERVACIONES						
INTERFAZ DE COMUNICACIONES						
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
OTROS						
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
EQUIPOS INSTALADOS*						
MEDIDOR		LECTURA		HORA:		
MARCA Landis		MODELO E 570		SERIE 60715239		TIPO
OBSERVACIONES						
TRANSFORMADOR DE MEDIDA						
MARCA Blox		MODELO HS - 600		SERIE 2302510002		RELACION 3500/5A
OBSERVACIONES						
MARCA Blox		MODELO HS - 600		SERIE 2302510001		RELACION 3500/5A
OBSERVACIONES						
MARCA Blox		MODELO HS - 600		SERIE 2302510003		RELACION 3500/5A
OBSERVACIONES						
INTERFAZ DE COMUNICACIONES						
MARCA PUSR		MODELO USR - TCP 232 - 302		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
OTROS						
MARCA		MODELO		SERIE		TIPO
OBSERVACIONES						
OBSERVACIONES GENERALES						
EJECUTADO POR Alfonso Rojas R						
REVISADO POR						

* Se amplía estos campos de acuerdo a los equipos encontrados o instalados.

Imagen 25 Acta de instalación equipos de telemetría 1



	ACTA DE INSPECCION Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA		Código	Página	
			IPSE-GI-F12	1/2	
			FECHA		
		7-11-2023			
DATOS DE TRABAJADORES					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ESTADO DE SALUD	HORAS TRABAJADAS	FIRMA
Kamod Corderos	1124036849	Técnico	Satisfactorio	15	
Jesé A Espieyru	1006918733	Auxiliar	Satisfactorio	15	
CHARLA DE CAPACITACION					
TEMA: Instalacion sistema telemetria satelital.					
EXPOSITOR: Alfonso Rojas R					
MINUTOS: 15					
LOS ARRIBA FIRMANTES CERTIFICAMOS QUE HEMOS RECIBIDO LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DESCRITO Y QUE ENTENDEMOS LOS RIESGOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS					
ASPECTOS HSEQ					
ACCIDENTES: Ninguno					
INCAPACIDADES: Ninguna					
INCIDENTES: Ninguno					
DESCRIPCION:					
ASPECTOS AMBIENTALES					
MANEJO DE RESIDUOS se le hace entrega a la comunidad para que dispongan de ellos segun manejo local.					
OTROS ASPECTOS AMBIENTALES					
OBSERVACIONES GENERALES					
En sitio se encuentran 3 plantas electricas, dos de 500 KW y una de 200 KW, la cual esta presentando recalentamiento y una de las plantas de 500 KW se encuentra fuera de servicio.					
ELABORO:		REVISOR:		OPERADOR/USUARIO:	
Alfonso Rojas R				Kamod Corderos Pico	
NOMBRE: 		NOMBRE		NOMBRE: 	
FIRMA		FIRMA		FIRMA: 1124036849	

Imagen 26 Acta de instalación equipos de telemetría 2

vitacom
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 800.250.325-2

Cra. 7 No. 156 - 80 OF: 1302 México, D.F. + (55) 5694 4304
PBX: 745 2741
Bogotá, D.C. - Colombia
www.vitacom.com.co

ORDEN DE SERVICIO

No. de Servicio	
Cliente	Contacto Local
IPSE	RAMED CARDENAS RICO 3116976325
Sitio	Teléfono y Ext.
CABO DE LA VELA	3146356210
Fecha y Hora de Llegada	Fecha y Hora de Salida
6-11-23 14:00	6-11-23
Hóras Laboradas	
15 HORAS	
Propósito del Viaje	
INSTALACION SISTEMA DE TELEMETRIA	
Resultado de las Pruebas y Observaciones	
<p>- SE IBERA AL SITIO Y SE ENCUENTRAN 3 PLANTAS PARA LA ZONA, EN LA CUAL UNA ESTA DERRAMADA POR LA TARGETA DE CONTROL</p> <p>- SE INSTALA LOS CTS A LA SPIDA DESPUES DE LA TRANSFERENCIA PRINCIPAL, POR ORDEN DEL ING JTIOP DE IPSE</p> <p>- SE INSTALA GABINETE, ANTENA Y EL SISTEMA A TIERRAS DOBLE SE CORRECTO UNA PLANTA QUE NO TENIA PROTECCION QUERANDO TODO UNIFICADO</p> <p>- SE DEJAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS CORRECTADOS</p> <p>Medidor 60715239</p> <p>CONVERSOR 04AD205B968E</p> <p>CT1 2302510003</p> <p>CT2 2302510002</p>	
Status:	Observaciones:
Terminado ☒	Pendiente: ☐
Equipos Retirados	
No. ARM	No. Tracking
No. Parte	No. Serie
CT3 2302510001	
ODU 205505022	
IDU ADO4500003107	
ANTENA SATURNAL DE 0.90 CMs CON SUS ACCESORIOS Y HERRAJES	
Equipos Instalados	
NOTA: HAY 3 PLANTAS EN SITIO SOLO FUNCIONAN 2 UNA DE 500V Y OTRA DE 200 WATTS	
ESTA PRESENTANDO FALLA DE RECALENTAMIENTO LA DE 200W	
HAY UNA DE 500W QUE ESTA FUERA DE SERVICIO X LA TARGETA DE CONTROL	
Tipo de Servicio	Cargo al Cliente
Garantía ☐	Contrato de Mantenimiento ☐
Representante de VITACOM (nombre y firma)	
Representante del Cliente (nombre y firma)	
SIMON RODRIGUEZ 79241955 BJA	

Original NOC - Copia azul CLIENTE

Imagen 27 Orden de servicio

Nombre Contacto	Teléfono
Ramed Cardenas	3116976325 3146356210

16. Diagrama Unifilar

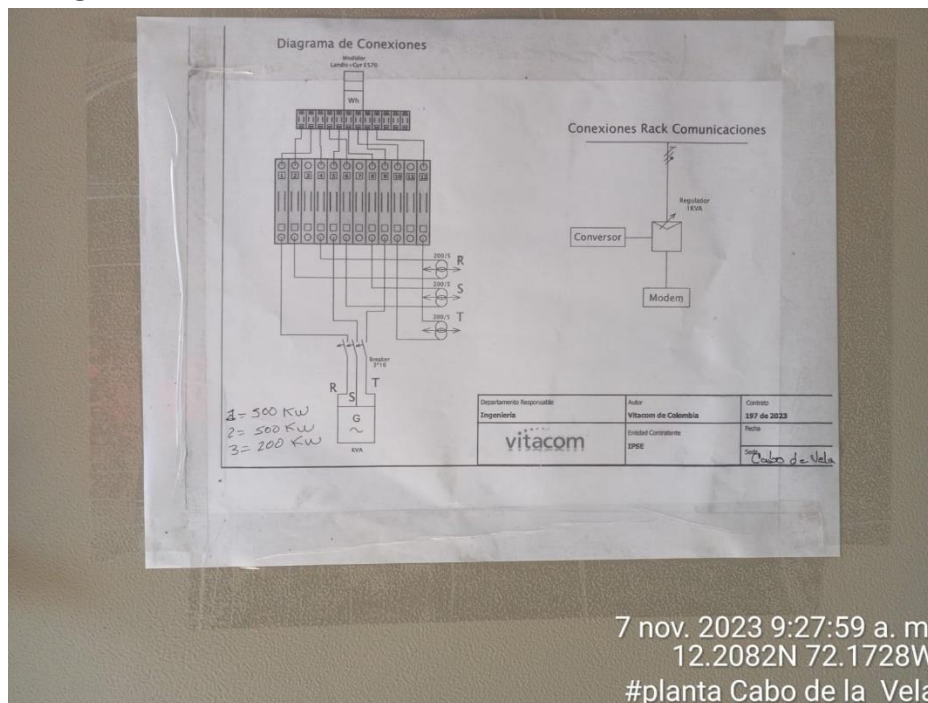


Imagen 28 Diagrama Cabo de la Vela


DOCUMENTACION ADJUNTA

CERTIFICADO MEDIDOR
FICHA TECNICA MEDIDOR
CERTIFICADO CTS
FICHA TECNICA CTS
REGISTRO FOTOGRAFICO

Yimmy Londoño

Yimmy Londoño

Ingeniero Eléctrico



José Buitrago Gasca
Coordinador de Proyecto
