



REPORTE DE SERVICIOS INSTALADOS CONTRATO 197-2023



VITACOM DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 156-80. Bogotá, Colombia
PBX: (+57) 1 7452741

Octubre 24 de 2023

REPORTE DE SERVICIOS INSTALADOS CONTRATO 197-2023

INFORME DE VISITA DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 197 DE 2023

Tabla de Contenido

OBJETIVOS.....	5
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	6
2. METODOLOGÍA APLICADA.....	6
3. EQUIPOS UTILIZADOS	7
4. TRABAJOS REALIZADOS.....	7
5. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD.....	7
Equipos de generación	8
ACTIVIDADES REALIZADAS	9
Transformadores de Corriente CT's.....	10
Instalación de Medidor.....	11
Instalación del Sistema de Comunicación.....	11
Instalación de Sistema Puesta a Tierra	12
6. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO.....	12
7. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACIÓN EN EL MEDIDOR.....	13
8. SEGUIMIENTO SGSST	14
9. Aportes Parafiscales.....	14
10. ANÁLISIS DE INDICADORES.....	14
11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL.....	23
12. PERSONAL TÉCNICO	23
13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES.....	23
14. CONCLUSIONES.....	23
15. DOCUMENTACIÓN	24
16. Diagrama Unifilar	31
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	31

Índice Imágenes

Imagen 1 Ubicación geográfica Juntas de Tamana	6
Imagen 2 Instalación física de la planta	8
Imagen 3 Planta eléctrica	8
Imagen 4 Salida de potencia del generador	9
Imagen 5 Placa del generador	9
Imagen 6 Gabinete instalado	10
Imagen 7 Placa de características de CT's	10
Imagen 8 Medidor Landis+Gyr	11
Imagen 9 Antena	11
Imagen 10 Puesta a tierra	12
Imagen 11 Medidas Voltaje	12
Imagen 12 Equipos en funcionamiento	12
Imagen 13 Configuración del medidor	13
Imagen 14 Prueba de telemetría	13
Imagen 15 SG-SST	15
Imagen 16 Índice de frecuencia	17
Imagen 17 Índice de incapacidad	19
Imagen 18 Índice de severidad	21
Imagen 19 Personal técnico	21
Imagen 20 Inspección de trabajo seguro	22
Imagen 21 Ficha técnica de Equipos medidor de energía	24
Imagen 22 Ficha técnica de Equipos transformador de medida	25
Imagen 23 Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones	26
Imagen 24 Hoja de vida de equipos	27
Imagen 25 Acta de instalación equipos de telemetría 1	28
Imagen 26 Acta de instalación equipos de telemetría 2	29
Imagen 27 Orden de servicio	30
Imagen 28 Diagrama Juntas de Tamana	31

OBJETIVOS

- A. Cumplir con lo estipulado en el contrato 197 de 2023, referente la instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema de medición de energía eléctrica en la localidad de Juntas de Tamana.
- B. Realizar visita al municipio de Juntas de Tamana departamento de Chocó para realizar instalación del sistema de telemetría para los consumos de energía en la planta de generación de la localidad.
- C. Realizar gestión necesaria para ejecutar el trabajo de instalación en la localidad de Juntas de Tamana departamento de Chocó dando cumplimiento con el RETIE, normas NTC e IPSE.
- D. Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos instalados con las pruebas necesarias y así mismo tomar evidencias de los equipos en sitio.
- E. Realizar cumplimiento del SG-SSTA, acatando recomendaciones e instrucciones de IPSE.
- F. Diligenciar documentación y cumplir a cabalidad todas las recomendaciones para la ejecución de las actividades en sitio, dadas por la entidad.
- G. Plasmar fallas e inconvenientes encontrados durante la ejecución en el presente informe.

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Juntas de Tamana es una localidad al sur de Chocó dentro del municipio de Novita.

Descripción

JUNTAS DE TAMANA

Nombre

4.950221,-76.488668



Imagen 1 Ubicación geográfica Juntas de Tamana

2. METODOLOGÍA APLICADA

Durante la actividad para realizar la instalación en la localidad se tienen en consideración los siguientes aspectos:

- Se realiza revisión del estado físico del sitio para diagnosticar las obras requeridas para ejecutar el montaje de los equipos.
- Se realiza verificación del estado de los cables y ductería, con el fin de garantizar la instalación sin que se presente ningún inconveniente.
- Se realiza el componente ambiental considerando que las zonas presentan condiciones ambientalmente adversas, para determinar que los materiales implementados sean acordes a las conexiones del sitio y soporten el impacto ambiental.

- Se revisa el funcionamiento y pruebas de los equipos, se confirma que los equipos quedan instalados de forma correcta funcionando de manera óptima.
- Se realizan pruebas de funcionamiento mediante software verificando la información y el funcionamiento de los medidores.
- Se realiza validación de medidas, seriales y conexiones del sistema de medida para verificar la información obtenida.

3. EQUIPOS UTILIZADOS

- Computador portátil con Software de Programación y lectura
- Ponchadora de cable eléctrico
- Ponchadora de cable de datos
- Pinza voltiamperimétrica
- Multímetro

4. TRABAJOS REALIZADOS

El día 23 de octubre se realiza visita al sitio Juntas de Tamana (Novita – Chocó), para realizar la instalación de telemetría, sistema de medida en baja tensión y sistema de comunicación para tele medición de la planta de generación de energía instalada en la localidad mencionada.

5. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD

La planta de generación se encuentra ubicada dentro del casco urbano del corregimiento, las instalaciones están compuestas por una estructura en madera y techo en teja de fibrocemento.



Imagen 2 Instalación física de la planta

Equipos de generación



Imagen 3 Planta eléctrica

En la planta de generación de Juntas de Tamana se encuentra instalado un generador con las siguientes especificaciones:

MARCA	MODELO	SERIE	CAPACIDAD	ESTADO
PERKINS	D82435-4759	U7890670	N/A	OPERATIVO

En el proceso de la instalación se realiza validación del funcionamiento del equipo.



Imagen 4 Salida de potencia del generador

En la planta de generación se encuentra instalado actualmente 1 generador a Diesel sobre el que relacionamos las características, se adjuntan las placas:



Imagen 5 Placa del generador

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el traslado de los equipos requeridos para el montaje por vía terrestre desde Bogotá hasta el municipio de Quibdó y desde allí en lancha se desplazaron hasta las instalaciones de la central de generación de Juntas de Tamana.

En el rack se instalaron los equipos de comunicaciones, medidores, transformadores de medida, estabilizador, breaker, regulador de energía.



Imagen 6 Gabinete instalado

Transformadores de Corriente CT's

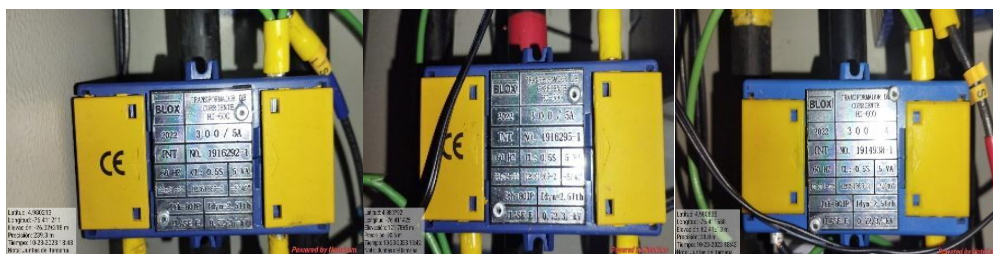


Imagen 7 Placa de características de CT's

MARCA	MODELO	RELACION	CLASE	SERIAL
BLOX	HS600	300/5 AMP	0,5S	1916292-1
BLOX	HS600	300/5 AMP	0,5S	1916295-1
BLOX	HS600	300/5 AMP	0,5S	1914938-1

Instalación de Medidor

Se realizó la instalación del medidor en la pared del gabinete y se realizó el tendido de la tubería EMT que lleva las señales de los transformadores de corriente y de las comunicaciones del medidor. Se realizó el montaje del medidor marca Landys Gyr E570 con serial 60715287 en la celda de medida con su respectivo bloque de prueba.

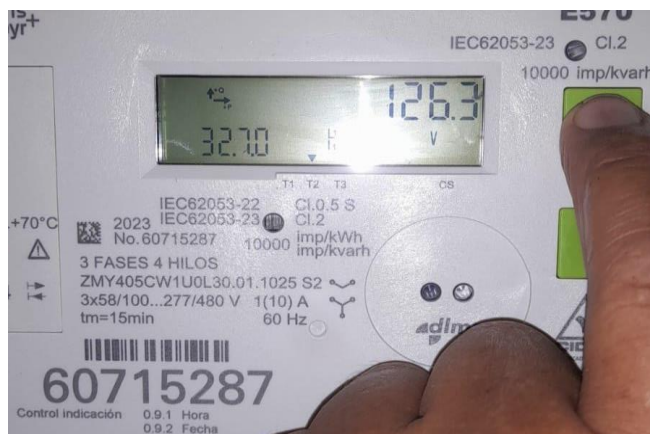


Imagen 8 Medidor Landis + Gyr

MEDIDOR			
MARCA	MODELO	CLASE	SERIAL
LANDIS + GYR	E570	0,5S	60715287

Instalación del Sistema de Comunicación



Imagen 9 Antena

Dentro del sistema de comunicación se instaló una antena de 0.90 m, un modem satelital, LNB. Se realiza proceso de verificación donde se ubica la antena.

Instalación de Sistema Puesta a Tierra

La instalación del sistema de puesta tierra se compone por tres varillas de cobre, protección contra sobrecargas, disponiendo como lugar de instalación una zona exterior a la construcción donde se ubica la planta eléctrica.



Imagen 10 Puesta a tierra



Imagen 11 Medidas Voltaje

6. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO

A continuación, se relacionan equipos instalados y en funcionamiento dentro del sistema de medición:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	ESTADO
1	Medidor de Energía	1	60715287	OK
2	Bornera de Conexión	1	N/A	OK
3	Transformador de Corriente 300/5 BLOX	1	1916292-1	OK
4	Transformador de Corriente 300/5 BLOX	1	1916295-1	OK
5	Transformador de Corriente 300/5 BLOX	1	1914938-1	OK
6	Interfaz de Comunicación	1	N/A	OK
7	Regulador de Voltaje Powest	1	N/A	OK
8	LNB	1	205504979	OK
9	Convertor Satelital	1	N/A	OK

Imagen 12 Equipos en funcionamiento

Relación de Transformación
CT: 300/5 = 60

LGZ1030760715287 - Meter Values - 23/10/2023 6:38 p. m.

Search Scale kWh, kvarh, kVAh

OBIS	Value	Unit	Designation	Group
0-0:42.0.0	LGZ1030760715287		COSEM logical device name	Identification Numbers
0-0:97.97.0	0x00000000		Error code	Diagnostics
0-0:97.98.0	0x00002000		Alarm code 1	Diagnostics
0-0:97.98.1	0x0004041F		Alarm code 2	Diagnostics
0-0:97.98.2	0x00000004		Alarm code 3	Diagnostics
0-0:1.0.0	2023-10-23 18:37:09 (0x00)		Clock	Clock
0-0:96.1.0	60715287		Device ID 1	Identification Numbers
0-0:96.1.1	60715287		Device ID 2	Identification Numbers
0-0:96.1.2			Device ID 3	Identification Numbers
0-0:96.1.3			Device ID 4	Identification Numbers
0-0:96.1.4			Device ID 5	Identification Numbers
0-0:96.1.5			Device ID 6	Identification Numbers
1-0:1.8.0	18,67	kWh	Active energy import +A (QI+QIV)	Energy Total
1-0:2.8.0	0,00	kWh	Active energy export -A (QII+QIII)	Energy Total
1-0:3.8.0	5,78	kvarh	Reactive energy import +R (QI+QII)	Energy Total
1-0:4.8.0	0,00	kvarh	Reactive energy export -R (QIII+QIV)	Energy Total
1-0:5.8.0	5,78	kvarh	Reactive energy +Ri (QI)	Energy Total
1-0:6.8.0	0,00	kvarh	Reactive energy +Rc (QII)	Energy Total
1-0:7.8.0	0,00	kvarh	Reactive energy -Ri (QIII)	Energy Total
1-0:8.8.0	0,00	kvarh	Reactive energy -Rc (QIV)	Energy Total
1-0:9.8.0	19,56	kVAh	Apparent energy import +VA (QI+QIV)	Energy Total
1-0:10.8.0	0,00	kVAh	Apparent energy export -VA (QII+QIII)	Energy Total
1-0:15.8.0	18,66	kWh	Active energy A (QI+QII+QIII+QIV)	Energy Total
1-0:16.8.0	18,66	kWh	Active energy A (QI+QIV-QII-QIII)	Energy Total
1-0:21.8.0	5,97	kWh	Active energy import +A (QI+QIV) L1	Energy Total
1-0:22.8.0	0,00	kWh	Active energy export -A (QII+QIII) L1	Energy Total
1-0:23.8.0	1,48	kvarh	Reactive energy import +R (QI+QII) L1	Energy Total
1-0:24.8.0	0,00	kvarh	Reactive energy export -R (QIII+QIV) L1	Energy Total

Imagen 13 Configuración del medidor

7. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACIÓN EN EL MEDIDOR

Se realiza montaje de los equipos y se procede a realizar una descarga de datos del medidor para verificar que se encuentra configurado correctamente y se obtienen datos reales.

Se puede extraer de manera remota mediante la plataforma, la información solicitada por el IPSE, en dicha prueba se puede validar las cadenas de medición, toma de datos y comunicación en conjunto.

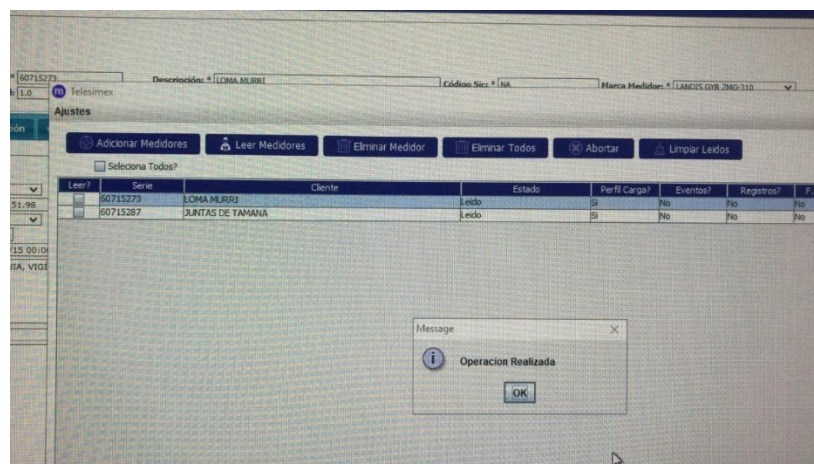


Imagen 14 Prueba de telemetría

8. SEGUIMIENTO SGSST

En la ejecución de las actividades se aplicaron las recomendaciones sugeridas por el SISO, en salud ocupacional y la prioridad del equipo de trabajo, fue garantizar la seguridad del personal de Telemetría, se contactó al operador de la planta, se le informó los trabajos que se realizarían en el sitio y los posibles riesgos que se podrían presentar, se realizó la demarcación correspondiente en el sitio. El personal en sitio acató las indicaciones dadas con respecto al uso de los EPP (se adjuntan evidencias).

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de septiembre del año 2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores y la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Durante el mes de octubre del 2023, se realizó planificación de las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto, se realiza inducción y re inducción en donde se le explica la misión, la visión, valores corporativos, políticas, objetivos, responsabilidades, generalidades SSTA, que hacer en caso de un accidentes de trabajo, peligros y riesgos, plan de emergencias, mecanismos de participación y consulta para los trabajadores involucrados que participaran en la ejecución de las actividades del proyecto, se dan indicaciones de las actividades que se deben ejecutar como las capacitaciones, campañas e inspecciones para la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, se llevaron registro de los indicadores del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, se programaron los exámenes médicos ocupacionales para el personal nuevo y se realizó la firma de contratos, con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza una revisión mensual de los aportes generados a cada entidad de EPS, AFP y ARL, según validación de afiliación inicial con el fin de asegurar que se encuentren cubiertos y sin ninguna novedad.

9. Aportes Parafiscales


Con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza una revisión mensual de los aportes generados a cada entidad de EPS, AFP y ARL, según validación de afiliación inicial.

10. ANÁLISIS DE INDICADORES

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite expresar en cifras relativas las características de accidentalidad de la actividad que se desarrolló, según la tasa de accidentabilidad (0) a continuación, se evidencia el resultado.

		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE												Cód.: PRG- SST-09						
		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SSTA												Fecha de elaboración: 17/07/2023						
														Versión: 001						
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA																				
Incentivar el desarrollo de capacitaciones,campañas y charlas que permitan destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, mediante la entrega de conocimientos para promover la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral de manera que se contribuya al mejoramiento del sistema de gestión SST y la prestación de los servicios.																				
2. ALCANCE																				
El Programa de Capacitación, promoción y prevención SSTA aplica para todo el personal de VITACOM que se encuentre laborando en el proyecto de IPSE.																				
3. METAS																				
CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 95% de las actividades del programa de capacitación, promoción y prevención SSTA.																				
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:		Director de operaciones y Responsable SG-SSTA																		
4. CRONOGRAMA																				
FECHA PLANEADE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:		Agosto a octubre del 2023																		
ACTIVIDAD		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		%		RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES				
		III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM				CUMPLIMIENTO Actividad / Paso			
FASE 1. PLANEAR	Definición de objetivos y metas del programa de capacitación, promoción y prevención.	1												100%	Viga SSTA Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención				
	Establecer las necesidades de capacitación, promoción y prevención.	1												100%	Viga SSTA Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención				
	Inducción en SSTA							1						100%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
FASE 2. HACER	Uso y cuidado de los elementos de protección personal							1						100%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Uso de herramientas manuales								1					0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Orden y aseo								1					0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Campaña de higiene postural								1					0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Trabajo seguro en alturas									1				0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Control de riesgo eléctrico									1				0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Control de riesgo público										1			0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Medio Ambiente										1			0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Campaña hábitos saludables en los entornos laborales											1		0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Campañas de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas											1		0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Campaña promoción de la salud mental											1		0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Como actuar en caso de una emergencia											1		0%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
	Como prestar un primer auxilio									1						Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia			
	Manejo de extintores									1				100%	Viga SSTA Trabajadores Director de operaciones Responsable del SG-SSTA	Registro de Asistencia				
FASE 3. VERIFICAR	Seguimiento a indicadores y planes de acción establecidos en el Programa									1			1	0%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención				
	Revisión, validación y ajuste del programa de capacitación, promoción y prevención.									1				100%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención				
FASE 4. ACTUAR	Cierre de los planes de acción, análisis de tendencias e indicadores del programa											1		0%	Responsable del SG-SSTA	Programa de Capacitación, promoción y prevención				
P= Programado E= Ejecutado																				
5. RECURSOS ASIGNADOS																				
Humanos:		Personal calificado para el desarrollo del Programa (Viga SSTA, Director de operaciones y Responsable del SG-SSTA)																		
Económicos:		Disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del programa																		
Financieros:		Asignado en el presupuesto																		
Técnicos:		Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos, equipo de cómputo, uso de plataformas tecnológicas.																		
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO																				
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA																				
FORMULA	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	VARIABLES	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA												GRÁFICA					
			JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL							
			III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM	III SEM	IV SEM						
			Programadas	2	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2		4	3	2	0	21
			Ejecutadas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3		0	0	0	0	7
Resultado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	33%				
Meta	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
ANÁLISIS DE DATOS																				
Septiembre: Las actividades del Programa para el mes de agosto se cumplieron en un 100% superando la meta establecida, se continuara con el seguimiento del cronograma para continuar con la tendencia actual.																				
Octubre:																				
8. PLAN DE ACCIÓN																				
HALLAZGO												RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA		FECHA DE EJECUCIÓN				
Septiembre: De acuerdo con los datos arrojados en el mes de septiembre no se requiere realizar ningún plan de acción.																				
Octubre:																				
Noviembre:																				

Imagen 15 SG-SST

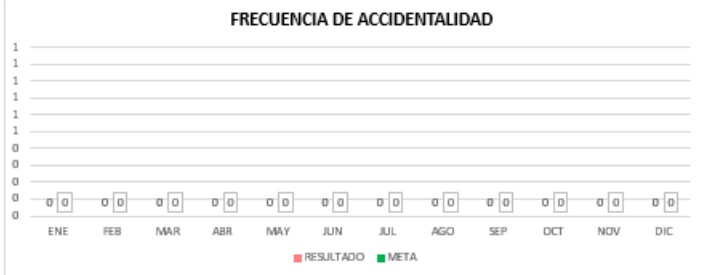	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Código: FT-SST-016		
	Formato Indicadores del SG-SSTA										Versión: 2 Vigencia: 28/04/2023		
Frecuencia de Accidentalidad													
Definición del Indicador	Nombre	Meta	Indicador (formula)								Fuente de información		
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Frecuencia de accidentalidad	0	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100								FURAT Investigaciones de accidentes de trabajo Estadísticas de accidentalidad ARL		
Tipo de indicador	Resultado		Interpretación	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes XXX , se presentaron XXX Accidentes de trabajo									
Frecuencia medición	Mensual		Personas a informar	Gerente General, Dirección Administrativa y COPASST									
Responsable:	Responsable sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente												
DATOS 2023													
Formula	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Numero de trabajadores en el mes	7	7	7	7	7	7	11	7	7				
RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENDENCIA DEL INDICADOR													
<p>FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD</p>  <p>■ RESULTADO ■ META</p>													

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de enero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Septiembre, se presentaron 0 Accidentes de trabajo.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 16 Índice de frecuencia

 Comunicación sin límites	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE											Código: FT-SST-016
	Formato Indicadores del SG-SSTA											Versión: 2
												Vigencia: 28/04/2023
Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante												
Definición del Indicador	Nombre			Meta	Indicador (formula)					Fuente de información		
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes con tiempo perdido	Frecuencia de accidentes de trabajo con lesión incapacitante			0	(Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z" / Número promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100					FURAT Investigaciones de accidentes de trabajo Estadísticas de accidentalidad ARL		
Tipo de indicador	Resultado				Interpretación		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes XXX , se presentaron XXX Accidentes de trabajo con lesión incapacitante					
Frecuencia medición	Mensual				Personas a informar		Gerente General, Dirección Administrativa y COPASST					
Responsable:	Responsable sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente											
DATOS 2023												
Formula	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z"	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Número promedio de trabajadores en el periodo "Z"	7	7	7	7	7	7	11	7	7			
RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENDENCIA DEL INDICADOR												
<div><div><div>Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC</div><div>RESULTADO META</div></div></div></div>												

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en enero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en febrero, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en marzo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en abril, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en mayo, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en junio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en julio, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en agosto, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en septiembre, se presentaron 0 Accidentes de trabajo con lesión incapacitante.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 17 Índice de incapacidad

ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
Mensual	Seguimiento	REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA					
		SI	NO	Descripción de la acción	Fecha de cumplimiento	Responsable	Estado
Enero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes enero, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Febrero	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes febrero, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Marzo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes marzo, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Abril	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes abril, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Mayo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes mayo, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Junio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes junio, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Julio	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes julio, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Agosto	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes agosto, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Septiembre	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes septiembre, se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.		X				
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Imagen 18 Índice de severidad



Imagen 19 Personal técnico

vitacom		Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente		Forma de Elaboración	
Consultoría en Energía		Análisis de Trabajo Seguro (ATS)		Fecha: 14/09/2023	
CONTRATACIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN		VERSIÓN: 2	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:		UBICACIÓN DEL TRABAJO:			
INSTALACION SISTEMA TELEMETRIA INSTALACION SISTEMA SATELITAL INSTALACION SISTEMA PUESTA TIERRA		JUNTAS DE TAMANA			
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENE:					
SIMON RODRIGUEZ EDUARDO OREJANA					
ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR					
TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ OTRO: ☒ FUEGO					
ACTIVIDADES CRÍTICAS: Dirigir los Formatos de Fichas de Trabajo Seguro					
ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR					
POPULADORA FISICA, JALADOR, PULADORA, CORRIPILOS, ALICATES, MEXCATORNA, COMPUTADOR, NAVES ALIAS					
PASOS (En los que se divide el trabajo)		RIESGOS POTENCIALES		ACCIONES DE CONTROL	
<ul style="list-style-type: none"> - Se llega y se inspecciona el lugar de trabajo - Se trasladan equipos y materiales a instalar - Se instala armario de telemetría - Se instala el sistema satelital - Se instala el sistema a tierra - Se instala los CTS correspondientes - Puebas de conexión satelital con el BOB DE BOGOTA - Puebas del conversor con el medidor - Puebas generales con todos los equipos conectados con el NOC BOGOTA E IPSE - Se realiza ASO General del sitio - Se entrega reporte al encargado del sitio - Entrega del sistema de telemetría al encargado del sitio - Salido 		<ol style="list-style-type: none"> Exposición a ruido Iluminación inadecuada Contacto superficies calientes Deficiencias de ventilación Exposición a vibraciones Proyección de partículas y fragmentos Movimientos en movimiento Manejo de herramientas Caidas de altura Exposición en espacios confinados Lanzamiento de cargas Caida de objetos Atrapeamientos por debajo o entre objetos Contacto directo y/o indirecto con electricidad Insustancias abrasivas en mal estado Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas Contacto con materiales o sustancias peligrosas Exposición y/o incendio Emisión de gases explosivos Exposición a vectores transmisores de enfermedades Contaminación biológica Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas de trabajo Exposición a vibraciones Accidentes o incidentes Vehiculares, aéreo y/o fluvial Movimiento de equipo pesado en el sitio de trabajo Colisión y vuelco de vehículos Atrapeamientos de personas Superficies resacas, irregulares, húmedas u obstruidas Techos, muros, pisos o paredes en mal estado Derrames Exposición reducida de trabajo Probabilidad de Lluvia Caidas del mismo nivel Otros 		<ol style="list-style-type: none"> Delimitar y señalizar el área de trabajo Solicitar permisos de trabajo Disponer de elementos de protección personal EPP. Ejecutar conexión a tierra de equipos Equipos y herramientas en buen estado. Realizar corte de ruidos Realizar medición de la concentración de gases en el área Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Disponer pantallas protectoras Inspeccionar áreas adyacentes Disponer de sistemas de comunicación Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo Aplicación de procedimientos de trabajo seguro Prevenir y/o contener derrames Instalar ventilación mecánica permanente Disponer un uño en el exterior Humedecer con agua el área Separar y disponer residuos líquidos Cubrimientos de materiales Adecuada disposición de residuos. Equipos de protección calientes adecuados para labor específica Uso de desinfectantes para equipos Disponer de sistemas de comunicación Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS Identificación de los productos químicos Almacenamiento correcto de materiales Disponer de equipos de extinción del fuego Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb Empelo de sistemas de acceso como escaleras Empelo de sistemas de acceso como andamios Empelo de sistemas de acceso como plataformas Otros 	
SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD					
Extintores		Kit para derrames		Escalera tipo tijera	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Demoras	
Botiquín y Camilla		Órdenes con cámara		Otros	
FIRMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ATS					
Firma		Registro n.º CC		Firma / Fecha	
SIMON RODRIGUEZ		79241075			
APROBACIÓN					
Firma		Registro n.º CC		Firma / Fecha	

Imagen 20 Inspección de trabajo seguro

11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL

Durante la instalación en la localidad de Juntas de Tamana no se generaron residuos peligrosos que deban ser tratados, los residuos corresponden a empaques de cartón y plástico en los que se transportaron los equipos fueron llevados al punto donde la comunidad tiene el reciclaje.

12. PERSONAL TÉCNICO

Jesús Eduardo Cárdenas
Técnico Comunicaciones

Luis Alfonso Rojas
Contratista Eléctrico

Simón Rodríguez
Técnico Comunicaciones

13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES

En el proceso de instalación no se presentó ninguna novedad, los procedimientos se realizan acorde a lo programado, se realizan pruebas desde la plataforma de Telemetría con resultados exitosos.

14. CONCLUSIONES

- Se logra documentar todo lo referente al sistema de alimentación eléctrica de la sede.
- Durante la instalación de los equipos se realizan verificaciones del estado de funcionamiento óptimo de los equipos instalados en sitio y el nuevo capex a instalar.
- Se instala gabinete de medida y sistema de puesta a tierra, acorde a normatividad vigente. De igual manera sistema de comunicación, se hacen pruebas con el NOC vía remota para las lecturas de telemetría.
- No se presenta incidentes ni accidentes durante la ejecución de las actividades
- Se evidencia planta en falla

15. DOCUMENTACIÓN

		FICHA TECNICA DE EQUIPOS				Código	Página
						IPSE-GI-F10	1/1
						Fecha	24-10-2023
EQUIPO: MEDIDOR DE ENERGIA							
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN							
LOCALIDAD	JUNTAS DE TAMAYA			CIRCUITO			
FECHA:	24-10-2023						
REGISTRO FOTOGRAFICO							
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS							
MARCA	MODELO/TIPO	TIPO DE ENERGIA QUE MIDE				NUMERO DE SERIE	
LAPDYS 642	E570	ACTIVA	☒	REACTIVA	☒	60715287	
CALSE DE EXACTITUD	TENSION NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	CONEXIÓN	2. FRECUENCIA	AÑO DE FABRICACION		
223x1.05, (23)x4	277/480V 3x58/100	1 (10) A	ELEM. 3- ELEM		2023		
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN							
DIMENSIONES:		ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	7,5		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		HUMEDAD:					
-40° / 70°C							
BATERIA		RS-232	☒	PUERTOS DE SALIDA			
CALIBRACION		No.	LABORATORIO				
ESTADO INICIAL							
BUENO		☒	REGULAR	☐	MALO	☐	
ESTADO FINAL DEL EQUIPO. EXCELENTE ESTADO							
VIDA UTIL ESTIMADA							
OBSERVACIONES:							
EJECUTADO POR. SIMON RODRIGUEZ							

Imagen 21 Ficha técnica de Equipos medidor de energía

		FICHA TECNICA DE EQUIPOS		Código	Página
				IPSE-GI-F10	1/1
				Fecha	
				24-10-2023	

EQUIPO: TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE					
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN					
LOCALIDAD	JUNTAS DE TAMANA		CIRCUITO		
FECHA:	24-10-2023				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS					
MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN		POTENCIA NOMINAL	
Blox	Hs-600	30/5 A		5 VA	
TENSIÓN MÁXIMA	TIPO DE USO INTERIOR EXTERIOR	NÚMERO DE SERIE 1916295-1 1919938-1		CLASE DE EXACTITUD 0.5S	
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN					
DIMENSIONES:	ALTO	8.5	ANCHO	9	PROFUNDIDAD 40m.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 / 40°C			HUMEDAD:		
PESO:			FRECUENCIA:		
CALIBRACIÓN		No.	LABORATORIO		
ESTADO INICIAL					
BUENO		REGULAR		MALO	
ESTADO FINAL DEL EQUIPO.					
VIDA UTIL ESTIMADA					
OBSERVACIONES:					
EJECUTADO POR. SIMON RODRIGUEZ					

Imagen 22 Ficha técnica de Equipos transformador de medida

	FICHA TECNICA DE EQUIPOS	Código	Página
		IPSE-GI-F10	1/1
		Fecha	1/04/2011

EQUIPO: INTERFAZ DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN

LOCALIDAD		CIRCUITO	
FECHA:	24-10-2023		

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			

DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS

MARCA	MODELO/TIPO	PUERTOS DE SALIDA	NUMERO DE SERIE
PUSE	USB - TCP 232-302	ETHERNET	
CALSE DE EXACTITUD	TENSION NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	FRECUENCIA
	100-240V	1 A	50/60 Hz
FUENTE	TIPO		
SERIAL	VOLTAGE	CORRIENTE	

DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN

DIMENSIONES:	ALTO	5 cm	ANCHO	6.5	PROFUNDIDAD	25 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN			HUMEDAD:			
CALIBRACION	No.	LABORATORIO				

ESTADO INICIAL

BUENO	☒	REGULAR	☐	MALO	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------	--------------------------

ESTADO FINAL DEL EQUIPO. EXCELENTE ESTADO

VIDA UTIL ESTIMADA

OBSERVACIONES:

EJECUTADO POR. SIMON RODRIGUEZ

Imagen 23 Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones

		HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA		Código	Página
				IPSE-GL-F11	1/1
				Fecha	24 Octubre DE 2023
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA					
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO					
TIPO DE INSTRUMENTO:					
MEDIDOR DE ENERGÍA ☐		TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE ☒		TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE TENSIÓN ☐	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MEDIDORES DE ENERGÍA					
MARCA	MODELO/TIPO	TIPO DE ENERGÍA QUE MIDE	CONSTANTE E. ACTIVA	CONSTANTE E. REACTIVA	
LANDYS 6VR	6.570	ACTIVA	10.000	10000	
CLASE DE EXACTITUD	TENSIÓN NOMINAL	RANGO DE CORRIENTE	TIPO (No De Tensión o Hilos)	NÚMERO DE SERIE	
(22)C10552301	27x58/100 V	1 (100)A	3 fases 4 hilos	60715287	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE CORRIENTE					
MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL		
Blox	HS-600	300/5A.	3VA.		
CLASE DE EXACTITUD	CLASE DE EXACTITUD				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN					
MARCA	MODELO/TIPO	RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	POTENCIA NOMINAL		
TENSIÓN MÁXIMA	TIPO DE USO INTERIOR EXTERIOR	NÚMERO DE SERIE	CLASE DE EXACTITUD		
REGISTRO DE UBICACIONES DEL INSTRUMENTO					
ITEM	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE RETIRO			
JUNTAS DE TAMIANA - 23-10-2023					
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN EN SITIO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN EN SITIO	DOCUMENTO (INFORME DE CALIBRACIÓN)	PROVEEDOR		
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO (INFORME DE MANTENIMIENTO)	PROVEEDOR		

Imagen 24 Hoja de vida de equipos

ipse		ACTA DE INSPECCION Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA		Código IPSE-GI-F12	Página 1/2
				FECHA 24-10-2023	
MANTENIMIENTO:					
LOCALIDAD: JUNTAS DETAMAYA		4.980914 76.41157		24-10-2023	
NIVEL DE TENSION: 440V		MEDIDA EN: 2 ELEMENTOS		FECHA: 24-10-2023	
		3 ELEMENTOS		HORA DE INICIO: 11	
		TIPO DE MEDIDA: INTERIOR		HORA FIN: 15	
				INFORME No.	
				tipo de comunicación	
				satelital	
				gprs	
ACTIVIDADES REALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION				
1	INSTALACION ANTENA SATELITAL				
2	INSTALACION SISTEMA A TIERRA				
3	INSTALACION GABINETE PARA TELEMETRIA				
4	INTERVENCION CABLES RED ELECTRICA				
5	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA SATELITAL				
6	INSTALACION DE CTA EN GABINETE				
7	PRUEBAS SESENALES DE LA TELEMETRIA				
8	ENTREGA DEL SERVICIO OPERATIVO				
EQUIPOS ENCONTRADOS*					
MEDIDOR		LECTURA		HORA	
MARCA		MODELO		TIPO	
OBSERVACIONES		SERIE			
TRANSFORMADOR DE MEDIDA					
MARCA		MODELO		RELACION	
OBSERVACIONES		SERIE			
INTERFAZ DE COMUNICACIONES					
MARCA		MODELO		TIPO	
OBSERVACIONES		SERIE			
OTROS					
MARCA		MODELO		TIPO	
OBSERVACIONES		SERIE			
EQUIPOS INSTALADOS*					
MEDIDOR		LECTURA		HORA	
MARCA		MODELO		TIPO	
OBSERVACIONES		SERIE			
TRANSFORMADOR DE MEDIDA					
MARCA		MODELO		RELACION	
OBSERVACIONES		SERIE			
MARCA		MODELO		RELACION	
OBSERVACIONES		SERIE			
MARCA		MODELO		RELACION	
OBSERVACIONES		SERIE			
INTERFAZ DE COMUNICACIONES					
MARCA		MODELO		TIPO	
OBSERVACIONES		SERIE			
OTROS					
MARCA		MODELO		TIPO	
OBSERVACIONES		SERIE			
OBSERVACIONES GENERALES					
EJECUTADO POR: SIMON RODRIGUEZ					
REVISADO POR:					
* Se amplía estos campos de acuerdo a los equipos encontrados o instalados.					

Imagen 25 Acta de instalación equipos de telemetría 1

		ACTA DE INSPECCION Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA				Código	Página
						IPSE-GI-F12	1/2
						FECHA	
				24-10-2023			
DATOS DE TRABAJADORES							
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ESTADO DE SALUD	HORAS TRABAJADAS	FIRMA		
Ferley Mosquera	1076816425	OPERADOR	SATISFACTORIO	11	Ferley Mosquera		
CHARLA DE CAPACITACION							
TEMA: SISTEMA SATELITAL Y TELEMETRIA							
EXPOSITOR:						MINUTOS: 15 minutos	
LOS ARRIBA FIRMANTES CERTIFICAMOS QUE HEMOS RECIBIDO LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DESCRITO Y QUE ENTENDEMOS LOS RIESGOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS							
ASPECTOS HSEQ							
ACCIDENTES: NINGUNO							
INCAPACIDADES: NINGUNO							
INCIDENTES: NINGUNO							
DESCRIPCION:							
ASPECTOS AMBIENTALES							
MANEJO DE RESIDUOS SE ENTREGA AL ENCARGADO PARA QUE DISPONGA ELLOS SEGUN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS							
OTROS ASPECTOS AMBIENTALES							
OBSERVACIONES GENERALES							
ELABORO:		REVISO:		OPERADOR/USUARIO:			
NOMBRE: Simon Rodriguez		NOMBRE:		Ferley Mosquera Ibarra			
FIRMA		FIRMA		FIRMA:		1076816425	

Imagen 26 Acta de instalación equipos de telemetría 2



DE COLOMBIA S.A.S.
Nit: 800.250.325-2

Cra. 7 No. 156 - 80 OF: 1302 México, D.F. + (55) 5694 4304
PBX: 745 2741
Bogotá, D.C. - Colombia
www.vitacom.com.co

ORDEN DE SERVICIO

Cliente
IPSE

No. de Servicio
3018277847

Contacto Local
FERLEY MOSQUERA IBARGA

Sitio
DORTAS DE TAMANA

Teléfono y Ext.
3018277847

Fecha y Hora de Llegada
23-10-2023 11:00

Fecha y Hora de Salida
24-10-2023 8:00

Horas Laboradas
12 HOURS

Propósito del Viaje
INSTALACION SISTEMA DE TELEMETRIA

Resultado de las Pruebas y Observaciones

- SE VUELA AL SITIO Y SE ENCUENTRA LA PLANTA EN PANA YA QUE PRENDE PERO NO FUNCIONA EL ALTERNADOR LES TOCA CARGAR LAS BATERIAS CON EL PAPEL SOLAR QUE QUEDA A 200 METROS
- SE SOLICITA MANTENIMIENTO DESDE EL APO PADO PERO NO A LLEGADO VISITA.
- SE INSTALA TELEMETRIA SIN INCONVENIENTES CON PRUEBAS CON PERSONAL DE IPSE DONDE ABUEBAN EL SITIO
- SE INSTALAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS

MEDIDOR	60715287
RECORADOR	POWEST PROPC 1000 VA
CONVERSOR	D4AD205D9304

Status: Terminado ☒ Pendiente: ☐ Observaciones:

Equipos Retirados	No. ARM	No. Tracking	No. Parte	No. Serie
CT 1	1116295-1			
CT 2	1914938-1			
CT 3	1916292-1			
ODU	205504979			
IDU	AD04500003082			

Equipos Instalados

ANTENA SATELITAL DE 0.90mts CON HERRAJES

Tipo de Servicio
Garantía ☐ Contrato de Mantenimiento ☐ Cargo al Cliente ☒

Representante de VITACOM (nombre y firma)
SIMON ROBERTO 79241975

Representante del Cliente (nombre y firma)
Ferley Mosquera 1076876425

Original NOC - Copia azul CLIENTE

Imagen 27 Orden de servicio

Nombre Contacto	Teléfono
Ferley Mosquera	3018277847

16. Diagrama Unifilar

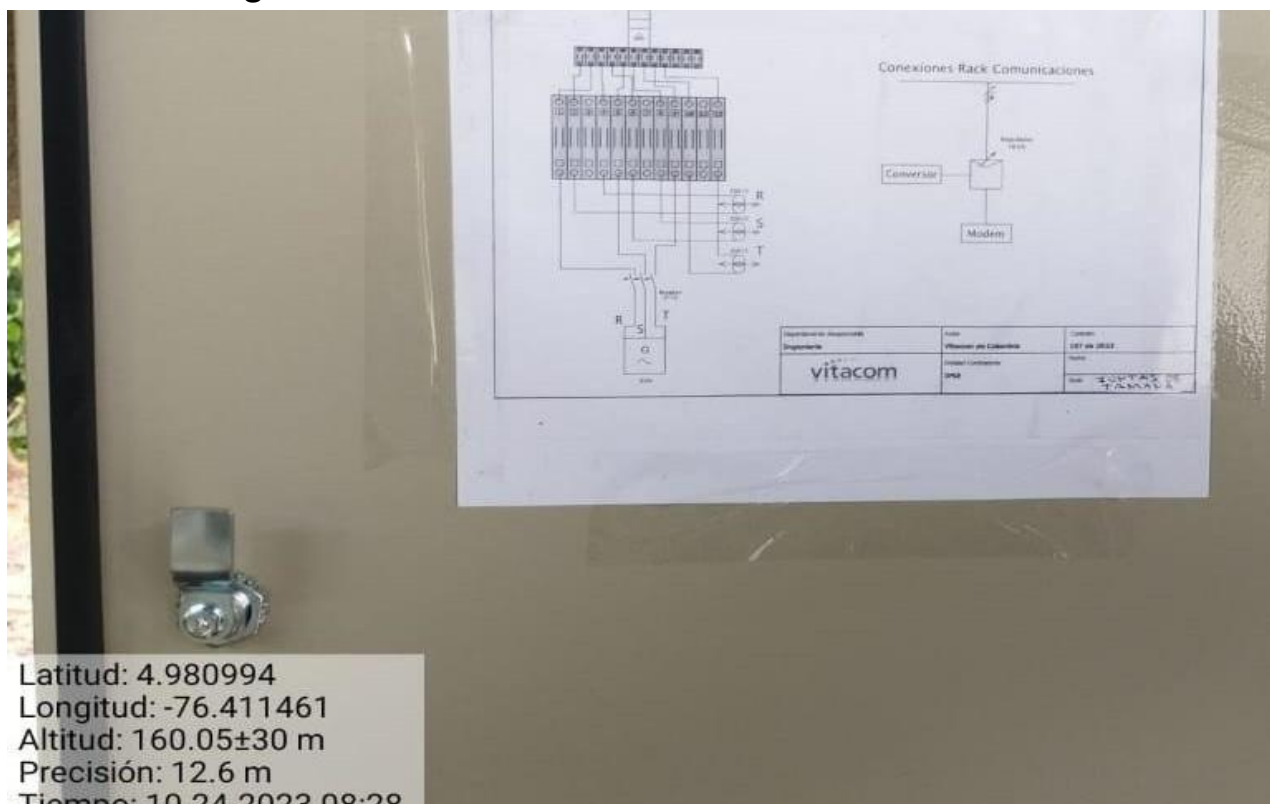


Imagen 28 Diagrama Juntas de Tamana

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

CERTIFICADO MEDIDOR
FICHA TECNICA MEDIDOR
CERTIFICADO CTS
FICHA TECNICA CTS
REGISTRO FOTOGRAFICO



Yimmy Londoño
Ingeniero Eléctrico



José Buitrago Gasca
Coordinador de Proyecto
