NOVATRONICA
TECNOLOGÍA & RESPALDO

NIT 900085334-4

NOVATRONICA S.A.S.
Cel. 3155572085
calle 11 # 13A - 41
centrodeservicios@novatronicasas.com

CÓDIGO DE LA ORDEN

25-0385

Fecha: 28 Julio 2025
Mantenimiento

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EQUIPO
Nombre: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.	**Marca:** General
Identificación: 819004070	**Modelo:** [CUMMIN G] GENERADOR DIESEL CUMMIN
Dirección: a 24-289, Av. El Libertador ##24-147, SANTA MARTA	**N° Serie:** 000000
Teléfono: 301 4480906	**Fecha Ingreso:** 28 Julio 2025
Correo:	**Fecha de compra:**

RECEPCIÓN

Receptor: TÉCNICO ANDRES
Comentarios de recepción: Revisión del generador para realización de mantenimiento preventivo y corrección de fallas. CENTRO DE SALUD SEDE LA CASTELLANA

Accesorio	Cantidad	Estado

SEÑORES USUARIOS: EL TIEMPO PARA DAR RESPUESTA DE DIAGNÓSTICO ES DE 10 A 15 DIAS HÁBILES

LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS ACCESORIOS NO GARANTIZA QUE ESTÉN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, ESTO SE DEFINIRÁ EN EL DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Fecha de diagnóstico: 28 Julio 2025 11:06:16 am
Técnico: TÉCNICO ANDRES
Comentarios de diagnóstico: Sede: La castellana. Se realiza la revisión y se encontró una falla de presión de aceite, por tal motivo se realizó el cambio del sensor de aceite por posible daño en este, el generador a pesar del cambio de este componente siguió presentando la falla, al revisar los cables de señales de la bomba de inyección y del sensor de aceite se encontraron que algunos de estos estaban deteriorados debido a mordidas de roedores, al revisar el cableado del equipo se encontró algunos cables empalmados y otros desconectados los cuales pueden ser causantes de fallas, se pudo encender el generador, pero este no apagaba, por tal motivo se determinó que lo mejor es hacer un barrido del cableado y reparar o cambiar los cables dañados, además de instalar una coraza para evitar este caso nuevamente en el futuro. Al momento de encender el generador se verificó que el equipo generara correctamente y funcione bien. Se realiza la verificación de los filtros para realizar el mantenimiento.

COTIZACIÓN

#	Código	Descripción	Cant.	IVA	Valor base	Dto	Valor parcial	Precio con IVA
1	9.810-001.0	SERVICIO TECNICO	1	19,00%	$ 4,724,893.00	0,00%	$ 4,724,893.00	$ 5,622,622.67

Subtotal	$ 4,724,893.00
IVA	$ 897,729.67
Revisión pagada	$ 0.00
Total	$ 5,622,622.67

Fecha de aprobación:
Comentarios de cotización:

REPARACIÓN

Fecha de reparación: 28 Julio 2025 11:07:03 am
Técnico: TÉCNICO ANDRES
Comentarios de reparación: se instala relé y cable de señal para apertura de válvula solenoide de combustible; donde dicho relé queda trabajando como esclavo del temporizador de arranque de la transferencia. se hacen pruebas de funcionamiento de arranque del equipo en modo automático cortando el suministro de RED y el generador enciende, se realiza la transferencia y al retornar la RED se realiza nuevamente la transferencia y el generador se apaga un minuto después como esta estipulado en el temporizador.

ENTREGA

Fecha de entrega: 28 Julio 2025 11:07:38 am
Técnico: TÉCNICO ANDRES
Tipo de entrega: Reparada
Fecha próximo mantenimiento:
Comentarios de entrega:

Firma de recibido

FOTOS DE RECEPCIÓN

28 Julio 2025 04:28:04 pm

FOTOS DE DIAGNÓSTICO

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Cables del tablero

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Cables deteriorados

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Cables solo encintados no tienen ningún tipo de protección

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Filtro de aceite

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Filtro de aire

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Filtro de combustible separador de agua

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Filtro primario de combustible.

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Generador Cummins 6 BTA

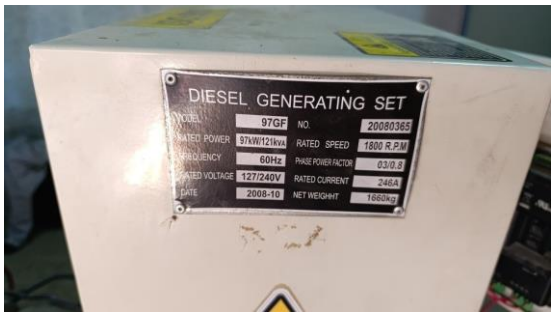

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Placa del generador

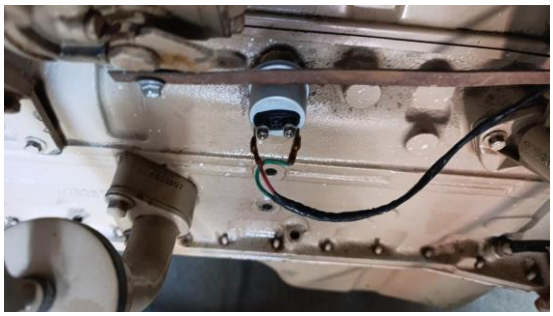

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Sensor de aceite nuevo

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Solenoide de paso de combustible

28 Julio 2025 04:45:04 pm

Tablero

FOTOS DE REPARACIÓN

28 Julio 2025 03:40:19 pm

Instalación de relé foto primero del lado derecho al lado de breaker mono-polar y cableado de señal para apertura de

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. El período para finalizar las reparaciones es de diez (10) a quince (15) días hábiles. Esto está sujeto a la disponibilidad de todas las piezas de repuesto necesarias y no incluye el período de tiempo mientras esperamos la aprobación del cliente del costo estimado para reparación

2. La cotización es una estimación, los precios están sujetos a cambios debido a circunstancias fuera del control de la empresa , tales como , pero no limitado a , las fluctuaciones del tipo de cambio , la compra de artículos de proveedores externos, de descubrimiento de otros problemas después del desmontaje de unidad, etc.

3. Todos los trabajos están sujetos a un cargo no reembolsable de diagnóstico que aparece en el frente de esta tarjeta. Una vez que usted está de acuerdo con la estimación para reparar su unidad, el costo del diagnóstico será acreditado a su cuenta final.

4. Fecha de entrega puede verse afectada por situaciones tales como la pérdida de energía eléctrica, huelgas en puntos públicos de acceso (muelle, aeropuertos, etc.) Si se necesitan piezas de repuesto para el trabajo y están demorados en transporte en tales puntos, a continuación, estas circunstancias son fuera de nuestro control.

5. Las máquinas que sean finalizadas deben ser recogidas por el cliente dentro de los dos (2) semanas desde el aviso de finalización de trabajo; de lo contrario la empresa se reserva el derecho de vender la unidad o partes de los mismos para recuperar gastos.

6. El cliente será notificado por la empresa, antes de cualquier decisión adoptada que afectará el costo del trabajo.

7. Esto no es una factura final o recibo. Una factura será emitida en el momento del pago de trabajo. Por favor presente este formulario de atención al recoger su unidad.

8. A partir de la fecha usted cuenta con 60 días máximo para realizar el retiro del equipo entregado para reparación. Después de este tiempo se ingresará el equipo al proceso de destrucción. Lo anterior está amparado bajo el estatuto del consumidor, Ley 1480 de 2011.

9. A partir de que el equipo sea entregado al cliente final, tienen 30 dias para traer el equipo por solicitud de garantia y revisar si aplica o no, de lo contrario estará por fuera de los tiempos y no se recibirá.

Firma:
