

**“RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON
ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS
PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE”**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

NO. LP CARDIQUE - 003-2021

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Periodo: Del 24 de marzo al 23 de diciembre del 2022

" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE".

CONTRATO ELECTRÓNICO NO CMA-CARDIQUE-001-2022

JET INGENIERÍA S.A.S
NIT: 802.024.876-8

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE CONTRATO ELECTRÓNICO NO CMA-CARDIQUE-001-2022
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
NIT CONTRATANTE	800254453-5
CONTRATISTA	INGAGROF S.A.S.
NIT CONTRATISTA	900574589-3
INTERVENTOR	JET INGENIERÍA S.A.S.
FECHA INICIO DE OBRA	24 de marzo de 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.287.232.061
ADICION 1	\$ 534.111.723,50
PLAZO	9 MESES
% AVANCE DE LA OBRA	100%
%AVANCE FINANCIERO	70.67%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ing. Hernán Peláez Ríos

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO DEL PROYECTO	5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	7
3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO	9
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	11
4.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA	11
4.1.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	11
4.1.2 COMPONENTE FINANCIERO	12
4.1.3. COMPONENTE JURIDICO	13
4.1.4 COMPONENTE TÉCNICO	15
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	22
5.1 COMPONENTE CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA	22
5.1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	22
5.1.2. COMPONENTE FINANCIERO	25
5.1.3. COMPONENTE JURIDICO	26
5.1.4. COMPONENTE TÉCNICO	27
5.1.5. COMPONENTE SST	28
5.1.6. COMPONENTE SOCIAL	28
6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO	28
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
8. ANEXOS	29

1. INTRODUCCIÓN

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, identificada con N.I.T. N° 800.254.453-5 a través de la licitación pública No. **LP-003-2021**, por una parte; y por la otra INGAGROF S.A.S. identificado con N.I.T. N° 900.574.589-3.

La interventoría del proyecto por parte de **JET INGENIERÍA S.A.S.**, representado legalmente por JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, a quién se adjudicó el proyecto que tiene por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”**.

El contenido del presente informe se compone de los estudios y documentos previos, el estudio del sector, los anexos técnicos y otros anexos que quedan a disposición del público y a todos los interesados en la plataforma (SECOP II), Sistema Electrónico de contratación pública. Producto de los procesos anteriormente mencionados se genera el presente informe final corresponde al periodo del 24 de marzo al 23 de diciembre del 2022, reportando las principales actividades ejecutadas en el presente proyecto durante el periodo señalado; además se recopilan los informes de seguimiento en las áreas administrativas, ambiental, técnica y financiera.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

- El objetivo general del contrato de obra pública No. LP-003-2021, es realizar la Restauración de ecosistemas de Bosque Secos y Bosques con Especies Nativas que favorezcan la polinización en áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La Región de los Montes de María, es de gran importancia ambiental para el departamento de Bolívar y su Ecosistema de Bosque seco tropical, está siendo alterado por factores como la ganadería, la expansión de la frontera agrícola, incendios forestales, tala y raza de bosques. Estas zonas han sido intervenidas por la acción del hombre y aún se encuentran relictos de bosques, asociados con rastrojos altos y áreas para cultivos. Las prácticas de manejo y la intensidad con que se realizan estas actividades, son causales de procesos de erosión y pérdida de fauna y flora. Las pendientes altas, los procesos de erosión, los suelos superficiales, las fuertes y continuas lluvias y la inestabilidad del terreno repercuten en mayor o menor grado en las poblaciones.

La ocupación de las zonas altas de montaña para el establecimiento de actividades agropecuarias ha estado acompañada, por deforestación que ha incidido de manera negativa sobre la función de retención de agua, cuya pérdida lo deja expuesto a fenómenos de erosión y sedimentación que alteran los flujos hídricos de las cuencas. Los Montes de María, son áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE, son ecosistemas estratégicos, que es necesario proteger y conservar para permitir el flujo de fauna del corredor biológico.

En El Carmen de Bolívar, hay la necesidad de iniciar los procesos de rehabilitación ecológica en áreas degradadas, en bosques y arbustos secos en las áreas rurales ubicadas en jurisdicción del Municipio e identificadas como prioritarias, conforme a la zonificación ambiental y forestal de CARDIQUE.

CARDIQUE, dentro de su plan de acción (PAI) 2020-2023, y plan nacional de desarrollo forestal incluyó la acción operativa **“RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS TROPICAL – BST (RONDAS HIDRICAS, ZONAS DE RECARGA DE ACUIFEROS, NACEDEROS DE AGUA, CORREDORES DE CONECTIVIDAD SOCIECOSISTEMICOS, AREAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACION Y AREAS ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS)”**, una de sus metas prioritarias es la reforestación o restauración de áreas que se han visto afectadas por la realización de proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, la ampliación de áreas para ganadería extensiva en áreas de vocación forestal, la explotación mineral a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no sostenibles.

En el Municipio de El Carmen de Bolívar, la apicultura se ha visto afectada por los efectos del cambio climático global y sumado a la tala de árboles para actividad agrícola, ganadería, minería, obras de ampliación de la carretera troncal de Occidente, y de regreso a los campesinos a la zona rural, ha conllevado a que la población de abejas disminuya y el rendimiento de la producción de miel por

colmena, estas condiciones de deforestación han afectado la estabilidad de las abejas ocasionando la enjambrazón de estas hacia zonas donde tengan mejores condiciones ambientales.

Al ejecutar el proyecto se establecerá modelos de RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION ECOLOGICA, Y APOYO A PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS, en 119 hectáreas de aptitud ambiental y forestal priorizados en las diferentes zonas rurales en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, y vincular a las comunidades de la zona en actividades de rehabilitación ecológica, siembra de especies nativas atrayentes de polinizadores y dispersores de semilla.

En El Municipio de Carmen De Bolívar, las veredas Padula y Verdum, y el corregimiento el salado requiere la contratación de una firma de interventoría que realice las labores de vigilancia y control del objeto del contrato mencionados a continuación: **"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE"**, por lo que la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

Se requiere "realizar la vigilancia y control" a través de figuras como la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"**, y la supervisión, para que se desarrolle esta función de vigilancia y control en los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución del contrato descrito.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localizará en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.



Ilustración 1. Localización del departamento Bolívar.

El **Carmen De Bolívar** es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, ubicado en el sistema orográfico de los Montes de María (Coordenadas: 9°43'06"N 75°07'21"O/ 9.7183333333333, -75.1225) con una superficie de territorio de 934 km².

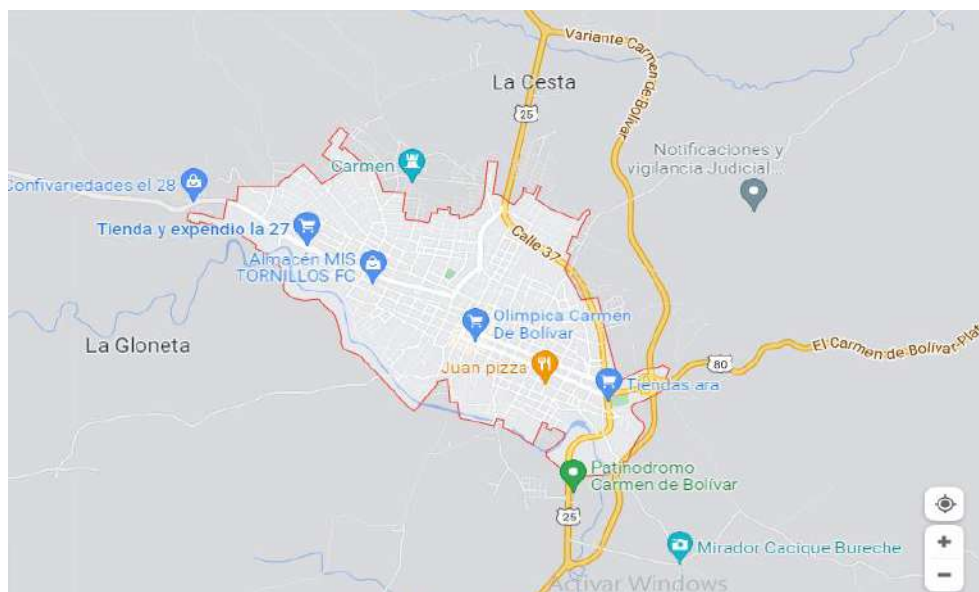


Ilustración 2. Localización del municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar.


Zona Seleccionada No 1

Corregimiento del Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar




Zona Seleccionada No 2

Vereda Verdun Municipio de El Carmen de Bolívar

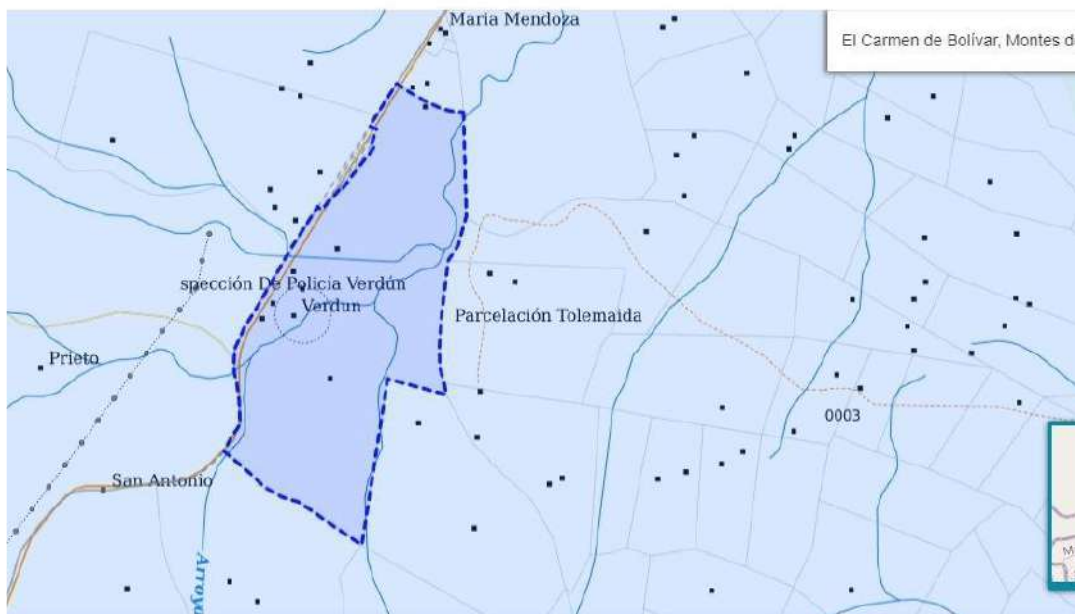

Zona Seleccionada No 2
Vereda Padúla Municipio de El Carmen de Bolívar

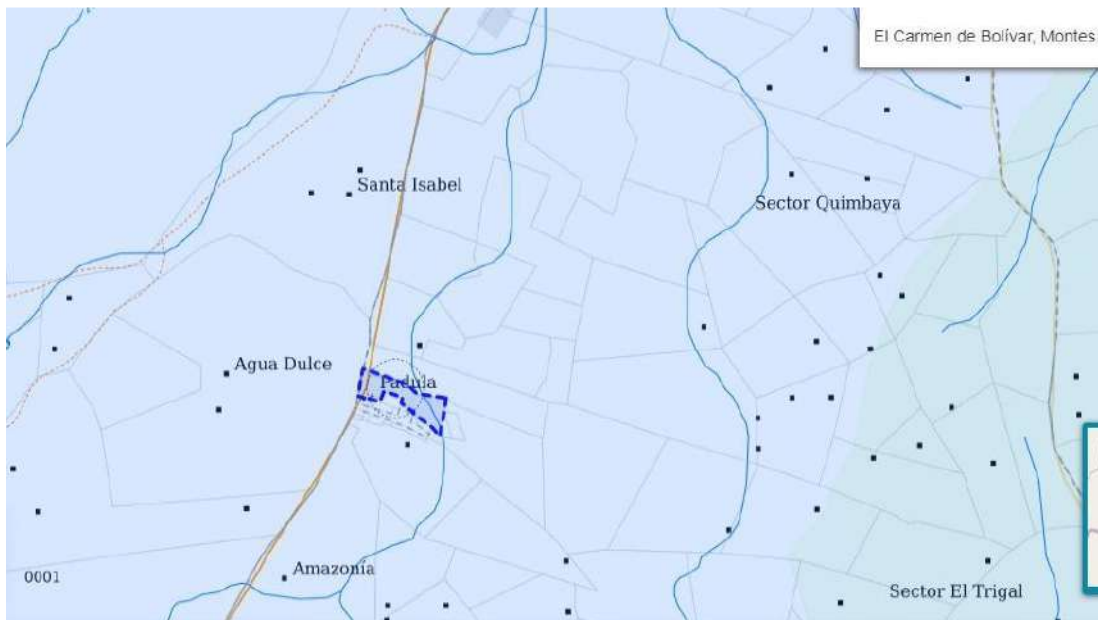

El Carmen de Bolívar, es un Municipio del departamento de Bolívar ubicado a 114 kms al sudeste de Cartagena de Indias y en el centro de la subregión Montes de María del departamento. Es considerado el municipio de mayor extensión de esa subregión, cuenta con una superficie territorial de 93.400 hectáreas.

El municipio de El Carmen de Bolívar, limita por el norte con el municipio de San Jacinto (Bolívar); por el sur con los municipios de Chalán y Ovejas (Sucre), por el este con los municipios de Zambrano y Córdoba (Bolívar) y por el oeste con los municipios de María La Baja (Bolívar) y Ricaurte -Coloso- y San Onofre (Sucre).

3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO

Las principales actividades a realizar durante la ejecución del proyecto **“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”** se describen a continuación:

- Realizar establecimiento de plantaciones (119 ha de reforestación protectora a distancia de siembra 3m x 3m)
- Características de plántulas (especies arbórea 80 cm altura)
- Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación.
- Preparación del terreno (Manualmente)

- Distribución y siembra de arboles
- Aislamiento de las áreas intervenidas con alambre de púas
- Mantenimiento de arreglos forestales
- Reposición por perdidas
- Control de plagas
- Limpias - control de malezas
- Replateo
- Prevención y control fitosanitario

El Interventor vigilara el cumplimiento de las diferentes etapas de ejecución del Contratistas, verificando y vigilando que los procedimientos agrícolas y sus resultados cumplan con las normas y especificaciones técnicas establecidas, verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de obra.

La Interventoría será responsable de coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad contratante y la Dirección de Obra. Velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecución de Obra, y ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sea oportunos y transparentes. Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad a lo estipulado en este documento.

Dentro del alcance del contrato de interventoría se tiene contemplado la ejecución de la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”**.

El contratista debe realizar las siguientes actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas al personal asignado a la obra
- Elaborar los informes técnicos y administrativos.
- Vigilar que los procedimientos agrícolas y sus resultados cumplan con las normas y especificaciones técnicas establecidas.
- Verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de obra.
- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad contratante y la Dirección de Obra.
- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se realicen conforme a los estándares o especificaciones.
- Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.
- Verificar la información de memorias de diseño y planos técnicos y velar por su correcta ejecución.

- Coordinar con el topógrafo el levantamiento de la información topográfica.
- Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra a sistemas de seguridad social y parafiscal.
- Control en el cumplimiento de la programación de la ejecución de las obras y suministros
- Coordinar y Supervisar la ejecución de los trabajos de todos los asesores de la Interventoría.
- Preparación de informes periódicos consignados en el contrato al igual firmará y aprobará el contenido de la bitácora y llevará un registro fotográfico.
- Asistir a las reuniones en conjunto con la Dirección de Obra y la entidad contratante cuando sean necesarios.
- Ejecutar los planes o programas de calidad y seguridad industrial implementados.

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

La siguiente tabla contempla los datos principales del contratista de obra:

CONTRATISTA	INGAGROF S.A.S NIT. 900574589-3	
TELÉFONO:	3114277810	
DIRECCIÓN:	Calle 10 VIA URRRA TIERRALTA CORDOBA	

4.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

Contratista de obra INGAGROF S.A.S. identificado con N.I.T. N° 900.574.589-3. Representada legalmente por el señor Carlos Alberto Rendón Polo.

CONTRATISTA	INGAGROF S.A.S
NÚMERO DE CONTRATO:	No. LP-CARDIQUE-003-2021
OBJETO DEL CONTRATO:	“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.
NIT CONTRATISTA:	900.574.589-3
PLAZO DEL CONTRATO:	El término para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) MESES. Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y suscripción de actas de inicio.

PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON 92/100 M/CTE (\$ 1.287.232.061,92),
ADICIÓN 1	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 50 CENTAVOS (\$534.111.723,50)
VALOR TOTAL:	MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.821.343.785,00)
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Marzo de 2022
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	La Entidad entregará un anticipo del (30%) del valor del contrato, al entregar la etapa de diagnóstico e identificación de las zonas a intervenir.
FORMA DE PAGO:	La entidad realizara un segundo pago parcial del (30%) cuando haya un avance por lo menos de un (50%) de ejecución y un pago final del (40%) a la finalización de la etapa de mantenimiento y asistencia técnica.

4.1.2 COMPONENTE FINANCIERO

Contratista	INGAGROF S.A.S.	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$1.287.232.061	
ADICIÓN NO 1	\$ 534.111.723,50	
RECURSOS:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	
	PAGOS PARCIALES	De acuerdo a la Cláusula 4 Valor Del Contrato y Forma de Pago , la entidad contratante pagará al contratista un primer pago parcial por el (30%) del valor del contrato ofertado en la licitación pública, un segundo pago parcial del (30%) cuando haya un avance por lo menos de un (50%) de ejecución y un pago final del (40%) a la finalización de la etapa de mantenimiento y asistencia técnica.

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA LP-003-2021						
Valor total contrato de obra			\$1.287.232.061,57		100%	
Concepto	Valor facturado	%	Amortización y descuentos	%	Valor neto recibido	Fecha de pago
Acta Parcial No. 1	\$386.169.618,47	21.20%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
Acta Parcial No. 2	\$386.169.618,47	21.20%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
Acta Parcial No. 3	\$514.892.824,78	28.26%	N/A	N/A	\$514.892.824,78	Pagada
Acta Parcial No. 4	\$534.111.723,50	29.32%	N/A	N/A	\$0,00	Trámite
TOTAL	\$1.821.343.785,00	100.00%			\$1.287.232.061,72	-

4.1.3. COMPONENTE JURIDICO

El contrato de obra No. LP – CARDIQUE - 003-2021 fue legalizado mediante aprobación de pólizas 03 de marzo de 2022.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	21/12/2021	30/11/2022	\$128.723.206,19	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-47-994000066036
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	21/12/2021	30/11/2025	\$64.361.603,10	
Estabilidad y calidad de la obra	23/10/2022	23/10/2023	\$257.446.412,38	
Calidad del servicio	30/11/2022	30/11/2023	\$64.361.603,10	

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

RIESGO	FECHA INICIO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
Amparo Básico – Predios Labores y Operaciones	21/12/2022	31/07/2022	\$181.705.200,00	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-74-994000010856

De acuerdo al Acta de inicio y modificación del contrato según Otrosí No.1 del contrato de obra No. LP – CARDIQUE - 003-2021 se realizó la actualización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de la referencia.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	21/12/2021	24/03/2023	\$128.723.206,19	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-47-994000066036
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	21/12/2021	24/03/2026	\$64.361.603,10	
Estabilidad y calidad de la obra	23/10/2022	23/10/2023	\$257.446.412,38	
Calidad del servicio	30/11/2022	30/11/2023	\$64.361.603,10	

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

RIESGO	FECHA INICIO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
Amparo Básico – Predios Labores y Operaciones	31/07/2022	24/10/2022	\$200.000.000	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-74-994000010856

De acuerdo al Acta modificativa según Otrosí No.2 del contrato de obra No. LP – CARDIQUE - 003-2021 se realizó la actualización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de la referencia.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	21/12/2021	24/05/2023	\$182.134.378,50	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-47-994000066036
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	21/12/2021	24/05/2026	\$91.067.189,25	
Estabilidad y calidad de la obra	24/12/2022	23/12/2023	\$364.268.757,00	
Calidad del servicio	30/11/2022	30/11/2023	\$91.067.189,25	

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

RIESGO	FECHA INICIO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
Amparo Básico – Predios Labores y Operaciones	31/07/2022	24/12/2022	\$300.000.000	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-74-994000010856

4.1.4 COMPONENTE TÉCNICO

El presente Informe final narra las principales actividades técnicas desarrolladas en el periodo comprendido del 24 de marzo al 23 de diciembre del presente año, se realizó supervisión, verificación, acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto “Restauración de ecosistemas de bosque secos y bosques con especies nativas que favorezcan la polinización en áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE”, en el Municipio de El Carmen de Bolívar, al Contratista “INGAGROF – Equipo Técnico y Equipos Social”, en las veredas Roma, Caracoli, Caracolito, Carabajal, San Rafael, Santa Fe, Piedra Azul, Mala Noche, Bajo Grande, Poza Oscura, San Isidro, La Turquí, El Hobo, Caña del Tigre, Santa Rita, El Bálsamo El Guapo, Tolomaida, La Zarza, Rancho Azul, Coloncito N°2, Bajo Grande y el corregimiento El Salado.

Las actividades programadas y ejecutadas del proyecto en los dos primeros meses fueron pausadas ya que se tuvo que recopilar la información solicitada para que este se desarrolle a satisfacción, y así cumplir con los requerimientos establecidos en el contrato y en los estudios previos.

Contando con la documentación e información del proyecto y de los beneficiarios se logró establecer el Plan de establecimiento forestal, el Cronograma de actividades, se realizó Visita previa de sitios a intervenir, se tomaron Registros de datos de campo, Actas de concertación, Georreferenciación de áreas a intervenir, Plan de establecimiento y manejo forestal (PEMF), Verificación de certificación de vivero y se dio Inicio a la verificación de encerramiento de predios.

Así mismo, en este periodo se realizó entrega de herramientas (paladragas, martillos, limas, machetes, alambre de púas, grapas, flexómetro y pita), así como material vegetal (100 plántulas/ha), para el desarrollo de las actividades programadas de aislamiento de lotes, siembra de plántulas, cargue y descargue de material, llenado de canastillas para ser posteriormente trasladados hasta los lotes y ser entregados a los beneficiarios del proyecto, se visita el lote y se hacen las recomendaciones necesarias para la plantación, mantenimiento de material vegetal en puntos de acopio (finca Acapulco, Vereda Bajo Grande entrada al salado km 4, finca puente peatonal entrada al salado y Bodega de El Carmen de Bolívar).

Se supervisaron actividades programadas en limpieza de terreno, trazado, ahoyado, plateo, siembra, resiembra, fertilización, control fitosanitario y aislamiento de lotes, de igual forma porcentaje total de siembra de material vegetal (plántulas), mantenimiento de plantaciones y porcentaje total del aislamiento.

Ya terminada las 119 has de reforestación protectora, las entidades contratantes deciden realizar adición de 50 hectáreas de reforestación protectora al proyecto, donde se verificó y supervisó que los participantes cumplan con los requisitos exigidos para acceder a los beneficios del proyecto como son: Cedula de ciudadanía, sana posesión y formato o acta de inscripción diligenciada. Las principales actividades que se realizaron durante la ejecución del proyecto "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE", fueron las siguientes.

- Establecimiento de plantaciones (119 ha de reforestación protectora a distancia de siembra 3m x 3m)
- Las características de plántulas (especies arbórea 80 cm altura)
- Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación.
- Preparación del terreno (Manualmente)
- Distribución y siembra de árboles
- Aislamiento de las áreas intervenidas con alambre de púas
- Mantenimiento de arreglos forestales
- Reposición por pérdidas
- Control de plagas
- Limpías - control de malezas

- Replateo
- Prevención y control fitosanitario

Capacitaciones, charlas y talleres en seguridad y salud en el trabajo (SISO), en los temas de uso de elementos de protección, Higiene postural, importancia del uso del tapabocas (Covid 19), factores de riesgo, pausas activas, primeros auxilios e identificación de peligros, triangulo de fuego, tipo de extintores, manejo de extintores, equipo de protección personas (EPP), riesgos eléctricos, cuidado del medio ambiente, ergonomía (movimientos repetitivos, posturas prolongadas), estrés laboral, fracturas de riesgo físico, prevención del consumo de alcohol, Ionizantes, radiaciones no Ionizantes, metodología de las 5 S, prevención de riesgos químicos, factores de riesgo en el área de trabajo, prevención de riesgos ergonómicos, prevención del consumo del tabaco y cigarrillo, riesgos psicosociales, riesgos locativos, riesgos en trabajos en alturas, pausas activas, posturas prolongadas mantenidas, seguridad en casa, importancia del reciclaje, trabajo en equipo.

Relación de beneficiarios que recibieron insumo material vegetal (plántulas) y herramientas para las actividades correspondiente a reforestación protectora.

ITEM	CORREGIMIENTO	PROPIETARIO	Ha	HERRAMIENTAS	PLANTULA S (1000)
1	ROMA	VIRGILIO MARTINEZ CASTILLO	1	SI	SI
2		DEINER BENITEZ LUNA	1	SI	SI
3		EDWIN BENITEZ LUNA	1	SI	SI
4	CARACOLI	JULIO FOSNSECA VARELA	1	SI	SI
5		JORGE LAMBRAÑO TORRES	1	SI	SI
6		JESUS PINEDA GARRIDO	1	SI	SI
7		OSMAN YEPES TORRES	1	SI	SI
8		BLEISYS OSPINO ARAGON	1	SI	
9	CARABAJAL	MANUEL ARRIETA ZAPATA	1	SI	SI
10		MANUEL ARRIETA DIAZ	1	SI	SI
11		JORGE LIBONATIS YEPEZ	2	SI	SI
12	SAN RAFAEL	ANGEL GUTIERREZ MENDOZA	1	SI	SI
13		EUGENIO OSPINA TERAN	1	SI	SI
14		GILBERTO VEGA ANILLO	1	SI	SI
15		ALVARO GUTIERREZ M	1	SI	SI
16		JORGE VEGA BUELVAS	1	SI	SI
17	SANTA FE	LEIDIS GAMARRA FUENTES	2	SI	SI



CARDIQUE



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

18		JORGE LAGUNA ROBLES	1	SI	SI
19		JOSE GARCIA PADILLA	1	SI	SI
20	PIEDRA AZUL	CATALINA VILLERA MESA	3	SI	SI
21		MEDARDO BALLESTAS CARDENAS.	1	SI	SI
22		DANILO BALLESTAS PULGAR	1	SI	SI
23		ENDER BALLESTAS CARDENAS	1	SI	SI
24		WILLIAM BALLESTAS C.	1	SI	SI
25		MEDARDO BALLESTAS PELUFFO	1	SI	SI
26		MEDARDO BALLESTAS PULGAR	1	SI	SI
27		LUIS MEZA RIOS	1	SI	SI
28		YANERIS BUELVAS TORRES	1	SI	SI
29		MARTA RAMIREZ PIMIENTA	1	SI	SI
30	PIEDRA AZUL	JAVIER MEDINA VITOLA	1	SI	SI
31	MALA NOCHE	LUZ ESTELA TERAN LORA	1	SI	SI
32		LUIS OCHOA MEDINA	1	SI	SI
33		NELVIS TEHERAN ANILLO	1	SI	SI
34	BAJO GRANDE	JOSE RICO SERMEÑO	2	SI	SI
35		WILDER MARTINEZ	1	SI	SI
36	SAN ISIDRO	OMAR ALVIS DIAZ	1	SI	SI
37	CARACOLICITO	GUSTAVO OSUNA CASTRO	2	SI	SI
38		JULIO TERAN CATALAN	1	SI	SI
39		RAFAEL ROQUEME PEREZ	1	SI	SI
40		OSCAR CONTRERAS OLIVO	1	SI	SI
41		REINALDO CONTRERAS OLIVO	1	SI	SI
42		ANTONIO OCHOA RIVERO	1	SI	SI
43		NEIR VEGA SALCEDO	1	SI	SI
44		LUIS PEREZ PIÑERES	1	SI	SI
45		MAIDA PIÑEREZ MARQUEZ	1	SI	SI
46		JOSE PEREZ CERPA	1	SI	SI
47		ARLEDIS ARRIETA CABRERA	1	SI	SI
48		DARWIN ARRIETA CABRERA	1	SI	SI



CARDIQUE



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

49	HOB0	YOMAR SIERRA RODRIGUEZ	1	SI	SI
50		GUILLERMO PEREZ PELUFFO	1	SI	SI
51		EDUARDO TAPIA MULETT	1	SI	SI
52		GUILLERMO MONTES ARIAS	1	SI	SI
		ARMANDO FLOREZ MILLAN	1	SI	SI
53		JEILEN GAMEZ LOPEZ	1	SI	SI
54		MARLENE MARTINEZ SIERRA	2	SI	SI
55		MARIA PEREZ MARTINEZ	1	SI	SI
56		ARLEY CABRERA PEREZ	1	SI	SI
57		JULIO SALCEDO SERPA	3	SI	SI
58	CAÑA DEL TIGRE	LUIS MEZA PEÑA	1	SI	SI
59		ANDERSON MONTES	1	SI	SI
60		JAVIER PORTO VILLARREAL	1	SI	SI
61		MARIA NAVARRO VILLEGAS	2	SI	SI
62		ARGEMIRO MARTELO M.	2	SI	SI
63	EL SALADO	VICTOR ROMERO PIMIENTA	1	SI	SI
64		CESAR MACHADO R.	3	SI	SI
65		EDUAR MEDINA VILORIA	3	SI	SI
66	SANTA RITA	IRAN COHEN REDONDO	1	SI	SI
67		SEGUNDO OVIEDO H.	2	SI	SI
68		ARMANDO TAPIAS GONZALEZ	1	SI	SI
69		OVER MARTINEZ PUERTA	1	SI	SI
70		JOSE MEZA LEGUIA	1	SI	SI
71		LUIS TORRES ESTOR	1	SI	SI
72		MANUEL MARTINEZ V.	1	SI	SI
73		TEOBALDO MEZA TAPIA	1	SI	SI
74		HARING VARGAS VASQUEZ	2	SI	SI
75		FRANCISCO VARGAS V.	2	SI	SI
76		ALEJANDRO VARGAS V.	1	SI	SI
77		FRANCISCO VASQUEZ R.	4	SI	SI
78		JUAN BERRIO SIMANCA	2	SI	SI
79		NUBIA TOBIAS DE ORTEGA	1	SI	SI



CARDIQUE



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

80		ALEXI ARIZA GAMARRA	1	SI	SI
81		CECIL VASQUEZ ROMERO	1	SI	SI
82	EL BALSAMO	PEDRO ARRIETA ALVAREZ	1	SI	SI
83		LUIS FONSECA ARRIETA	1	SI	SI
84		JORGE CAPELLA PONCE	1	SI	SI
85		WILSON OCHOA TEJADA	1	SI	SI
86		JAIR CAPELLA ORELLANO	1	SI	SI
87		ARGEMIRO CAPELLA M.	1	SI	SI
88		ALEXANDER ARRIETA TOBIAS	1	SI	SI
89			FRANCISCO DE LA HOZ	1	SI
90	EL BALSAMO	JOSE DE LA HOZ ARRIETA	2	SI	SI
91		WILFREDO MIRANDA ANILLO	1	SI	SI
92		MARYLUZ HERRERA BRIEVA	1	SI	SI
93		MARICELA MONTES TORRES	1	SI	SI
94		HECTOR NAVARRO HERRERA	2	SI	SI
TOTAL HECTAREAS 119					

Relación de beneficiarios de las 50 hectáreas adicionales del proyecto, quienes recibieron insumo material vegetal (plántulas) y herramientas para las actividades correspondiente a reforestación protectora.

ITEM	VEREDA	PROPIETARIO	Ha
1	CARACOLI	MARICELA BARRETO BAJO	1
2		YENIS E. SEÑA DE ORO	1
3		ADRIANA P. LEGUIA TERAN	1
4		ANGELICA M. DIAZ RODELO	1
5		MADY ARROYO BUELVAS	1
6		DELICA ACOSTA MONTES	1
7	VERDUM	EDWIN PATERNINA SILVA	2
8	RANCHO AZUL	ELIZABETH MARTINEZ DE AVILA	1
9		BETILDA ROJAS CARO	1
10		EDGAR ROJAS CARO	1
11		ELIS HERNANDEZ TORRES	1
12		MARLENE ALVIS CARO	1
13		HERNANDO DIAZ OCHOA	1
14		LEIDER DIAZ OCHOA	2




CARDIQUE



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

15		FERNANDO OLIVERA CAUSADO	1
16	MALA NOCHE	JAIRO JARABA MUÑOZ	1
17		ANER VELASQUEZ MEZA	1
18		PAOLA REDONDO SEÑA	1
19		WILSON HERNANDEZ ACEVEDO	2
20		EVER VARELA BUELVAS	1
21	BAJO GRANDE	ERNELIA MARTINEZ SIERRA	1
22	EL HOBO	MARLENE MARTINEZ SIERRA	1
23		JULIO SALCEDO SERPA	1
24	COLONCITO N°2	PATRICIA VALETA ROMERO	2
25		FRANCISCO MERIÑO SANDOVAL	1
26		HUGO ALFONSO ARROYO NOVOA	1
27		GUSTAVO TAPIAS TORRES	1
28		MIGUEL CAPELA CASTILLO	1
29		JORGE ELIECER RIVERA BLANCI	1
30		FARID SALAZAR MIRANDA	1
31	SANTA RITA	OVER MARTINEZ PUERTA	1
32		FLOR DIAZ TORRES	1
33		TEOBALDO MEZA TAPIAS	1
34		FRANCISCO VARGAS VASQUEZ	1
35		EDILBERTO WILCHES PEREZ	1
36		HARRING VARGAS VASQUEZ	1
37	PIEDRA AZUL	JUAN HERNANDEZ GUERRA	1
38		MEDARDO BALLESTAS CARDENAS	1
39	SAN RAFAEL	ESTHER MONTES OCHOA	3
40		EMIR GONZALES LUNA	1
41		LILIBETH GONZALEZ HERRERA	1
42		ALBEIRO MENDOZA MONTES	1
TOTAL HECTAREAS REFORESTADAS			50

Se presenta la curva S de seguimiento de avance del proyecto, donde se puede evidenciar el desarrollo de la ejecución del contrato por parte del contratista de obra INGAGROF S.A.S.

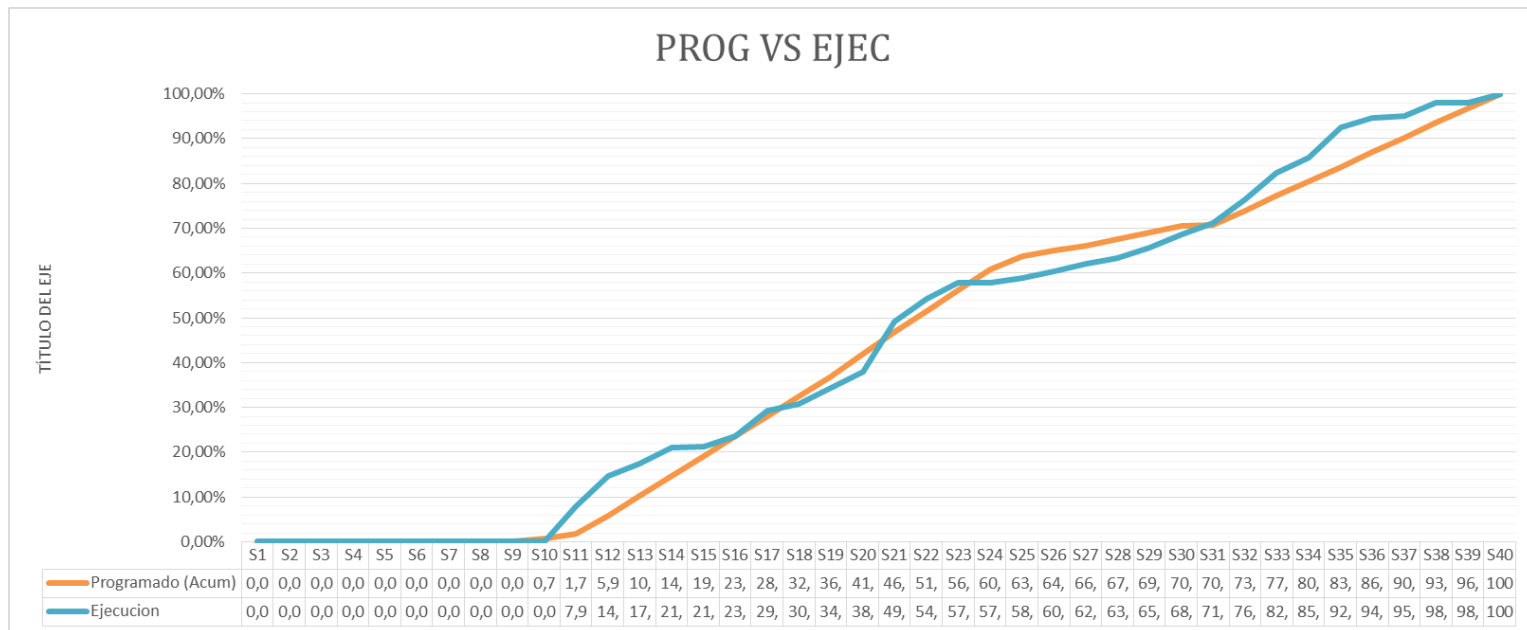

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE:	JET INGENIERÍA
TELÉFONO:	3104966577 – 3117029
DIRECCIÓN:	CARRERA 35 No. 71-138 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO.

5.1 COMPONENTE CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

5.1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

5.1.1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA:	JET INGENIERÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE

	INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 111.826.085,00),
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
NIT INTERVENTORÍA:	802.024.876-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PLAZO DE EJECUCIÓN DE SIETE (7) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Marzo de 2022
PRORROGA No 1:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de diciembre de 2022
SUPERVISIÓN:	CARDIQUE

5.1.1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PERSONAL

El personal contratado durante la ejecución de las actividades en este periodo son los siguientes:

Henry Alberto Santiago Oyuela	Director de interventoría	Uno (1)
Tandril Sander López Manjarrez	Residente de interventoría	Uno (1)
Brenda Savina Piña Acevedo	Trabajador Social	Uno (1)
Jeison David Álvarez Brito	Topógrafo	Uno (1)
Erika Patricia Jácome Montaña	Profesional SISO	Uno (1)

5.1.1.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE ESTE PERIODO

Relacion de oficios				
CODIGO	FECHA	ENVÍA	RÉCIBE	DESCRIPCION
JET.BS 001.03.22	15/03/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PREVIOS
JET.BS 002.03.22	16/03/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	PRESENTACION EQUIPO DE INTERVENTORIA
JET.BS 003.03.22	17/03/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	PRESENTACION EQUIPO DE INTERVENTORIA

JET.BS 004.03.22	31/03/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTOS PREVIOS
JET.BS 005.03.22	6/04/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZA
JET.BS 006.03.22	6/04/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS DE INTERVENTORIA
JET.BS 007.03.22	26/04/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTOS PREVIOS
JET.BS 008.03.22	26/04/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL
JET.BS 009.03.22	26/04/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	CITACION A COMITÉ DE OBRA
JET.BS 0010.03.22	30/04/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	ACLARACION DE CLAUSULA 16 CONTRATO DE OBRA
JET.BS 011.05.22	4/05/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	NOTIFICACIÓN PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA
		JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S.	
JET.BS 013.05.22	5/05/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 1
JET.BS 014.05.22	18/05/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	REITERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS
JET.BS 015.06.22	3/06/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ACTA DE COBRO PARCIAL NO 3.
JET.BS 016.06.22	14/06/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	PROGRAMACIÓN DE OBRA
JET.BS 017.06.22	30/06/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	CITACIÓN A COMITÉ DE OBRA
JET.BS 018.06.22	30/06/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	REPLAZO PROFESIONAL SST INTERVENTORIA
JET.BS 019.07.22	5/07/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S.	OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y SOLICITUDES
JET.BS 020.07.22	12/07/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
JET.BS 021.07.22	14/07/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	CITACIÓN A COMITÉ DE OBRA
JET.BS- 022.07.2022	22/08/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CONTRATISTA	Solicitud de informe mensual
JET.BS- 023.08.2022	23/08/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CONTRATISTA	Citación a comité de obra
		JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	
JET.BS 024.09.22	27/09/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL
JET.BS 025.10.22	10/10/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUD DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS

JET.BS 026.10.22	14/10/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUD DE INFORMACIÓN
JET.BS 027.10.22	18/10/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	CITACIÓN A COMITÉ DE OBRA
JET.BS 028.11.22	22/11/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	ESTADO DEL PROYECTO
JET.BS 029.11.22	30/11/2022	JET INGENIERIA S.A.S	CARDIQUE	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO
JET.BS 030.12.22	13/12/2022	JET INGENIERIA S.A.S	INGAGROF S.A.S	SOLICITUDES VARIAS

Anexo 5. Correspondencia enviada.

5.1.2. COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo a la forma de pago establecida para el contrato de interventoría.

JET INGENIERIA S.A.S	
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”
VALOR INCIAL DEL PROYECTO	\$ 111.826.085,00
ADICIÓN NO 1	\$ 31.950.310,00
RECURSOS:	CARDIQUE
FORMA DE PAGO	La entidad pagara al contratista con pagos parciales mensuales hasta un máximo acumulado del 80% del valor del contrato

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Valor total contrato de obra			\$ 143.776.395		100%	
Anticipo (30%)			N/A		0%	
Concepto	Valor facturado	%	Amortización y descuentos	%	Valor neto recibido	Estado
Acta parcial No. 1	\$ 15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$ 15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 2	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 3	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 4	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 5	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 6	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,00	Pagada
Acta parcial No. 7	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A		Trámite
Acta final.	\$ 31.950.310,00	22.22 %	N/A	N/A		Trámite
TOTAL	\$ 143.776.395	100 %	-	-	\$ 95.850.930,00	

5.1.3. COMPONENTE JURIDICO

El contrato de interventoría No. CMA – CARDIQUE – 001-2022 fue legalizado mediante aprobación de las pólizas.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	03/03/2022	03/03/2023	\$22.365.217	Compañía Mundial de Seguros S.A. Nº: CRC-100007568
Prestaciones sociales legales	03/03/2022	03/10/2025	\$5.591.304	
Calidad del servicio	03/03/2022	03/10/2023	\$ 16.773.912	

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal según acta modificativa N° 01

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	24/03/2022	23/03/2023	\$28.755.279	Compañía Mundial de Seguros S.A. Nº: CRC-100007568
Prestaciones sociales legales	24/03/2022	23/10/2025	\$7.188.819,75	
Calidad del servicio	24/03/2022	23/10/2023	\$ 21.566.459,25	

5.1.4. COMPONENTE TÉCNICO

En este periodo se realizaron actividades técnicas por parte del contratista INGAGROF S.A.S.

- Plan de establecimiento forestal
- Cronograma de actividades
- Visitas previas de sitios a intervenir
- Registros de datos de campo
- Actas de concertación, Georreferenciación de áreas a intervenir
- Plan de establecimiento y manejo forestal (PEMF)
- Verificación de certificación de vivero
- Inicio de verificación de encerramiento de predios
- Aislamiento parcial de terreno
- Limpia parcial de terreno
- Trazado y ahoyado parcial
- Plateo y siembra parcial
- Siembra
- Resiembra
- Limpia
- Plateo
- Resiembra
- Fertilización
- Control Fitosanitario

5.1.5. COMPONENTE SST

El personal especializado en seguridad y salud en el trabajo se encuentra en revisión de los documentos entregados por el contratista en donde incluye, Plan de bioseguridad contra el contra Covid-19 y el informe de Seguridad y salud en el trabajo. (**Ver Anexo 2.** Informe SST de interventoría)

5.1.6. COMPONENTE SOCIAL

Se realizó el acompañamiento para el cierre social con el contratista INGAGROF S.A.S. y en las actividades complementarias de este componente. (**Ver Anexo No. 3** Informe Social de Interventoría)

6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo se presentaron fenómenos atmosféricos como fueron los fuertes veranos e intensos inviernos con lluvias torrenciales, y frecuentes durante el día, vientos y tormentas eléctricas lo cual dificultó la salida a campo para el desarrollo de las actividades programadas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda seguir el plan de manejo fitosanitario recomendado por el contratista (fertilización y control de malezas), para garantizar el normal desarrollo y crecimiento de las plantas ya establecidas, y garantizar el normal desarrollo de los cultivos maderables.
- Se recomienda hacer seguimientos periódicos a la entidad contratante con los diferentes equipos de apoyo como la unidad municipal de asistencia técnica de El Carmen de Bolívar con la finalidad de mantener el trabajo realizado.
- Se logró cumplir con el objeto contractual de manera eficiente, reforestando un total de 169 hectáreas en el Municipio de El Carmen de Bolívar y veredas adyacentes.

Cordialmente,

TANDRIL SANDER LOPEZ MANJARREZ
Ingeniero Forestal De Interventoría
JET INGENIERIA S.A.S.

HENRY ALBERTO SANTIAGO OYUELA
Director de Interventoría
JET INGENIERIA S.A.S.

8. ANEXOS

- Anexo 1. Registro fotográfico
- Anexo 2. Informe Siso de Interventoría
- Anexo 3. Informe Social de Interventoría
- Anexo 4. Correspondencia enviada y recibida

ANEXO No. 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Socialización del proyecto, Verificación de plántulas en vivero.





Entrega de material vegetal (plantulas) y herramientas, siembra de plantulas y aislamiento de lotes.





Revisión, Monitoreo y Seguimiento a material vegetal sembrado (plántulas)





JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8





cargue y descargue de material vegetal en puntos de acopio.









JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8





JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8



ANEXO No. 2

INFORME SOCIAL

"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE"

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. LP CARDIQUE - 003-2021**

INFORME SOCIAL FINAL

" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE".

**JET INGENIERÍA S.A.S
NIT: 802.024.876-8**

Gestión Social

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO DEL PROYECTO	5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	7
4. GESTION SOCIAL	9
4.1 PROGRAMA DE DIVULGACION ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	9
<i>Actividades ejecutadas durante el desarrollo de la obra</i>	10
4.2 ACTAS DE VECINDAD	15
4.3 PROGRAMA VINCULACION LABORAL	15
5. CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.

JETing.

1. INTRODUCCIÓN

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, identificada con N.I.T. N° 800.254.453-5 a través de la licitación pública No. **LP-003-2021**, por una parte; y por la otra INGAGROF S.A.S. identificado con N.I.T. N° 900.574.589-3.

La interventoría del proyecto por parte de **JET INGENIERÍA S.A.S.**, representado legalmente por JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, a quién se adjudicó el proyecto que tiene por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”**.

Producto de los procesos anteriores se genera el presente informe donde se evidencian los avances, efectividad y cumplimiento de las actividades Sociales necesarias para el buen desarrollo del proyecto en mención, de igual forma se describen los programas mencionados a continuación y establecidos dentro del Plan de Gestión Social establecidos para la implementación de estrategias de acompañamiento continuo con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

Programas del Plan de Gestión Social a implementar:

- Programa de divulgación, atención y participación comunitaria
- Actas de vecindad
- Vinculación laboral.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

- El objetivo general del contrato de obra pública No. LP-003-2021, es realizar la Restauración de ecosistemas de Bosque Secos y Bosques con Especies Nativas que favorezcan la polinización en áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La Región de los Montes de María, es de gran importancia ambiental para el departamento de Bolívar y su Ecosistema de Bosque seco tropical, está siendo alterado por factores como la ganadería, la expansión de la frontera agrícola, incendios forestales, tala y raza de bosques. Estas zonas han sido intervenidas por la acción del hombre y aún se encuentran relictos de bosques, asociados con rastrojos altos y áreas para cultivos. Las prácticas de manejo y la intensidad con que se realizan estas actividades, son causales de procesos de erosión y pérdida de fauna y flora. Las pendientes altas, los procesos de erosión, los suelos superficiales, las fuertes y continuas lluvias y la inestabilidad del terreno repercuten en mayor o menor grado en las poblaciones.

La ocupación de las zonas altas de montaña para el establecimiento de actividades agropecuarias ha estado acompañada, por deforestación que ha incidido de manera negativa sobre la función de retención de agua, cuya pérdida lo deja expuesto a fenómenos de erosión y sedimentación que alteran los flujos hídricos de las cuencas. Los Montes de María, son áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE, son ecosistemas estratégicos, que es necesario proteger y conservar para permitir el flujo de fauna del corredor biológico.

En El Carmen de Bolívar, hay la necesidad de iniciar los procesos de rehabilitación ecológica en áreas degradadas, en bosques y arbustos secos en las áreas rurales ubicadas en jurisdicción del Municipio e identificadas como prioritarias, conforme a la zonificación ambiental y forestal de CARDIQUE.

CARDIQUE, dentro de su plan de acción (PAI) 2020-2023, y plan nacional de desarrollo forestal incluyó la acción operativa **“RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS TROPICAL – BST (RONDAS HIDRICAS, ZONAS DE RECARGA DE ACUIFEROS, NACEDEROS DE AGUA, CORREDORES DE CONECTIVIDAD SOCIECOSISTEMICOS, AREAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACION Y AREAS ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS)”**, una de sus metas prioritarias es la reforestación o restauración de áreas que se han visto afectadas por la realización de proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, la ampliación de áreas para ganadería extensiva en áreas de vocación forestal, la explotación mineral a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no sostenibles.

En Municipio de El Carmen de Bolívar, la apicultura se ha visto afectada por los efectos del cambio climático global y sumado a la tala de árboles para actividad agrícola, ganadería, minería, obras de ampliación de la carretera troncal de Occidente, y de regreso a los campesinos a la zona rural, ha conllevado a que la población de abejas disminuya y el rendimiento de la producción de miel por

colmena, estas condiciones de deforestación han afectado la estabilidad de las abejas ocasionando la enjambrazón de estas hacia zonas donde tengan mejores condiciones ambientales.

Al ejecutar el proyecto se establecerá modelos de RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION ECOLOGICA, Y APOYO A PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS, en 119 hectáreas de aptitud ambiental y forestal priorizados en las diferentes zonas rurales en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar y vincular a las comunidades de la zona en actividades de rehabilitación ecológica, siembra de especies nativas atrayentes de polinizadores y dispersores de semilla.

En El Municipio de Carmen De Bolívar, las veredas Padula y Verdum, y el corregimiento el salado requiere la contratación de una firma de interventoría que realice las labores de vigilancia y control del objeto del contrato mencionados a continuación: **"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE"**, por lo que la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

Se requiere "realizar la vigilancia y control" a través de figuras como la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"**, y la supervisión, para que se desarrolle esta función de vigilancia y control en los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución del contrato descrito.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localizará en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.



Ilustración 1. Localización del departamento Bolívar.

El **Carmen De Bolívar** es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, ubicado en el sistema orográfico de los Montes de María (Coordenadas: 9°43'06"N 75°07'21"O/ 9.7183333333333, -75.1225) con una superficie de territorio de 934 km².


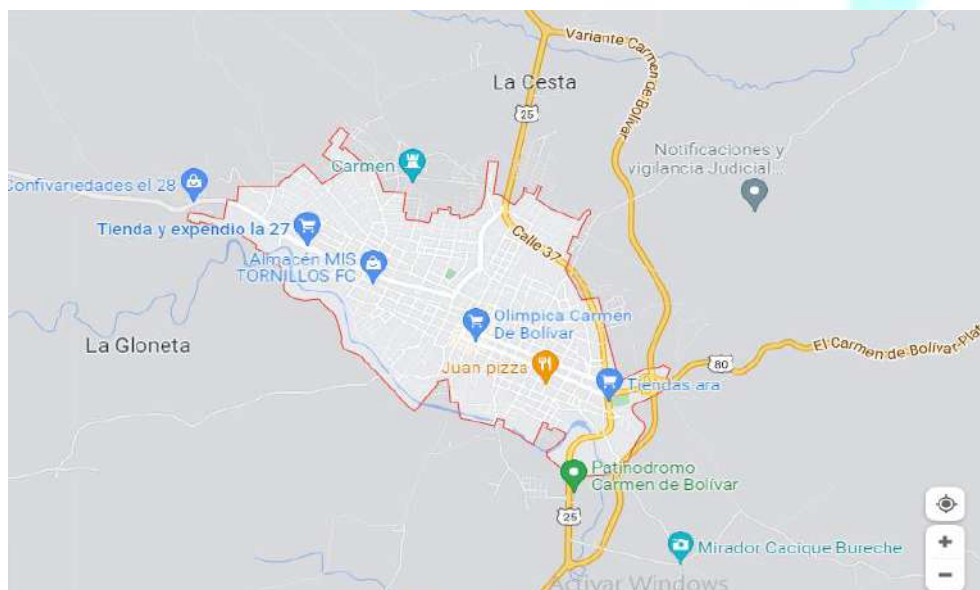


Ilustración 2. Localización del municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar.


Zona Seleccionada No 1
Corregimiento del Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar



Zona Seleccionada No 2
Vereda Verdun Municipio de El Carmen de Bolívar

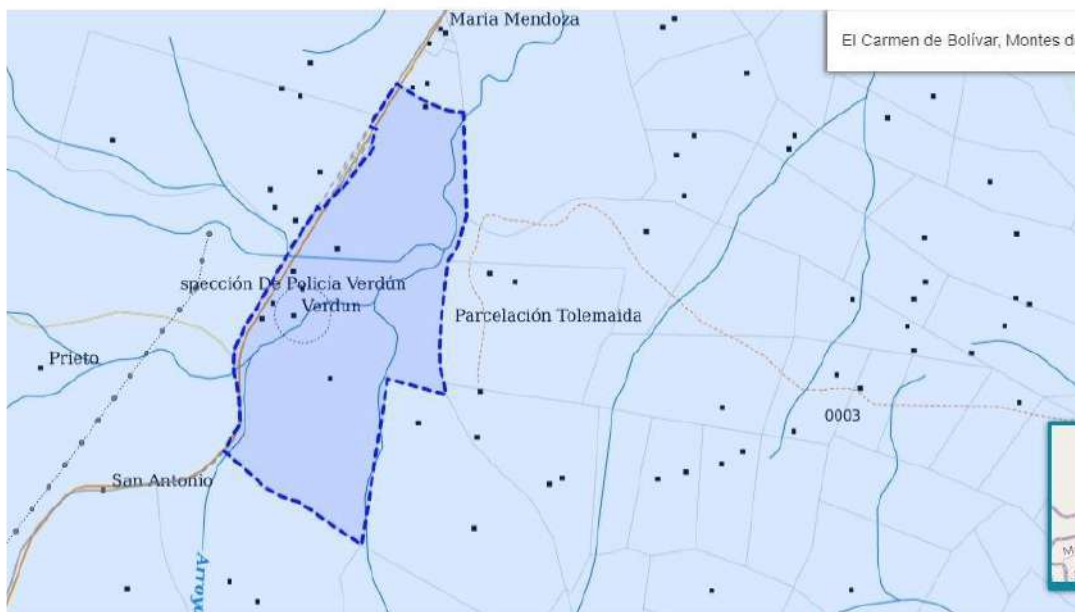

Zona Seleccionada No 2
Vereda Padúla Municipio de El Carmen de Bolívar

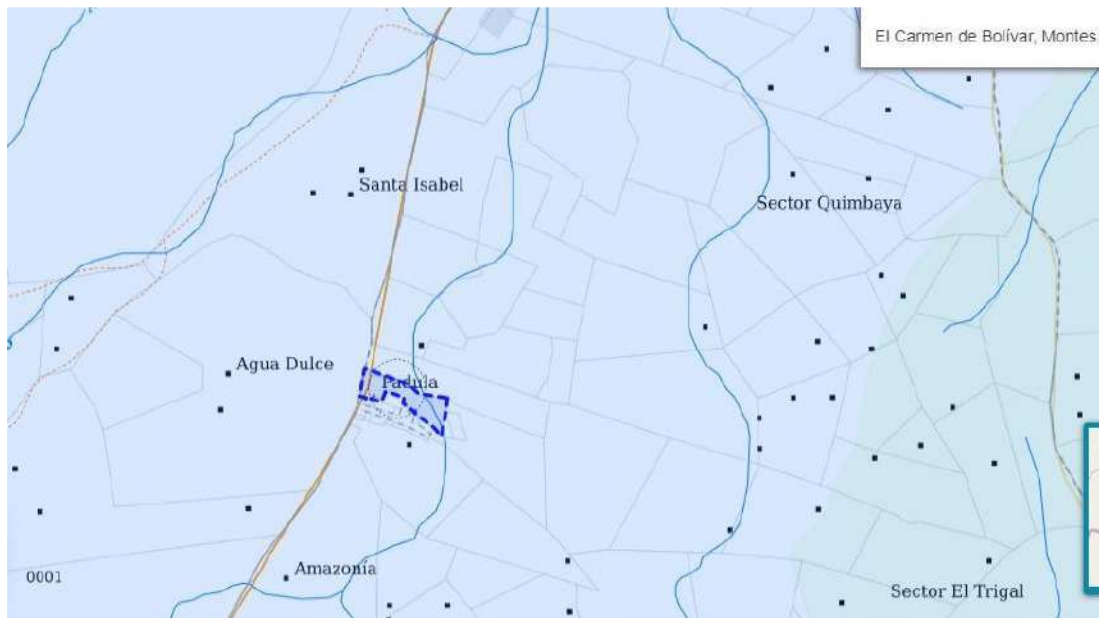

El Carmen de Bolívar es un Municipio del departamento de Bolívar ubicado a 114 kms al sudeste de Cartagena de Indias y en el centro de la subregión Montes de María del departamento. Es considerado el municipio de mayor extensión de esa subregión, cuenta con una superficie territorial de 93.400 hectáreas.

El municipio de El Carmen de Bolívar limita por el norte con el municipio de San Jacinto (Bolívar); por el sur con los municipios de Chalán y Ovejas (Sucre), por el este con los municipios de Zambrano y Córdoba (Bolívar) y por el oeste con los municipios de María La Baja (Bolívar) y Ricaurte -Coloso- y San Onofre (Sucre).

4. GESTION SOCIAL

4.1 PROGRAMA DE DIVULGACION ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Es importante que la población del área de influencia directa e indirecta se encuentre bien informada sobre la construcción, avance de la obra y su posterior operación. La falta de información genera especulación, por lo que se hace necesario diseñar estrategias donde se emplearán diferentes espacios y medios de comunicación, para permitir la difusión de una información clara y precisa acerca del proyecto entre los diferentes actores.

La información y la participación son elementos indispensables para generar sentido de pertenencia, por parte de las comunidades del área de influencia del proyecto, por lo tanto, el programa formula y desarrolla estrategias de comunicación que promueven los procesos de información y diálogo social,

centrándose en fortalecer las relaciones de los grupos de interés (líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, comunidades aledañas y diferentes actores directos e indirectos) del proyecto, posicionar la imagen del proyecto y la contratista.

En lo que respecta a la atención y participación comunitaria el objetivo es darle seguimiento a cada una de las actividades a ejecutarse de la mano de la comunidad, la contratista debe conformar un comité de veedurías el cual debe velar y acompañar los procesos en los que la comunidad sea directamente relacionado.

Actividades ejecutadas durante el desarrollo de la obra

Divulgación, atención y participación comunitaria		
Item	Actividad	Observación
01	Socialización del proyecto	
02	Veeduría ciudadana	
03	Capacitaciones	El área de gestión social en apoyo del área ambiental y SST desarrollo seis talleres de capacitaciones a los miembros beneficiarios del proyecto y personal del área de influencia del mismo.
04	Atención a la comunidad	Se realizaron recorridos en presencia de interventoría, contratista y comunidad del área de influencia con el propósito de hacer reconocimiento de manifestaciones ciudadanas.

Registro fotográfico:



Imagen 1 socialización y divulgación



Imagen 2 Atención a la comunidad



Imagen 3 Capacitaciones

A continuación, se enlista el grupo de beneficiarios del proyecto:

Beneficiarios del Proyecto						
PREDIO	PROPIETARIO	CEDULA	TELEFONO	Ha	COORDENADAS	
					N	W
CARACOLÍ						
VILLA ELIZABETH	MARICELA BARRETO BAJO	45.583.931	3135194813	1	09° 43´ 50.4"	075° 12´ 34.4"
DURA POCO	YENIS SEÑAS DE ORO	22.521.150	3128549108	1	09° 43´ 33.5"	075° 12´ 34.4"
VILLA PAOLA	ADRIANA LEGUIA TERAN	45.646.827	3114207451	1	09° 44´ 18.8"	075° 13´ 35.7"
VILLA PAOLA	ANGELICA DIAZ RODELO	45.581.454	3145037828	1	09° 44´ 20.5"	075° 13´ 32.8"
VILLA VICTORIA	MADY AROYO DE BUELVAS	33.278.575	3214338631	1	09° 43´ 54.7"	075° 11´ 07.7"
LA ESPERANZA	DELIKA ACOSTA MONTES	39.491.867	3107168036	1	09° 43´ 39.1"	075° 12´ 36.8"
TOTAL				6		
VERDUN						
LA ESPERANZA	EDWIN PATERNINA SILVA	73.551.052	3006184407	2	09° 38´ 45"	075° 08´ 05"
TOTAL				2		
RANCHO AZUL						
LA BENDICION DE DIOS	ELIZABETH MARTINEZ DEAVILA	1.052.079.134	3016175661	1	09° 45´28.8"	075° 07´ 54.0"
VILLA ISABEL	BETILDA ROJAS CARO	23.089.744	3135553655	1	09° 45´07.6"	075° 07´ 45.9"
LA BENDICION	EDGAR ACOSTA MERCADO	73.431.294	3203380486	1	09° 45´13.5"	075° 07´40.7"
LOS RECUERDOS	ELIS HERNANDEZ TORRES	45.579.795	3205118025	1	09° 45´19.06"	075° 07´49.4"



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

LOS NARANJALES	MARLENE ALVIS CARO	45.584.672	3205865261	1	09° 45'14.5"	075° 07'46.3"
AVANCEMOS	HERNANDO DIAZ OCHOA	9.105.177	3216908783	1	09° 44'57.8"	075° 07'365.3"
MIRAMAR	LEIDER DIAZ OCHOA	1.052.976.643	3126667875	2	09° 45'03.3"	075° 07'39.3"
LA DIVISA	FERNANDO OLIVERA CAUSADO	73.434.896	3143322605	1	09° 45'12.1"	075° 08'19.9"
TOTAL				9		

MALA NOCHE						
EL INICIO	JAIRO JARABA MUÑOZ	73.550.269	3205190926	1	09° 44'13.8"	075° 06'47.7"
LA CANDELARIA	ANER VELAZQUEZ MEZA	73.552.630	3135879672	1	09° 45'28.1"	075° 06'21.6"
VILLA CARMEN	PAOLA REDONDO SEÑAS	45.649.378	3107582426	1	09° 45'40.8"	075° 06'37.4"
EL PROGRESO	WILSON HERNANDEZ ACEVEDO	78.034.305	3133907611	2	09° 45'29.4"	075° 06'16.8"
VILLANUEVA	EVER VARELA BUELVAS	73.150.169	3204475362	1	09° 45' 21.5"	075° 06'27.6"
TOTAL				6		

BAJO GRANDE						
VILLA ESPERANZA	ERNELIA RIVERA CARDENAS	22.905.273	3135639185	1	09° 41'11.2"	075° 13'23.7"
TOTAL				1		

EL HOBO						
LA ESPERANZA	MARLENE MARTINEZ SIERRA	45.578.636	3137839430	1	09° 40'21.3"	075° 14'18.8"
EL ESPEJO	JULIO SALCEDO SERPA	9.112.718	3105324034	2	09° 39'58.3"	075° 15'18.3"
TOTAL				3		

COLONCITO N° 2						
LA PRADERA	PATRICIA VALETA ROMERO	64.479.465	3147807357	2	09° 46'29.4"	075° 08'55.9"
MIRA PA EL PUEBLO	FRANCISCO MERIÑO SANDOVAL	73.551.239	3136488492	1	09° 42' 00.9"	075° 06'14.3"
LOS GUAYABOS	HUGO ARROYO NOVOA	9.105.195	3115640518	1	09° 42' 01.0"	075° 06'29.6"
LOS GUAYABOS	GUSTAVO TAPIAS TORRES	73.431.545	3204510059	1	09° 42' 00.7"	075° 06'42.2"
EL AMPARO	MIGUEL CAPELA CASTILLO	9.106.409	3126485554	1	09° 42' 25.7"	075° 06'31.6"
LA ENTRADA	JORGE ELIECER RIVERA BLANCO	73.544.191	3217451822	1	09° 41'58.2"	075° 06'16.3"
LA ESQUINITA	FARID SALAZAR MIRANDA	73.429.894	3012158240	1	09° 42'03.4"	075° 06'24.1"
TOTAL				8		

SANTA RITA						
VILLA MARTA	OVER MARTINEZ PUERTA	73.566.459	3145476510	1	09° 39'47.7"	075° 06'11.3"
LA BENDICION	FLOR MARIA DIAZ TORRES	45.583.186	3007428204	1	09° 41' 40.6"	075° 06'26.6"
GALLO FINO	TEOBALDO MEZA TAPIAS	73.551.650	3013765613	1	09° 40'08.3"	075° 06'29.7"
VILLAVICENCIO	FRANCISCO VARGAS VASQUEZ	73.550.441	3145168714	1	09° 40'11.6"	075° 05'48.7"

LAS MARIAS	EDILBERTO WILCHES PEREZ	73.548.431	3205384807	2	09° 40'15"	075° 05'26"
VILLAVICENCIO	HARING VARGAS VASQUEZ	73.550.434	3115106257	1	09° 40'02.8"	075° 05'51.8"
TOTAL				7		

PIEDRA AZUL						
VILLA MARTA	JUAN HERNANDEZ GUERRA	70.522.081	3127352135	1	09° 44' 45.5"	075° 08' 11.1"
LA QUEBRADA	MEDARDO BALLESTAS CARDENAS	73.430.891	3203991717	1	09° 44' 42.5"	075° 08' 13.1"
TOTAL				2		
SAN RAFAEL						
BELLA LUZ	ESTHER JUDITH MONTES OCHOA	45.576.360	3137310650	3	09° 43' 05.6"	075° 00' 51.7"
VILLA ROSIRIS	EMIR GONZALEZ LUNA	73.429.814	3107035280	1	09° 43' 04.1"	075° 02' 22.8"
VILLA LUZ	LILIBETH GONZALEZ HERRERA	45.649.346	3004868224	1	09° 43' 06.1"	075° 00' 52.2"
LA BELLEZA	ALBEIRO MEDINA MONTES	73.434.070	3108295852	1	09° 43' 03.7"	075° 00' 49.2"
TOTAL				6		
TOTAL HECTAREAS SELECCIONADAS				50		

Registro fotográfico





Imagen 4 beneficiarios del proyecto

4.2 ACTAS DE VECINDAD

Los Levantamientos de actas de vecindad han sido instaurados dentro de la fase inicial del proyecto como una medida preventiva al momento de llevar a cabo la ejecución del proyecto, con el fin de valorar el estado actual en el que se encuentran las viviendas. La actividad de levantamiento de actas de vecindad fue dirigida por el profesional social del contratista y bajo la supervisión de la interventoría.

Desde el programa se da acompañamiento social a las actividades requeridas por el área de Gestión Predial, durante diferentes escenarios de intervención, en el cual se da seguimiento al estado de viviendas, predios o áreas antes durante y después de la intervención para el desarrollo del contrato y de espacios informativos previo a la ejecución de las obras, particularmente cuando se requiere levantamiento de actas de vecindad.

Actividades ejecutadas

El desarrollo de este contrato no contempló la ejecución de actas de vecindad, ya que la zona del área de influencia no lo requirió.

4.3 PROGRAMA VINCULACION LABORAL

Dentro de la contratación de la mano de obra, se busca vincular la población local en las actividades de construcción como una manera de mitigar el impacto de la obra.

En el proceso de contratación de mano de obra se deberá dar cumplimiento al marco jurídico colombiano sobre la generación de empleo, particularmente la Ley 636 de 2013, el Decreto 1072 de 2015, compilatorio de las normas del sector trabajo, y las leyes 823 de 2003 y 1496 de 2011 y aquellas

que las complementen, modifiquen o sustituyan. En particular es necesario tener en cuenta la implementación del sistema público de empleo en el área del proyecto.

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es necesario que se dio prioridad a la mano de obra, calificada y no calificada, del área de influencia del proyecto.

Actividades ejecutadas

A continuación, se relacionan los integrantes o empleados vinculados a la obra durante su desarrollo:

Contratación Mano de obra			
CARMEN DE BOLIVAR			
ITEM	NOMBRE	CEDULA	TELÉFONO
01	VIRGILIO MARTINEZ CASTILLO	8.729.423	3229228041
02	DEINER BENITEZ LUNA	73.435.465	3106577368
03	EDWIN BENITEZ LUNA	73.552.402	3135407795
04	ANGEL GUTIERREZ MENDOZA	73.543.937	3216972344
05	EUGENIO OSPINA TERAN	73.543.031	3146257813
06	GILBERTO VEGA ANILLO	73.546.889	3126490947
07	ALVARO GUTIERREZ M	73.548.144	3107187130
08	JORGE VEGA BUELVAS	73.550.366	3006468649
09	JORGE LAGUNA ROBLES	9.114.457	3135385813
10	JOSE GARCIA PADILLA	1.047.423.782	3008179107
11	ALVARO DIAZ PEREZ	73.434.088	3004790752

A continuación, se anexa el registro fotográfico del personal de MONC en ejecución de sus actividades en este caso específico en la preparación del terreno en el cual se hicieron las labores de limpieza de forma manual en un área total de 60 hectáreas, en las que se establecieron las restauraciones.

Registro Fotográfico



Imagen 5 vinculación laboral

Productos generados:

Lista de socialización

Acta de veeduría ciudadana

Capacitaciones

ANEXOS



Ingenieros Agroforestales
NIT: 9005745893

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATO No. LP - CARDIQUE - 002 - 2021, Objeto: RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE.

TEMA: Socialización Contrato LP - CARDIQUE -- 003 - 2021

LUGAR: Cruz Roja - El Carmen de Bolívar FECHA: 6 / 04 / 2022

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
1	Martha Judith	Ramirez Pimental	45.645.076	Martha Ramirez
2	Yaneis	Buelvas Torres	1.052.072.385	Yaneis Buelvas
3	Luz Esthela	Teran Toro	45.645.939	Luz Teran Toro
4	Melvis Mayibis	Teheran Arillo	45.584.398	Melvis Teheran
5	Mirlen Milena	Rivera Luna	1.052.076.133	Mirlen Rivera
6	Sandra Marcela	Vargas Montes	1.052.081.793	Sandra Varga
7	Ruben Dario	Obando Franceschi	1.067.891.318	Ruben Obando
8	Leidis Licet	Camara Fuentes	45.583.340	Leidis Camara
9	Enda Segundo	Ballesteras Cardenas	73.544.067	Enda Ballester

CL 10 KM 2 Via Ura Tierralla, Córdoba, Colombia
320611372 3114277810-32051110562-3126211031
Ingaagro5es2012@gmail.com - gerencia@ingagro.com.co



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
10	Davilo José	Ballestas Polgar	1.052.088.506.	x Danilo
11	Medardo Rafael	Ballestas Polgar	1.007.245.000	x Medardo
12	Dalciris	Rico Ballestas.	1.002.344.929	x Dalciris Rico
13	Sindy Isabel	Montes del Toro	1.052.077.550	x Sindy Montes
14	Kelis Johana	Cantillo Olivera	1.052.083.765	x Kelis cantillo
15	Argemiro Rafael	Martelo Montes	9.107.544	x Argemiro
16	Enik Daniel	Bolivarquez Yepez.	1.052.066.582	x Enik Bolivarquez
17	William	Ballestas Cardenas	73.546.756	x William Ballestas.e
18	Manuel Alejandro	Arrieta Zapata	1.052.097.081	x Manuel Alejandro Arrieta
19	Davilo José	Ballestas Cardenas	73.544.948	x Davilo BALLESTAS
20	Edwin	Beutetz Lora	73.552.402	x Edwin
21	Manuel Antonio	Arrieta Diaz.	9.172.689	x Manuel Arrieta
22	Javier Antonio	Medina Vitola.	73.433.191	x Javier
23	Rosiris Maria	Diaz Perez	45.582.891.	x Rosiris Diaz Perez



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8



Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
24	Ingrid Yaneth	Hernandez Diaz	1073.825.734	Ingrid Hernandez
25	Estadís Rafael	Ovalle Dominguez	73.431.571.	Estadís Dominguez
26	Enicela Judith.	Pomero Mercado	45.645.501	Enicela Pomero.
27	Adrian	Ortiz Luna	73.552.198	Adrian Ortiz
28	Omair Enrique	Alvis Diaz.	1.052.075.491	Omair ALVIS
29	Rafael Antonio.	Meza Almeida	73.434.300	Rafael Meza
30	Victor Ramiro	Pomero Pimiento	9113.363	Pomero Pimiento
31	Angel	Gutiérrez Muelba	73.543.937.	Angel Gutierrez
32	Eugenio Alfonso	Aspina Teran	73.543.031.	
33	Gilberto	Vega Avillo.	73.546.889	Gilberto Vega
34	Alvaro José	Gutiérrez Mendoza	73.548.144	Alvaro Gutierrez
35	Medardo Rafael	Ballestas Corderas	73.430.891	Medardo Ballestas
36	Jorge Luis	Lagoa Robles	9.114.457.	Jorge Lagoa
37	HERNAN A. PEÑERA P.	Supervisor CARDIAS	14 396 498.	Hernan A. Peñera

CL 10 KM 2 Via Urra Tierrita, Córdoba, Colombia
3206111372 3114277810-32051110562-3126211031
Ingagrofsas2012@gmail.com - gerencia@ingagrof.com.co



Ingenieros Agroforestales
NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
38	Abel Thom Tom	Ariza-Lobos	78561216	Abel Tom
39	Tanvil S.	Copez Mangano	28244522	Tanvil S.
40	Robert Herz Lugo	Umeda	73548200	Robert Herz Lugo
41	José Tomás	García Padilla	1047423782	José Tomás
42	María Farieta Carmona	UHATA	1052094720	María Farieta Carmona
43	Apolinar Redondo Pérez	CARDIQUE	73546584	Apolinar Redondo Pérez
44	Edimar	Rodriguez Garcia	9267-341	Edimar
45	SES Sosaola	CHAMARTE	4139854	SES Sosaola
46	Naver Daniel	Lombardo Pineda	1052072287	Naver Daniel
47	José A. Muros Lora	Muros Lora	73429.897	José A. Muros Lora



Ingenieros Agroforestales
NIT: 9005745893

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATO No. LP - CARDIQUE - 002 - 2021, Objeto: RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE.

TEMA: Socialización Contrato LP-CARDIQUE-003-2021.

LUGAR: Salón Comunal - Cgto El Salado FECHA: 20/04/2022

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
1	Jose Luis Saverio	Cardique	14139854	Jose S.
2	David Alberto	Montes Castro	1.047.217.059	David Montes
3	Maria Margarita	Mena festrejo	1.052.092.882	Maria H. Mena
4	Alejandra Lomiva	Torres Cabrera	1.052.085.425	Alexandro Torres
5	Mabel Judith	Torres Montes	45.646.216	Nohel Torres
6	Javier Alfonso	Montes Castro	73.433.802	Javier Montes
7	Alexi Alexander	Ariño Gamarras	73.433.329	Alexi Ariño
8	Julio Cesar	Herrera Parra	73.549.515	No firma
9	Cesar Augusto	Maduro Rodriguez	79.684.166	Cesar

CL 10 KM 2 Via Urra Tierra, Córdoba, Colombia
320611372 3114277810-3205110562-3126211031
ingagrofas2012@gmail.com - gerencia@ingagrof.com.co



Ingenieros Agroforestales
NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
10	Levis	Daraba Arrieta	1 005 440 339	Levis Arrieta
11	Manuel del Cristo	Chauarino Ponce	3 831 816	Manuel Chauarino Ponce
12	Jaime Alfonso	Cohen Lopez	9 110 121	Jaime Cohen
13	Elisabeth	Narvaez Rodriguez	1101815679	Elisabeth Narvaez
14	Jader Alfonso	Mena Angarita	73 430 906	Jader Mena
15	Nairo José	Catalán Gracia	73 434 408	Nairo Catalán
16	Xavier Enrique	Mena Angarita	92546353	Xavier Mena
17	Juan Alfonso	Cohen Navarro	3 861 123	Juan Cohen
18	Luis Omar	Ortega Niño	8 853 502	Luis Ortega
19	Juan Gustavo	Cohen Redondo	8 498 306	Juan Cohen
20	Manuel del Cristo	Chauarino Figueroa	1007.139.206	Manuel Chauarino
21	Eusebia	Castro Suarez	45 580 192	Eusebia Castro
22	Elvia Rosa	Badel Beltrán	33 202 331	Elvia Badel
23	Irene	Niño Cortez	27 594 200	Irene Niño



Ingenieros Agroforestales
NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
24	Apelino Roberto Pérez	CARDIQUE	7356596	Roberto P.
25	José Antonio Montes López		73420847	José A. López
26	Trinidad López	Alfonsina	78744525	T. López
27	Molys Judith	Benavidez Tordocillo	1.052.081.832	Molys Benavidez
28	José Enrique	Medina Ponce	73.184.634	José Enrique P.
29	Nauel David	Andrés Pineda	1052.072.287	Nauel David
30	Andrés Felipe	Andrés Pineda	100344861	Andrés P.
31.	Jaime Rico	Rico Rivera	1002441583	Jaime Rico



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de El Carmen de Bolívar el día **06** del mes **Abril** de 2022, se reunieron miembros de la autoridad Municipal, director de UMATA, funcionarios de CARDIQUE, Asociaciones productoras apícolas, líderes comunales, miembros de las comunidades, y equipo contratista Con el objeto de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores(as) del CONTRATO No. LP-CARDIQUE-003-2021 cuyo OBJETO es: "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE a los siguientes ciudadanos(as), según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección y Teléfono	ENTIDAD
Andrés Navarro Herrer	92534564	B. Hato Gomez 310 6920071	
Leidis Gamero Fuentes	415583310	Maritón Culla Principal 3215507310	COOP. MARI
Jaime Rico Rivera	1002441553	Ojo Grande C/11 Principal 316 6748174	Asproaceb
Diner Benitez Luna	73435455	Boma 310 6577368	COOP. MARI
Jose Riu Simeño	3860731	bajo grande 3205233932	Asproaceb
Francisco Vazquez R	3832601	Sta Rita 32825116	



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Dirección y Teléfono	ENTIDAD
Argemiro manrelo m	9107544	POZA OSCURA 313594424	Amor y Paz
Luis Pérez	1052088486	3204120088 Carr. El Hoyo	Luis Pérez

SEGUNDO: La veeduría se denominará "VEEDURIA FORESTAL 2022", estará domiciliada en El Municipio de El Carmen de Bolívar y tendrá una duración de 07 Meses.

Los asistentes a la Reunión aprueban esta designación y se aporta la Planilla de asistencia como aval de esta acta, debido a que fue en el acto de este ejercicio que se conformó la veeduría.

TERCERO: El grupo de veedores(as) elige democráticamente como su coordinador(a) o presidente(a) a Jaime Rico Rivera y como secretario(a) a Leidis Licet Samana F.

CUARTO: El grupo de control social se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la comunidad. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

QUINTO: los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

FIRMAS

Nombre y apellidos	C.C.	FIRMA
Jaime Rico Rivera	192 574 584	Jaime Rico R.
Leidis Licet Samana F.	45.583.310	Leidis Samana F.
Jaime Rico Rivera	1002441593	Jaime Rico R.



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nombre y apellidos	C.C.	FIRMA
Diana Barrios Luna	73435465	<i>[Firma]</i>
Jose Rico Serrano	3860731	<i>[Firma]</i>
Francisco Valdez Romero	3832601	<i>[Firma]</i>
Argemiro martelo m.	9107544	<i>[Firma]</i>
Luis Pérez Pineros	1052088486	<i>[Firma]</i>

Dada en el Municipio de El Carmen de Bolívar a los 06 días del mes de Abril del año 2022.

INGAGROF
INGENIEROS AGROFORESTALES S.A.S.



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATO No. LP-CARDIQUE-003-2021, cuyo objeto es "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE."

TEMA: El Cambio Climático y su afectación a las poblaciones apícolas

LUGAR: El Carmen de Bolívar. FECHA: 19/08/2022.

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
1	Edwin Buitrago Luna		73552402	Edwin Buitrago
2	Daniel	Buitrago	73435465	Daniel
3	Faustino Antonio	Medina Vilda	73.433.791	Faustino
4	Jorge Libonatis	Yepes	73548741	Jorge
5	ALVARO GUERRERO	mandaza	73 548 744	ALVARO
6	Angel	Gutierrez	73.543977	Angel
7	Gilberto	vega Anillo	73546889	Gilberto vega
8	Medardo Ballista	Ballista Cardenas	73.430.891	Medardo B.
9	Medardo RAPACI	BALLISTA PUGAR	1007245000	Medardo
10	william ALFREDO	Ballistas Cardenas	73 546 756	william B.



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
11	der Eytela	tenun Jonu	45 645 929	der Eytela
12	Ender	Ballester	73544067	Ender
13	NGELVIS	TENGOIN Anillo	45.581.398	NGELVIS
14	xanerys	BUEVAS TORRES	7052072385	xanerys
15	Malten Enrique	Pana Vellegas	73 551 436	Malten Pana
16	Sandra Milena	Parra Sento	7007244921	Sandra Parra
17	JOSE TOMAS	garcia Padilla	1047423782	JOSE
18	Leidis Licet	Gamaun Tentes	45583310	Leidis Gamaun
19	Flore Maria	Diaz Torres	45583186	Flore Maria
20	Olinar	Rodriguez Gama	9.267331	Olinar
21	LUIS ADOLFO	Ochoa Medina	9.110.708	LUIS ADOLFO
22	Fin	MEZC	73544277	Fin
23	Marta	Ramirez Pimichu	45 645 076	Marta Ramirez
24	SAENZ AFRONSO	MONTES LOPEZ	73479547	SAENZ
25	Felissa	Alvarez Sanabina	1049348699	Felissa



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
26	GERSON	NAUATRO	787432	
27	Mariam	Caldera Betin	1.104.416818	Mariam Caldera
28	Nancy Samui	Nancy Jean	1.102.231.874	
29	Nancy Daniel	Lombardo Pineda	1.052.072.287	Nancy Lombardo



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATO No. LP-CARDIQUE-003-2021, cuyo objeto es "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE."

TEMA: Importancia Ecológica, Social y Económica de las abejas.

LUGAR: El Carmen de Bolívar

FECHA: 29 / 07 / 2022

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
1	Ender	Ballusteg	73544067	Ender
2	Luis Adolfo	Ochoa Medina	9.110.708	
3	Luis	Meza	7354277	Luis
4	Malfren	Para Villegas	73551436	Malfren Parra
5	Sandra	Para Suen	1007244927	Sandra Parra
6	Leidis Licet	Gamarra Fuentes	45583310	Leidis Gamarra
7	José Tomás	García Padilla	1047423782	José G.
8	Flor María	Díaz Torres	45583186	Flor Díaz
9	Marta	Ramírez Pimentel	45645076	Marta Ramírez
10	Yanoris	Buenvas Torres	7052072385	Yanoris Buenvas



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
11	NEIVIS MAILIVIS	TENEVAN ANILLO	YS. 581.388	NEIVIS TENEVAN
12	José fernán fern	Tern fern	45645979	José fern fern
13	William Alfredo	Ballesteros Quiróes	73546756	William B
14	Medardo RAFAEL	BANESTOR PUIGAR	1007245000	Medardo R
15	Medardo Rafael	Ballesteros Andueza	73430891	Medardo R.
16	Gilberto ve	vega Anillo	73546889	Gilberto vega
17	Jorge Alberto	Lobonatis Xpós	73548711	Jorge Xpós
18	ALVARO	Butierrez	73548744	ALVARO
19	Leo	Mela	73547277	Leo
20	Edúin	Bermúdez Luna	73552402	Edúin Luna
21	Peirer	Berrios L.	73435465	Peirer
22	Luis Antonio	Molina Vitola	73.433.191	Luis
23	Angel	Butierrez	73.543937	Angel
24	Javier Aguirre	Morales Latorre	73.474.847	Javier
25	Polimar	Rodríguez Gamiá	9.267371	Polimar R



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
26	Gerson	MAURICIO	78743924	[Signature]
27	Helissa	Alvarez Sanabria	1049348699	[Signature]
28	Vianay	Quiteria Leon	1.100.231.874	[Signature]
29	Carlos Augusto	Escobar Soldarriaga	1041610902	[Signature]
30	Naiver Daniel	Gumbrao Medina	1.052.072.287	[Signature]
31	Mariam	Caldera Betin	1104416818	Mariam Caldera



Ingenieros Agroforestales

NIT: 9005745893

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONTRATO No. LP-CARDIQUE-003-2021, cuyo objeto es "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE."

TEMA: El Cambio Climático y su afectación a las poblaciones apícolas

LUGAR: El Carmen de Bolívar.

FECHA: 19/08/2022.

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	Nº CEDULA	FIRMA
1	Eduin Buitrago	Buitrago	73552402	Eduin B.
2	Diner	Buitrago	73435405	Diner
3	Juan Antonio	Medina Vida	73.433.791	Juan A.
4	Jorge Libanidis	Yepes	73548741	Jorge L.
5	ALVARO GUTIERREZ	mandaza	73 548 744	ALVARO
6	Angel	Gutierrez	73.543977	Angel
7	Gilberto	Vega Anillo	73546889	Gilberto V.
8	Medardo Ballestas	Ballestas Cardenas	73.430.891	Medardo B.
9	Medardo RAPACI	BALLESTA PUGAR	1007245000	Medardo
10	william alfredo	Ballestas Cardenas	73 546 756	william B.

ANEXO No. 3

INFORME SST



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME FINAL



" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE".

DICIEMBRE 2022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
SEGUIMIENTO AL SISTEMA EN GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	5
1. PAGO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL A ARL, EPS. FONDO DE PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.....	5
2. ORDEN Y ASEO	5
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6
4. CAPACITACIONES SST	9
5. PAUSAS ACTIVAS	12
6. PREOPERACIONALES	13
7. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS.....	13
8. ELEMENTOS DE EMERGENCIAS	13
9. INDICADORES DE GESTIÓN.....	13
CONCLUSIÓN	14
ANEXOS	15



INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

El presente informe indica las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, del proyecto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"**.

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo realizadas durante del periodo comprendido entre Marzo a Diciembre del 2022.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal del proyecto AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE", a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles; y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control de los factores de riesgo a los que se expone el personal que labora en el proyecto.
- Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el proyecto.
- Garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas de las máquinas, equipos y herramientas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados, con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento del espacio y una mayor seguridad en las tareas, logrando así un entorno de trabajo más cómodo y agradable para minimizar accidentes laborales.
- Priorizar y controlar los riesgos locativos así como los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.

SEGUIMIENTO AL SISTEMA EN GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

1. PAGO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL A ARL, EPS. FONDO DE PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.

Se evidencia que el contratista dio cumplimiento a la Ley 100 de 1993 que estableció el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de proporcionar la cobertura al sistema de salud, pensiones, y riesgos profesionales todos los trabajadores son afiliados al sistema de seguridad social integral, independientemente de la forma de remuneración y se están efectuando los pagos correspondientes a ARL, EPS, PENSION Y CCF.

(Ver Anexo 1. Planilla Seguridad social)

2. ORDEN Y ASEO

Se evidencia que el contratista mantuvo de forma ordenada los insumos y herramientas dentro de las instalaciones del proyecto.



Imagen 1. Organización de insumos



Imagen 2. Organización de insumos

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se evidencia que el contratista durante la ejecución del proyecto, hizo entrega de los elementos de protección personal al personal que laboro en el tiempo del desarrollo del proyecto. (Ver Anexo 2. Registro de entrega de EPP)

Ver Registro fotográfico.



Imágenes 3 y 4. Uso de EPP y Dotación



Imagen 5. Uso de EPP y Dotación



Imágenes 6 y 7. Uso de EPP y Dotación



Imagen 8. Uso de EPP y Dotación



Imágenes 9 y 10. Uso de EPP

4. CAPACITACIONES SST

La finalidad de las charlas de seguridad dentro de las empresas es de gran importancia puesto que representan un compromiso con el bienestar integral de los trabajadores y a su vez es fundamental que la seguridad y el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, se garanticen en el ejercicio laboral.

Por lo anterior, el contratista implemento de manera responsable las charlas de seguridad y pausas activas, que fueron organizadas por el área seguridad y salud del trabajo con la finalidad de preservar la integridad de todos los colaboradores del proyecto y a su vez disminuir niveles de estrés propios de la labor.

Se evidencia que el contratista realizo capacitaciones y charlas con relación al SG-SST con la comunidad perteneciente al proyecto. (**Ver Anexo 3.** Registro de charlas SST).



Imágenes 11 y12. Capacitaciones SST





Imágenes 13, 14, 15 y 16. Capacitaciones SST



Imágenes 17 y 18. Capacitaciones SST

5. PAUSAS ACTIVAS

Se evidencia que el contratista realizo las pausas activas, durante la ejecución del proyecto.



Imágenes 19, 20 y 21. Pausas Activas

6. PREOPERACIONALES

Se evidencia que el contratista realizó preoperacionales a las motocicletas utilizadas para el transporte en las áreas del proyecto.
(Ver Anexo 4. Preoperacionales)

7. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas

Se evidencia que contratista realizó durante el periodo de ejecución registro de análisis de trabajo seguro. (Ver Anexo 5. Registro de ATS)

8. ELEMENTOS DE EMERGENCIAS

Se evidencia que el contratista conto con los elementos de emergencia como botiquín y camilla de emergencia.



9. INDICADORES DE GESTIÓN



3.1 Número De Personas:
Personal Operativo: 7

3.2 Índices Estadísticos De Seguridad

3.2.1. Mes de Diciembre
N° Trabajadores promedio mes Diciembre: 7

N° de accidentes inhabilitadores y fatales: 0

N° de accidentes menores no inhabilitadores: 0

N° de horas trabajadas: 8 horas diarias lunes-viernes

5,5 horas sábados

N° de días trabajados: 30

N° de días perdidos: 0

NÚMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS

HHT= N° trabajadores x N° horas trabajadas x N° días trabajados $HHT = (7 \times 8 \times 21) + (7 \times 5.5 \times 5) = 1368,5$ horas hombre trabajadas

INDICE DE FRECUENCIA

IF= N° de Accidente x 2000.0000/ N° HHT $IF = (0 \times 200.000 / 1368,5) = 0$

INDICE GRAVEDAD

IG= (N° Días perdidos /N° HHT)*200.000 $IG = (0 / 1368,5) \times 200.000 = 0$

INDICE ACCIDENTALIDAD

IA= N° AT/N° Prom. De trabajadores*100 $IA = (0 / 7) \times 100 = 0$

CONCLUSIÓN

Se evidencia que INGENIEROS AGROFORESTALES SAS, implementó medidas de seguridad, cumpliendo así lo establecido en GS-SST, resaltando su compromiso por el bienestar de cada uno de sus trabajadores, generando un ambiente de trabajo optimo y permitiendo el avance del proyecto en condiciones adecuadas.

ANEXOS

- Anexo 1. Planillas de seguridad social
- Anexo 2. Registro entrega de EPP
- Anexo 3. Registro de charlas SST
- Anexo 4. Preoperacionales
- Anexo 5. Análisis de trabajo seguro
- Anexo 6. Inspección de botiquín y camilla

105

2004/04/28 12:22

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE DEL APORTANTE: ALVARO RODRIGUEZ NOMBRE DEL APOYADO: ALVARO RODRIGUEZ CATEGORIA: 151 FIANCO TIPO DE PLANILLA: 7036410002 MES: 202305 VALOR: 1.000.000		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7036410002 VALOR: 1.000.000 VALOR PAGADO: 1.000.000	
DATOS GENERALES DEL APOYADO NOMBRE DEL APOYADO: ALVARO RODRIGUEZ NOMBRE DEL APOYADO: ALVARO RODRIGUEZ CATEGORIA: 151 FIANCO TIPO DE PLANILLA: 7036410002 VALOR: 1.000.000		DATOS GENERALES DEL APOYADO NOMBRE DEL APOYADO: ALVARO RODRIGUEZ NOMBRE DEL APOYADO: ALVARO RODRIGUEZ CATEGORIA: 151 FIANCO TIPO DE PLANILLA: 7036410002 VALOR: 1.000.000	

TOTAL APORTES A PENSION									
FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
202305	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

TOTAL APORTES A SALUD									
FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
202305	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
202305	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

TOTAL APORTES A GASTOS DE COMPAÑIA FAMILIAR									
FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
202305	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

DETALLE DE APORTES									
FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
202305	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

DETALLE DE APORTES									
FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
202305	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBTOTAL:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible][illegible]

ADMINISTRACIÓN		TOTAL DEPORTES A CADA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		TOTAL	
	NO DEPORTES	NO DEPORTES	NO DEPORTES	NO DEPORTES	NO DEPORTES
028205	028205	028205	028205	028205	028205
028206	028206	028206	028206	028206	028206
028207	028207	028207	028207	028207	028207
028208	028208	028208	028208	028208	028208
028209	028209	028209	028209	028209	028209
028210	028210	028210	028210	028210	028210
028211	028211	028211	028211	028211	028211
028212	028212	028212	028212	028212	028212
028213	028213	028213	028213	028213	028213
028214	028214	028214	028214	028214	028214
028215	028215	028215	028215	028215	028215
028216	028216	028216	028216	028216	028216
028217	028217	028217	028217	028217	028217
028218	028218	028218	028218	028218	028218
028219	028219	028219	028219	028219	028219
028220	028220	028220	028220	028220	028220
028221	028221	028221	028221	028221	028221
028222	028222	028222	028222	028222	028222
028223	028223	028223	028223	028223	028223
028224	028224	028224	028224	028224	028224
028225	028225	028225	028225	028225	028225
028226	028226	028226	028226	028226	028226
028227	028227	028227	028227	028227	028227
028228	028228	028228	028228	028228	028228
028229	028229	028229	028229	028229	028229
028230	028230	028230	028230	028230	028230
028231	028231	028231	028231	028231	028231
028232	028232	028232	028232	028232	028232
028233	028233	028233	028233	028233	028233
028234	028234	028234	028234	028234	028234
028235	028235	028235	028235	028235	028235
028236	028236	028236	028236	028236	028236
028237	028237	028237	028237	028237	028237
028238	028238	028238	028238	028238	028238
028239	028239	028239	028239	028239	028239
028240	028240	028240	028240	028240	028240
028241	028241	028241	028241	028241	028241
028242	028242	028242	028242	028242	028242
028243	028243	028243	028243	028243	028243
028244	028244	028244	028244	028244	028244
028245	028245	028245	028245	028245	028245
028246	028246	028246	028246	028246	028246
028247	028247	028247	028247	028247	028247
028248	028248	028248	028248	028248	028248
028249	028249	028249	028249	028249	028249
028250	028250	028250	028250	028250	028250
028251	028251	028251	028251	028251	028251
028252	028252	028252	028252	028252	028252
028253	028253	028253	028253	028253	028253
028254	028254	028254	028254	028254	028254
028255	028255	028255	028255	028255	028255
028256	028256	028256	028256	028256	028256
028257	028257	028257	028257	028257	028257
028258	028258	028258	028258	028258	028258
028259	028259	028259	028259	028259	028259
028260	028260	028260	028260	028260	028260
028261	028261	028261	028261	028261	028261
028262	028262	028262	028262	028262	028262
028263	028263	028263	028263	028263	028263
028264	028264	028264	028264	028264	028264
028265	028265	028265	028265	028265	028265
028266	028266	028266	028266	028266	028266
028267	028267	028267	028267	028267	028267
028268	028268	028268	028268	028268	028268
028269	028269	028269	028269	028269	028269
028270	028270	028270	028270	028270	028270
028271	028271	028271	028271	028271	028271
028272	028272	028272	028272	028272	028272
028273	028273	028273	028273	028273	028273
028274	028274	028274	028274	028274	028274
028275	028275	028275	028275	028275	028275
028276	028276	028276	028276	028276	028276
028277	028277	028277	028277	028277	028277
028278	028278	028278	028278	028278	028278
028279	028279	028279	028279	028279	028279
028280	028280	028280	028280	028280	028280
028281	028281	028281	028281	028281	028281
028282	028282	028282	028282	028282	028282
028283	028283	028283	028283	028283	028283
028284	028284	028284	028284	028284	028284
028285	028285	028285	028285	028285	028285
028286	028286	028286	028286	028286	028286
028287	028287	028287	028287	028287	028287
028288	028288	028288	028288	028288	028288
028289	028289	028289	028289	028289	028289
028290	028290	028290	028290	028290	028290
028291	028291	028291	028291	028291	028291
028292	028292	028292	028292	028292	028292
028293	028293	028293	028293	028293	028293
028294	028294	028294	028294	028294	028294
028295	028295	028295	028295	028295	028295
028296	028296	028296	028296	028296	028296
028297	028297	028297	028297	028297	028297
028298	028298	028298	028298	028298	028298
028299	028299	028299	028299	028299	028299
028300	028300	028300	028300	028300	028300
028301	028301	028301	028301	028301	028301
028302	028302	028302	028302	028302	028302
028303	028303	028303	028303	028303	028303
028304	028304	028304	028304	028304	028304
028305	028305	028305	028305	028305	028305
028306	028306	028306	028306	028306	028306
028307	028307	028307	028307	028307	028307
028308	028308	028308	028308	028308	028308
028309	028309	028309	028309	028309	028309
028310	028310	028310	028310	028310	028310
028311	028311	028311	028311	028311	028311
028312	028312	028312	028312	028312	028312
028313	028313	028313	028313	028313	028313
028314	028314	028314	028314	028314	028314
028315	028315	028315	028315	028315	028315
028316	028316	028316	028316	028316	028316
028317	028317	028317	028317	028317	028317
028318	028318	028318	028318	028318	028318
028319	028319	028319	028319	028319	028319
028320	028320	028320	028320	028320	028320
028321	028321	028321	028321	028321	028321
028322	028322	028322	028322	028322	028322
028323	028323	028323	028323	028323	028323
028324	028324	028324	028324	028324	028324
028325	028325	028325	028325	028325	028325
028326	028326	028326	028326	028326	028326
028327	028327	028327	028327	028327	028327
028328	028328	028328	028328	028328	028328
028329	028329	028329	028329	028329	028329
028330	028330	028330	028330	028330	028330
028331	028331	028331	028331	028331	028331
028332	028332	028332	028332	028332	028332
028333	028333	028333	028333	028333	028333
028334	028334	028334	028334	028334	028334
028335	028335	028335	028335	028335	028335
028336	028336	028336	028336	028336	028336
028337	028337	028337	028337	028337	028337
028338	028338	028338	028338	028338	028338
028339	028339	028339	028339	028339	028339
028340	028340	028340	028340	028340	028340
028341	028341	028341	028341	028341	028341
028342	028342	028342	028342	028342	028342
028343	028343	028343	028343	028343	028343
028344	028344	028344	028344	028344	028344
028345	028345	028345	028345	028345	028345
028346	028346	028346	028346	028346	028346
028347	028347	028347	028347	028347	028347
028348	028348	028348	028348	028348	028348
028349	028349	028349	028349	028349	028349
028350	028350	028350	028350	028350	028350
028351	028351	028351	028351	028351	028351
028352	028352	028352	028352	028352	028352
028353	028353	028353	028353	028353	028353
028354	028354	028354	028354	028354	028354
028355	028355	028355	028355	028355	028355
028356	028356	028356	028356	028356	028356
028357	028357	028357	028357	028357	028357
028358	028358	028358	028358	028358	028358
028359	028359	028359	028359	028359	028359
028360	028360	028360	028360	028360	028360
028361	028361	028361	028361	028361	028361
028362	028362	028362	028362	028362	028362
028363	028363	028363	028363	028363	028363
028364	028364	028364	028364	028364	028364
028365	028365	028365	028365	028365	028365
028366	028366	028366	028366	028366	028366
028367	028367	028367	028367	028367	028367
028368	028368	028368	028368	028368	028368
028369	028369	028369	028369	028369	028369
028370	028370	028370	028370	028370	028370
028371	028371	028371	028371	028371	028371
028372	028372	028372	028372	028372	028372
028373	028373	028373	028373	028373	028373
028374	028374	028374	028374	028374	028374
028375	028375	028375	028375	028375	028375
028376	028376	028376	028376	028376	028376
028377	028377	028377	028377	028377	028377
028378	028378	028378	028378	028378	028378
028379	028379	028379	028379	028379	028379
028380	028380	028380			

[illegible]

TOTAL	\$ 4,058,900
--------------	---------------------

2004-05-22

References

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL[illegible]

[illegible]

TOTAL APORTEES A PUEBLOS									
CÓDIGO	ADMINISTRACIÓN INDICADOR	N.º CURP/INSA	COMUNIDAD		MUNICIPIO		ESTADO	MÉDIA	TOTAL PPA
			COMUNIDAD	ESTADO	COMUNIDAD	ESTADO			
01	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	LA ZONA DE LOS RIOS	2	8,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0.0
TOTAL PPA									0

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL

2012-06-03 10:05 CHITMAN

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL			CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS			B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1		CRA 35 71 138			3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23186807	E	2022-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.138.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	23186807	2022-05-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S
2	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S					
3	CC 22568232	AFRICANO SOLANO ENEDYS MARIA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S						
4	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S						
5	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S						
6	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S						
7	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S						
8	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAIND MARIA	1.000.000		X															0			0	22	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	12	0	91.700	N
9	CC 1128044534	GONZALEZ SOSA GISELA PATRICIA	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S						
10	CC 1140893312	BARRIGA GARCIA CAMILO ERNESTO	1.000.000	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	13.400	S						
11	CC 1140893312	BARRIGA GARCIA CAMILO ERNESTO	1.000.000	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	933.334	149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	229.100	S						
12	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S						
13	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F												X				0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	600.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	120.000	S						
14	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			24	24	24	24	COLPENSION ES-25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	588.600	S						
15	CC 1193065301	ARROYO ARRIETA ANDRIAN JOSUE	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S						

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23186807	E	2022-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.138.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	23186807		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.150.001	29.183.335	28.450.001	28.383.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	3.934.100	0	0	0	3.934.100
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.262.100	0	0	0	2.262.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.064.000	0	0	0	1.064.000
EPS(Administradoras: 4)				13	1.229.800	0	0	0	1.229.800
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	131.700	0	0	0	131.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	800.100	0	0	0	800.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	192.000	0	0	0	192.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				12	863.400	0	0	0	863.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	863.400	0	0	0	863.400
CCF(Administradoras: 1)				12	1.111.400	0	0	0	1.111.400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	12	1.111.400	0	0	0	1.111.400
Gran Total					7.138.700	0	0	0	7.138.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL			CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS			B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1		CRA 35 71 138			3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	23402819	E	2022-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.165.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	23402819	2022-06-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.					Cot.	Cot.	Cot.			
1	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S		
2	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	0	0	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S
3	CC 22568232	AFRICANO SOLANO ENEDYS MARIA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	
4	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	
5	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	
6	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	
7	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.650.000	106.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.650.000	106.000	2.650.000	184.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S	
8	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAIND MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	12	0	125.000	N
9	CC 1128044534	GONZALEZ SOSA GISELA PATRICIA	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	
10	CC 1140893312	BARRIGA GARCIA CAMILO ERNESTO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	
11	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	
12	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F												X				0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	800.000	32.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	800.000	0	800.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	160.000	S	
13	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	2.200.000	88.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	539.500	S	
14	CC 1193065301	ARROYO ARRIETA ANDRIAN JOSUE	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	23402819	E	2022-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.165.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	23402819		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.150.000	29.450.000	28.450.000	28.450.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	3.934.000	0	0	0	3.934.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.064.000	0	0	0	1.064.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.262.000	0	0	0	2.262.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 4)				13	1.263.000	0	0	0	1.263.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	192.000	0	0	0	192.000
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	165.000	0	0	0	165.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	800.000	0	0	0	800.000
ARP(Administradoras: 1)				12	862.700	0	0	0	862.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	862.700	0	0	0	862.700
CCF(Administradoras: 1)				12	1.106.000	0	0	0	1.106.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	12	1.106.000	0	0	0	1.106.000
Gran Total					7.165.700	0	0	0	7.165.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 35 71 138		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23774876	E	2022-07-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.454.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	23774876	2022-07-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.					Cot.	Cot.	Cot.				
1	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S		
2	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	0	0	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S	
3	CC 22568232	AFRICANO SOLANO ENEDYS MARIA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	
4	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	
5	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	
6	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	
7	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.650.000	106.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.650.000	106.000	2.650.000	184.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S	
8	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAIND MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	12	0	125.000	N
9	CC 1128044534	GONZALEZ SOSA GISELA PATRICIA	2.500.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	83.334	13.400	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	83.334	3.400	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	83.334	3.400	83.334	5.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	26.100	S	
10	CC 1140893312	BARRIGA GARCIA CAMILO ERNESTO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S	
11	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	
12	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	
13	CC 1193065301	ARROYO ARRIETA ANDRIAN JOSUE	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23774876	E	2022-07-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.454.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	23774876		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.733.334	27.033.334	26.033.334	26.033.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	3.547.400	0	0	0	3.547.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.064.000	0	0	0	1.064.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.875.400	0	0	0	1.875.400
EPS(Administradoras: 4)				13	1.166.400	0	0	0	1.166.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	95.400	0	0	0	95.400
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	165.000	0	0	0	165.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	800.000	0	0	0	800.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				12	698.800	0	0	0	698.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	698.800	0	0	0	698.800
CCF(Administradoras: 1)				12	1.041.400	0	0	0	1.041.400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	12	1.041.400	0	0	0	1.041.400
Gran Total					6.454.000	0	0	0	6.454.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 802024876	8	JET INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23956842	E	2022-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.427.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	23956842	2022-08-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS		PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S	
2	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S						
3	CC 22568232	AFRICANO SOLANO ENEDYS MARIA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S							
4	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S								
5	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S								
6	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S								
7	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S								
8	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAIND MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	12	0	125.000	N
9	CC 1140893312	BARRIGA GARCIA CAMILO ERNESTO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S								
10	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S								
11	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S								
12	CC 1193065301	ARROYO ARRIETA ANDRIAN JOSUE	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S								

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	23956842	E	2022-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.427.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	23956842		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.650.000	26.950.000	25.950.000	25.950.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.534.000	0	0	0	3.534.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.862.000	0	0	0	1.862.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.064.000	0	0	0	1.064.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 4)				12	1.163.000	0	0	0	1.163.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.000	0	0	0	92.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	800.000	0	0	0	800.000
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	165.000	0	0	0	165.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				11	692.900	0	0	0	692.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	692.900	0	0	0	692.900
CCF(Administradoras: 1)				11	1.038.000	0	0	0	1.038.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	11	1.038.000	0	0	0	1.038.000
Gran Total					6.427.900	0	0	0	6.427.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 35 71 138		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24162291	E	2022-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.182.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	24162291	2022-09-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.					Cot.	Cot.
1	CC 7518509	GARCIA MORENO HENRY	3.600.000		F	X														0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.600.000	144.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	3.600.000	144.000	3.600.000	250.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	538.600	S
2	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000		F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S
3	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S
4	CC 22568232	AFRICANO SOLANO ENEDYS MARIA	1.000.000		F		X													0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	133.334	21.400	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	133.334	5.400	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	133.334	5.400	133.334	700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	32.900	S
5	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
6	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
7	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S
8	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.650.000	106.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.650.000	106.000	2.650.000	184.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S
9	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAIND MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	125.000	N
10	CC 1140893312	BARRIGA GARCIA CAMILO ERNESTO	1.000.000		F		X													0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS SURA-EPS010	133.334	5.400	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	133.334	5.400	133.334	700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	32.900	S
11	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000		F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
12	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S
13	CC 1193065301	ARROYO ARRIETA ANDRIAN JOSUE	1.200.000		F		X													0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	40.000	6.400	0	0	EPS SURA-EPS010	40.000	1.600	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	40.000	1.600	40.000	2.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24162291	E	2022-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.182.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	24162291		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.756.668	27.656.668	26.656.668	26.656.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.071.200	0	0	0	3.071.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	925.400	0	0	0	925.400
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.537.800	0	0	0	1.537.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 4)				13	1.191.400	0	0	0	1.191.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.000	0	0	0	92.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	250.000	0	0	0	250.000
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	2	130.400	0	0	0	130.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	719.000	0	0	0	719.000
ARP(Administradoras: 1)				12	853.500	0	0	0	853.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	853.500	0	0	0	853.500
CCF(Administradoras: 2)				12	1.066.400	0	0	0	1.066.400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	1	144.000	0	0	0	144.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	11	922.400	0	0	0	922.400
Gran Total					6.182.500	0	0	0	6.182.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24409985	E	2022-10-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.039.400	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	24409985	2022-10-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL					IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 7518509	GARCIA MORENO HENRY	3.600.000	F	X															0			0	20	20	20	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.000	96.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	2.400.000	96.000	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	5	359.100	S		
2	CC 9770361	PINZON GIRALDO ROY ANDERSSON	3.600.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.600.000	576.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.600.000	144.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.600.000	144.000	3.600.000	250.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.114.600	S	
3	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S	
4	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S
5	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
6	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
7	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S
8	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.650.000	106.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.650.000	106.000	2.650.000	184.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S
9	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAIND MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	12	0	125.000	N	
10	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
11	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24409985	E	2022-10-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.039.400	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	24409985		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.050.000	29.750.000	28.750.000	28.750.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				8	3.598.000	0	0	0	3.598.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	2.086.000	0	0	0	2.086.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	904.000	0	0	0	904.000
EPS(Administradoras: 4)				11	1.275.000	0	0	0	1.275.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	6	856.000	0	0	0	856.000
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	125.000	0	0	0	125.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.000	0	0	0	92.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	202.000	0	0	0	202.000
ARP(Administradoras: 1)				10	1.016.400	0	0	0	1.016.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	1.016.400	0	0	0	1.016.400
CCF(Administradoras: 2)				10	1.150.000	0	0	0	1.150.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	9	1.054.000	0	0	0	1.054.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	1	96.000	0	0	0	96.000
Gran Total					7.039.400	0	0	0	7.039.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24804183	E	2022-11-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.434.900	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24804183	2022-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS		PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.					ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 9770361	PINZON GIRALDO ROY ANDERSSON	3.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.600.000	576.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.600.000	144.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.600.000	144.000	3.600.000	250.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.114.600	S
2	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S
3	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S
4	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
5	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
6	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S
7	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.650.000	106.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.650.000	106.000	2.650.000	184.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S
8	CC 86012702	GUZMAN CARDENAS ROBINSON MANUEL	1.700.000	F X																0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	736.667	117.900	0	0	SANITAS-EPS005	736.667	29.500	COMFENALCO VALLE-CCF56	736.667	29.500	736.667	51.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	228.200	S
9	CC 94252572	RICO RODRIGUEZ JAIME	1.700.000	F X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.700.000	68.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S
10	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAINA MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	12	0	125.000	N
11	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
12	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24804183	E	2022-11-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.434.900	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24804183		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.486.667	29.786.667	28.786.667	28.786.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.987.900	0	0	0	3.987.900
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.475.900	0	0	0	2.475.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	904.000	0	0	0	904.000
EPS(Administradoras: 4)				12	1.276.500	0	0	0	1.276.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	924.000	0	0	0	924.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	121.500	0	0	0	121.500
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	125.000	0	0	0	125.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				11	1.019.000	0	0	0	1.019.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	1.019.000	0	0	0	1.019.000
CCF(Administradoras: 2)				11	1.151.500	0	0	0	1.151.500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	97.500	0	0	0	97.500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	9	1.054.000	0	0	0	1.054.000
Gran Total					7.434.900	0	0	0	7.434.900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	24933662	E	2022-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.821.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	24933662	2022-12-20	Pagada							

Página 1 2022-12-05

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	24933662	E	2022-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.821.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	24933662		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
35.830.000	40.130.000	40.130.000	40.130.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	5.802.800	0	0	0	5.802.800
PROTECCION	230201	800229739	0	3	851.200	0	0	0	851.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.007.600	0	0	0	3.007.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.176.000	0	0	0	1.176.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	768.000	0	0	0	768.000
EPS(Administradoras: 5)				16	1.605.200	0	0	0	1.605.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	394.400	0	0	0	394.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	68.000	0	0	0	68.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	40.000	0	0	0	40.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	8	996.800	0	0	0	996.800
ARP(Administradoras: 1)				16	1.808.700	0	0	0	1.808.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	1.808.700	0	0	0	1.808.700
CCF(Administradoras: 2)				16	1.605.200	0	0	0	1.605.200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	14	1.469.200	0	0	0	1.469.200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	136.000	0	0	0	136.000
Gran Total					10.821.900	0	0	0	10.821.900

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25000996	E	2022-12-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.922.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	25000996	2023-01-13	Pagada							

Página 1 2022-12-07

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25000996	E	2022-12-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.922.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	25000996		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
36.155.000	40.455.000	40.455.000	40.455.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	5.854.800	0	0	0	5.854.800
PROTECCION	230201	800229739	0	3	976.000	0	0	0	976.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	695.200	0	0	0	695.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.007.600	0	0	0	3.007.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.176.000	0	0	0	1.176.000
EPS(Administradoras: 5)				16	1.618.200	0	0	0	1.618.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	68.000	0	0	0	68.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	8	1.028.000	0	0	0	1.028.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	376.200	0	0	0	376.200
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	40.000	0	0	0	40.000
ARP(Administradoras: 1)				16	1.831.400	0	0	0	1.831.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	1.831.400	0	0	0	1.831.400
CCF(Administradoras: 2)				16	1.618.200	0	0	0	1.618.200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	136.000	0	0	0	136.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	14	1.482.200	0	0	0	1.482.200
Gran Total					10.922.600	0	0	0	10.922.600



FORMATO
PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CÓDIGO: SG-SST-EPP-01

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Jader Montes	Cédula	73429847	Técnico	Equipo Técnico

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados, con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casaca de Seguridad	01	09-09-22	Jader A. Montes
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Felissa Suarez	10493418699	Aux SST	



FORMATO
PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CÓDIGO: SG-SST-EPP-01

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE
Carlos Escobar	Cedula	1041610902	Aux-Campo	Equipo Técnico

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados, con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12: Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2015 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casaca de Seguridad	01	09-07-22	[Firma]
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Felissa Alvarez	10493218694	Aux. SST	[Firma]



FORMATO
PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CÓDIGO: SG-SST-EPP-01

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Nauwer Lambraño	Cedula	1052092287	Aux Camp	Equipo Tecnico

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados, con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Cafas de Seguridad.	01	09-09-22	Nauwer Lambraño P.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Felissa Alvarez	10493418699	AUX SST	



FORMATO
PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP))

CÓDIGO: SG-SST-EPP-01

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Jaime Pico	Cedula	1002441583	Aux Campo	Equipo Tecnico

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados, con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12)- Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Cafas de Seguridad	01	09-09-2022	Jaime Pico
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Felissa Suarez	10498418699	Aux SST	



FORMATO DE INSPECCION PARA EPF


Codigo: SG-SST-IEPP-02

Version: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP28 de Octubre 2022
Helissa Aguilar S.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPADIDOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Carlos Escobar	Aux. Campo	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

x 

NOMBRE Carlos Escobar
CEDULA 1041610902



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: SG-SST-IEPP-02

Versión: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP

28 de Octubre / 22
Hessia Hwaitee

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPAJODOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jader Fontes	Teenier	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

r Jader Fontes
Firma
NOMBRE Jader Fontes
CEDULA 78429847



FORMATO DE INSPECCION PARA EPF


Codigo: SG-SST-IEPP-02

Version: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP28 de Octubre 2022
Helissa Aguilar S.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPADIDOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Carlos Escobar	Aux. Campo	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

x 

NOMBRE Carlos Escobar
CEDULA 1041610902



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: SG-SST-IEPP-02

Versión: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP

28 de Octubre / 22
Hessia Hwaitee

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPAJODOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jader Fontes	Teenier	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

r Jader Fontes
Firma
NOMBRE Jader Fontes
CEDULA 78429847



FORMATO DE INSPECCION PARA SPS

Tamaño: 50.000.000.000

Versión: 1

Vigencia desde: 01/08/2017

Fecha:
Realizado por:
Revisado por:

08-09-2022
Jaime Rico
AOC-351

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CAPAS DE PROTECCION		GUANTES		MASCARILLA		TAPABUCOS		BOTAS DEG		CASCOS		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jaime Rico Arce	Arce	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades realizadas no requieren protección adicional ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

Jaime Rico Ruelas
Jaime Rico
10024141583



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: 90-607-001-02


Versión: 1

Vigencia desde: 01/08/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/OTSP

08-09-2022
Helissa Alvarez
MEX SSI

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CASACA DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPABUCOS		BOTAS NEG		CASCOS		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			E	NC	E	NC	E	NC	E	NC	E	NC	E	NC	E	NC	
1	Carlos Escobar Aux Campo																Las actividades ejercidas no requieren protección respiratoria ni auditiva.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	


Firma
Nombre Carlos Escobar
Cédula 10211610902



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: 30-55T-EPP-01

Versión: 1

Vigente desde: 01/08/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia: OTIAP

08 Septiembre 2022
Feleissa Alvarez
Aux SSI

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPAJOR		BOTAS DEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			E	NC	E	NC	C	NC	C	NC	C	NC	E	NC	E	NC	
1	Naiver Lamberto	Aux. Campo															Las actividades ejercidas no requieren protec- cion respiratoria ni auditiva.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

Naiver Lamberto P.
Naiver Lamberto
CÉDULA 1052092287



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Codigo: 95-SST-IEPP-02

Version: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha:
Realizado por:
Dependencia/DIAF:31-08-2022
Helissa Alvarez

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPADOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Odimar Rodriguez Tecnia		✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de Ruido, ni estan expuestos a productos quimicos es por ello que no requieren proteccion auditiva y respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

Odimar Rf
FIRMA
NOMBRE Odimar Rodriguez
CEDULA 9267371



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: 00007-001-02

Versión: 1

Fecha: 2022-08-31

Fecha:
Presencia de:
Observaciones:

31/08-2022
felisa Aguilar

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CAPAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPADITOS		BOTAS DEB.		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jader Montes	Tecnico	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de Ruido ni estan expuestos a productos quimicos es por ello que no requieren proteccion auditiva y respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

JADER P MONTES L
Jader Montes
73129817



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Camacoli, Camacoliceto
FECHA: 26 de Septiembre / 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Estrés Laboral

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	
2	Jaime Pico	1002441583	Aux. campo	
3	Náiver Lombardo	1052072287	Aux. campo	
4	Jader Montes	73429847	Técnico	JADER D MONTES
5	Odimar Rodríguez	9267371	Técnico	Odimar R
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Heliosa Alvarez			
18	Aux. SST.			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: U. la Zarsa El hobo
FECHA: 29 de Septiembre / 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Factores de Riesgos físicos

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Odimar Rodriguez	9269371	Tecnico	Odimar R
2	Jader Monts	93429847	Tecnico	Jader Monts
3	Naiver Lambraño	1052072287	Aux Campo	Naiver Lambraño
4	Jaime Rico	1002441583	Aux Campo	Jaime Rico
5	Carlos Escobar	1041610902	Aux Campo	Carlos Escobar
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez			
19	Aux SST			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Santa Rita
FECHA: 28 de Septiembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Factores de Riesgo Ergonomico

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Odimar Rodriguez	9267371	Teenico	Odimar R
2	Jader Montes	73429847	Teenico	JADER M MONTES
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux campo	Jaime Rico
5	Naiver Lambrano	1052072287	Aux. campo	Naiver lambrano
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Melissa Suarez			
19	Aux SST			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Parícuti, V. Bajo Grande.
FECHA: 29 de Septiembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Prevención del Consumo del alcohol.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral, y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
2	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
3	Naiyer Lambrano	1152072287	Aux. campo	Naiyer Lambrano
4	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader A Montes
5	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez			
19		Aux. SST		
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Roma.
FECHA: 30 de Septiembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Prevención del Sobrepeso y la Obesidad.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral, y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	
2	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	
3	Odimar Rodriguez	9267391	Tecnico	
4	Nalver Lambrano	1052092287	Aux. campo	
5	Jaider Montes	93429847	Tecnico	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	Responsable: Melissa Suarez			
20	Aux SST			



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR:

FECHA:

ACTIVIDAD:

TEMA:

Hala noche
10 de Octubre - 2022
Entrega de material vegetal.
Manejo de Extintores.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jader Montes	93429847	Tecnico	JADER D MONTES
2	Jaime Rico	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rico
3	Odimar Rodriguez	9267871	Tecnico	Odimar Rg
4	Náiver Lambraño	1052072287	Aux. Campo	Náiver Lambraño
5	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Melissa Alvarez			
18	Aux SST.			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: El balsamo, El Salado.
FECHA: 11 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material Vegetal.
TEMA: Triangulo de fuego y tipo de extintores.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral, y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	
2	Naiver Lambrano	1052072287	Aux. Campo	
3	Jader Montes	73429847	Tecnico	
4	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	
5	Jaime Rico	1002441583	Aux. Campo	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	Responsable: Jairo Alvarez.			
17	Aux SST.			
18				
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03






FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Hala noche Santo Rita.
FECHA: 12 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal.
TEMA: EPP: Protección Respiratoria.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	
2				
3	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	
4	Naiver Lambraño	1052072287	Aux. campo	
5	Jaime Rico	10024211583	Aux. campo	
6	Jordan Montes	932129847	Tecnico	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Melissa Alvarez			
19	Aux. SST			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Rancho Azul.
FECHA: 13 de octubre - 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal.
TEMA: Riesgo Eléctrico

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rico	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rico
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rf
3	Jader Montes	78429847	Tecnico	Jader Montes
4	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	Carlos Escobar
5	Nauver Lambraño	1052072287	Aux. Campo	Nauver Lambraño
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez			
19	Aux. SST			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Tolimay
FECHA: 14 de octubre - 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal.
TEMA: Cuidado del medio ambiente.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rico	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rico
2	Odimar Rodriguez	9267391	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	Carlos Escobar
4	Naiver Lambrano	1052072287	Aux. Campo	Naiver lambrano
5	Jader Montes	93429847	Tecnico	JADER D MONTES L
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Melissa Alvarez			
18	Aux SST.			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Santa Rita, El balsamo, El Salado
FECHA: 03 de octubre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Ergonomía: Movimientos Repetitivos

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rieo	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rieo
2	Naiver Lambrano	1062092287	Aux. Campo	Naiver Lambrano
3	Jader Montes	73429847	Tecnico	JADER A. MONTES
4	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
5	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	Carlos Escobar
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	Responsable: Helio	Alvarez		
17	Aux.	SST.		
18				
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR:	V. Cambajal, Piedra azul
FECHA:	01 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Seguimiento
TEMA:	Riesgo Mecánico

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
2	Jader Montes	73429849	Tecnico	Jader Montes
3	Nayer Lambrano	1052092287	Aux. campo	Nayer Lambrano
4	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rodriguez
5	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	Responsable: Jussara Alvarez			
17	Aux. SST			
18				
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. mala noche
FECHA: 05 de octubre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de seguimiento
TEMA: Importancia del autocuidado.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nauver Lambrano	1062092287	Aux. campo	Nauver lambrano
2	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
3	Jader Montes	93429847	Teenico	JADER D MONTES L
4	Odimar Rodriguez.	9267371	Teenico	Odimar Rf
5	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo.	Carlos Escobar
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felissa Alvarez.			
18	Aux. SST			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR:	V. Santa Fe, Roma
FECHA:	06 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de seguimiento
TEMA:	La Seguridad dentro y fuera del trabajo.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nalver Lambrano	1052072287	Aux. Campo	Nalver Lambrano
2	Jader Montes	73429849	Teenico	Jader Montes
3	Odimar Rodriguez	9267371	Teenico	Odimar Rf
4	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	Carlos Escobar
5	Jaime Rico	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rico
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Heussa Alvarez			
18	Aux. SST			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Bajo Grande
FECHA: 07 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD: Visita técnica
TEMA: Ergonomía: Posturas Prolongadas

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rieo	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rieo
2	Naiwer Lambrano	1052072287	Aux. Campo	Naiwer Lambrano
3	Jader Montes.	93429847	Técnico	Jader Montes
4	Odimar Rodriguez.	9267371	Técnico	Odimar Rg.
5	Carlos Escobar	1041610902	Aux. Campo	Carlos Escobar
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felissa Alvarez.			
18	Aux. SST			
19				
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	V. Rancho Azul
FECHA:	01 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de seguimiento.
TEMA:	Riesgos Psicosociales.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052072287	Aux. campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rg
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Feassa Suarez			
18	Aux SST.			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR:

V. Olata Noche

FECHA:

03 de Noviembre - 2022

ACTIVIDAD:

Visita de Seguimiento

TEMA:

Riesgos Locativos

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naver Lambrano	1052072287	Aux. campo	Naver Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Leissa Alvarez			
19	Aux 887			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. San Rafael
FECHA: 02 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA:

Riesgos en trabajos en alturas.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052072287	Aux-campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar RZ
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felisa Alvarez			
18	Aux 881			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. piedra azul
FECHA: 01 de Noviembre 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal
TEMA: Pausas Activas

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawer Lambrano	1052072287	Aux. campo	Nawer Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rodriguez
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Flores	73429847	Tecnico	Jader Flores
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Melissa Alvarez			
19	Aux. SST.			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Colonceto, Villa Andina
FECHA: 31 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal
TEMA: Posturas prolongadas mantenidas.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naiver Lambraño	1052072287	Aux-Campo	Naiver Lambraño
2	Odimar Rodriguez	9267391	Tecnico	Odimar Rg
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-Campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-Campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	93429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Melissa Suarez			
18	Aux- SST			
19				
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	V. El Hoyo, El Guapo
FECHA:	08 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Revisión.
TEMA:	

Prevención del Riesgo Químico.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nauwer Lambraño	1052072287	Aux-campo	Nauwer Lambraño
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Flores	73429847	Tecnico	Jader
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez			
19	Auxiliar SST			
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	V. Caracoli
FECHA:	09 de Noviembre, - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Revisión.
TEMA:	Factores de Riesgo en el area de trabajo.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naiwer Lambrano	1052072287	Aux-campo	Naiwer Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	[Signature]
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	[Signature]
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	J. Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Melissa Alvarez.			
19	Aux. SST.			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR:	Villa Amalia
FECHA:	10 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Revisión.
TEMA:	Prevención Riesgo Ergonómico.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawel Lambrano	1052072287	Aux-campo	Nawel Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felisa Alvarez			
19	Auxiliar SST			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Rancho Azul Santa Rita
FECHA: 11 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Revisión.
TEMA: Prevención del Consumo del Tabaco y Cigarillo

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawes Lambrano	1052072287	Aux. campo	Nawes Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rg
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez.			
19	Aux. SST.			
20				

	<p>FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	Zona de influencia del Proyecto.
FECHA:	15 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Seguimiento.
TEMA:	Seguridad en Casa.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052092257	Aux. campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9269371	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felissa Alvarez			
18	Aux. SST			
19				
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	Zona de Influencia del Proyecto
FECHA:	16 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Seguimiento.
TEMA:	Importancia del reciclaje.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052072289	Aux. campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Melissa Alvarez			
18	Aux. SST			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Zona de influencia del proyecto.
FECHA: 17 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento.
TEMA:

Código de Colores para la Clasificación de Residuos.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1051092289	Aux-campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felissa Suarez.			
18	Aux. SST			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-08-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Zona de influencia del Proyecto
FECHA: 18 de Noviembre - 2021
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA:

Importancia del Trabajo en Equipo.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral, y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Navei Sambrano	1052092283	Aux. campo	Navei Sambrano
2	Odimar Rodriguez	9269371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Pico	1002141583	Aux. campo	Jaime Pico
5	Jader Flores	73429817	Tecnico	Jader Flores
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissio Suarez			
19	Aux. SST.			
20				

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-BST-PM-05
			FECHA EDICION 01-08-2022

PLACA DEL VEHICULO	URE 01F		
MARCA	Honda		
MODELO	2019		
CILINDRAJE	150		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	104160902	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Carlos Escobar	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	26-10-26

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	18	06	23
Licencia de Conducción del conductor	26	10	26

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	06	02	19
Seguro Obligatorio (soat)	25	05	23

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	05-09-22	06-09-22	07-09-22	08-09-22	09-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua							
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espellos laterales	✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado de los escalapios	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

7	ELEMENTO A VERIFICAR POR COVID 19	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1	Elementos de Protección Personal (EPP) para la limpieza: monogafas, guantes de nitrilo y protección respiratoria	✓		✓		✓		✓			
7.2	kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables y un atomizador con alcohol al 70%	✓		✓		✓		✓			
7.3	bolsa color negro para recolección de residuos	✓		✓		✓		✓			
7.4	Verificación protocolo de limpieza y desinfección	✓		✓		✓		✓			
	1. Realiza el lavado	✓		✓		✓		✓			
	2. Limpia la moto antes y después de cada uso: 1. Switch de encendido 2. Comando de direccionales 3. cabrilla o manubrio. Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros	✓		✓		✓		✓			
	3. Desinfecta la moto, rociándola, (idealmente con alcohol en concentraciones al 70% (alcohol antiséptico para el hogar)) Nota: Aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.	✓		✓		✓		✓			
	4. Realiza el lavado de manos después de realizar la limpieza	✓		✓		✓		✓			
Observaciones:											
III. SEGUIMIENTO											
Fecha seguimiento											
Nombre Supervisor											
Firma Supervisor											
Firma del Conductor											

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	W V W 99 C		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2013		
CILINDRAJE	125 CC		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	73 429 P 47	
	NOMBRE Y APELLIDOS	JADERA R. MONTES LORA	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	29	08	22
Licencia de Conducción del conductor			

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	29	08	22
Seguro Obligatorio (soat)	29	08	22

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	05-09-22	06-09-22	07-09-22	08-09-22	09-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Pérdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua							
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas																		
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)			✓			✓			✓			✓			✓			
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)																		
4.4	Deformaciones de la llanta																		
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejos laterales		✓			✓			✓			✓			✓				
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)		✓			✓			✓			✓			✓				
5.4	Estado manillares		✓			✓			✓			✓			✓				
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado de los escalapios	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓				
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DKT 696		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2023		
CILINDRAJE	124		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1002441583	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jaime Rico Rivera	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	05	07	23	Tarjeta de propiedad	08	07	2022
Licencia de Conducción del conductor	05	07	24	Seguro Obligatorio (soat)	13	07	2023

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	05-07-22	06-07-22	07-07-22	08-07-22	09-07-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua							
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.9	Sistema eléctrico general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.4	Luces direccionales Delant (2)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.5	Luces direccionales Traseras (2)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.2	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.6	Indicador estado de batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.8	Estado de los escalapios	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																					
6.3	Guantes																					
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.6	Protectores para rodillas y canillas																					
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DKT 696		
MARCA	YAMAHA		
MODELO	2023		
CILINDRAJE	124		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1002 441583	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jaime Luis Rico Rivera	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	05	04	2024
Licencia de Conducción del conductor			

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjetas de propiedad	05	04	2022
Seguro Obligatorio (soat)	13	04	2023

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	29/08/22	30/08/22	31/08/22	01/09/22	02/09/22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua							
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado delos escalapios	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

	FORMATO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS	SG-SST-PM-05
		FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	W V W 94 C		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2013		
CILINDRAJE	125cc		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	73.629.847	
	NOMBRE Y APELLIDOS	JANER P MONTERO LOPEZ	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	3 Categorías no vence

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	29	08	22	Tarjeta de propiedad	29	08	22
Licencia de Conducción del conductor	—	—	—	Seguro Obligatorio (soat)	29	08	22

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	29/08/22	30/08/22	31/08/22	01/09/22	02/09/22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua	✓	✓	✓	✓	✓		
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓								
2.3	Estado pifion y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓								
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓								
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓								
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓								
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓								
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓								
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓								
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓								
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓								
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓								
3.3	Luces Bajas																					
3.4	Luces direccionales Delant (2)	✓			✓			✓			✓			✓								
3.5	Luces direccionales Traseras (2)	✓			✓			✓			✓			✓								
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓								
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Estado Liantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓								
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)			✓			✓			✓			✓			✓						
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)																					
4.4	Deformaciones de la llanta																					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓								
5.2	Espejos laterales		✓			✓			✓			✓			✓							
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)		✓			✓			✓			✓			✓							
5.4	Estado manillares		✓			✓			✓			✓			✓							
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓								
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓								
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
5.8	Estado delos escalapios	✓			✓			✓			✓			✓								
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓								
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓							
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																					
6.3	Guantes																					
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
6.6	Protectores para rodillas y canillas																					
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓								
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓								

7	ELEMENTO A VERIFICAR POR COVID 19	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1	Elementos de Protección Personal (EPP) para la limpieza: monogafas, guantes de nitrilo y protección respiratoria	✓		✓		✓		✓		✓	
7.2	Kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables y un atomizador con alcohol al 70%	✓		✓		✓		✓		✓	
7.3	bolsa color negro para recolección de residuos	✓		✓		✓		✓		✓	
7.4	Verificación protocolo de limpieza y desinfección	✓		✓		✓		✓		✓	
	1. Realiza el lavado	✓		✓		✓		✓		✓	
	2. Limpia la moto antes y después de cada uso. 1. Switch de encendido 2. Comando de direccionales 3. cabrilla o manubrio. Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros	✓		✓		✓		✓		✓	
	3. Desinfecta la moto, rociándola, (idealmente con alcohol en concentraciones al 70% (alcohol antiséptico para el hogar)). Nota: Aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.	✓		✓		✓		✓		✓	
	4. Realiza el lavado de manos después de realizar la limpieza	✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

licencia de 3 categoria no tiene vencimiento

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento

Nombre Supervisor

Firma Supervisor

Firma del Conductor

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	UVW-490		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2013		
CILINDRAJE	125 cc		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	73429847	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jader Montes Lopez	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	
		NO Venec.	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	29	08	22	Tarjeta de propiedad	29	08	22
Licencia de Conducción del conductor				Seguro Obligatorio (soat)	29	08	22

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	26-09-22	27-09-22	28-09-22	29-09-22	30-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua							
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓								
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓								
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓								
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓								
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓								
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓								
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓								
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓								
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓								
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓								
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓								
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓								
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓								
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓								
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓								
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓								
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓								
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)																					
4.4	Deformaciones de la llanta																					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓								
5.2	Espejos laterales		✓			✓			✓			✓			✓							
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)		✓			✓			✓			✓			✓							
5.4	Estado manillares		✓			✓			✓			✓			✓							
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓								
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓								
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
5.8	Estado delos escalapios	✓			✓			✓			✓			✓								
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓								
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓							
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																					
6.3	Guantes																					
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
6.6	Protectores para rodillas y canillas																					
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓								
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓								

7	ELEMENTO A VERIFICAR POR COVID 19	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1	Elementos de Protección Personal (EPP) para la limpieza: monogafas, guantes de nitrilo y protección respiratoria	✓		✓		✓		✓		✓	
7.2	kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables y un atomizador con alcohol al 70%	✓		✓		✓		✓		✓	
7.3	bolsa color negro para recolección de residuos	✓		✓		✓		✓		✓	
7.4	Verificación protocolo de limpieza y desinfección	✓		✓		✓		✓		✓	
	1. Realiza el lavado	✓		✓		✓		✓		✓	
	2. Limpia la moto antes y después de cada uso: 1. Switch de encendido 2. Comando de direccionales 3. cabrilla o manubrio. Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros	✓		✓		✓		✓		✓	
	3. Desinfecta la moto, rociándola, (idealmente con alcohol en concentraciones al 70% (alcohol antiséptico para el hogar)) Nota: Aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.	✓		✓		✓		✓		✓	
	4. Realiza el lavado de manos después de realizar la limpieza	✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

*Licencia de conducción no vence
Tercera categoría.*

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento

Nombre Supervisor

Firma Supervisor

Firma del Conductor

	FORMATO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS	SG-SST-PM-05
		FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DET-698		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2023		
CILINDRAJE	129		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1002HH1583	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jaime Rico Riquelme	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	05	07	24
Licencia de Conducción del conductor	05	07	24

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	05	07	22
Seguro Obligatorio (soat)	13	07	23

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	26-09-22	27-09-22	28-09-22	29-09-22	30-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Pérdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	/	/	/	/	/		
1.2 Nivel de combustible	/	/	/	/	/		
1.3 Nivel de líquido de frenos	/	/	/	/	/		
1.4 Fugas de combustible	/	/	/	/	/		
1.5 Fugas de Agua							
1.6 Fugas de Aceite motor	/	/	/	/	/		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	/	/	/	/	/		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.9	Sistema eléctrico general	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.2	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.8	Estado delos escalapies	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	URE-DIF		
MARCA	HONDA		
MODELO	2019		
CILINDRAJE	150		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	DH1610902	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Carlos Escobar	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	26-10-26

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	18	06	23	Tarjeta de propiedad	06	02	19
Licencia de Conducción del conductor	26	10	26	Seguro Obligatorio (soat)	25	05	23

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	26-09-22	27-09-22	28-09-22	29-09-22	30-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Pérdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua	✓	✓	✓	✓	✓		
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tensión de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado delos escalapios	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

	FORMATO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS	SG-SST-PM-05
		FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DKT-698		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2023		
CILINDRAJE	124		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1002441583	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jaime Rico Rivera	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	05	07	24	Tarjeta de propiedad	05	07	22
Licencia de Conducción del conductor	05	07	24	Seguro Obligatorio (soat)	13	07	23

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	10-10-22	11-10-22	12-10-22	13-10-22	14-10-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua	✓						
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	/			/			/			/			/					
2.2	Estado y tension de la cadena	/			/			/			/			/					
2.3	Estado piñon y corona trasera	/			/			/			/			/					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	/			/			/			/			/					
2.5	Estado y tensión freno delantero	/			/			/			/			/					
2.6	Estado y tensión freno trasero	/			/			/			/			/					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	/			/			/			/			/					
2.8	Funcionamiento de la dirección	/			/			/			/			/					
2.9	Sistema electrico general	/			/			/			/			/					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	/			/			/			/			/					
2.11	Estado del exosto	/			/			/			/			/					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	/			/			/			/			/					
3.2	Luces Altas	/			/			/			/			/					
3.3	Luces Bajas	/			/			/			/			/					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	/			/			/			/			/					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	/			/			/			/			/					
3.6	Luces del tablero	/			/			/			/			/					
3.7	Luz Freno	/			/			/			/			/					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	/			/			/			/			/					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	/			/			/			/			/					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	/			/			/			/			/					
4.4	Deformaciones de la llanta	/			/			/			/			/					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	/			/			/			/			/					
5.2	Espejos laterales	/			/			/			/			/					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	/			/			/			/			/					
5.4	Estado manillares	/			/			/			/			/					
5.5	Indicador de velocidad	/			/			/			/			/					
5.6	Indicador estado de bateria	/			/			/			/			/					
5.7	Pito	/			/			/			/			/					
5.8	Estado de los escalapios	/			/			/			/			/					
5.9	Placa	/			/			/			/			/					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	/			/			/			/			/					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	/			/			/			/			/					
6.5	Gafas de protección	/			/			/			/			/					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	/			/			/			/			/					
6.8	Chaleco Reflectivo	/			/			/			/			/					

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DPE-017		
MARCA	HONDA		
MODELO	2019		
CILINDRAJE	150		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1041610902	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Carlos Escobar	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	26-10-26

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	18	06	23	Tarjeta de propiedad	06	02	19
Licencia de Conducción del conductor	26	10	26	Seguro Obligatorio (soat)	28	05	23

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA		10-10-22			11-10-22			12-10-22			13-10-22			14-10-22								
KILOMETRAJE																						
1	Niveles y Perdidas de Líquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Estado Nivel de Aceite	/			/			/			/			/								
1.2	Nivel de combustible	/			/			/			/			/								
1.3	Nivel de liquido de frenos	/			/			/			/			/								
1.4	Fugas de combustible	/			/			/			/			/								
1.5	Fugas de Agua	/			/			/			/			/								
1.6	Fugas de Aceite motor	/			/			/			/			/								
1.7	Fugas de líquidos de frenos	/			/			/			/			/								

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	/			/			/			/			/					
2.2	Estado y tension de la cadena	/			/			/			/			/					
2.3	Estado piñon y corona trasera	/			/			/			/			/					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	/			/			/			/			/					
2.5	Estado y tensión freno delantero	/			/			/			/			/					
2.6	Estado y tensión freno trasero	/			/			/			/			/					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	/			/			/			/			/					
2.8	Funcionamiento de la dirección	/			/			/			/			/					
2.9	Sistema electrico general	/			/			/			/			/					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	/			/			/			/			/					
2.11	Estado del exosto	/			/			/			/			/					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	/			/			/			/			/					
3.2	Luces Altas	/			/			/			/			/					
3.3	Luces Bajas	/			/			/			/			/					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	/			/			/			/			/					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	/			/			/			/			/					
3.6	Luces del tablero	/			/			/			/			/					
3.7	Luz Freno	/			/			/			/			/					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	/			/			/			/			/					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	/			/			/			/			/					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	/			/			/			/			/					
4.4	Deformaciones de la llanta	/			/			/			/			/					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	/			/			/			/			/					
5.2	Espejos laterales	/			/			/			/			/					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	/			/			/			/			/					
5.4	Estado manillares	/			/			/			/			/					
5.5	Indicador de velocidad	/			/			/			/			/					
5.6	Indicador estado de bateria	/			/			/			/			/					
5.7	Pito	/			/			/			/			/					
5.8	Estado delos escalapies	/			/			/			/			/					
5.9	Placa	/			/			/			/			/					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	/			/			/			/			/					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	/			/			/			/			/					
6.5	Gafas de protección	/			/			/			/			/					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	/			/			/			/			/					
6.8	Chaleco Reflectivo	/			/			/			/			/					

	FORMATO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS	SG-SST-PM-05
		FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	WVW-H9C		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2013		
CILINDRAJE	125 cc		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	73 H29 B49	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jader Montes Torres	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	
		No vence	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	29	08	22
Licencia de Conducción del conductor			

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	29	08	22
Seguro Obligatorio (soat)	29	08	22

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	10-10-22	11-10-22	12-10-22	13-10-22	14-10-22		
KILOMETRAJE							

1	Niveles y Perdidas de Líquidos			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Estado Nivel de Aceite			/			/			/			/			/			/		
1.2	Nivel de combustible			/			/			/			/			/			/		
1.3	Nivel de líquido de frenos			/			/			/			/			/			/		
1.4	Fugas de combustible			/			/			/			/			/			/		
1.5	Fugas de Agua																				
1.6	Fugas de Aceite motor			/			/			/			/			/			/		
1.7	Fugas de líquidos de frenos			/			/			/			/			/			/		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓								
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓								
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓								
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓								
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓								
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓								
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓								
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓								
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓								
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓								
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓								
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓								
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓								
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓								
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓								
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓								
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓								
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)																					
4.4	Deformaciones de la llanta																					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓								
5.2	Espejos laterales		✓			✓			✓			✓			✓							
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)		✓			✓			✓			✓			✓							
5.4	Estado manillares		✓			✓			✓			✓			✓							
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓								
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓								
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
5.8	Estado de los escalapios	✓			✓			✓			✓			✓								
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓								
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓							
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																					
6.3	Guantes																					
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
6.6	Protectores para rodillas y canillas																					
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓								
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓								

7	ELEMENTO A VERIFICAR POR COVID 19	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1	Elementos de Protección Personal (EPP) para la limpieza: monogafas, guantes de nitrilo y protección respiratoria	✓		✓		✓		✓		✓	
7.2	kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables y un atomizador con alcohol al 70%	✓		✓		✓		✓		✓	
7.3	bolsa color negro para recolección de residuos	✓		✓		✓		✓		✓	
7.4	Verificación protocolo de limpieza y desinfección	✓		✓		✓		✓		✓	
	1. Realiza el lavado	✓		✓		✓		✓		✓	
	2. Limpia la moto antes y después de cada uso: 1. Switch de encendido 2. Comando de direccionales 3. cabrilla o manubrio. Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros	✓		✓		✓		✓		✓	
	3. Desinfecta la moto, rociándola, (idealmente con alcohol en concentraciones al 70% (alcohol antiséptico para el hogar)) Nota: Aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.	✓		✓		✓		✓		✓	
	4. Realiza el lavado de manos después de realizar la limpieza	✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

*licencia de conducción de 3ra categoría
NO vence.*

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento

Nombre Supervisor

Firma Supervisor

Firma del Conductor

	FORMATO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS	SG-SST-PM-05
		FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DPE - DIF		
MARCA	HONDA		
MODELO	2019		
CILINDRAJE	150		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1041610402	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Carlos Escobar	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	26-10-26

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	18	06	23
Licencia de Conducción del conductor	26	10	26

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	06	02	19
Seguro Obligatorio (soat)	25	05	23

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	12-09-22	13-09-22	14-09-22	15-09-22	16-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Pérdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
1.5 Fugas de Agua	✓	✓	✓	✓	✓		
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓		

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Luces direccionales Delant (2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras (2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado delos escalapios	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

	FORMATO		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS		SG-SST-PM-05
			FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	DET-698		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2023		
CILINDRAJE	129		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1002HH1583	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jaime Rico Rivera	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	05	07	24	Tarjeta de propiedad	05	07	22
Licencia de Conducción del conductor	05	07	24	Seguro Obligatorio (soat)	13	07	28

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	12-09-22	13-09-22	14-09-22	15-09-22	16-09-22		
KILOMETRAJE							
1 Niveles y Perdidas de Líquidos	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
1.1 Estado Nivel de Aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2 Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3 Nivel de líquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.4 Fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.5 Fugas de Agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.6 Fugas de Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.7 Fugas de líquidos de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Deformaciones de la llanta	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)	✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado manillares	✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado delos escalapios	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

7	ELEMENTO A VERIFICAR POR COVID 19	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1	Elementos de Protección Personal (EPP) para la limpieza: monogafas, guantes de nitrilo y protección respiratoria	✓		✓		✓		✓		✓	
7.2	kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables y un atomizador con alcohol al 70%	✓		✓		✓		✓		✓	
7.3	bolsa color negro para recolección de residuos	✓		✓		✓		✓		✓	
7.4	Verificación protocolo de limpieza y desinfección	✓		✓		✓		✓		✓	
	1. Realiza el lavado	✓		✓		✓		✓		✓	
	2. Limpia la moto antes y después de cada uso: 1. Switch de encendido 2. Comando de direccionales 3. cabrilla o manubrio. Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros	✓		✓		✓		✓		✓	
	3. Desinfecta la moto , rociándola, (idealmente con alcohol en concentraciones al 70% (alcohol antiséptico para el hogar)) Nota: Aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.	✓		✓		✓		✓		✓	
	4. Realiza el lavado de manos después de realizar la limpieza	✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento

Nombre Supervisor

Firma Supervisor

Firma del Conductor

	FORMATO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTOS	SG-SST-PM-05
		FECHA EDICION 01-06-2022

PLACA DEL VEHICULO	WVW-49C		
MARCA	Yamaha		
MODELO	2013		
CILINDRAJE	125cc		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	732129849	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jader Montes Lopez	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA	No vence

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	29	08	22
Licencia de Conducción del conductor			

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	29	08	22
Seguro Obligatorio (soat)	29	08	22

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA	12-09-22	13-09-22	14-09-22	15-09-22	16-09-22		
KILOMETRAJE							

1	Niveles y Pérdidas de Líquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Estado Nivel de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Nivel de combustible	✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Nivel de líquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Fugas de combustible	✓			✓			✓			✓			✓					
1.5	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓					
1.6	Fugas de Aceite motor	✓			✓			✓			✓			✓					
1.7	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓					

2	Estado Mecanico	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Estado y tension de la cadena	✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Estado piñon y corona trasera	✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Estado guaya y sistema embrague	✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Estado y tensión freno delantero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Estado y tensión freno trasero	✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Suspensión trasera (amortiguadores)	✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Funcionamiento de la dirección	✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Sistema electrico general	✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Funcionamiento caja de cambios	✓			✓			✓			✓			✓					
2.11	Estado del exosto	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de Luces	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Luces direccionales Delant.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Luces direccionales Traseras.(2)	✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Luces del tablero	✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Estado Llantas	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Delantera (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Trasera Derecha (Desgaste y ajuste)	✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Estado de los pernos (Ajuste)																		
4.4	Deformaciones de la llanta																		
5	Estado General	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado y ajuste de la silla del conductor	✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Espejos laterales		✓			✓			✓			✓			✓				
5.3	Estado barreras laterales (si aplica)		✓			✓			✓			✓			✓				
5.4	Estado manillares		✓			✓			✓			✓			✓				
5.5	Indicador de velocidad	✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Indicador estado de bateria	✓			✓			✓			✓			✓					
5.7	Pito	✓			✓			✓			✓			✓					
5.8	Estado de los escapapiés	✓			✓			✓			✓			✓					
5.9	Placa	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Equipo de Seguridad	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Casco de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓				
6.2	Chaqueta antifricción protección codos																		
6.3	Guantes																		
6.4	Botas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
6.5	Gafas de protección	✓			✓			✓			✓			✓					
6.6	Protectores para rodillas y canillas																		
6.7	Herramienta	✓			✓			✓			✓			✓					
6.8	Chaleco Reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓					

7	ELEMENTO A VERIFICAR POR COVID 19	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7.1	Elementos de Protección Personal (EPP) para la limpieza: monogafas, guantes de nitrilo y protección respiratoria	✓		✓		✓		✓		✓	
7.2	kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos o toallas desechables y un atomizador con alcohol al 70%	✓		✓		✓		✓		✓	
7.3	bolsa color negro para recolección de residuos	✓		✓		✓		✓		✓	
7.4	Verificación protocolo de limpieza y desinfección	✓		✓		✓		✓		✓	
	1. Realiza el lavado	✓		✓		✓		✓		✓	
	2. Limpia la moto antes y después de cada uso: 1. Switch de encendido 2. Comando de direccionales 3. cabrilla o manubrio. Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros	✓		✓		✓		✓		✓	
	3. Desinfecta la moto, rociándola, (idealmente con alcohol en concentraciones al 70% (alcohol antiséptico para el hogar)) Nota: Aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente.	✓		✓		✓		✓		✓	
	4. Realiza el lavado de manos después de realizar la limpieza	✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

*licencia de conducción no vence.
tercera categoría*

III. SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento

Nombre Supervisor

Firma Supervisor

Firma del Conductor



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico.**

**Naiver Lambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas


Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

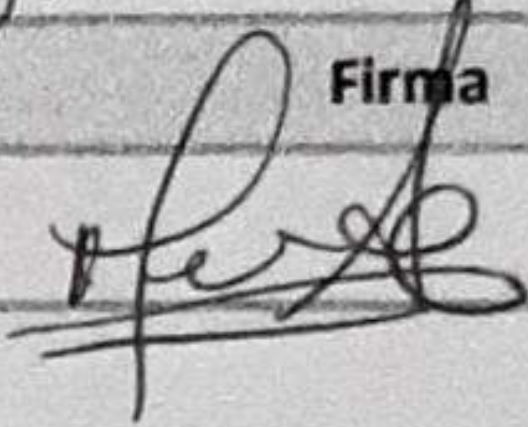EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res:	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☒ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño cc 1052072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez cc 9269371	Odimar R8
Carlos Escobar cc 1041610902	WW
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felisso Alvarez cc 10493218609	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP Inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Peligros biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	Mordeduras de serpientes Picaduras de insectos Caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de EPP
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de Elementos de protección personal

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Plataformas.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 Personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RR HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable, la actividad esta sujeta a cambios climáticos.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Área/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El Bolson**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ESPACIO CONFINADO CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS OTRO, CUAL? **No requiere Permiso.**

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Náyer Lambrano cc 1052092287	Náyer Lambrano
Delmar Rodriguez cc 9267871	Delmar Rf
Carlos Escobar cc 1041610902	W

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales		
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	x	Moto cicletas para el traslado a las Veredas.
Otras		

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicletas hacia las Veredas previamente programadas	Accidente de tránsito	choques golpes caídas	Uso de EPP (casco) inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes picaduras de insectos caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de elementos de protección personal.
Finalizadas las visitas en las demás Veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Lambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez ce 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico.**

**Naiver Lambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas


Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

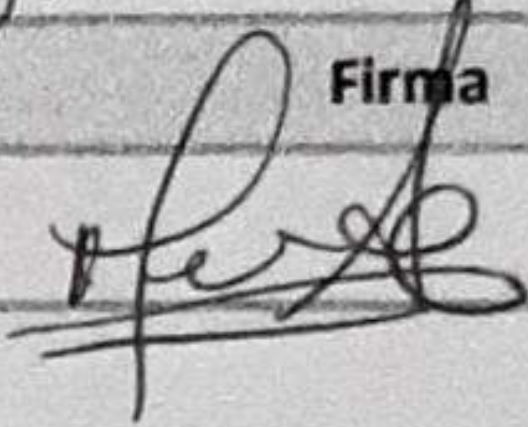EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res:	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☒ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño ce 1062072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez ce 9269371	Odimar R8
Carlos Escobar ce 1041610902	WW
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Feliso Alvarez ce 10493218609	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP Inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	Mordeduras de serpientes Picaduras de insectos Caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de EPP
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de Elementos de protección personal

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Plataformas.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 Personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RR HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable, la actividad esta sujeta a cambios climáticos.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Área/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El Bolson**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ESPACIO CONFINADO CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS OTRO, CUAL? **No requiere Permiso.**

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Nável Lambraño cc 1052092287
Delmar Rodríguez cc 9267871
Carlos Escobar cc 1041610902

Nável Lambraño
Delmar Rf
Carlos Escobar

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Moto cicletas para el traslado a las Veredas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicletas hacia las Veredas previamente programadas	Accidente de tránsito	choques golpes caídas	Uso de EPP (casco) inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes picaduras de insectos caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de elementos de protección personal.
Finalizadas las visitas en las demás Veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Lambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez ce 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. El Hobo, B. grande, Caracoli**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y Descargue de material Vegetal.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores

(Ejecutor)

Firma

**Odimar Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes**

**Odimar R.G.
JADER MONTES**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para el transporte de material Vegetal

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)

La actividad se realiza a nivel vehicular, motos

N/A

N/A

inspecciones de Seguridad.

Botas de Seguridad, casco, gafas
guantes.

Recurso humano.

No

Si

Superficies resbaladizas, cargas pesadas, picaduras de insectos, mordeduras de animales, exposición a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
-llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual)	Presencia de animales (insectos, reptiles)	Picaduras mordeduras.	Uso de elementos de protección personal.
-Cargue de canastillas al carro	Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas.	lesiones musculo-esqueleticos	Charlas sobre higiene postural (ayudas mecánicas, si es posible)
-Descargue de canastillas en el carro.			pausas activas
-Traslado a los lotes en el carro.	Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.	lesiones musculo esquelético traumas Golpes.	Revisiones Preventivas y Periodicas (inspección preoperacional)
-Descargue del carro en el lote	Movimientos repetitivos sobre-esfuerzo posturas prolongadas mantenidas. exposición a altas Temperaturas.	lesiones musculo esquelético lumbalgias Golpe de calor insolación Quemaduras.	Charlas sobre higiene postural y ergonomía. pausas activas uso de vestimenta adecuada para la actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y ren.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.


Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Odinor Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes.


Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Helissa Alvarez S.

Firma


Luis
SANCHEZ D. MONTES L

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **IngagroF**

Área/Proceso:

Operativa.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am.**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y des carga de material vegetal.

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. Carabaja.**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00pm.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

**Carlos
Nave
Jaime**

Firma

**Nave
Jaime**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para transporte de material vegetal.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?
(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)

la actividad se realiza a nivel
vehículo, motos.

N/A.

N/A.

inspecciones de seguridad.

Botas de seguridad, casco, gafas
guantes. 07 personas.

Reverso humano.

NO

SI

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picadoras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
<p>Llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual).</p> <p>Cargar de canastillas al carro.</p> <p>Descargar de las canastillas en el carro</p>	<p>Presencia de animales (insectos, reptiles)</p> <p>Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p>	<p>• mordeduras • picaduras</p> <p>lesiones musculoesqueléticas</p>	<p>uso de elementos de protección personal.</p> <p>Charlas sobre higiene postural - Ayudas mecánicas (si es posible) pausas Activas</p>
<p>Traslado a los lotes en el carro</p> <p>Descargar del carro en el lote.</p>	<p>Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.</p> <p>movimientos repetitivos Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p> <p>Exposición a altas temperaturas</p>	<p>lesiones musculoesqueléticas Traumas, golpes.</p> <p>lesiones musculoesqueléticas - lumbalgias.</p> <p>golpe de calor insolación quemaduras.</p>	<p>Revisiones preventivas (inspecciones pre-operacionales de Vehículo)</p> <p>- Charlas higiene postural + Ergonomía - pausas Activas.</p> <p>- Uso de Vestimenta adecuada para la actividad - protectores solares.</p>

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y riesgos.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar 10111610902
Nover Lambraño 1052092287
Jaime Pico 10024411583

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez S. 1019348699

Firma

Nover Lambraño
Jaime Pico

Firma

Felissa Alvarez S.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INBAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **V. el Hobo, Caracoli**

Lugar de Trabajo: **Bajo Grande, mala noche**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento
Revisión de Siembra.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Naliver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar**

**Naliver Lambrano
Jaime Rico**
[Signature]

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x motos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Sambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Sambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez cc 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Area/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **2. Poral**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El Bolívar**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL? No requiere Permiso.	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Náyer Lombardo c.c. 1052092207	Náyer Lombardo
Edimar Rodríguez c.c. 9267371	Edimar Rf
Carlos Escobar c.c. 1041610902	u

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	x Motocicletas para el traslado a las Veredas.
Otras	

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	10 escaleras.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	PP HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable. la actividad está sujeta a cambios climáticos.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP inspecciones preoperacionales
Llegada a los Piesgos lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Piesgos biológicos (presencia de animales) superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes Picaduras de insectos caídas al mismo nivel golpes.	Uso de EPP.
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de Elementos de protección personal

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño ce 1052072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez ce 9269371	Odimar RS
Carlos Escobar ce 1041610902	W
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felissa Alvarez ce 10493218607	Felissa



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Área/Proceso: **Operativo**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rrol**

Lugar de Trabajo: **Parul, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Nauver Lambrano
Jaime Rico.**

**Nauver Lambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motos, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, bafas, Botas de seguridad.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Recurso humano.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
*Traslado en motocicletas hacia las veredas previamente programadas	• Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP (casco) Inspecciones preoperatorias.
* Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias.	• Riesgos Biológicos (presencia de animales) • Superficies resbaladizas	mordeduras de Serpientes Picaduras de insectos. caídas al mismo nivel. Golpes	Uso de Elementos de protección personal
Finalizadas las visitas en las demás veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re:
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Sí, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar

Firma

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez Sanabria

Firma

Felissa Alvarez Sanabria



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INBAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **V. el Hobo, Caracoli**

Lugar de Trabajo: **Bajo Grande, mala noche**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento
Revisión de Siembra.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Naliver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar**

**Naliver Lambrano
Jaime Rico**
[Signature]

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x motos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Sambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Sambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez cc 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Area/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **2. Rural**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El Bolson**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL? No requiere Permiso.	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Náyer Lombardo c.c. 1052092287	Náyer Lombardo
Edimar Rodríguez c.c. 9267371	Edimar Rf
Carlos Escobar c.c. 1041610902	u

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	x Motocicletas para el traslado a las Veredas.
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	10 escaleras.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	PP HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable. la actividad esta sujeta a cambios climáticos.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP inspecciones preoperacionales
Llegada a los Piesgos lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Peligros biológicos (presencia de animales) superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes Picaduras de insectos caídas al mismo nivel golpes.	Uso de EPP.
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de Elementos de protección personal

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño ce 1052072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez ce 9269371	Odimar RS
Carlos Escobar ce 1041610902	W
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felissa Alvarez ce 10493218607	Felissa



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Área/Proceso: **Operativo**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rrol**

Lugar de Trabajo: **Parul, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Nauver Jambrano
Jaime Rico.**

**Nauver Jambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motos, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, bafas, Botas de seguridad.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Recurso humano.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
*Traslado en motocicletas hacia las veredas previamente programadas	• Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP (casco) Inspecciones preoperatorias.
* Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias.	• Riesgos Biológicos (presencia de animales) • Superficies resbaladizas	mordeduras de Serpientes Picaduras de insectos. caídas al mismo nivel. Golpes	Uso de Elementos de protección personal
Finalizadas las visitas en las demás veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re:
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Sí, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar

Firma

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez Sanabria

Firma

Felissa



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico.**

**Naiver Lambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas


Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

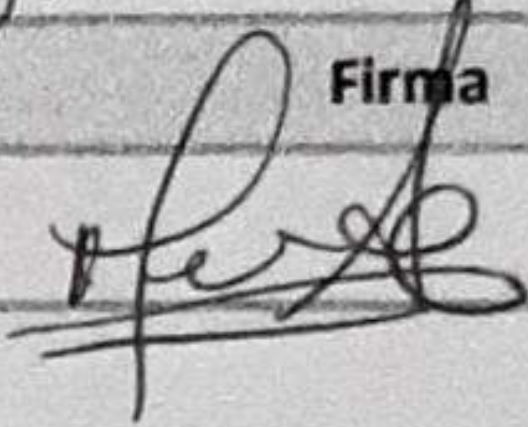EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res:	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☒ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño cc 1062072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez cc 9269371	Odimar R8
Carlos Escobar cc 1041610902	WW
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felisso Alvarez cc 10493218609	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP Inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	Mordeduras de serpientes Picaduras de insectos Caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de EPP
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de Elementos de protección personal

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Plataformas.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 Personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RR HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable, la actividad esta sujeta a cambios climáticos.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Área/Proceso: **Operativo**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**

Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El balneario**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL? **No requiere Permiso.**

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Náweli Lambrano cc 1052092287
Delmar Rodríguez cc 9267871
Carlos Escobar cc 1041610902**

**Náweli Lambrano
Delmar Rf
[Firma]**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Moto cicletas para el traslado a las Veredas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicletas hacia las Veredas previamente programadas	Accidente de tránsito	choques golpes caídas	Uso de EPP (casco) inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes picaduras de insectos caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de elementos de protección personal.
Finalizadas las visitas en las demás Veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Lambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez ce 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. El Hobo, B. grande, Caracoli**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y Descargue de material Vegetal.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores

(Ejecutor)

Firma

**Odimar Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes**

**Odimar R.G.
JADER MONTES**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para el transporte de material Vegetal

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)

La actividad se realiza a nivel.
vehículo, motos
N/A

N/A

inspecciones de Seguridad.

Botas de Seguridad, casco, gafas
guantes.

Recurso humano.

No

Si

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picaduras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
-llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual)	Presencia de animales (insectos, reptiles)	Picaduras mordeduras.	Uso de elementos de protección personal.
-Cargue de canastillas al carro	Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas.	lesiones musculo-esqueleticos	Charlas sobre higiene postural (ayudas mecánicas, si es posible)
-Descargue de canastillas en el carro.			pausas activas
-Traslado a los lotes en el carro.	Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.	lesiones musculo esquelético traumas Golpes.	Revisiones Preventivas y Periodicas (inspección preoperacional)
-Descargue del carro en el lote	Movimientos repetitivos sobre-esfuerzo posturas prolongadas mantenidas. exposición a altas Temperaturas.	lesiones musculo esquelético lumbalgias Golpe de calor insolación Quemaduras.	Charlas sobre higiene postural y ergonomía. pausas activas uso de vestimenta adecuada para la actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y ren.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.


Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Odinor Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes.


Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Helissa Alvarez S.

Firma


SANDER D. MONTES L

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **IngagroF**

Área/Proceso:

Operativa.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am.**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y des carga de material vegetal.

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. Carabaja.**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00pm.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

**Carlos
Nancy
Jaime**

Firma

**Nancy Latorre
Jaime**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para transporte de material vegetal.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

la actividad se realiza a nivel
vehículo, motos.

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

N/A.

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

N/A.

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección
requeridos?

inspecciones de seguridad.

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

Botas de seguridad, casco, gafas
guantes. 07 personas.

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

Recurso humano.

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

NO

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área
de trabajo?

SI

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza,
superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas,
etc.)

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picaduras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
<p>Llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual).</p> <p>Cargue de canastillas al carro.</p> <p>Descargue de las canastillas en el carro</p>	<p>Presencia de animales (insectos, reptiles)</p> <p>Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p>	<p>• mordeduras • picaduras</p> <p>lesiones musculoesquelético</p>	<p>uso de elementos de protección personal.</p> <p>Charlas sobre higiene postural - Ayudas mecánicas (si es posible) pausas Activas</p>
<p>Traslado a los lotes en el carro</p> <p>Descargue del carro en el lote.</p>	<p>Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.</p> <p>movimientos repetitivos Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p> <p>Exposición a altas temperaturas</p>	<p>lesiones musculoesquelético Traumas, golpes.</p> <p>lesiones musculoesquelético - lumbalgias.</p> <p>golpe de calor insolación quemaduras.</p>	<p>Revisiones preventivas (inspecciones pre-operacionales de Vehículo)</p> <p>- Charlas higiene postural + Ergonomía - pausas Activas.</p> <p>- Uso de Vestimenta adecuada para la actividad - protectores solares.</p>

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y riesgos.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar 10111610902
Nover Lambraño 1052092287
Jaime Pico 10024411583

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez S. 1019348699

Firma

Nover Lambraño
Jaime Pico

Firma

Felissa Alvarez



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. El Hobo, B. grande, Caracoli**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y Descargue de material Vegetal.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores

(Ejecutor)

Firma

**Odimar Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes**

**Odimar R.G.
JADER MONTES**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para el transporte de material Vegetal

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)

La actividad se realiza a nivel.
vehículo, motos

N/A

N/A

inspecciones de Seguridad.

Botas de Seguridad, casco, gafas
guantes.

Recurso humano.

No

Si

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picaduras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
-llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual)	Presencia de animales (insectos, reptiles)	Picaduras mordeduras.	Uso de elementos de protección personal.
-Cargue de canastillas al carro	Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas.	lesiones musculo-esqueleticos	Charlas sobre higiene postural (ayudas mecánicas, si es posible)
-Descargue de canastillas en el carro.			pausas activas
-Traslado a los lotes en el carro.	Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.	lesiones musculo esquelético traumas Golpes.	Revisiones Preventivas y Periodicas (inspección preoperacional.)
-Descargue del carro en el lote	Movimientos repetitivos sobre-esfuerzo posturas prolongadas mantenidas. exposición a altas Temperaturas.	lesiones musculo esquelético lumbalgias Golpe de calor insolación Quemaduras.	Charlas sobre higiene postural y ergonomía. pausas activas uso de vestimenta adecuada para la actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y ren.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.


Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Odinor Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes.


Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Helissa Alvarez S.

Firma


Luis
SANCHEZ MONTES L

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **IngagroF**

Área/Proceso:

Operativa.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am.**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y des carga de material vegetal.

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. Carabaja.**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00pm.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

**Carlos
Nancy
Jaime**

Firma

**Nancy Latorre
Jaime**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para transporte de material vegetal.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

la actividad se realiza a nivel
vehículo, motos.

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

N/A.

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

N/A.

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección
requeridos?

inspecciones de seguridad.

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

Botas de seguridad, casco, gafas
guantes. 07 personas.

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

Recurso humano.

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

NO

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área
de trabajo?

SI

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza,
superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas,
etc.)

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picaduras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
<p>Llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual).</p> <p>Cargue de canastillas al carro.</p> <p>Descargue de las canastillas en el carro</p>	<p>Presencia de animales (insectos, reptiles)</p> <p>Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p>	<p>• mordeduras • picaduras</p> <p>lesiones musculoesquelético</p>	<p>uso de elementos de protección personal.</p> <p>Charlas sobre higiene postural - Ayudas mecánicas (si es posible) pausas Activas</p>
<p>Traslado a los lotes en el carro</p> <p>Descargue del carro en el lote.</p>	<p>Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.</p> <p>movimientos repetitivos Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p> <p>Exposición a altas temperaturas</p>	<p>lesiones musculoesquelético Traumas, golpes.</p> <p>lesiones musculoesquelético - lumbalgias.</p> <p>golpe de calor insolación quemaduras.</p>	<p>Revisiones preventivas (inspecciones pre-operacionales de Vehículo)</p> <p>- Charlas higiene postural + Ergonomía - pausas Activas.</p> <p>- Uso de Vestimenta adecuada para la actividad - protectores solares.</p>

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar 10111610902
Nover Lambraño 1052092287
Jaime Pico 10024411583

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez S. 1019348699

Firma

Nover Lambraño
Jaime Pico

Firma

Felissa Alvarez



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural.**

Lugar de Trabajo: **V. el balsamo, el salado, San Rafael, Sto. Fe.**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de siembra.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Odimar Rodriguez ce 9267371
Jader Montes ce 73429847
Carlos Escobar ce 1041610902**

**Odimar R &
Jader P Montes L**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x

motocicletas para el traslado a las veredas.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Botas de seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable. la actividad esta sujeta a cambios climáticos

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicleta hacia las veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP inspecciones preoperacionales.
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	Mordeduras de serpientes Picadura de insectos Caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de EPP.
Finalizadas las visitas en las demás veredas retornan en las motos.	Accidente de tránsito.	Choques Golpes Caídas	Uso de elementos de protección personal.

DECLARACIÓN DE HECHOS

¿El presente, producido a una persona que reside en territorio?

- ☐ Si, diligenciado a su presencia con la firma, dactilada con el consentimiento otorgado de parte de ella, con los datos y en el momento de la diligencia.
- ☒ No, diligenciado con la firma con presencia, implícita de la autoridad competente.

¿El presente producido antes de la firma con las autoridades competentes?

- ☒ Si, producido con la firma.
- ☐ No, producido al momento antes de tener cualquier decisión.

Nombre y Cédula de los Interrogados (Operarios)

Olivero Rodríguez
Javier Gómez
Carlos Escobar

Nombre y Cédula de la persona (Director)

Gerardo Álvarez de 1047948699

Fecha

29 de mayo de 2014
Luis
[Firma]



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGABROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **V. el Hoyo, Caracoli**

Lugar de Trabajo: **Bojo grande, mala noche**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento
Revisión de Bembora.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Naiver Lambraño
Jaime Rico
Carlos Escobar**

**Naiver Lambraño
Jaime Rico
(Firma)**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x motos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicletas hacia las Veredas previamente programadas	Accidente de tránsito	choques golpes caídas	Uso de EPP (casco) inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes picaduras de insectos caídas al mismo nivel golpes.	Uso de elementos de protección personal.
Finalizadas las visitas en las demás Veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Nauver Lambrano
Jaime Rico


Firma


Nauver Lambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez ce 1049348699

Firma





ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INCAOROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **3 Rod**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGÍA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos

Cédula, nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Nauver Lambraño
Jaime Rico**

**Nauver Lambraño
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

y fotos para el transporte a las Veredas

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motociclos, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, Botas de Seguridad.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 Trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Recurso humano.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
*Traslado en motocicletas hacia las veredas previamente programadas	• Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP (casco) Inspecciones preoperacionales.
* Llegado a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias.	• Riesgos Biológicos (presencia de animales) • Superficies resbaladizas	mordeduras de Serpientes Picaduras de insectos. Caídas al mismo nivel. Golpes	Uso de elementos de protección personal
Finalizadas las visitas en las demás veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re:
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar

Firma

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez Sanabria

Firma

Felissa



FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMELLAS

Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2019
Código: GT-H-F-78

Nombre del responsable de la inspección:

Felissa Alvarez Sandoval

Área:

Operativa

CAMELLAS

Condiciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

CONDICIÓN DE CAMELLA

No.	N. DE CAMELLA	USUCACIÓN PISO	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	ESTADO DEL SOPORTE	INSTALACIÓN A PARED	CORREAS DE SEGURIDAD	LIMPIEZA	INMOVILIZADOR	OBSERVACIONES
1	4	Vivero	B	B	B	B	B	B	B	
2										
3										
4										
5										

BOTIQUIN

Condiciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

CONDICIONES DEL BOTIQUIN

No.	N. DE BOTIQUIN	USUCACIÓN PISO	MORRAL - ESTADO GENERAL (Limpio, señalizado, etc.)	GASAS LIMPIAS PAQUETE (20 Unidades)	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" (1 Unidad)	BAJALENGUAS (Paq. X 20)	GUANTES DE LATEX (Caja x 100 unidades)	VENDA ELASTICA 2 x 5 YARDAS (1 Unidad)	VENDA ELASTICA 3 x 5 YARDAS (1 Unidad)	VENDA ELASTICA 5 x 5 YARDAS (1 Unidad)	SOLUCIÓN SALINA 250 o 500 c.c (2 Unidades)	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO (1 Unidad)	ALCOHOL ANTISEPTICO (Frasco 275 ml)	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	MICROPOR (1 Unidad)	CURAS	APLICADORES (1 Paquete)	LINTERNA	PARCHE OCULAR	PITO	TAPABOCAS	TIJERAS DE TRAUMA	BOLSA ROJAS	BOLSAS TRANSPARENTES	OBSERVACIONES
1	01	Vivero	B	B	B	B	B	NC	B	B	B	B	NC	B	NA	B	B	B	NA	B	B	B	NA	NA	01 par de guantes de latex
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

* Botiquín con contenido Prescripción No. 0705 de 2007 Tipo A

ANEXO No. 4

CORRESPONDECIA



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 15 de marzo de 2022

JET.BS - 001.03.22

Señores
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Solicitud de documentos previos al inicio del proyecto

Cordial saludo,

En aras de llevar nuestro proceso de seguimiento, reporte y control al contrato de la referencia, nos permitimos solicitar la información y documentación relacionada:

1. Hojas de vida del personal mínimo ofrecido en la propuesta, encargado de la ejecución de las actividades del proyecto.

PROFESIONAL OFRECIDO	CANTIDAD
DIRECTOR DE PROYECTO	1
RESIDENTE FORESTAL	1
PROFESIONAL CIENCIAS SOCIALES	1
PROFESIONAL SST O QHSE	1
PROFESIONAL SIG	1
TECNICOS PROFESIONAL EN AMNEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES	2

2. Programación detallada para el desarrollo del proyecto, información en Project.
3. Flujo de inversión de recursos.
4. Propuesta económica, análisis de precios unitarios y desglose del AIU, información en libros de Excel.
5. Entrega del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, junto con los certificados de calibración de equipos de medida vigentes.
6. Plan de Manejo Ambiental (PMA).
7. Plan de Gestión Social PGS
8. Plan de gestión para la seguridad y salud en el trabajo.
9. Plan de aplicación de protocolo PAPSO.



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

10. Informe ejecutivo dentro del cual se informe lo siguiente:

- Organigrama del consorcio con los profesionales requeridos para la ejecución de las actividades.
- Líneas de mando y coordinación.
- Niveles de decisión
- Manual de funciones del personal que interactuará con la interventoría y el ente contratante.
- Información clara y certera de las oficinas centrales de la empresa.

Dicha información debe ser remitida a la mayor brevedad posible a la siguientes direcciones de Correo Electrónico: interventoriabosqueseco@gmail.com; J.trujillo@jetingenieria.com; y a la dirección Cra 35 No 71 – 138, Barranquilla, Atlántico.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 15 de marzo de 2022

JET.BS - 002.03.22

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena

REF.: Objeto – Concurso de méritos abierto No. CMA-CARDIQUE-001-2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS FORESTALES NATIVAS - BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACIÓN ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APÍCOLA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Entrega Hojas de Vida Profesionales de Interventoría.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se les hace entrega parcial de las Hojas de Vida del personal propuesto por esta interventoría para la ejecución del contrato en referencia. A continuación, se muestran los profesionales por cada área.

Nombre.

Cargo.

Henry Alberto Santiago Oyuela
Jeison David Álvarez Brito

Director de Interventoría.
Profesional SIG

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 17 de marzo de 2022

JET.BS - 003.03.22

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena

REF.: Objeto – Concurso de méritos abierto No. CMA-CARDIQUE-001-2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS FORESTALES NATIVAS - BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACIÓN ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APÍCOLA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Entrega Hojas de Vida Profesionales de Interventoría

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se les hace entrega parcial de las hojas de vida del personal propuesto por esta interventoría para la ejecución del contrato en referencia. A continuación, se muestran los profesionales por cada área.

Nombre.

Cargo.

Tandril Sander López Manjarrez
Wilmer Campo Morales
Brenda Savina Piña Acevedo

Residente de Interventoría
Profesional SST
Profesional Social

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Anexo: Hojas de vida de profesionales; treinta y un (31) Folios.
Elaboró: Ing. David Marmolejo Romero

Barranquilla, 31 de marzo de 2022

JET.BS - 004.03.22

Señores
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Reiteración de solicitud de documentos previos

Cordial saludo,

En aras de llevar nuestro proceso de seguimiento, reporte y control al contrato de la referencia, reiteramos por primera vez la solicitud expuesta a través oficio JET.BS 001.03.22 enviado el día 15 de marzo del presente año, el cual tuvo por objeto “Solicitud de documentos previos al inicio del proyecto” y que hace referencia a la documentación que se describe a continuación:

1. Hojas de vida del personal mínimo ofrecido en la propuesta, encargado de la ejecución de las actividades del proyecto.

PROFESIONAL OFRECIDO	CANTIDAD
DIRECTOR DE PROYECTO	1
RESIDENTE FORESTAL	1
PROFESIONAL CIENCIAS SOCIALES	1
PROFESIONAL SST O QHSE	1
PROFESIONAL SIG	1
TECNICOS PROFESIONAL EN AMNEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES	2

2. Programación detallada para el desarrollo del proyecto, información en Project.
3. Flujo de inversión de recursos.
4. Propuesta económica, análisis de precios unitarios y desglose del AIU, información en libros de Excel.
5. Entrega del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, junto con los certificados de calibración de equipos de medida vigentes.
6. Plan de aprovechamiento forestal.
7. Plan de Gestión Social.

8. Plan de gestión para la seguridad y salud en el trabajo.
9. Plan de aplicación de protocolo PAPSO.
10. Informe ejecutivo dentro del cual se informe lo siguiente:
 - Organigrama del consorcio con los profesionales requeridos para la ejecución de las actividades.
 - Líneas de mando y coordinación.
 - Niveles de decisión
 - Manual de funciones del personal que interactuará con la interventoría y el ente contratante.
 - Información clara y certera de las oficinas centrales de la empresa.

Dicha información debe ser remitida en un plazo no mayor a 3 días hábiles a las siguientes direcciones de Correo Electrónico: interventoriabosqueseco@gmail.com; J.trujillo@jetingenieria.com; y a la dirección Cra 35 No 71 – 138, Barranquilla, Atlántico.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 06 de abril de 2022

JET.BS - 005.04.22

Señores
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Actualización de pólizas

Cordial saludo,

En aras de llevar nuestro proceso de seguimiento, reporte y control al contrato de la referencia, nos permitimos solicitar sea entregada la actualización de las garantías de acuerdo al acta de inicio que aseguran el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Agradecemos de antemano por la atención.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 6 de abril de 2022

JET.BS - 006.04.22

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena

REF.: Objeto – Concurso de méritos abierto No. CMA-CARDIQUE-001-2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS FORESTALES NATIVAS - BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACIÓN ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APÍCOLA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Entrega de pólizas actualizadas

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento al compromiso de mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, el cual reza en la cláusula decimocuarta del contrato en la referencia, nos permitimos realizar la entrega para la revisión y aprobación de la actualización de estas.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

Código de Seguridad: lni8D09x6Xz03GJIXcN/sA==

OBJETO DE CONTRATO

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

HOJA No.

VIGILÂNCIA
SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA
DE CUBA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

No. PÓLIZA	CRC-10002250	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	350015397	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del		03/03/2022		24:00 Horas Del	23/10/2022		N/A
							N/A
TOMADOR	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					No. DOC. IDENTIDAD	802.024.876-8
DIRECCIÓN	CRA 35 71 13					TELÉFONO	3620259
ASEGURADO	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					No. DOC. IDENTIDAD	802.024.876-8
DIRECCIÓN	CRA 35 71 13					TELÉFONO	3620259
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN						TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24/03/2022
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

RCE:24/03/2022- 23/10/2022

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
No.CMA CARDIQUE 001 2022, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. PARA LA RESTAURACIÓN,
REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURA FORESTALES NATIVAS BOSQUE SECO TROPICAL INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN
FAVOREZCAN LOS PROCESO DE POLINIZACIÓN ASI COMO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL
CARMEN DE BOLIVAR JURISDICCION DE CARDIQUE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	0.00	50,000,000.00	60.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	50,000,000.00	60.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	50,000,000.00	60.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	50,000,000.00	60.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	50,000,000.00	60.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 200.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LESLIE KAREN RICO MEZA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/04/2022

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Lineas de Atención al Cliente:

• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

No. PÓLIZA	CRC-100002250	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	350015397	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	05/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
	03/03/2022		23/10/2022			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE NIT 800.254.453 5 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT 802.024.876 8, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE NIT 800.254.453 5 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE NIT 800.254.453 5 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LÍMITE EVENTO/PERSONA Y LÍMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV





JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 26 de abril de 2022

JET.BS - 007.04.22

Señores
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Reiteración de solicitud de documentos previos

Cordial saludo,

En aras de llevar nuestro proceso de seguimiento, reporte y control al contrato de la referencia, reiteramos por segunda vez la solicitud expuesta a través de los oficio JET.BS 001.03.22 y JET.BS 004.03.22 enviados el día 15 y 31 de marzo del presente año, los cuales tuvieron por objeto la solicitud de documentos previos al inicio del proyecto y que hace referencia a la documentación que se describe a continuación:

1. Hojas de vida del personal mínimo ofrecido en la propuesta, encargado de la ejecución de las actividades del proyecto.

PROFESIONAL OFRECIDO	CANTIDAD
DIRECTOR DE PROYECTO	1
RESIDENTE FORESTAL	1
PROFESIONAL CIENCIAS SOCIALES	1
PROFESIONAL SST O QHSE	1
PROFESIONAL SIG	1
TECNICOS PROFESIONAL EN AMNEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES	2

2. Programación detallada para el desarrollo del proyecto, información en Project.
3. Flujo de inversión de recursos.
4. Propuesta económica, análisis de precios unitarios y desglose del AIU, información en libros de Excel.
5. Entrega del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, junto con los certificados de calibración de equipos de medida vigentes.
6. Plan de aprovechamiento forestal.



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

7. Plan de Gestión Social.
8. Plan de gestión para la seguridad y salud en el trabajo.
9. Plan de aplicación de protocolo PAPSO.
10. Informe ejecutivo dentro del cual se informe lo siguiente:
 - Organigrama del consorcio con los profesionales requeridos para la ejecución de las actividades.
 - Líneas de mando y coordinación.
 - Niveles de decisión
 - Manual de funciones del personal que interactuará con la interventoría y el ente contratante.
 - Información clara y certera de las oficinas centrales de la empresa.

Dicha información debe ser remitida en un plazo no mayor a 3 días hábiles a las siguientes direcciones de Correo Electrónico: interventoriabosqueseco@gmail.com; J.trujillo@jetingenieria.com; y a la dirección Cra 35 No 71 – 138, Barranquilla, Atlántico.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato
Copia: Ing. Ángelo Bacci Hernández, direccion@cardique.gov.co – Director General CARDIQUE



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 26 de abril de 2022

JET.BS - 008.04.22

Señores
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atr.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal

REF.: Objeto - Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Solicitud de informe mensual

Cordial saludo,

En aras de llevar nuestro proceso de seguimiento, reporte y control al contrato de la referencia, solicitamos sea entregado el informe mensual de ejecución de obra correspondiente al primer periodo que va desde el 24 de marzo de 2022 hasta 23 de abril de 2022, cuyo contenido debe relacionar los componentes técnico, administrativos, financiero, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo.

Dicha información debe ser remitida en un plazo no mayor a 3 días hábiles a la siguiente dirección de correo electrónico: interventoriabosqueseco@gmail.com.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,

JORGE ELIÉCER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co - Supervisor del contrato



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 26 de abril de 2022

JET.BS - 009.04.22

Señores,
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.
Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos
Supervisor del Contrato
Cartagena

Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Citación a comité de obra

Cordial saludo,

En aras de continuar con el seguimiento y control del proyecto de la referencia que se encuentra actualmente en ejecución, la empresa JET INGENIERIA S.A.S en calidad de interventoría, lo estamos invitando a una reunión de comité de seguimiento:

Fecha: Jueves 28 de enero 2022

Hora: 10:00 a.m.

Modalidad: Virtual.

Enlace de reunión: <https://meet.google.com/rbk-xbhq-xzk>

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 29 de abril de 2022

JET.BS - 010.04.22

Señores,
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Aclaración sobre clausula número 16 del contrato de obra

Cordial saludo,

En aras de continuar con el seguimiento y control del proyecto en la referencia, nos permitimos solicitar muy respetuosamente a ustedes señores entidad, aclarar el porcentaje exigido a asegurar para el amparo que cubre el cumplimiento del contrato de obra que se relaciona en la referencia, ya que en el clausulado número 16 del contrato de obra reza: **"CLAUSULA 16-GARANTIAS a) Cumplimiento del contrato: Por una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato, vigente por el termino de duración del contrato y cuatro meses más, en todo caso hasta la liquidación del contrato".** Sin embargo, durante el proceso de licitación publicada en la plataforma de SECOP II, esta garantía se encuentra establecida por un monto del 10% del valor del contrato, valor que no concuerda con el contrato. Por tal motivo se solicita que se realice la aclaración, ya que en caso de que prevalezca el porcentaje del amparo presentado durante el proceso de licitación deberá realizarse la modificación al contrato para la actualización de las pólizas.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Barranquilla, 04 de Mayo de 2022

JET.BS - 011.05.22

Señores,
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.
Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos
Supervisor del Contrato
Cartagena

Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.


ASUNTO: Notificación para recibir correspondencia

Cordial saludo,

Mediante el presente documento notificamos la actualización de los canales de comunicación para el recibo de correspondencia como interventoría del proyecto de la referencia, aclarando que los correos serán recibidos en la siguiente dirección de correo electrónico: interventoriabosqueseco@gmail.com con copia en todo documento enviado a j.trujillo@jetingeneria.com.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. No. 72.214.607 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Barranquilla, 05 de Mayo de 2022

JET.BS - 013.05.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Devolución del Informe Mensual No. 1

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato en la referencia, solicitamos que sea corregida la presentación y estructura del informe presentado el día 3 de mayo de 2022, subsanar las observaciones e información faltante correspondiente al periodo desde el 24 de marzo al 23 de abril de 2022, se recomienda utilizar la estructura de informe especificada a continuación:

1. CUERPO DEL INFORME:

- a) Hoja de presentación (Cuadro resumen de las condiciones contractuales como se muestra en la página 3 del informe presentado)
 - Número del contrato
 - Objeto del contrato
 - Información del contratista
 - Información de la interventoría
 - Información del supervisor designado al contrato
 - Plazo contractual
 - Periodo del informe
- b) Tabla de contenido
 - Componente técnico
 - Componente social
 - Componente SST
 - Anexos
- c) Anexos (Documentos contractuales como propuesta, contrato, actas de inicio, pólizas, Informe social, Informe Siso cada uno con los soportes correspondientes)
 - Contrato de obra

- Actas de inicio
- Record de pólizas
- Presupuesto oficial
- Informe social de obra
- Informe SST de obra
- Planillas de seguridad social

2. COMPONENTE TECNICO:

- Descripción de actividades realizadas en campo con su respectivo registro fotográfico
- Programación de actividades con su respectivo flujo de inversión
- Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas

3. COMPONENTE SOCIAL:

- Informe social correspondiente al periodo de ejecución de la obra del 24 de marzo al 23 de abril, con todos sus soportes y anexos correspondientes.
- Actas de reunión de las socializaciones, con el desarrollo de la misma.
- Conformación del comité de veeduría máximos 5 integrantes mínimo 3 y adjuntar el respectivo listado radicado ante la personería.

4. COMPONENTE SST:

- Informe SST correspondiente al periodo de ejecución de la obra del 24 de marzo al 23 de abril de 2022.
- Manual del SG SST: Se solicita el documento manual del sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo, para el seguimiento en la implementación de este durante el periodo de la obra.
- Protocolo de bioseguridad: se solicita de manera inmediata la implementación del protocolo de bioseguridad exigido por el ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 223 del 2021 y 777 del 2021.
- Seguridad social: se solicita de manera inmediata el listado de trabajadores con sus respectivos exámenes de ingreso y el certificado de afiliación a la seguridad social.

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Proyectó: Ing. Kathleen Altamar Arias.

Revisó: Ing. David Marmolejo Romero.

Copia: Ing. Hernán Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato

Barranquilla, 18 de Mayo de 2022

JET.BS - 014.05.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar


REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Reiteración actualización de pólizas

Cordial saludo,

Mediante la presente, se solicita sea actualizada y entregada la póliza de garantía única de cumplimiento y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra de publica relacionado en la referencia, de acuerdo al acta de inicio y otro sí aclaratorio expedido por la entidad contratante.

Gracias de antemano por la atención.
Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Proyectó: Ing. David Marmolejo Romero.

Anexo 1: Otro sí aclaratorio; Formato “.pdf”; Documento de un (1) Folio.
Copia: Ing. Hernán Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato

Barranquilla, 03 de Junio de 2022

JET.BS - 015.06.22

Señores,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Acta parcial de cobro No. 2

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones como interventoría, se presenta el informe de seguimiento mensual No. 2 al proyecto en la referencia. Adicionalmente se hace entrega del acta de cobro parcial No. 2 de interventoría con los siguientes anexos:

1. Acta de cobro No. 2
2. Factura electrónica de venta
3. Certificación bancaria
4. Copia del contrato de interventoría No. CMA-CARDIQUE-001-2022
5. Cedula de representante legal
6. Copia del Acta de inicio
7. Póliza de cumplimiento actualizada según acta de inicio
8. Rut de la empresa
9. Certificado de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales de la empresa JET INGENIERIA S.A.S.
10. Resumen de las planillas de seguridad social
11. Informe mensual de interventoría No. 2

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 29 de junio de 2022

JET.BS - 017.06.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Citación a comité de obra

Cordial saludo,

En aras de continuar con el seguimiento y control del proyecto de la referencia que se encuentra actualmente en ejecución, la empresa JET INGENIERIA S.A.S en calidad de interventoría, lo estamos invitando a una reunión de comité de seguimiento el cual se solicita la asistencia del director y residente de obra para dar información de acuerdo a las actividades realizadas durante el contrato.

Fecha: Jueves 30 de junio 2022

Hora: 10:00 a.m.

Modalidad: Virtual

Link de acceso: <https://meet.google.com/pzm-hdza-uzh>

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,


JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Barranquilla, 13 de junio de 2022

JET.BS - 016.06.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Programación de obra

Cordial saludo,

La presente es para solicitarle señores contratistas como supervisores del contrato de la referencia, que sea corregida y actualizada la programación de obra, puesto que no es específica en las actividades que corresponden a la realización o consecución del alcance del proyecto; si bien es cierto que el contrato contempla 4 capítulos principales que corresponden a: Aislamiento, reforestación protectora, mantenimiento reforestación protectora y capacitaciones, los cuales son muy generales y no especifican el listado de actividades que engloban dicho ítem de pago y no es posible realizar un correcto seguimiento a las actividades ejecutadas.

La programación solicitada debe contener las actividades asociadas al capítulo, por ejemplo: Para el capítulo de Aislamiento las actividades comprenden: Trazado, ahoyado, transporte menor, hincado, templado y grapado y mantenimiento de cercos, de manera que cada una de estas actividades se deben valorizar para poder hacer un seguimiento detallado de lo que se ejecuta semanalmente en obra. Para el ítem de reforestación protectora se identifican actividades como: Preparación de terreno, adecuación de caminos, Plateo, trazado de plantación, ahoyado, aplicación de correctivos, aplicación de fertilizantes, plantación (siembra), control fitosanitario, reposición (Replante) y transporte interno e insumos, a los cuales se le debe asociar a cada uno de estos un costo para reportes de avance de ejecución.

Finalmente, la programación se debe realizar de una forma más detallada desglosando las actividades que componen cada ítem de ejecución y poder evaluar y presentar ante las entidades contratantes un avance específico de la ejecución real del contrato.

Agradecemos de antemano tomar las recomendaciones expuestas por esta interventoría y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a las observaciones realizadas a la programación inicial, y realizar la entrega de esta en un periodo no mayor a 3 días hábiles una vez sea radicado este oficio por medio magnético al correo autorizado para recibir información ingaprofsas2012@gmail.com con copia a gerencia@ingagrofor.com.co.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Ing. Hernán Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato

Barranquilla, 30 de junio de 2022

JET.BS - 018.06.22

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena


REF.: Objeto – Concurso de méritos abierto No. CMA-CARDIQUE-001-2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS FORESTALES NATIVAS - BOSQUE SECO TROPICAL - INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACIÓN ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APÍCOLA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Reemplazo profesional SST

Cordial Saludo.

La presente es para anunciar el cambio del profesional para el cargo de profesional SST que actualmente ostenta el ING. WILMER CAMPO MORALES, quien será reemplazado en el cargo respectivo por la ING. ERIKA MONTAÑO JÁCOME cumpliendo con la disponibilidad que esta exige del 50%. A continuación, se anexa hoja de vida del profesional propuesto por esta interventoría con todos los soportes que la faculta para desempeñar el cargo, para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Barranquilla, 05 de junio de 2022

JET.BS - 019.07.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Observaciones, aclaraciones y solicitudes

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”, nos permitimos realizar observaciones a los procesos técnicos y solicitudes de documentación administrativa necesaria para el correcto seguimiento por parte de esta interventoría.

Durante el desarrollo del proyecto en lo que se ha denominado etapa de “Reforestación protectora densidad 1111” se ha evidenciado que el suministro y siembra de plántulas no corresponden a lo consagrado en el “anexo 1 – especificaciones técnicas” capítulo 4, inciso 4.2 “características de plántulas”, documento que hace parte integral de los estudios previos, el cual indica que; las plántulas de especies arbóreas deberán ser de más de 80 cm de altura, lignificadas, rusificada en bolsa de 9x18 con fuelle. En los recorridos y seguimientos realizados por esta interventoría, se ha identificado que las alturas promedios de estas plántulas sembradas se encuentran entre 50 y 60 cm de altura, características que no corresponden a lo consagrado en las especificaciones técnicas, por lo que se le conmina al contratista la corrección de estas plántulas sembradas ya que no serán recibidas por esta interventoría.

Es de vital importancia el cuidado en el crecimiento de las plántulas para obtener un individuo de especie arbórea totalmente sano, por lo que el proyecto contempla para esta siembra fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos y productos de control fitosanitario que ayudan a un buen desarrollo de la planta aportando nutrientes y protegiéndola de las plagas. Esta aclaración se hace necesaria ya que estos productos no han sido entregados a los beneficiarios para el buen ejercicio en el cuidado de las plantas, por lo que será responsabilidad del contratista la muerte de cada una de estos individuos toda vez que se haya identificado en el inventario de supervivencia consagrado en el inciso 4.8 “reposición por perdida” del “anexo 1 – especificaciones técnicas” y además no será reconocido por esta interventoría los productos para el cuidado de las plántulas que no se utilicen o se suministren para el cuidado de estas.

Se le recuerda al contratista que las obligaciones contractuales de estricto cumplimiento se encuentran plasmadas en el capítulo de 10 del presente “anexo 1 – especificaciones técnicas” para no incurrir en incumplimiento contractuales, de las cuales se derivan las siguientes solicitudes de esta interventoría al contratista:

1. Presentar ante esta interventoría el informe mensual de actividades correspondiente al periodo que va desde 24 de mayo hasta 23 de junio de 2022, plazo: 3 días hábiles a partir del presente comunicado.
 - “Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos y los demás relacionados con las actividades desarrolladas que les sean solicitados, ante el funcionario que realice la supervisión contractual”
2. Se solicita que sea entregada inmediatamente el comprobante y las planillas de pago de los aportes al sistema de salud y de pensión de las personas empleadas en el mes anterior al presente comunicado.
 - “Presentar ante el supervisor contractual, el comprobante de pago de los aportes al sistema de salud y de pensiones en cumplimiento a los dispuesto en los artículos 282 de la ley 100 de 1993 y 114 del decreto 2150 de 1995, y además normas concordantes y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el decreto 510 del 5 de marzo de 2003, la ley 789 de 2022 y demás que los adicionen, complementen o modifiquen”.

Agradecemos de antemano acatar de manera inmediata las observaciones, realizar las correcciones pertinentes de acuerdo estas y entregar la documentación solicitada en el plazo otorgado.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Proyectó: David Andrés Marmolejo Romero; contacto: inteventoriabosqueseco@gmail.com y d.marmolejo@jetingenieria.com

Copia: Ing. Hernán Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato

Barranquilla, 11 de julio de 2022

JET.BS - 020.07.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Incumplimientos contractuales

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”, nos permitimos reportar ante ustedes las circunstancias consideradas por esta interventoría como incumplimientos al contrato de obra pública en mención, de acuerdo a los estudios y documentos previos que hacen parte integral de la obra que se está ejecutando:

1. A corte del presente oficio, no ha sido entregada la reprogramación de las actividades contractuales teniendo en cuenta las observaciones expresadas por esta interventoría y que ha sido solicitado a través del oficio JET.BS-016.06.2022. Teniendo en cuenta que no se ha atendido esta solicitud por parte del contratista, se le realiza seguimiento de acuerdo a la programación inicial, notando un retraso en la ejecución de la obra que no ha tenido explicación de los motivos, pues tiene un porcentaje programado del 33,45% y un ejecutado del 20,58% presentando un atraso del 12.87%. Cabe resaltar que entre sus obligaciones contractuales se encuentra: “Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo con el cronograma aprobado y entregar la obra dentro del plazo de ejecución pactado”.
2. El día jueves 30 de junio se citó a comité técnico de seguimiento de la obra en ejecución mediante oficio JET.BS-017.06.2022 con el objetivo de tratar temas del componente técnico y administrativo, el cual se celebraría de manera virtual a las 8:00 a.m. y fue informado por correo electrónico a la dirección dispuesta por el contratista para recibir información y comunicados ingagrofsas2012@gmail.com. El contratista expuso su justificación por la cual no podía asistir a la reunión y que esta fuera reprogramada; de tal forma esta interventoría atendió a su solicitud y se reprogramo el comité para el día viernes a las 2:00 p.m. acordado de manera verbal con el Arquitecto Luis Camargo en representación del contratista. Quedando con este compromiso, la interventoría se presentó a la reunión a la hora indicada, sin embargo el contratista ingreso al link

de meet programado para la reunión e inmediatamente se retiraron, abandonando el comité e incumpliendo con el compromiso realizado.

3. A fecha de corte de este oficio el contratista no presenta el informe de avance No. 3 correspondiente al tercer mes de ejecución de la obra que comprende las fechas del 24 de mayo al 23 de junio de 2022. Incumpliendo con las obligaciones dispuestas en el estudio previo que establece que el contratista debe “Entregar la información que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el Supervisor, para tal efecto”. Se deja constancia de que ya se ha solicitado anteriormente la entrega de esta información mediante oficio JET.BS-019.07.2022.
4. No han sido entregada las planillas de seguridad social del personal que se encuentra laborando actualmente en campo y del personal clave exigido para ocupar los cargos dispuestos por el pliego de condiciones. Siendo esto una de las obligaciones del contratista establecidas en el anexo: “Acatar la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales y demás disposiciones pertinentes” “....Así como realizar la afiliación y acreditar el pago mensual de aportes del personal contratado al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales de acuerdo con los términos legales”
5. El personal que se encuentra laborando en campo, no cuenta con la dotación de elementos personales de protección, tal y como se evidencia en las fotografías anexadas. Sin embargo cabe resaltar que entre las obligaciones del contratista esta: “Garantizar que el personal empleado para la ejecución de los trabajos contratados, cumplan con la documentación y condiciones de experiencia e idoneidad exigidas en el pliego de condiciones, así como la dotación permanente de elementos de protección para el personal que lo requiera según la ley. Así como realizar la afiliación y acreditar el pago mensual de aportes del personal contratado al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales de acuerdo con los términos legales”



Fig. 1 y 2 Mano de obra sin dotación de elementos de protección personal

En relación con el incumplimiento del contrato, la Interventoría quiere expresar que el contrato, como expresión nítida que es de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, consagrado positivamente en el artículo 1602 del Código Civil, por cuya inteligencia los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales.

Como es de conocimientos de las partes actoras en este proceso contractual, según la normatividad vigente se desprende que la interventoría fue investida de amplias facultades de supervisión y seguimiento respecto del cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. En desarrollo de ese seguimiento debe ejercer un control integral sobre el proyecto, en el cual puede exigir al contratista información relacionada con su cumplimiento, como la adopción de medidas encaminadas a mantener las condiciones técnicas ofrecidas y a corregir las anomalías de tipo técnico presentadas en la ejecución del proyecto, sugiriendo para ese propósito recomendaciones dirigidas a solucionar los posibles desajustes evidenciados en la realización de actividades. Tal como lo señala El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. De fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00132-01(64154)3 Actor: NACIONAL DE SEGUROS S.A. Demandado: INVIAS Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA).

La Interventoría quiere traer a colación el principio de la bona fides, o principio de la buena fe que se sustenta en el valor ético de la confianza y constituye la base de las relaciones jurídicas, que impone a los sujetos de derecho determinados comportamientos y regla.

Esta Interventoría quiere dejar señalado que a partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (iniciación, construcción, y mantenimiento) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el incumplimiento de esas obligaciones.

Como es de conocimiento del Contratista de acuerdo a lo estipulado en el contrato LP-CARDIQUE-003-2021, en su CLÁUSULA DIEZ- OBLIGACIONES, se expresan unas series de obligaciones y en la cual esta Interventoría le va a exponer las que está incumpliendo:

- Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo con el cronograma aprobado y entregar la obra dentro del plazo de ejecución pactado.
- Así como realizar la afiliación y acreditar el pago mensual de aportes del personal contratado al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales de acuerdo con los términos legales.
- Acatar la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales y demás disposiciones pertinentes.
- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones del contrato.

- Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta etapa.
- Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales.
- Cumplimiento de requisitos de salud y seguridad en el trabajo (SST) por parte de los contratistas, lo cual está establecido en el artículo 27 de Decreto 1072 de 2015.
- Entregar la información que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el Supervisor, para tal efecto.
- Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veras.

Lo que se evidencia que de acuerdo a la programación de las actividades actualizadas y al cronograma aprobado, la ejecución de la obra se encuentra presentando un atraso considerable del 12,87 por ciento imputable al contratista y lo cual viene afectando en forma grave el cumplimiento de lo contratado. Lo que permite presumir o suponer que el contratista no logrará recuperar el atraso mencionado como tampoco cumplir con la programación para meses futuros.

Como es de su conocimiento de acuerdo con el Manual de interventoría, esta parte como interventor del contrato de la referencia está en la obligación de informar oportunamente tanto al Contratista como al contratante de la presunta ocurrencia de circunstancias constitutivas de incumplimiento de las obligaciones contractuales que no hayan sido atendidas y resueltas efectivamente en este caso por parte del contratista.

Ley 1150 de 2007 que introdujo una reforma al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), en el su artículo 17 señaló que en desarrollo del derecho al debido proceso en materia sancionatoria contractual y del deber de control y vigilancia sobre los contratos, las entidades tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, decisión que deberá estar precedida de audiencia del afectado y de un procedimiento mínimo y que sólo procede mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.


También se le recuerda al contratista que las multas podrán declararse sin perjuicio de otras sanciones que se le puedan imponer como es la exigibilidad de la cláusula penal, la declaratoria de caducidad o la cuantificación y cobro de perjuicios, según sea el caso.

Además, conviene destacar lo señalado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISION No. 6, en sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021, MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEMANDANTE: LUIS NICODEMUS HURTADO SUAREZ H & G INGENIEROS DEMANDADO: MUNICIPIO DE TENZA RADICACIÓN: 150013333008 2015- 00108- 01, en donde expresa: “Que las obligaciones contenidas en los contratos estatales deben cumplirse en los términos y condiciones en ellos pactados”, y como se comprueba dentro del contrato de obra No. LP-CARDIQUE-003-2021, en su cláusula Diez, esta nos habla y expresa sobre las MULTAS, teniendo como

fundamento legal la ley 1474 de 2011, y en la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

De todo lo anteriormente expuesto le reiteramos nuestra solicitud en exigirles al contratista en iniciar de inmediato las actividades que presentan atraso y presentar el plan de la programación de las actividades actualizadas y al cronograma aprobado, donde garanticen la entrega de las obras en la fecha mencionada. De lo contrario, esta interventoría, y en vista del atraso señalado en la actualidad, recurrirá a recomendación de las sanciones a que haya lugar, ante el ente contratante, por incumplimiento de las obligaciones y compromisos

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Ing. Hernán Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato



JET INGENIERIA S.A.S.
NIT. 802.024.876-8

Barranquilla, 29 de julio de 2022

JET.BS - 022.07.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Solicitud de informe mensual

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato de obra en la referencia, nos permitimos solicitar el informe mensual de obra que va desde el 24 de junio hasta el 23 de julio de 2022, que contenga los componentes técnicos, social, seguridad y salud en el trabajo del proyecto.

Agradecemos de antemano entregar la documentación solicitada a la mayor brevedad posible.
Atentamente,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Ing. Hernán Peláez Ríos, hpelaez@cardique.gov.co – Supervisor del contrato

Barranquilla, 10 de octubre de 2022

JET.BS - 025.10.22

Señores
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Solicitud de documentos actualizados

Cordial saludo,

En aras de llevar nuestro proceso de seguimiento, reporte y control al contrato de la referencia, nos permitimos solicitar sea entregada la actualización de las garantías de acuerdo al acta modificatoria No 2 al contrato de obra No. 145 de 2021 y la programación de obra de acuerdo a las actividades adicionadas.

Agradecemos de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

El Carmen de Bolívar, 14 de octubre de 2022

JET.BS - 026.10.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto - Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE".

ASUNTO: Solicitud de información

Cordial saludo,

Conforme con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato de licitación pública No LP-CARDIQUE-003-2021, se solicita sea entregada a esta interventoría la información que se anuncia en el listado del presente comunicado, de acuerdo a las obligaciones contempladas en el pliego de condiciones, los estudios previos y la forma de pago del contrato de obra. Cabe aclarar que esta solicitud está basada en la modificatoria No 3 del contrato en donde quedo establecido mejorar el alcance ampliando la restauración del ecosistema de bosque seco y bosque con especies nativas a 50 hectáreas adicionales, esta información es indispensable para la supervisión y labor de esta interventoría.

Documentos solicitados para el seguimiento de la adición:

- Diagnóstico e identificación de las zonas a intervenir.
- Plan de establecimiento forestal y manejo forestal.
- Programación de actividades en Project.
- Visita previa de los sitios a intervenir con el fin de registrar datos de campo.
- Listado de los nuevos beneficiarios del proyecto donde se relacione nombres completos, numero de documento de identidad, nombre de vereda, nombre del predio, numero celular.
- Acta de concertación que incluya la georreferenciación de las áreas a intervenir.
- Realizar y presentar registros fotográficos.
- Solicitar y adelantar los trámites para obtener los permisos o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos.

Los documentos solicitados deberán ser presentado a esta interventoría a más tardar el 20 de octubre de 2022.
De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

JORGE ENIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Barranquilla, 17 de octubre de 2022

JET.BS - 027.10.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Citación a comité de obra

Cordial saludo,

En aras de continuar con el seguimiento y control del proyecto de la referencia que se encuentra actualmente en ejecución, la empresa JET INGENIERIA S.A.S en calidad de interventoría, lo estamos invitando a una reunión de comité de seguimiento el cual se solicita la asistencia del director y residente de obra para dar información de acuerdo a las actividades realizadas durante el contrato e información administrativa.

Fecha: Martes 20 de octubre 2022


Hora: 10:00 a.m.

Modalidad: Virtual

Link de acceso: <https://meet.google.com/oqr-pjwf-kyy>

Gracias de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

C.C. 72.214.607

REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Barranquilla, 22 de noviembre de 2022

JET.BS - 028.11.22

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena


REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Estado del contrato No LP-CARDIQUE-003-2021

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada a esta interventoría el día 21 de noviembre de 2022 y en cumplimiento de nuestras obligaciones, se envía el presente comunicado, en donde se evidencia el estado actual del proyecto a través del porcentaje de ejecución de la obra con respecto a la programación y el porcentaje de ejecución presupuestal.

A fecha del presente comunicado el contrato de obra presenta un avance en su ejecución del 92.58% con respecto a una programación del 83.71%, evidenciando un avance del 8.87%. A continuación se presenta la curva seguimiento en donde se ilustra la ejecución del contrato.

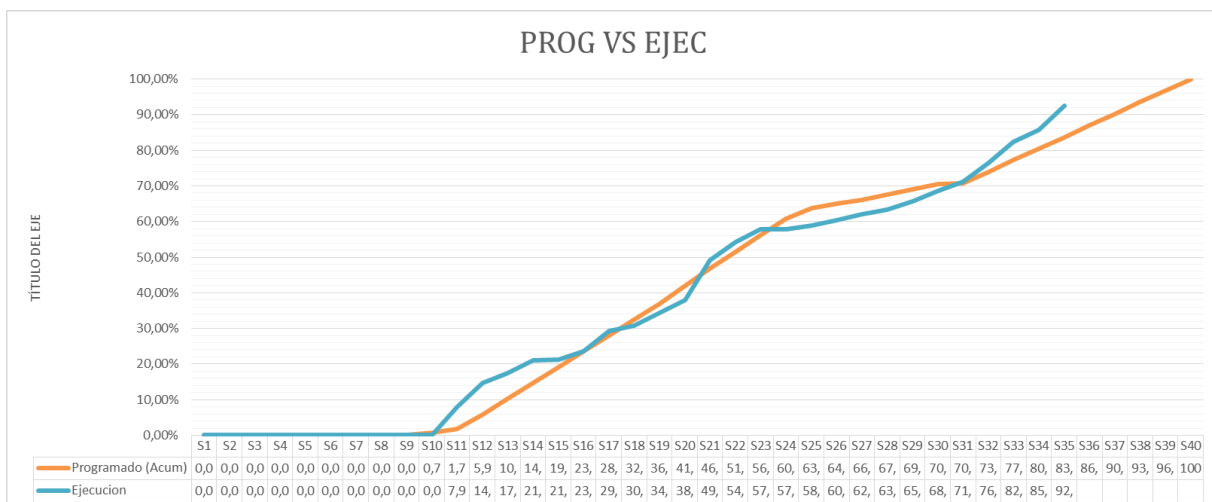

Condiciones actualizadas.

RESTAURACION	ESTABLECIMIENTO Y PRIMER MANTENIMIENTO				
RESTAURACION ACTIVA	Und	Inicial	Adición	Costo Unitario	Costo Total
AISLAMIENTO	Km	17,86	7,5	10.816.000,00	274.293.760,00
REFORESTACION PROTECTORA	Ha	119	50	7.085.000,00	1.197.365.000,00
MANTENIMIENTO REFORESTACION PROTECTORA	Ha	119	50	1.974.834,47	333.747.025,42
CAPACITACIONES	Gbl	1	0	15.938.000,00	15.938.000,00
COSTO TOTAL					1.821.343.785,42

Ejecución del contrato.

RESTAURACION	ESTABLECIMIENTO Y PRIMER MANTENIMIENTO			
RESTAURACION ACTIVA	Und	Ejecutado	Costo Unitario	Costo Total
AISLAMIENTO	Km	22	10.816.000,00	237.952.000,00
REFORESTACION PROTECTORA	Ha	169	7.085.000,00	1.197.365.000,00
MANTENIMIENTO REFORESTACION PROTECTORA	Ha	119	1.974.834,47	235.005.301,92
CAPACITACIONES	Gbl	1	15.938.000,00	15.938.000,00
COSTO TOTAL				1.686.260.301,92


Con respecto al porcentaje de ejecución presupuestal, se ha avalado el pago en un 60% del valor inicial del contrato equivalente a 772.339.236,94 pesos MTE de acuerdo a la forma de pago establecida en él.

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA LP-003-2021						
Valor inicial del contrato		\$ 1.287.232.061,92		70.67%		
Valor Adición 1		\$ 534.111.723,08		29.33%		
Valor total contrato de obra		\$1.821.343.785,00		100%		
Concepto	Valor facturado	%	Amortización y descuentos	%	Valor neto recibido	Fecha de pago
Acta Parcial No. 1	\$386.169.618,47	30%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
Acta Parcial No. 2	\$386.169.618,47	30%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
TOTAL	\$772.339.236,94	60%	N/A	N/A	\$772.339.236,94	-

Se anexan a este oficio copia el informe mensual No 7 presentado por el contratista de obra y el informe mensual No 7 de la interventoría, en donde queda plasmada la información de las áreas intervenidas con su respectiva georreferenciación, adicionalmente las actas de recibo a satisfacción por la comunidad e interventoría con los registros fotográficos de las diferentes capacitaciones y actividades realizadas.

Agradecemos de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

El Carmen de Bolívar, 29 de noviembre de 2022

JET.BS - 029.11.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Apremio por incumplimiento en entrega de información

Cordial saludo,

Conforme con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato de licitación pública No LP-CARDIQUE-003-2021, se reitera la solicitud presentada por esta interventoría a través del comunicado JET.BS – 026.10.2022, en donde se solicitaron los siguientes documentos que se enlistan, de acuerdo a la modificativa No 3 con la finalidad de ampliar el alcance del contrato.

- Diagnóstico e identificación de las zonas a intervenir.
- Plan de establecimiento forestal y manejo forestal.
- Programación de actividades en Project.
- Visita previa de los sitios a intervenir con el fin de registrar datos de campo.
- Listado de los nuevos beneficiarios del proyecto donde se relacione nombres completos, numero de documento de identidad, nombre de vereda, nombre del predio, numero celular.
- Acta de concertación que incluya la georreferenciación de las áreas a intervenir.
- Realizar y presentar registros fotográficos.

Esta solicitud deberá presentarse a la interventoría en las próximas 24 horas o se dará inicio a un presunto incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que no se cumple a satisfacción las obligaciones del contratista contempladas en los estudios previos documento integral del contrato de obra inciso 10.

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: hpelaez@cardique.gov.co – Ing. Hernán Peláez Ríos – Supervisor entidad contratante



El Carmen de Bolívar, 13 de diciembre de 2022

JET.BS - 030.12.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Solicitudes varias

Cordial saludo,

En concordancia con la ejecución del contrato de la referencia y teniendo en cuenta que las actividades en obra entran en la etapa de culminación y entrega del proyecto, se solicita que se realicen las actividades y entrega de documentación PENDIENTES.

- Realizar las actividades de mantenimiento de reforestación protectora para evitar la invasión de arvenses, la aparición de plagas y enfermedades, mejorar el estado general de las plantaciones utilizando las practicas silviculturales necesarias para mantener el buen desarrollo de los arboles establecidos.
- Entregar el informe final de la obra en donde se indique datos completos del contratista, relación de las garantías del contrato con sus modificaciones y la aseguradora respectiva, debe incluir número de las pólizas, vigencias y valores respectivos asegurados.
- Entregar planos record (corresponde a un anexo del informe final de obra que incluye las actas de concertación y georreferenciación de las áreas intervenidas)
- Entregar memoria descriptiva de la ejecución/desarrollo del contrato con registro fotográfico que evidencie el antes y después de las zonas intervenidas.
- Entregar copia de liquidación, paz y salvos de todos los trabajadores del contratista teniendo en cuenta los profesionales y tecnólogos.
- Entregar certificación del Revisor Fiscal del contratista en el que conste que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con seguridad social (EPS, AFP y ARL, parafiscales, pago de impuestos, liquidaciones económicas por prestación de servicios entre otros). Esta certificación se debe hacer por todo el plazo del contrato.
- Entregar manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones, en donde especifique los tiempos de mantenimiento, control de plagas, control de maleza, entre otras.

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Supervisor del contrato - hpelaez@cardique.gov.co – Ing. Hernán Peláez Ríos.
