

**“RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON
ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS
PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE”**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. LP CARDIQUE - 003-2021**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 08

Periodo: Del 24 de octubre al 23 de noviembre del 2022

**" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA
RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS
FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE
PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE".**

CONTRATO ELECTRÓNICO NO CMA-CARDIQUE-001-2022

**JET INGENIERÍA S.A.S
NIT: 802.024.876-8**

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE CONTRATO ELECTRÓNICO NO CMA-CARDIQUE-001-2022
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
NIT CONTRATANTE	800254453-5
CONTRATISTA	INGAGROF S.A.S.
NIT CONTRATISTA	900574589-3
INTERVENTOR	JET INGENIERÍA S.A.S.
FECHA INICIO DE OBRA	24 de marzo de 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.287.232.061
ADICION 1	\$ 534.111.723,50
PLAZO	9 MESES
% AVANCE DE LA OBRA	92.58%
%AVANCE FINANCIERO	70.67%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ing. Hernán Peláez Ríos

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO DEL PROYECTO	5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	7
3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO	9
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	11
4.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA	11
4.1.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	11
4.1.2 COMPONENTE FINANCIERO	12
4.1.3. COMPONENTE JURIDICO	13
4.1.4 COMPONENTE TÉCNICO	15
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	22
5.1 COMPONENTE CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA	23
5.1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	23
5.1.2. COMPONENTE FINANCIERO	24
5.1.3. COMPONENTE JURIDICO	26
5.1.4. COMPONENTE TÉCNICO	26
5.1.5. COMPONENTE SST.....	27
5.1.6. COMPONENTE SOCIAL	27
6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO.....	27
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
8. ANEXOS.....	28

1. INTRODUCCIÓN

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, identificada con N.I.T. N° 800.254.453-5 a través de la licitación pública No. **LP-003-2021**, por una parte; y por la otra INGAGROF S.A.S. identificado con N.I.T. N° 900.574.589-3.

La interventoría del proyecto por parte de **JET INGENIERÍA S.A.S.**, representado legalmente por JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, a quién se adjudicó el proyecto que tiene por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”**.

El contenido del presente informe se compone de los estudios y documentos previos, el estudio del sector, los anexos técnicos y otros anexos que quedan a disposición del público y a todos los interesados en la plataforma (SECOP II), Sistema Electrónico de contratación pública. Producto de los procesos anteriormente mencionados se genera el presente informe que cubre el periodo que va desde el 24 de octubre al 23 de noviembre del 2022, reportando las principales actividades ejecutadas en el presente proyecto durante el periodo señalado; además se recopilan los informes de seguimiento en las áreas administrativas, ambiental, técnica y financiera.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

- El objetivo general del contrato de obra pública No. LP-003-2021, es realizar la Restauración de ecosistemas de Bosque Secos y Bosques con Especies Nativas que favorezcan la polinización en áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La Región de los Montes de María, es de gran importancia ambiental para el departamento de Bolívar y su Ecosistema de Bosque seco tropical, está siendo alterado por factores como la ganadería, la expansión de la frontera agrícola, incendios forestales, tala y raza de bosques. Estas zonas han sido intervenidas por la acción del hombre y aún se encuentran relictos de bosques, asociados con rastrojos altos y áreas para cultivos. Las prácticas de manejo y la intensidad con que se realizan estas actividades, son causales de procesos de erosión y pérdida de fauna y flora. Las pendientes altas, los procesos de erosión, los suelos superficiales, las fuertes y continuas lluvias y la inestabilidad del terreno repercuten en mayor o menor grado en las poblaciones.

La ocupación de las zonas altas de montaña para el establecimiento de actividades agropecuarias ha estado acompañada, por deforestación que ha incidido de manera negativa sobre la función de retención de agua, cuya pérdida lo deja expuesto a fenómenos de erosión y sedimentación que alteran los flujos hídricos de las cuencas. Los Montes de María, son áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE, son ecosistemas estratégicos, que es necesario proteger y conservar para permitir el flujo de fauna del corredor biológico.

En El Carmen de Bolívar, hay la necesidad de iniciar los procesos de rehabilitación ecológica en áreas degradadas, en bosques y arbustos secos en las áreas rurales ubicadas en jurisdicción del Municipio e identificadas como prioritarias, conforme a la zonificación ambiental y forestal de CARDIQUE.

CARDIQUE, dentro de su plan de acción (PAI) 2020-2023, y plan nacional de desarrollo forestal incluyó la acción operativa **“RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS TROPICAL – BST (RONDAS HIDRICAS, ZONAS DE RECARGA DE ACUIFEROS, NACEDEROS DE AGUA, CORREDORES DE CONECTIVIDAD SOCIECOSISTEMICOS, AREAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACION Y AREAS ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS)”**, una de sus metas prioritarias es la reforestación o restauración de áreas que se han visto afectadas por la realización de proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, la ampliación de áreas para ganadería extensiva en áreas de vocación forestal, la explotación mineral a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no sostenibles.

En el Municipio de El Carmen de Bolívar, la apicultura se ha visto afectada por los efectos del cambio climático global y sumado a la tala de árboles para actividad agrícola, ganadería, minería, obras de ampliación de la carretera troncal de Occidente, y de regreso a los campesinos a la zona rural, ha conllevado a que la población de abejas disminuya y el rendimiento de la producción de miel por



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

colmena, estas condiciones de deforestación han afectado la estabilidad de las abejas ocasionando la enjambrazón de estas hacia zonas donde tengan mejores condiciones ambientales.

Al ejecutar el proyecto se establecerá modelos de RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION ECOLOGICA, Y APOYO A PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS, en 119 hectáreas de aptitud ambiental y forestal priorizados en las diferentes zonas rurales en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, y vincular a las comunidades de la zona en actividades de rehabilitación ecológica, siembra de especies nativas atrayentes de polinizadores y dispersores de semilla.

En El Municipio de Carmen De Bolívar, las veredas Padula y Verdum, y el corregimiento el salado requiere la contratación de una firma de interventoría que realice las labores de vigilancia y control del objeto del contrato mencionados a continuación: **"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE"**, por lo que la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

Se requiere "realizar la vigilancia y control" a través de figuras como la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"**, y la supervisión, para que se desarrolle esta función de vigilancia y control en los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución del contrato descrito.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localizará en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.



Ilustración 1. Localización del departamento Bolívar.

El **Carmen De Bolívar** es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, ubicado en el sistema orográfico de los Montes de María (Coordenadas: 9°43'06"N 75°07'21"O/ 9.7183333333333, -75.1225) con una superficie de territorio de 934 km².


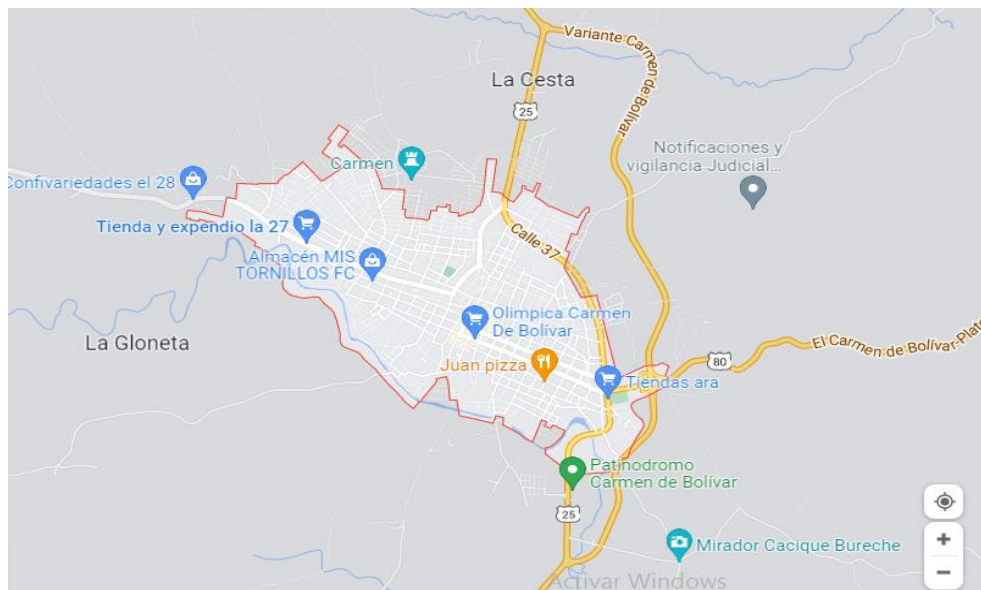


Ilustración 2. Localización del municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar.


Zona Seleccionada No 1
Corregimiento del Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar



Zona Seleccionada No 2
Vereda Verdum Municipio de El Carmen de Bolívar

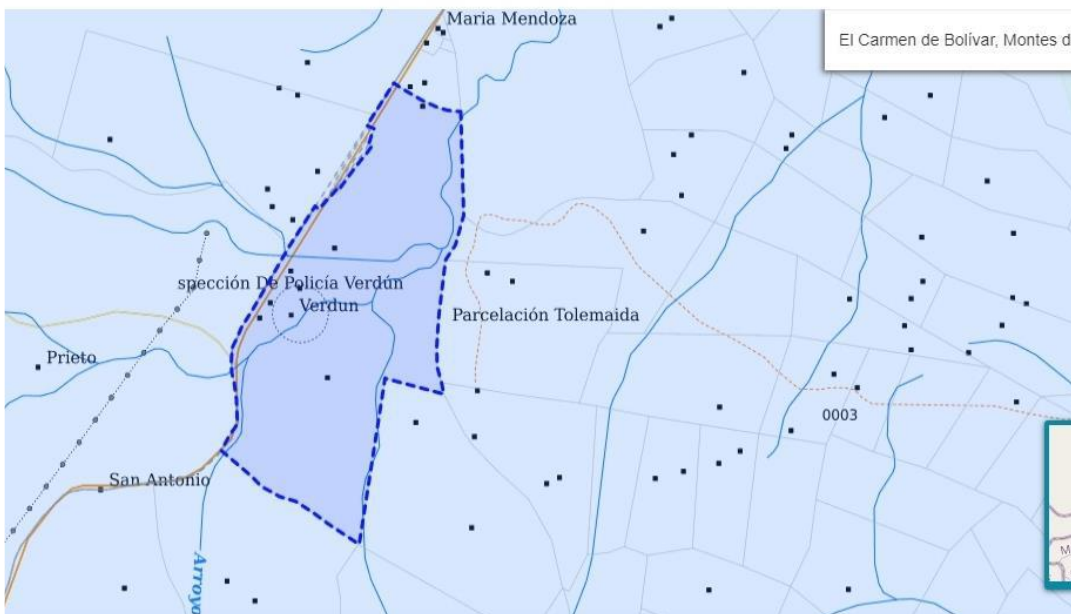

Zona Seleccionada No 2
Vereda Padúla Municipio de El Carmen de Bolívar

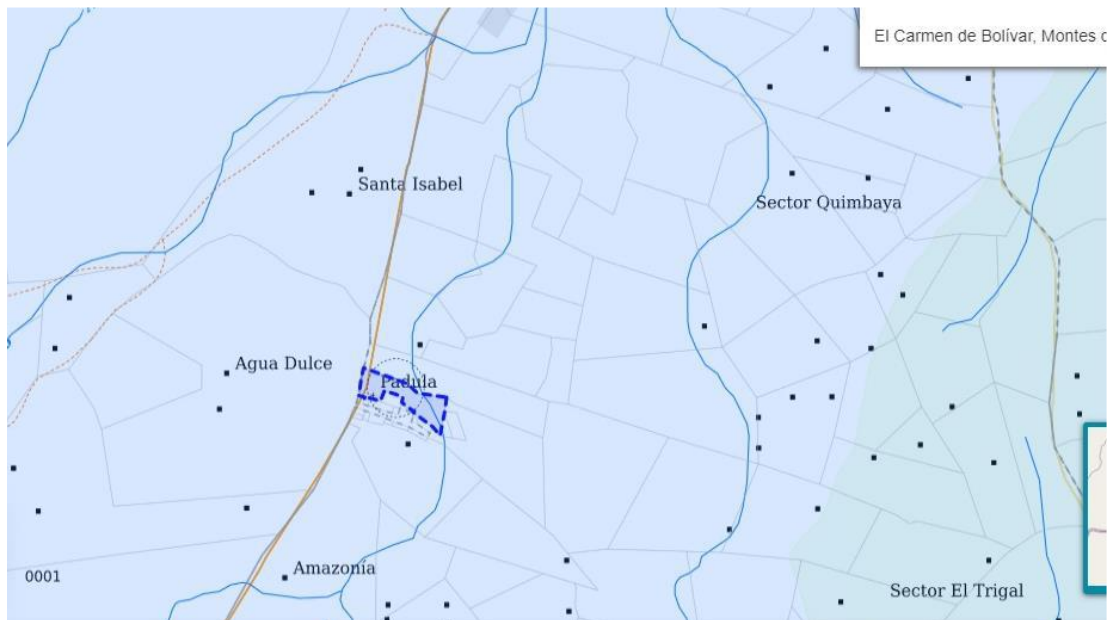

El Carmen de Bolívar, es un Municipio del departamento de Bolívar ubicado a 114 kms al sudeste de Cartagena de Indias y en el centro de la subregión Montes de María del departamento. Es considerado el municipio de mayor extensión de esa subregión, cuenta con una superficie territorial de 93.400 hectáreas.

El municipio de El Carmen de Bolívar, limita por el norte con el municipio de San Jacinto (Bolívar); por el sur con los municipios de Chalán y Ovejas (Sucre), por el este con los municipios de Zambrano y Córdoba (Bolívar) y por el oeste con los municipios de María La Baja (Bolívar) y Ricaurte -Coloso- y San Onofre (Sucre).

3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO

Las principales actividades a realizar durante la ejecución del proyecto **“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”** se describen a continuación:

- Realizar establecimiento de plantaciones (119 ha de reforestación protectora a distancia de siembra 3m x 3m)
- Características de plántulas (especies arbórea 80 cm altura)
- Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación.
- Preparación del terreno (Manualmente)

- Distribución y siembra de arboles
- Aislamiento de las áreas intervenidas con alambre de púas
- Mantenimiento de arreglos forestales
- Reposición por perdidas
- Control de plagas
- Limpias - control de malezas
- Replateo
- Prevención y control fitosanitario

El Interventor vigilara el cumplimiento de las diferentes etapas de ejecución del Contratistas, verificando y vigilando que los procedimientos agrícolas y sus resultados cumplan con las normas y especificaciones técnicas establecidas, verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de obra.

La Interventoría será responsable de coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad contratante y la Dirección de Obra. Velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecución de Obra, y ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sea oportunos y transparentes. Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad a lo estipulado en este documento.

Dentro del alcance del contrato de interventoría se tiene contemplado la ejecución de la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”.**

El contratista debe realizar las siguientes actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas al personal asignado a la obra
- Elaborar los informes técnicos y administrativos.
- Vigilar que los procedimientos agrícolas y sus resultados cumplan con las normas y especificaciones técnicas establecidas.
- Verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de obra.
- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con la entidad contratante y la Dirección de Obra.
- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se realicen conforme a los estándares o especificaciones. 9
- Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.
- Verificar la información de memorias de diseño y planos técnicos y velar por su correcta ejecución.

- Coordinar con el topógrafo el levantamiento de la información topográfica.
- Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra a sistemas de seguridad social y parafiscal.
- Control en el cumplimiento de la programación de la ejecución de las obras y suministros
- Coordinar y Supervisar la ejecución de los trabajos de todos los asesores de la Interventoría.
- Preparación de informes periódicos consignados en el contrato al igual firmará y aprobará el contenido de la bitácora y llevará un registro fotográfico.
- Asistir a las reuniones en conjunto con la Dirección de Obra y la entidad contratante cuando sean necesarios.
- Ejecutar los planes o programas de calidad y seguridad industrial implementados.

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

La siguiente tabla contempla los datos principales del contratista de obra:

CONTRATISTA	INGAGROF S.A.S NIT. 900574589-3	
TELÉFONO:	3114277810	
DIRECCIÓN:	Calle 10 VIA URRRA TIERRALTA CORDOBA	

4.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

Contratista de obra INGAGROF S.A.S. identificado con N.I.T. N° 900.574.589-3. Representada legalmente por el señor Carlos Alberto Rendón Polo.

CONTRATISTA	INGAGROF S.A.S
NÚMERO DE CONTRATO:	No. LP-003-2021
OBJETO DEL CONTRATO:	“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.”.
NIT CONTRATISTA:	900.574.589-3
PLAZO DEL CONTRATO:	El término para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) MESES. Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y suscripción de actas de inicio.

PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON 92/100 M/CTE (\$ 1.287.232.061,92),
ADICIÓN 1	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 50 CENTAVOS (\$534.111.723,50)
VALOR TOTAL:	MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.821.343.785,00)
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Marzo de 2022
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	La Entidad entregará un anticipo del (30%) del valor del contrato, al entregar la etapa de diagnóstico e identificación de las zonas a intervenir.
FORMA DE PAGO:	La entidad realizara un segundo pago parcial del (30%) cuando haya un avance por lo menos de un (50%) de ejecución y un pago final del (40%) a la finalización de la etapa de mantenimiento y asistencia técnica.

4.1.2 COMPONENTE FINANCIERO

Contratista	INGAGROF S.A.S.	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$1.287.232.061	
ADICIÓN NO 1	\$ 534.111.723,50	
RECURSOS:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE	
	PAGOS PARCIALES	De acuerdo a la Cláusula 4 Valor Del Contrato y Forma de Pago , la entidad contratante pagará al contratista un primer pago parcial por el (30%) del valor del contrato ofertado en la licitación pública, un segundo pago parcial del (30%) cuando haya un avance por lo menos de un (50%) de ejecución y un pago final del (40%) a la finalización de la etapa de mantenimiento y asistencia técnica.

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA LP-003-2021						
Valor total contrato de obra			\$1.287.232.061,57		100%	
Concepto	Valor facturado	%	Amortización y descuentos	%	Valor neto recibido	Fecha de pago
Acta Parcial No. 1	\$386.169.618,47	21.20%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
Acta Parcial No. 2	\$386.169.618,47	21.20%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
Acta Parcial No. 3	\$514.892.824,78	28.26%	N/A	N/A	\$514.892.824,78	Pagada
TOTAL	1.287.232.061,72	70.66%			1.287.232.061,72	-

4.1.3. COMPONENTE JURIDICO

El contrato de obra No. LP – CARDIQUE - 003-2021 fue legalizado mediante aprobación de pólizas 03 de marzo de 2022.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	21/12/2021	30/11/2022	\$128.723.206,19	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-47-994000066036
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	21/12/2021	30/11/2025	\$64.361.603,10	
Estabilidad y calidad de la obra	23/10/2022	23/10/2023	\$257.446.412,38	
Calidad del servicio	30/11/2022	30/11/2023	\$64.361.603,10	

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

RIESGO	FECHA INICIO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
Amparo Básico – Predios Labores y Operaciones	21/12/202	31/07/2022	\$181.705.200,00	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-74-994000010856

De acuerdo al Acta de inicio y modificación del contrato según Otrosí No.1 del contrato de obra No. LP – CARDIQUE - 003-2021 se realizó la actualización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de la referencia.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	21/12/2021	24/03/2023	\$128.723.206,19	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-47-994000066036
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	21/12/2021	24/03/2026	\$64.361.603,10	
Estabilidad y calidad de la obra	23/10/2022	23/10/2023	\$257.446.412,38	
Calidad del servicio	30/11/2022	30/11/2023	\$64.361.603,10	

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

RIESGO	FECHA INICIO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
Amparo Básico – Predios Labores y Operaciones	31/07/2022	24/10/2022	\$200.000.000	Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Nº:390-74-994000010856

4.1.4 COMPONENTE TÉCNICO

El presente informe describe las principales actividades técnicas desarrolladas del 24 de octubre al 23 de noviembre del presente año, en este periodo se realizaron visitas de seguimiento, cargue y descargue de material vegetal en puntos de acopio (finca Acapulco, finca puente peatonal entrada al salado), se hace entrega del material vegetal a los beneficiarios del proyecto en las diferentes veredas, revisión a la siembra y resiembra de material vegetal (plántulas), control de malezas y plateo, acompañamiento, monitoreo, verificación y supervisión al Contratista “INGAGROF – Equipo Técnico y Equipos Social”, en la ejecución de las acciones programadas en las veredas Caracolí, Caracolcito, El Guapo, El Hobo, Tolemaida, La Zarza, San Isidro, Roma, Carabajal, San Rafael, Santa Fe, Rancho Azul, Piedra Azul, Mala Noche, Coloncito, Bajo Grande, Caña del Tigre, Santa Rita, El Balsado y el corregimiento El Salado, donde se desarrolla el proyecto “Restauración de ecosistemas de bosque secos y bosques con especies nativas que favorezcan la polinización en áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE”, en el Municipio de El Carmen de Bolívar.

Continúan las labores de cargue y descargue de material vegetal (plántulas) en los puntos de acopio, llenado de canastillas con material vegetal estas se transportan en carro, se trasladan hasta los lotes y posteriormente son entregados a los beneficiarios del proyecto (100 plántulas/ha), quienes continúan con las actividades programadas de limpia, plateo, resiembra, fertilización, control de malezas y control fitosanitario.

Así mismo se continúa con las charlas y talleres de capacitación a comunidades y equipo técnico Ingagrof, en seguridad y salud en el trabajo (SISO), se exponen temas relacionados con las radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, metodología de las 5 S, prevención de riesgos químicos, factores de riesgo en el área de trabajo, prevención de riesgos ergonómicos, prevención del consumo del tabaco y cigarrillo, riesgos psicosociales, riesgos locativos, riesgos en trabajos en alturas, pausas activas, posturas prolongadas mantenidas, seguridad en casa, importancia del reciclaje, trabajo en equipo.

Dentro de las actividades programadas del proyecto el residente de interventoría ha realizado monitoreo, seguimiento, verificación y supervisión a la adición de las 50 hectáreas, los participantes beneficiarios cumplan a cabalidad con los requisitos exigidos para adquirir los beneficios del proyecto como son: Cedula de ciudadanía, sana posesión y formato o acta de inscripción diligenciada, en este periodo se ha entregado la totalidad de Insumos (material vegetal plántulas) y herramientas (paladragas, martillos, limas, machetes, alambre de púas, grapas, flexómetro y pita).

De igual forma se continúa con las labores programadas de seguimiento, revisión y monitoreo a las actividades de siembra de material vegetal (plántulas), limpia, plateo, resiembra, fertilización, control fitosanitario y mantenimiento de plantaciones, visitamos el lote en compañía del beneficiario del proyecto y se hacen las recomendaciones necesarias para la plantación.

A continuación, se relacionan los beneficiarios que han recibido hasta la fecha insumos material vegetal (plántulas) y herramientas para las actividades correspondiente a reforestación protectora.


ITEM	CORREGIMIENTO	PROPIETARIO	Ha	HERRAMIENTAS	PLANTULAS (1000)
1	ROMA	VIRGILIO MARTINEZ CASTILLO	1	SI	SI
2		DEINER BENITEZ LUNA	1	SI	SI
3		EDWIN BENITEZ LUNA	1	SI	SI
4	CARACOLI	JULIO FOSNSECA VARELA	1	SI	SI
5		JORGE LAMBRAÑO TORRES	1	SI	SI
6		JESUS PINEDA GARRIDO	1	SI	SI
7		OSMAN YEPES TORRES	1	SI	SI
8		BLEISYS OSPINO ARAGON	1	SI	
9	CARABAJAL	MANUEL ARRIETA ZAPATA	1	SI	SI
10		MANUEL ARRIETA DIAZ	1	SI	SI
11		JORGE LIBONATIS YEPEZ	2	SI	SI
12	SAN RAFAEL	ANGEL GUTIERREZ MENDOZA	1	SI	SI
13		EUGENIO OSPINA TERAN	1	SI	SI
14		GILBERTO VEGA ANILLO	1	SI	SI
15		ALVARO GUTIERREZ M	1	SI	SI
16		JORGE VEGA BUELVAS	1	SI	SI
17	SANTA FE	LEIDIS GAMARRA FUENTES	2	SI	SI
18		JORGE LAGUNA ROBLES	1	SI	SI
19		JOSE GARCIA PADILLA	1	SI	SI
20	PIEDRA AZUL	CATALINA VILLERA MESA	3	SI	SI
21		MEDARDO BALLESTAS CARDENAS.	1	SI	SI
22		DANILO BALLESTAS PULGAR	1	SI	SI
23		ENDER BALLESTAS CARDENAS	1	SI	SI
24		WILLIAM BALLESTAS C.	1	SI	SI
25		MEDARDO BALLESTAS PELUFFO	1	SI	SI
26		MEDARDO BALLESTAS PULGAR	1	SI	SI

27	PIEDRA AZUL	LUIS MEZA RIOS	1	SI	SI
28		YANERIS BUELVAS TORRES	1	SI	SI
29		MARTA RAMIREZ PIMIENTA	1	SI	SI
30		JAVIER MEDINA VITOLA	1	SI	SI
31	MALA NOCHE	LUZ ESTELA TERAN LORA	1	SI	SI
32		LUIS OCHOA MEDINA	1	SI	SI
33		NELVIS TEHERAN ANILLO	1	SI	SI
34	BAJO GRANDE	JOSE RICO SERMEÑO	2	SI	SI
35		WILDER MARTINEZ	1	SI	SI
36	SAN ISIDRO	OMAR ALVIS DIAZ	1	SI	SI
37	CARACOLICITO	GUSTAVO OSUNA CASTRO	2	SI	SI
38		JULIO TERAN CATALAN	1	SI	SI
39		RAFAEL ROQUEME PEREZ	1	SI	SI
40		OSCAR CONTRERAS OLIVO	1	SI	SI
41		REINALDO CONTRERAS OLIVO	1	SI	SI
42		ANTONIO OCHOA RIVERO	1	SI	SI
43		NEIR VEGA SALCEDO	1	SI	SI
44	HOBÓ	LUIS PEREZ PIÑERES	1	SI	SI
45		MAIDA PIÑEREZ MARQUEZ	1	SI	SI
46		JOSE PEREZ CERPA	1	SI	SI
47		ARLEDIS ARRIETA CABRERA	1	SI	SI
48		DARWIN ARRIETA CABRERA	1	SI	SI
49		YOMAR SIERRA RODRIGUEZ	1	SI	SI
50		GUILLERMO PEREZ PELUFFO	1	SI	SI
51		EDUARDO TAPIA MULETT	1	SI	SI
52		GUILLERMO MONTES ARIAS	1	SI	SI
		ARMANDO FLOREZ MILLAN	1	SI	SI
53		JEILEN GAMEZ LOPEZ	1	SI	SI
54		MARLENE MARTINEZ SIERRA	2	SI	SI
55		MARIA PEREZ MARTINEZ	1	SI	SI
56		ARLEY CABRERA PEREZ	1	SI	SI
57		JULIO SALCEDO SERPA	3	SI	SI

58	CAÑA DEL TIGRE	LUIS MEZA PEÑA	1	SI	SI
59		ANDERSON MONTES	1	SI	SI
60		JAVIER PORTO VILLARREAL	1	SI	SI
61		MARIA NAVARRO VILLEGAS	2	SI	SI
62		ARGEMIRO MARTELO M.	2	SI	SI
63	EL SALADO	VICTOR ROMERO PIMIENTA	1	SI	SI
64		CESAR MACHADO R.	3	SI	SI
65		EDUAR MEDINA VILORIA	3	SI	SI
66	SANTA RITA	IRAN COHEN REDONDO	1	SI	SI
67		SEGUNDO OVIEDO H.	2	SI	SI
68		ARMANDO TAPIAS GONZALEZ	1	SI	SI
69		OVER MARTINEZ PUERTA	1	SI	SI
70		JOSE MEZA LEGUIA	1	SI	SI
71		LUIS TORRES ESTOR	1	SI	SI
72		MANUEL MARTINEZ V.	1	SI	SI
73		TEOBALDO MEZA TAPIA	1	SI	SI
74		HARING VARGAS VASQUEZ	2	SI	SI
75		FRANCISCO VARGAS V.	2	SI	SI
76		ALEJANDRO VARGAS V.	1	SI	SI
77		FRANCISCO VASQUEZ R.	4	SI	SI
78		JUAN BERRIO SIMANCA	2	SI	SI
79		NUBIA TOBIAS DE ORTEGA	1	SI	SI
80		ALEXI ARIZA GAMARRA	1	SI	SI
81		CECIL VASQUEZ ROMERO	1	SI	SI
82	EL BALSAMO	PEDRO ARRIETA ALVAREZ	1	SI	SI
83		LUIS FONSECA ARRIETA	1	SI	SI
84		JORGE CAPELLA PONCE	1	SI	SI
85		WILSON OCHOA TEJADA	1	SI	SI
86		JAIR CAPELLA ORELLANO	1	SI	SI
87		ARGEMIRO CAPELLA M.	1	SI	SI
88		ALEXANDER ARRIETA TOBIAS	1	SI	SI
89		FRANCISCO DE LA HOZ	1	SI	SI

	EL BALSAMO				
90		JOSE DE LA HOZ ARRIETA	2	SI	SI
91		WILFREDO MIRANDA ANILLO	1	SI	SI
92		MARYLUZ HERRERA BRIEVA	1	SI	SI
93		MARICELA MONTES TORRES	1	SI	SI
94		HECTOR NAVARRO HERRERA	2	SI	SI
TOTAL HECTAREAS 119					

Se presenta la curva S de seguimiento de avance del proyecto, en el que se evidencia que el contratista, a fecha de corte de este informe presenta avance en su ejecución del 92.58% con respecto a una programación del 83.71%, evidenciando un avance del 8.87%, de esta forma se concluye que el contratista INGAGROF S.A.S. se encuentra al día en sus actividades programadas y ejecutadas mensualmente.

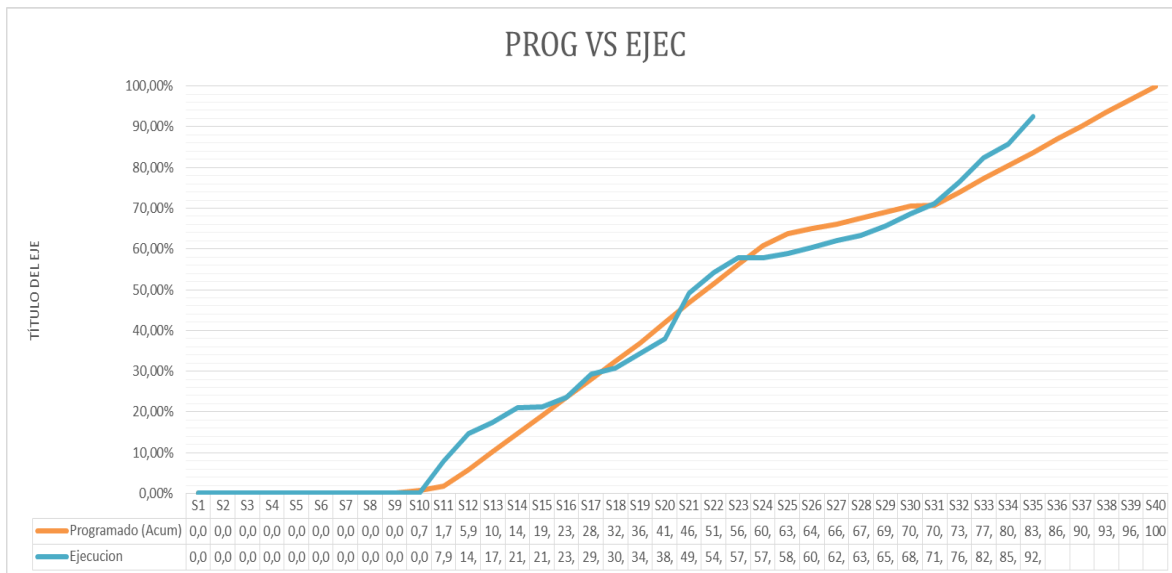

Se ha realizado entrega de Insumos material vegetal (plántulas) y kit de herramientas a la totalidad de los beneficiarios del proyecto, adición de 50 hectáreas programadas en las veredas de Caracolí, Verdum, Rancho Azul, Mala noche, Bajo Grande, El Hobo, Coloncito N°2, Santa Rita, Piedra Azul, San Rafael.

A continuación, se relacionan los beneficiarios de las 50 hectáreas adicionales del proyecto, quienes han recibido insumo material vegetal (plántulas) y kit herramientas para las actividades correspondiente a reforestación protectora.



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8



CARDIQUE



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

ITEM	VEREDA	PROPIETARIO	Ha
1	CARACOLI	MARICELA BARRETO BAJO	1
2		YENIS E. SEÑA DE ORO	1
3		ADRIANA P. LEGUIA TERAN	1
4		ANGELICA M. DIAZ RODELO	1
5		MADY ARROYO BUELVAS	1
6		DELICA ACOSTA MONTES	1
7	VERDUM	EDWIN PATERNINA SILVA	2
8	RANCHO AZUL	ELIZABETH MARTINEZ DE AVILA	1
9		BETILDA ROJAS CARO	1
10		EDGAR ROJAS CARO	1
11		ELIS HERNANDEZ TORRES	1
12		MARLENE ALVIS CARO	1
13		HERNANDO DIAZ OCHOA	1
14		LEIDER DIAZ OCHOA	2
15		FERNANDO OLIVERA CAUSADO	1
16	MALA NOCHE	JAIR JARABA MUÑOZ	1
17		ANER VELASQUEZ MEZA	1
18		PAOLA REDONDO SEÑA	1
19		WILSON HERNANDEZ ACEVEDO	2
20		EVER VARELA BUELVAS	1
21	BAJO GRANDE	ERNELIA MARTINEZ SIERRA	1

22	EL HOBO	MARLENE MARTINEZ SIERRA	1
23		JULIO SALCEDO SERPA	1
24	COLONCITO N°2	PATRICIA VALETA ROMERO	2
25		FRANCISCO MERIÑO SANDOVAL	1
26		HUGO ALFONSO ARROYO NOVOA	1
27		GUSTAVO TAPIAS TORRES	1
28		MIGUEL CAPELA CASTILLO	1
29		JORGE ELIECER RIVERA BLANCI	1
30		FARID SALAZAR MIRANDA	1
31	SANTA RITA	OVER MARTINEZ PUERTA	1
32		FLOR DIAZ TORRES	1
33		TEOBALDO MEZA TAPIAS	1
34		FRANCISCO VARGAS VASQUEZ	1
35		EDILBERTO WILCHES PEREZ	1
36		HARRING VARGAS VASQUEZ	1
37	PIEDRA AZUL	JUAN HERNANDEZ GUERRA	1
38		MEDARDO BALLESTAS CARDENAS	1
39	SAN RAFAEL	ESTHER MONTES OCHOA	3
40		EMIR GONZALES LUNA	1
41		LILIBETH GONZALEZ HERRERA	1
42		ALBEIRO MENDOZA MONTES	1
TOTAL HECTAREAS REFORESTADAS			50

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE:	JET INGENIERÍA
TELÉFONO:	3104966577 – 3117029
DIRECCIÓN:	CARRERA 35 No. 71-138 BARRANQUILLA, ATLÁNTICO.

5.1 COMPONENTE CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

5.1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

5.1.1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA:	JET INGENIERÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 111.826.085,00),
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
NIT INTERVENTORÍA:	802.024.876-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PLAZO DE EJECUCIÓN DE SIETE (7) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Marzo de 2022
PRORROGA No 1:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de diciembre de 2022
SUPERVISIÓN:	CARDIQUE

5.1.1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PERSONAL

El personal contratado durante la ejecución de las actividades en este periodo son los siguientes:

Henry Alberto Santiago Oyuela	Director de interventoría	Uno (1)
Tandril Sander López Manjarrez	Residente de interventoría	Uno (1)
Brenda Savina Piña Acevedo	Trabajador Social	Uno (1)
Jeison David Álvarez Brito	Topógrafo	Uno (1)
Erika Patricia Jácome Montaña	Profesional SISO	Uno (1)

5.1.1.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE ESTE PERIODO

RELACIÓN DE OFICIOS ENVIADOS			
CODIGO	FECHA	DIRIGIDO	DESCRIPCION
JET.BS 028.11.22	22/11/2022	CARDIQUE	ESTADO DEL PROYECTO
JET.BS 029.11.22	30/11/2022	CARDIQUE	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO
JET.BS 030.12.22	13/12/2022	INGAGROF S.A.S	SOLICITUDES VARIAS

RELACIÓN DE OFICIOS RECIBIDOS			
CODIGO	FECHA	DIRIGIDO	DESCRIPCION
	05/12/2022	JET INGENIERIA S.A.S.	INFORME DE AVANCE DE OBRA NO 7
	05/12/2022	JET INGENIERIA S.A.S.	INFORME DE AVANCE DE OBRA NO 8

Anexo 5. Correspondencia enviada y recibida.

5.1.2. COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo a la forma de pago establecida para el contrato de interventoría.

JET INGENIERIA S.A.S	
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$ 111.826.085,00
ADICIÓN NO 1	\$ 31.950.310,00
RECURSOS:	CARDIQUE
FORMA DE PAGO	La entidad pagara al contratista con pagos parciales mensuales hasta un máximo acumulado del 80% del valor del contrato

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Valor total contrato de obra			\$ 143.776.395		100%	
Anticipo (30%)			N/A		0%	
Concepto	Valor facturado	%	Amortización y descuentos	%	Valor neto recibido	Estado
Acta parcial No. 1	\$ 15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$ 15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 2	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 3	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial No. 4	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada
Acta parcial	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,0	Pagada

No. 5						
Acta parcial No. 6	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A	\$15.975.155,00	Pagada
Acta parcial No. 7	\$15.975.155,00	11.11 %	N/A	N/A		Trámite
TOTAL	\$ 111.826.085	77.78 %	-	-	\$ 95.850.930,00	

5.1.3. COMPONENTE JURIDICO

El contrato de interventoría No. CMA – CARDIQUE – 001-2022 fue legalizado mediante aprobación de las pólizas.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal inicial

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	03/03/2022	03/03/2023	\$22.365.217	Compañía Mundial de Seguros S.A. Nº: CRC-100007568
Prestaciones sociales legales	03/03/2022	03/10/2025	\$5.591.304	
Calidad del servicio	03/03/2022	03/10/2023	\$ 16.773.912	

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal según acta modificativa N° 01

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
	INICIA	VENCE		
Cumplimiento del contrato.	24/03/2022	23/03/2023	\$28.755.279	Compañía Mundial de Seguros S.A. Nº: CRC-100007568
Prestaciones sociales legales	24/03/2022	23/10/2025	\$7.188.819,75	
Calidad del servicio	24/03/2022	23/10/2023	\$ 21.566.459,25	

5.1.4. COMPONENTE TÉCNICO

Durante el presente periodo se iniciaron las actividades por parte del contratista que se relacionan a continuación:

- Plan de establecimiento forestal
- Cronograma de actividades
- Visitas previas de sitios a intervenir
- Registros de datos de campo
- Actas de concertación, Georreferenciación de áreas a intervenir
- Plan de establecimiento y manejo forestal (PEMF)
- Verificación de certificación de vivero
- Inicio de verificación de encerramiento de predios
- Aislamiento parcial de terreno
- Limpia parcial de terreno
- Trazado y ahoyado parcial
- Plateo y siembra parcial
- Siembra
- Resiembra
- Limpia
- Plateo
- Resiembra
- Fertilización
- Control Fitosanitario

5.1.5. COMPONENTE SST

El personal especializado en seguridad y salud en el trabajo se encuentra en revisión de los documentos entregados por el contratista en donde incluye, Plan de bioseguridad contra el contra Covid-19 y el informe de Seguridad y salud en el trabajo. (**Ver Anexo 2.** Informe SST de interventoría)

5.1.6. COMPONENTE SOCIAL

Se continúa con el acompañamiento al contratista INGAGROF S.A.S. en las actividades de socialización y recorrido de predios para iniciar con cada uno de los trabajos programados durante la ejecución del proyecto. (**Ver Anexo No. 4** Informe Social de Interventoría)

6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el mes de noviembre se han venido presentando lluvias torrenciales y frecuentes durante el día, vientos y tormentas eléctricas lo cual ha dificultado la salida a campo para el desarrollo de las actividades programadas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista continuar con las actividades programadas durante las etapas del proyecto, controles de malezas, fertilización, georreferenciación, entrega de recursos y continuar con las capacitaciones. Aprovechar el periodo de lluvias para realizar la siembra y aplicación del plan de fertilización, control de plagas, enfermedades y manejo fitosanitario.
- Se recomienda realizar lo antes posible todas aquellas actividades de mantenimiento, ya que gracias a la temporada invernal la maleza alrededor de las plántulas crece con rapidez.
- Con el adelanto que presenta el contratista de obra en la ejecución del contrato de obra, se prevé que pueda terminar en el plazo contractual vigente.

Cordialmente,



TANDRIL SANDER LOPEZ MANJARREZ
Ingeniero Forestal De Interventoría
JET INGENIERIA S.A.S.



HENRY ALBERTO SANTIAGO OYUELA
Director de Interventoría
JET INGENIERIA S.A.S.

8. ANEXOS

- Anexo 1. Registro fotográfico
- Anexo 2. Informe Siso de Interventoría
- Anexo 3. Informe Social de Interventoría
- Anexo 4. Correspondencia enviada y recibida

ANEXO No. 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Revisión, Monitoreo y Seguimiento a material vegetal sembrado (plántulas)





cargue y descargue de material vegetal en puntos de acopio.











ANEXO No. 2

INFORME SOCIAL

ANEXO No. 3

INFORME SST

ANEXO No. 4

CORRESPONDECIA

ANEXO No. 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Revisión, Monitoreo y Seguimiento a material vegetal sembrado (plántulas)





cargue y descargue de material vegetal en puntos de acopio.





ANEXO No. 2

INFORME SOCIAL



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

NO. LP CARDIQUE - 003-2021

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 08

" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE".

JET INGENIERÍA S.A.S
NIT: 802.024.876-8

Gestión Social

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO DEL PROYECTO	4
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
4. GESTION SOCIAL	8
4.1 PROGRAMA DE DIVULGACION ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	8
<i>Actividades ejecutadas socialización y divulgación</i>	9
Actividades ejecutadas, atención y participación comunitaria	12
.....	13
4.2 ACTAS DE VECINDAD	15
4.3 PROGRAMA VINCULACION LABORAL	15
5. CONCLUSIONES	16

1. INTRODUCCIÓN

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, identificada con N.I.T. N° 800.254.453-5 a través de la licitación pública No. **LP-003-2021**, por una parte; y por la otra INGAGROF S.A.S. identificado con N.I.T. N° 900.574.589-3.

La interventoría del proyecto por parte de **JET INGENIERÍA S.A.S.**, representado legalmente por JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, a quién se adjudicó el proyecto que tiene por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE”**.

Producto de los procesos anteriores se genera el presente informe donde se evidencian los avances, efectividad y cumplimiento de las actividades Sociales necesarias para el buen desarrollo del proyecto en mención, de igual forma se describen los programas mencionados a continuación y establecidos dentro del Plan de Gestión Social establecidos para la implementación de estrategias de acompañamiento continuo con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

Programas del Plan de Gestión Social a implementar:

- Programa de divulgación, atención y participación comunitaria
- Actas de vecindad
- Vinculación laboral.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

- El objetivo general del contrato de obra pública No. LP-003-2021, es realizar la Restauración de ecosistemas de Bosque Secos y Bosques con Especies Nativas que favorezcan la polinización en áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La Región de los Montes de María, es de gran importancia ambiental para el departamento de Bolívar y su Ecosistema de Bosque seco tropical, está siendo alterado por factores como la ganadería, la expansión de la frontera agrícola, incendios forestales, tala y raza de bosques. Estas zonas han sido intervenidas por la acción del hombre y aún se encuentran relictos de bosques, asociados con rastrojos altos y áreas para cultivos. Las prácticas de manejo y la intensidad con que se realizan estas actividades, son causales de procesos de erosión y pérdida de fauna y flora. Las pendientes altas, los procesos de erosión, los suelos superficiales, las fuertes y continuas lluvias y la inestabilidad del terreno repercuten en mayor o menor grado en las poblaciones.

La ocupación de las zonas altas de montaña para el establecimiento de actividades agropecuarias ha estado acompañada, por deforestación que ha incidido de manera negativa sobre la función de retención de agua, cuya pérdida lo deja expuesto a fenómenos de erosión y sedimentación que alteran los flujos hídricos de las cuencas. Los Montes de María, son áreas pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE, son ecosistemas estratégicos, que es necesario proteger y conservar para permitir el flujo de fauna del corredor biológico.

En El Carmen de Bolívar, hay la necesidad de iniciar los procesos de rehabilitación ecológica en áreas degradadas, en bosques y arbustos secos en las áreas rurales ubicadas en jurisdicción del Municipio e identificadas como prioritarias, conforme a la zonificación ambiental y forestal de CARDIQUE.

CARDIQUE, dentro de su plan de acción (PAI) 2020-2023, y plan nacional de desarrollo forestal incluyó la acción operativa **“RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS TROPICAL – BST (RONDAS HIDRICAS, ZONAS DE RECARGA DE ACUIFEROS, NACEDEROS DE AGUA, CORREDORES DE CONECTIVIDAD SOCIECOSISTEMICOS, AREAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACION Y AREAS ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS)”**, una de sus metas prioritarias es la reforestación o restauración de áreas que se han visto afectadas por la realización de proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, la ampliación de áreas para ganadería extensiva en áreas de vocación forestal, la explotación mineral a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no sostenibles.

En Municipio de El Carmen de Bolívar, la apicultura se ha visto afectada por los efectos del cambio climático global y sumado a la tala de árboles para actividad agrícola, ganadería, minería, obras de ampliación de la carretera troncal de Occidente, y de regreso a los campesinos a la zona rural, ha conllevado a que la población de abejas disminuya y el rendimiento de la producción de miel por

colmena, estas condiciones de deforestación han afectado la estabilidad de las abejas ocasionando la enjambrazón de estas hacia zonas donde tengan mejores condiciones ambientales.

Al ejecutar el proyecto se establecerá modelos de RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION ECOLOGICA, Y APOYO A PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS, en 119 hectáreas de aptitud ambiental y forestal priorizados en las diferentes zonas rurales en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar y vincular a las comunidades de la zona en actividades de rehabilitación ecológica, siembra de especies nativas atrayentes de polinizadores y dispersores de semilla.

En El Municipio de Carmen De Bolívar, las veredas Padula y Verdum, y el corregimiento el salado requiere la contratación de una firma de interventoría que realice las labores de vigilancia y control del objeto del contrato mencionados a continuación: **"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN AREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE"**, por lo que la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

Se requiere "realizar la vigilancia y control" a través de figuras como la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"**, y la supervisión, para que se desarrolle esta función de vigilancia y control en los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución del contrato descrito.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localizará en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.



Ilustración 1. Localización del departamento Bolívar.

El **Carmen De Bolívar** es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, ubicado en el sistema orográfico de los Montes de María (Coordenadas: 9°43'06"N 75°07'21"O/ 9.7183333333333, -75.1225) con una superficie de territorio de 934 km².


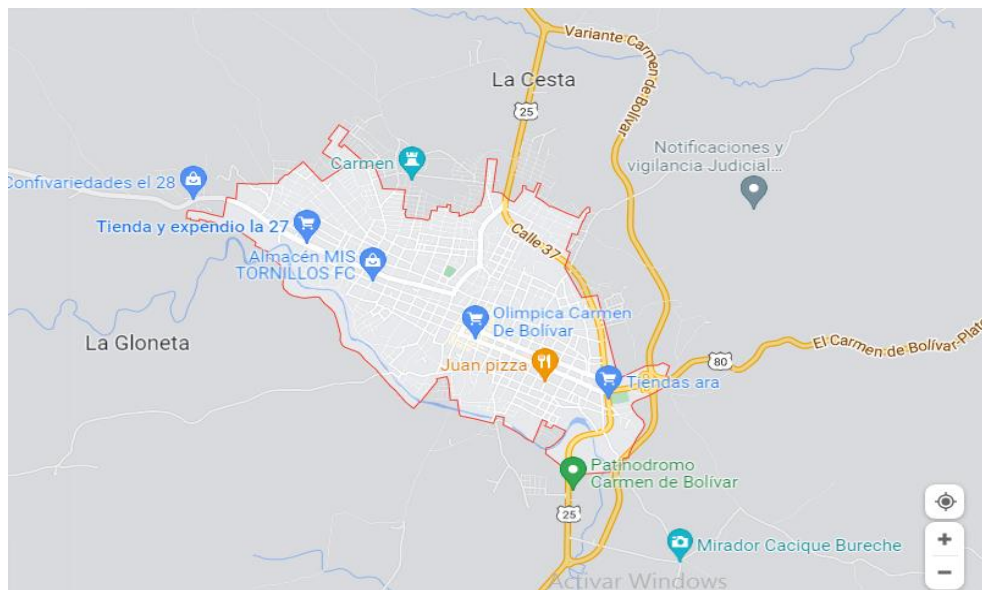


Ilustración 2. Localización del municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar.


Zona Seleccionada No 1
Corregimiento del Salado, Municipio de El Carmen de Bolívar



Zona Seleccionada No 2
Vereda Verdun Municipio de El Carmen de Bolívar

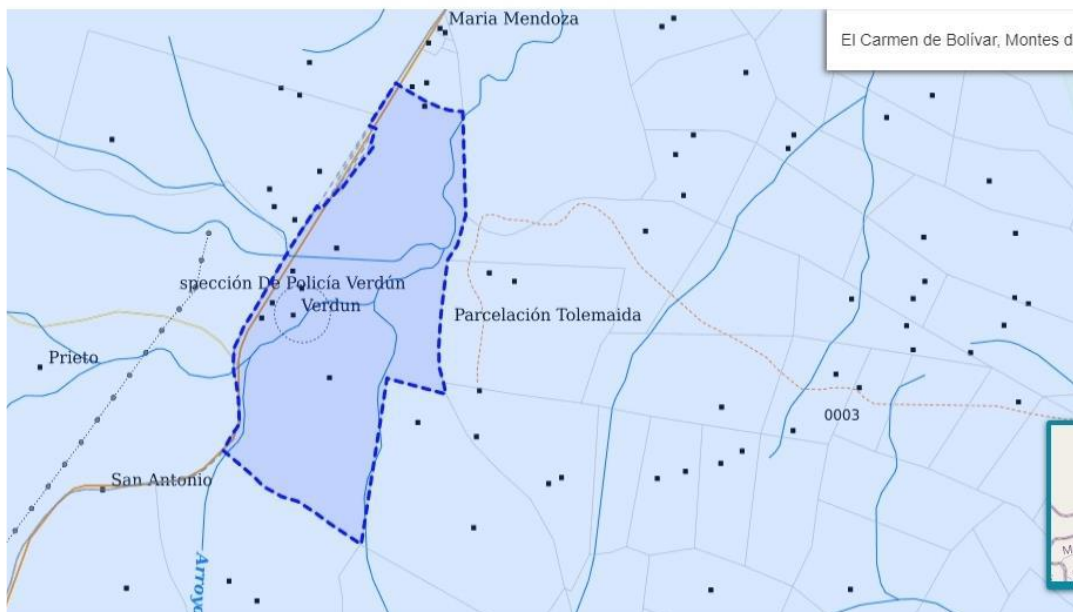

Zona Seleccionada No 2
Vereda Padúla Municipio de El Carmen de Bolívar

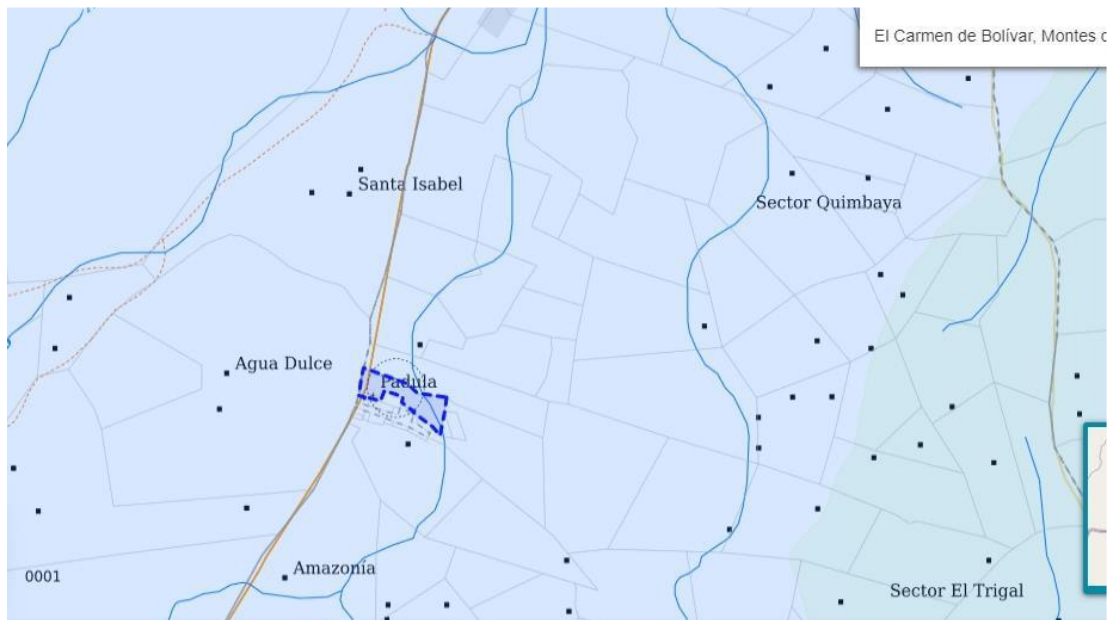

El Carmen de Bolívar es un Municipio del departamento de Bolívar ubicado a 114 kms al sudeste de Cartagena de Indias y en el centro de la subregión Montes de María del departamento. Es considerado el municipio de mayor extensión de esa subregión, cuenta con una superficie territorial de 93.400 hectáreas.

El municipio de El Carmen de Bolívar limita por el norte con el municipio de San Jacinto (Bolívar); por el sur con los municipios de Chalán y Ovejas (Sucre), por el este con los municipios de Zambrano y Córdoba (Bolívar) y por el oeste con los municipios de María La Baja (Bolívar) y Ricaurte -Coloso- y San Onofre (Sucre).

4. GESTION SOCIAL

4.1 PROGRAMA DE DIVULGACION ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Es importante que la población del área de influencia directa e indirecta se encuentre bien informada sobre la construcción, avance de la obra y su posterior operación. La falta de información genera especulación, por lo que se hace necesario diseñar estrategias donde se emplearán diferentes espacios y medios de comunicación, para permitir la difusión de una información clara y precisa acerca del proyecto entre los diferentes actores.

La información y la participación son elementos indispensables para generar sentido de pertenencia, por parte de las comunidades del área de influencia del proyecto, por lo tanto, el programa formula y desarrolla estrategias de comunicación que promueven los procesos de información y diálogo social,

centrándose en fortalecer las relaciones de los grupos de interés (líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, comunidades aledañas y diferentes actores directos e indirectos) del proyecto, posicionar la imagen del proyecto y la contratista.

En lo que respecta a la atención y participación comunitaria el objetivo es darle seguimiento a cada una de las actividades a ejecutarse de la mano de la comunidad, la contratista debe conformar un comité de veedurías el cual debe velar y acompañar los procesos en los que la comunidad sea directamente relacionado.

Se deberá dar atención a la comunidad por medio de un punto de atención en el cual se deben recepcionar las manifestaciones ciudadanas, la contratista está en la obligación de dar respuesta a cada una de estas de manera oficial.

Actividades ejecutadas socialización y divulgación

Beneficiarios del Proyecto						
EL CARMEN DE BOLÍVAR						
PREDIO	PROPIETARIO	CEDULA	TELÉFONO	Ha	COORDENADAS	
					N	W
TOTAL				7		
PIEDRA AZUL						
QUEBRADA N° 2	CATALINA VILLERA MESA	50.996.440	318608395	3	09°44'45,1"	075°08'09,7"
LA QUEBRADA	MEDARDO BALLESTAS C.	73.430.891	3203991717	1	09°44'45,5"	075°08'13,1"
LA QUEBRADA	DANILO BALLESTAS PULGAR	1.052.088.506	3126460560	1	09°44'45,5"	075°08'13,1"
LA QUEBRADA	ENDER BALLESTAS CARDENAS	73.544.067	3113509026	1	09°44'45,5"	075°08'13,1"
LA QUEBRADA	WILLIAM BALLESTAS C.	73.546.756		1	09°44'45,5"	075°08'13,1"
LA QUEBRADA	MEDARDO BALLESTAS P.	9.105.158	3203991717	1	09°44'45,5"	075°08'13,1"
LA QUEBRADA	MEDARDO BALLESTAS P.	1.007.245.000	3126460560	1	09°44'45,5"	075°08'13,1"
LA BENDICION	LUIS MEZA RIOS	73.547.277	3107014505	1	09°45'11,3"	075°07'38,1"
LA DIVISA	YANERIS BUELVAS TORRES	1.052.072.385	3143322605	1	09°45'12,1"	075°08'19,9"
LA ESPERANZA	MARTA RAMIREZ PIMIENTA	45.645.076	3146215975	1	09°45'11,2"	075°08'06,5"
LOS MAMONES	JAVIER MEDINA VITOLA	73.433.191	3216866207	1	09°43'54,7"	075°08'13,1"
TOTAL				13		
MALA NOCHE						
LA PRIMAVERA	LUZ ESTELA TERAN LORA	45.645.979	3105355200	1	09°45'14,7"	075°07'43,7"
VILLA EDITH	LUIS OCHOA MEDINA	9.110.708	315626602	1	09°45'31,0"	075°07'10,8"
EL FLORAL	NELVIS TEHERAN ANILLO	45.581.398	3043950606	1	09°45'31,0"	075°07'07,5"
TOTAL				3		

**TOTAL HECTAREAS
REFORESTADAS**

30

Nº	CORREGIMIENTO/ EREDA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CELULA R	Nº HC	N	w
1	CARACOLÍ	MARICELA BARRETO BAJO	45.583.931	3135194 813	1	09° 43' 50.4"	075° 12' 34.4"
2		YENIS E. SEÑA DE ORO	22.521.150	3128549 108	1	09° 43' 33.5"	075° 12' 34.4"
3		ADRIANA P. LEGUIA TERAN	45.646.827	3114207 451	1	09° 44' 18.8"	075° 13' 35.7"
4		ANGELICA M. DIAZ RODELO	45.581.454	3145037 828	1	09° 44' 20.5"	075° 13' 32.8"
5		MADY LEONOR AROYO BUELVAS	33.278.575	3214338 631	1	09° 43' 54.7"	075° 11' 07.7"
6		DELICA ACOSTA MONTES	39.491.867	3107168 036	1	09° 43' 39.1"	075° 12' 36.8"
7	VERDUN (TOLEMAIDA)	EDWIN PATERNINA SILVA	73.551.052	3006184 407	2	09° 38' 45"	075° 08' 05"
8	RANCHO AZUL	ELIZABETH MARTINEZ DEAVILA	1.052.079. 134	3016175 661	1	09° 45'28.8"	075° 07' 54.0"
9		BETILDA ROJAS CARO	23.089.744	3135553 655	1	09° 45'07.6"	075° 07' 45.9"
10		EDGAR ACOSTA MERCADO	73.431.294	3203380 486	1	09° 45'13.5"	075° 07'40.7"
11		ELIS HERNANDEZ TORRES	45.579.795	3205118 025	1	09° 45'19.06"	075° 07'49.4"
12		MARLENE ALVIS CARO	45.584.672	3205865 261	1	09° 45'14.5"	075° 07'46.3"
13		HERNANDO DIAZ OCHOA	9.105.177	3216908 783	1	09° 44'57.8"	075° 07'365.3"
14		LEIDER DIAZ OCHOA	1.052.976. 643	3126667 875	2	09° 45'03.3"	075° 07'39.3"
15		FERNANDO OLIVERA CAUSADO	73.434.896	3143322 605	1	09° 45'12.1"	075° 08'19.9"
16	MALA NOCHE	JAIRO JARABA MUÑOZ	73.550.269	3205190 926	1	09° 44'13.8"	075° 06'47.7"
17		ANER VELAZQUEZ MEZA	73.552.630	3135879 672	1	09° 45'28.1"	075° 06'21.6"



CARDIQUE



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

18		PAOLA REDONDO SEÑA	45.649.378	3107582 426	1	09° 45'40.8"	075° 06'37.4"
19		WILSON HERNANDEZ ACEVEDO	78.034.305	3133907 611	2	09° 45'29.4"	075° 06'16.8"
20		EVER VARELA BUELVAS	73.150.169	3204475 362	1	09° 45' 21.5"	075° 06'27.6"
21	BAJO GRANDE	ERNELIA RIVERA CARDENAS	22.905.273	3135639 185	1	09° 41'11.2"	075° 13'23.7"
22	EL HOBO	MARLENE MARTINEZ SIERRA	45.578.636	3137839 430	2	09° 40'21.3"	075° 14'18.8"
23		JULIO SALCEDO SERPA	9.112.718	3105324 034	2	09° 39'58.3"	075° 15'18.3"
24	COLONCITO N° 2	PATRICIA VALETA ROMERO	64.479.465	3147807 357	1	09° 46'29.4"	075° 08'55.9"
25	Villa Amalia	FRANCISCO MERIÑO SANDOVAL	73.551.239	3136488 492	1	09° 42' 00.9"	075° 06'14.3"
26		HUGO ALFONSO ARROYO NOVOA	9.105.195	3115640 518	1	09° 42' 01.0"	075° 06'29.6"
27		GUSTAVO TAPIAS TORRES	73.431.545	3204510 059	1	09° 42' 00.7"	075° 06'42.2"
28		MIGUEL CAPELA CASTILLO	9.106.409	3126485 554	1	09° 42' 25.7"	075° 06'31.6"
29		JORGE ELIECER RIVERA BLANCO	73.544.191	3217451 822	1	09° 41'58.2"	075° 06'16.3"
30		FARID SALAZAR MIRANDA	73.429.894	3012158 240	1	09° 42'03.4"	075° 06'24.1"
31	SANTA RITA	OVER MARTINEZ PUERTA	73.566.459	3145476 510	1	09° 39'47.7"	075° 06'11.3"
32		FLOR MARIA DIAZ TORRES	45.583.186	3007428 204	1	09° 41' 40.6"	075° 06'26.6"
33		TEOBALDO MEZA TAPIAS	73.551.650	3013765 613	1	09° 40'08.3"	075° 06'29.7"
34		FRANCISCO VARGAS VASQUEZ	73.550.441	3145168 714	1	09° 40'11.6"	075° 05'48.7"
35		EDILBERTO WILCHES PEREZ	73.548.431	3205384 807	2	09° 40'15"	075° 05'26"
36		HARRING VARGAS VASQUEZ	73.550.434	3115106 257	1	09° 40'02.8"	075° 05'51.8"
37	PIEDRA AZUL	JUAN HERNANDEZ GUERRA	70.522.081	3127352 135	1	09° 44'45.5"	075° 08'11.1"
38		MEDARDO BALLESTAS CARDENAS	73.430.891	3203991 717	1	09° 44'42.5"	075° 08'13.1"
39	SAN RAFAEL	ESTHER JUDITH MONTES OCHOA	45.576.360	3137310 650	3	09° 43'05.6"	075° 00' 51.7"
40		EMIR GONZALEZ LUNA	73.429.814	3107035 280	1	09° 43'04.1"	075° 02'22.8"
41		LILIBETH GONZALEZ HERRERA	45.649.346	3004868 224	1	09° 43'06.1"	075° 00'52.2"
42		ALBEIRO MEDINA MONTES	73.434.070	3108295 852	1	09° 43'03.7"	075° 00'49.2"

TOTAL HECTAREAS ADICIONADAS	50		
-----------------------------	----	--	--

Actividades ejecutadas, atención y participación comunitaria

- En el desarrollo de este periodo se realizó recorrido de reconocimiento en el Carmen de Bolívar para la adición de potenciales 50 hectáreas para restauración, se tiene en cuenta las condiciones de la zona o área de influencia.
- Selección de beneficiarios:
Para la selección de beneficiarios del proyecto **“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACIÓN EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE.”**, se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones:
 - Que los potenciales beneficiarios tengan como actividad económica la apicultura.
 - Que se encuentren afiliados a una asociación productora apícola.
 - Que cuente con el área disponible para labores de establecimiento, demostrando la tenencia de esta mediante una Sana Posesión.
 - Firma voluntaria de una carta de manifestación de interés en el proceso.

Registro Fotográfico



Imagen 1 recorrido de área de influencia

Registro Fotográfico



Imagen 2 selección de beneficiarios

4.2 ACTAS DE VECINDAD

Los Levantamientos de actas de vecindad han sido instaurados dentro de la fase inicial del proyecto como una medida preventiva al momento de llevar a cabo la ejecución del proyecto, con el fin de valorar el estado actual en el que se encuentran las viviendas. La actividad de levantamiento de actas de vecindad fue dirigida por el profesional social del contratista y bajo la supervisión de la interventoría.

Desde el programa se da acompañamiento social a las actividades requeridas por el área de Gestión Predial, durante diferentes escenarios de intervención, en el cual se da seguimiento al estado de viviendas, predios o áreas antes durante y después de la intervención para el desarrollo del contrato y de espacios informativos previo a la ejecución de las obras, particularmente cuando se requiere levantamiento de actas de vecindad.

Actividades ejecutadas

Durante este periodo no se relacionan actividades

4.3 PROGRAMA VINCULACION LABORAL

Dentro de la contratación de la mano de obra, se busca vincular la población local en las actividades de construcción como una manera de mitigar el impacto de la obra.

En el proceso de contratación de mano de obra se deberá dar cumplimiento al marco jurídico colombiano sobre la generación de empleo, particularmente la Ley 636 de 2013, el Decreto 1072 de 2015, compilatorio de las normas del sector trabajo, y las leyes 823 de 2003 y 1496 de 2011 y aquellas que las complementen, modifiquen o sustituyan. En particular es necesario tener en cuenta la implementación del sistema público de empleo en el área del proyecto.

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es necesario que se dé prioridad a la mano de obra, calificada y no calificada, del área de influencia del proyecto siempre y cuando cumpla con los perfiles y requisitos de la empresa.

Actividades ejecutadas

A continuación, se relacionan los integrantes o empleados de Monc del sector.

CONTRATACION MANO DE OBRA			
CARMEN DE BOLIVAR			
ITEM	NOMBRE	CEDULA	TELÉFONO
01	VIRILIO MARTINEZ CASTILLO	8.729.423	3229228041
02	DEINER BENITEZ LUNA	73.435.465	3106577368
03	EDWIN BENITEZ LUNA	73.552.402	3135407795

04	ANGEL GUTIERREZ MENDOZA	73.543.937	3216972344
05	EUGENIO OSPINA TERAN	73.543.031	3146257813
06	GILBERTO VEGA ANILLO	73.546.889	3126490947
07	ALVARO GUTIERREZ M	73.548.144	3107187130
08	JORGE VEGA BUELVAS	73.550.366	3006468649
09	JORGE LAGUNA ROBLES	9.114.457	3135385813
10	JOSE GARCIA PADILLA	1.047.423.782	3008179107
11	ALVARO DIAZ PEREZ	73.434.088	3004790752

5. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de actividades en este periodo se dio cumplimiento al proceso de atención ciudadana, se realizaron recorridos de obra para hacer reconocimiento de las necesidades, interrogantes y observaciones del área de influencia, de esta manera lograr fortalecer la relación, contratista-comunidad.

ANEXO No. 3

INFORME SST



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME No. 8

" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE".

PERIODO

24 de Octubre al 23 de Noviembre del 2022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
SEGUIMIENTO AL SISTEMA EN GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	5
1. PAGO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL A ARL, EPS. FONDO DE PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.....	5
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5
3. CHARLAS - CAPACITACIONES SST	6
4. ELEMENTOS DE EMERGENCIAS	6
5. INSPECCIONES DE EPP.....	7
6. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS.....	7
7. INDICADORES DE GESTIÓN.....	7
CONCLUSIÓN.....	8
ANEXOS	8

INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

El presente informe indica las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, del proyecto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE"**.

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo realizadas durante del periodo comprendido entre el 24 de Octubre al 23 de Noviembre del 2022.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal del proyecto AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION, REHABILITACION Y/O RECUPERACION DE LAS COBERTURAS FORESTALES NATIVAS – BOSQUE SECO TROPICAL – INCLUYENDO ESPECIES QUE PROPICIEN O FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE POLINIZACION ASI COMO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR APICOLA EN AREAS DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, JURISDICCION DE CARDIQUE", a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles; y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control de los factores de riesgo a los que se expone el personal que labora en el proyecto.
- Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el proyecto.
- Garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas de las máquinas, equipos y herramientas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados, con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento del espacio y una mayor seguridad en las tareas, logrando así un entorno de trabajo más cómodo y agradable para minimizar accidentes laborales.
- Priorizar y controlar los riesgos locativos así como los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.

SEGUIMIENTO AL SISTEMA EN GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

1. PAGO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL A ARL, EPS. FONDO DE PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.

Se evidencia que el contratista da cumplimiento a la Ley 100 de 1993 que estableció el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de proporcionar la cobertura al sistema de salud, pensiones, y riesgos profesionales todos los trabajadores son afiliados al sistema de seguridad social integral, independientemente de la forma de remuneración y se están efectuando los pagos correspondientes a ARL, EPS, PENSION Y CCF.

(Ver Anexo 1. Planilla Seguridad social)

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se evidencia que el contratista cumple con todos los elementos de protección personal y dotación.

Ver Registro fotográfico.



Imagen 1 y 2. Uso de EPP

3. CHARLAS - CAPACITACIONES SST

La finalidad de las charlas de seguridad dentro de las empresas es de gran importancia puesto que representan un compromiso con el bienestar integral de los trabajadores y a su vez es fundamental que la seguridad y el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, se garanticen en el ejercicio laboral.

Por lo anterior, el contratista continúa con la implementación de manera responsable con respecto a las charlas de seguridad y pausas activas, que son organizadas por el área seguridad y salud del trabajo con la finalidad de preservar la integridad de todos los colaboradores del proyecto y a su vez disminuir niveles de estrés propios de la labor. (**Ver Anexo 2.** Registro de asistencias a charlas SST).

4. ELEMENTOS DE EMERGENCIAS

Se evidencia que el contratista cuenta con los elementos de emergencia como botiquín y camilla de emergencia. (**Ver Anexo 3.** Inspección de botiquín y camilla).



5. INSPECCIONES DE EPP

Se evidencia que el contratista realizó inspecciones relacionados con los elementos de protección personal.

(Ver Anexo 4. Registro de inspecciones de epp)

6. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas

Se evidencia que contratista realizó durante este periodo registro de análisis de trabajo seguro. (Ver Anexo 5. Registro de ATS)

7. INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Número De Personas:

Personal Operativo: 7

3.2 Índices Estadísticos De Seguridad

3.2.1. Mes de Noviembre

Nº Trabajadores promedio mes Noviembre: 7

Nº de accidentes inhabilitadores y fatales: 0

Nº de accidentes menores no inhabilitadores: 0

Nº de horas trabajadas: 8 horas diarias lunes-viernes

5,5 horas sábados

Nº de días trabajados: 30

Nº de días perdidos: 0

NÚMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS

HHT= Nº trabajadores x Nº horas trabajadas x Nº días trabajados
 $HHT = (7 \times 8 \times 21) + (7 \times 5.5 \times 5) = 1368,5$ horas hombre trabajadas

INDICE DE FRECUENCIA

$IF = \text{N}^\circ \text{ de Accidente} \times 2000.0000 / \text{N}^\circ \text{ HHT}$ $IF = (0 \times 200.000 / 1368,5) = 0$

INDICE GRAVEDAD

$IG = (\text{N}^\circ \text{ Días perdidos} / \text{N}^\circ \text{ HHT}) \times 200.000$ $IG = (0 / 1368,5) \times 200.000 = 0$

INDICE ACCIDENTALIDAD

$IA = \text{N}^\circ \text{ AT} / \text{N}^\circ \text{ Prom. De trabajadores} \times 100$ $IA = (0 / 7) \times 100 = 0$

CONCLUSIÓN

Se evidencia que INGENIEROS AGROFORESTALES SAS, implementa medidas de seguridad, cumpliendo así lo establecido en GS-SST, resaltando su compromiso por el bienestar de cada uno de sus trabajadores, generando un mejor ambiente de trabajo y permitiendo el avance del proyecto. Se le recomienda hacer entrega de la planilla de seguridad social junto con el informe SST.

ANEXOS

- Anexo 1. Planillas de seguridad social
- Anexo 2. Registro de charlas SST
- Anexo 3. Inspección de botiquín y camilla
- Anexo 4. Registro de inspecciones de epp
- Anexo 5. Análisis de trabajo seguro

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72005323	0	HENRY ALBERTO SANTIAGO OYUELA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 77A 85 75 T13 AP 204		3008145829			HENRYALBER@YAHOO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24580438	I	2022-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	357.200	2.600	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24580438	2022-11-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.					Cot.	Cot.
1	CC 72005323	SANTIAGO OYUELA HENRY ALBERTO	1.000.000																	0			30	30	0	30	COLPENSI ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	EPS SURA- EPS010	1.000.000	125.000	SIN CCF- SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	354.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72005323	0	HENRY ALBERTO SANTIAGO OYUELA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 77A 85 75 T13 AP 204		3008145829			HENRYALBER@YAHOO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24580438	I	2022-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	357.200	2.600	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24580438		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
1.000.000		1.000.000		1.000.000
				0
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	1.200	0	161.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	1.200	0	161.200
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	900	0	125.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	125.000	0	900	0	125.900
ARP(Administradoras: 1)				1	69.600	0	500	0	70.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	69.600	0	500	0	70.100
Gran Total					354.600	0	2.600	0	357.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121042629	0	JEISON DAVID ALVAREZ BRITO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-279	CR 9A 18 05		3058743740			JEDALBRI@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24541253	I	2022-11-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	886.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24541253	2022-11-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	CF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.	
1	CC 1121042629	ALVAREZ BRITO JEISON DAVID	2.500.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	312.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	886.500	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121042629	0	JEISON DAVID ALVAREZ BRITO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-279	CR 9A 18 05		3058743740			JEDALBRI@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24541253	I	2022-11-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	886.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24541253		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
2.500.000		2.500.000		2.500.000
				0
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	400.000	0	0	0	400.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	400.000	0	0	0	400.000
EPS(Administradoras: 1)				1	312.500	0	0	0	312.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	312.500	0	0	0	312.500
ARP(Administradoras: 1)				1	174.000	0	0	0	174.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	174.000	0	0	0	174.000
Gran Total					886.500	0	0	0	886.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029			T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24804183	E	2022-11-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.434.900	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24804183	2022-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS		PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.					ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 9770361	PINZON GIRALDO ROY ANDERSSON	3.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.600.000	576.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.600.000	144.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.600.000	144.000	3.600.000	250.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.114.600	S
2	CC 17144564	PIÑA RIOS DAVID HERNANDO	4.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	4.300.000	172.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.300.000	172.000	4.300.000	22.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	366.500	S
3	CC 22493027	PIÑA ACEVEDO YENIS ZIORELLA	7.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	7.000.000	1.120.000	35.000	35.000	EPS SURA-EPS010	7.000.000	280.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	1.786.600	S
4	CC 42031233	TRUJILLO REYES ZANDRA MILENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
5	CC 72214607	TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
6	CC 72279117	OROZCO MONTERO YULHANER ENRIQUE	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S
7	CC 78744522	LOPEZ MANJARREZ TANDRIL SANDER	2.650.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.650.000	424.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.650.000	106.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.650.000	106.000	2.650.000	184.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	820.500	S
8	CC 86012702	GUZMAN CARDENAS ROBINSON MANUEL	1.700.000	F X																0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	736.667	117.900	0	0	SANITAS-EPS005	736.667	29.500	COMFENALCO VALLE-CCF56	736.667	29.500	736.667	51.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	228.200	S
9	CC 94252572	RICO RODRIGUEZ JAIME	1.700.000	F X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.700.000	68.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S
10	CC 1045742777	ARRIETA ORTEGA CAROLAINA MARIA	1.000.000																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	12	0	125.000	N
11	CC 1143372563	SUAREZ TORRES OSCAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
12	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24804183	E	2022-11-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.434.900	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24804183		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.486.667	29.786.667	28.786.667	28.786.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.987.900	0	0	0	3.987.900
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.475.900	0	0	0	2.475.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	400.000	0	0	0	400.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	904.000	0	0	0	904.000
EPS(Administradoras: 4)				12	1.276.500	0	0	0	1.276.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	924.000	0	0	0	924.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	121.500	0	0	0	121.500
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	125.000	0	0	0	125.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				11	1.019.000	0	0	0	1.019.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	1.019.000	0	0	0	1.019.000
CCF(Administradoras: 2)				11	1.151.500	0	0	0	1.151.500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	97.500	0	0	0	97.500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	9	1.054.000	0	0	0	1.054.000
Gran Total					7.434.900	0	0	0	7.434.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 22521596	0	BRENDA SAVINA PIÑA ACEVEDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CALLE 31 N 24-68		3153139296			JHORYELLARENALESLOBO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24542202	I	2022-11-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.400	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24542202	2022-11-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.			
1	CC 22521596	PIÑA ACEVEDO BRENDA SAVINA	1.500.000																	0				30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0		SALUD 0TOTAL-EPS002	1.500.000	187.500	SIN CCF-SINCCF		0	0	1.500.000		7.900	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	435.400	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 22521596	0	BRENDA SAVINA PIÑA ACEVEDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CALLE 31 N 24-68		3153139296			JHORYELLARENALESLOBO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24542202	I	2022-11-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.400	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24542202		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	240.000	0	0	0	240.000
PORVENIR				1	240.000	0	0	0	240.000
EPS(Administradoras: 1)				1	187.500	0	0	0	187.500
SALUD TOTAL				1	187.500	0	0	0	187.500
ARP(Administradoras: 1)				1	7.900	0	0	0	7.900
ARL SURA				1	7.900	0	0	0	7.900
Gran Total					435.400	0	0	0	435.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 22521596	0	BRENDA SAVINA PIÑA ACEVEDO		I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CALLE 31 N 24-68			3153139296			JHORYELLARENALESLOBO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24695665	I	2022-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24695665	2022-12-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 22521596	PIÑA ACEVEDO BRENDA SAVINA	1.500.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	187.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	57	0	435.400	N	0	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 22521596	0	BRENDA SAVINA PIÑA ACEVEDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CALLE 31 N 24-68		3153139296			JHORYELLARENALESLOBO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24695665	I	2022-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	435.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24695665		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	240.000	0	0	0	240.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	240.000	0	0	0	240.000
EPS(Administradoras: 1)				1	187.500	0	0	0	187.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	187.500	0	0	0	187.500
ARP(Administradoras: 1)				1	7.900	0	0	0	7.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.900	0	0	0	7.900
Gran Total					435.400	0	0	0	435.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121042629	0	JEISON DAVID ALVAREZ BRITO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-279	CR 9A 18 05		3058743740			JEDALBRI@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24717414	I	2022-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	890.500	4.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24717414	2022-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.	
1	CC 1121042629	ALVAREZ BRITO JEISON DAVID	2.500.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	312.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	57	0	886.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121042629	0	JEISON DAVID ALVAREZ BRITO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-279	CR 9A 18 05		3058743740			JEDALBRI@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24717414	I	2022-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	890.500	4.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24717414		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	400.000	0	1.800	0	401.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	400.000	0	1.800	0	401.800
EPS(Administradoras: 1)				1	312.500	0	1.400	0	313.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	312.500	0	1.400	0	313.900
ARP(Administradoras: 1)				1	174.000	0	800	0	174.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	174.000	0	800	0	174.800
Gran Total					886.500	0	4.000	0	890.500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	24933662	E	2022-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.821.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	24933662	2022-12-20	Pagada							

Página 1 2022-12-05

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 802024876	8	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 35 71 138		3117029		T.HUMANO@JETINGENIERIA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	24933662	E	2022-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.821.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	24933662		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
35.830.000	40.130.000	40.130.000	40.130.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	5.802.800	0	0	0	5.802.800
PROTECCION	230201	800229739	0	3	851.200	0	0	0	851.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.007.600	0	0	0	3.007.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.176.000	0	0	0	1.176.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	768.000	0	0	0	768.000
EPS(Administradoras: 5)				16	1.605.200	0	0	0	1.605.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	394.400	0	0	0	394.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	106.000	0	0	0	106.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	68.000	0	0	0	68.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	40.000	0	0	0	40.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	8	996.800	0	0	0	996.800
ARP(Administradoras: 1)				16	1.808.700	0	0	0	1.808.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	1.808.700	0	0	0	1.808.700
CCF(Administradoras: 2)				16	1.605.200	0	0	0	1.605.200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	14	1.469.200	0	0	0	1.469.200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	136.000	0	0	0	136.000
Gran Total					10.821.900	0	0	0	10.821.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63548880	0	ERIKA PATRICIA MONTAÑO JACOME	I	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	DIAGONAL 41 23 - 17 CASA 64		3152305838		INGERIKAMONTANO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24771175	I	2022-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	851.100	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	24771175	2022-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																												DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	FECHA VSP	VTE	VST	SLN	FECHA INICIO SLN	FECHA FIN SLN	IGE	FECHA INICIO IGE	FECHA FIN IGE	LMA	FECHA INICIO LMA	FECHA FIN LMA	VAC	FECHA INICIO VAC	FECHA FIN VAC	AVP	VCT	FECHA INICIO VCT	FECHA FIN VCT	IRL	FECHA INICIO IRL	FECHA FIN IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 63548880	MONTAÑO JACOME ERIKA PATRICIA	2.400.000																															0				30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	2.400.000	384.000	0		SALUD 0 TOTAL-EPS002	2.400.000	300.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	851.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63548880	0	ERIKA PATRICIA MONTAÑO JACOME	I	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	DIAGONAL 41 23 - 17 CASA 64		3152305838		INGERIKAMONTANO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-11	24771175	I	2022-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	851.100	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	24771175		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	384.000	0	0	0	384.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	384.000	0	0	0	384.000
EPS(Administradoras: 1)				1	300.000	0	0	0	300.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	300.000	0	0	0	300.000
ARP(Administradoras: 1)				1	167.100	0	0	0	167.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	167.100	0	0	0	167.100
Gran Total					851.100	0	0	0	851.100



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63548880	0	ERIKA PATRICIA MONTAÑO JACOME	I	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	DIAGONAL 41 23 - 17 CASA 64		3152305838		INGERIKAMONTANO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24540582	I	2022-11-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	851.100	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	24540582	2022-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																							DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales										
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	FECHA VSP	VTE	VST	SLN	FECHA INICIO SLN	FECHA FIN SLN	IGE	FECHA INICIO IGE	FECHA FIN IGE	LMA	FECHA INICIO LMA	FECHA FIN LMA	VAC	FECHA INICIO VAC	FECHA FIN VAC	AVP	VCT	FECHA INICIO VCT	FECHA FIN VCT	IRL	FECHA INICIO IRL	FECHA FIN IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE					IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 63548880	MONTAÑO JACOME ERIKA PATRICIA	2.400.000																																			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	2.400.000	384.000	0	0	SALUD 0 TOTAL-EPS002	2.400.000	300.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	851.100	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63548880	0	ERIKA PATRICIA MONTAÑO JACOME	I	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	DIAGONAL 41 23 - 17 CASA 64		3152305838		INGERIKAMONTANO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24540582	I	2022-11-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	851.100	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	24540582		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	384.000	0	0	0	384.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	384.000	0	0	0	384.000
EPS(Administradoras: 1)				1	300.000	0	0	0	300.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	300.000	0	0	0	300.000
ARP(Administradoras: 1)				1	167.100	0	0	0	167.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	167.100	0	0	0	167.100
Gran Total					851.100	0	0	0	851.100



	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	V. El Hoyo, El Guapo
FECHA:	08 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Revisión.
TEMA:	

Prevención del Riesgo Químico.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nauel Lambrano	1052072287	Aux-campo	Nauel Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Flores	73429847	Tecnico	Jader
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez			
19	Auxiliar SST			
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	V. Caracoli
FECHA:	09 de Noviembre, - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Revisión.
TEMA:	Factores de Riesgo en el area de trabajo.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawer Lambrano	1052072287	Aux-campo	Nawer Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	[Signature]
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	[Signature]
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	J. Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Melissa Alvarez.			
19	Aux. SST.			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Villa Amalia
FECHA: 10 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Revisión.
TEMA: Prevención Riesgo Ergonómico.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawer Lambrano	1052072287	Aux-campo	Nawer Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felisa Alvarez.			
19	Auxiliar SST			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Rancho Azul, Santa Rita
FECHA: 11 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Revisión.
TEMA: Prevención del Consumo del Tabaco y Cigarillo

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawes Lambrano	1052072287	Aux. campo	Nawes Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rg
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissa Alvarez.			
19	Aux. SST.			
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	V. Rancho Azul
FECHA:	01 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de seguimiento.
TEMA:	Riesgos Psicosociales.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052072287	Aux. campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rg
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Feassa Suarez			
18	Aux SST.			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR:

V. Olata Noche

FECHA:

03 de Noviembre - 2022

ACTIVIDAD:

Visita de Seguimiento

TEMA:

Riesgos Locativos

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naver Lambrano	1052072287	Aux. campo	Naver lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Feassa Alvarez			
19	Aux 887			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. San Rafael
FECHA: 02 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA:

Riesgos en trabajos en alturas.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052072287	Aux-campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felisa Alvarez			
18	Aux 881			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. piedra azul
FECHA: 01 de Noviembre 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal
TEMA: Pausas Activas

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nawer Lambrano	1052072287	Aux. campo	Nawer Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rodriguez
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Flores	73429847	Tecnico	Jader Flores
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Melissa Alvarez			
19	Aux. SST.			
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: V. Colonceto, Villa Andina
FECHA: 31 de Octubre - 2022
ACTIVIDAD: Entrega de material vegetal
TEMA: Posturas prolongadas mantenidas.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naiver Lambraño	1052072287	Aux-Campo	Naiver Lambraño
2	Odimar Rodriguez	9267391	Tecnico	Odimar Rg
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-Campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. Campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	93429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Melissa Suarez			
18	Aux- SST			
19				
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	Zona de influencia del Proyecto.
FECHA:	15 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Seguimiento.
TEMA:	Seguridad en Casa.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052092257	Aux. campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9269371	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felissa Alvarez			
18	Aux. SST			
19				
20				

	<p align="center">FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD</p>	CÓDIGO: SG-SST-CS-03
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

LUGAR:	Zona de Influencia del Proyecto
FECHA:	16 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD:	Visita de Seguimiento.
TEMA:	Importancia del reciclaje.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1052072289	Aux. campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar Rf
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Melissa Alvarez			
18	Aux. SST			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-CS-03

FECHA: 01/06/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Zona de influencia del proyecto.
FECHA: 17 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento.
TEMA:

Código de Colores para la Clasificación de Residuos.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral; y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Lambrano	1051092289	Aux-campo	Naves Lambrano
2	Odimar Rodriguez	9267371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux-campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002441583	Aux-campo	Jaime Rico
5	Jader Montes	73429847	Tecnico	Jader Montes
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Responsable: Felissa Suarez.			
18	Aux. SST			
19				
20				



FORMATO
CHARLAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-SST-08-03

FECHA: 01/09/2022

VERSIÓN: 01

Página 1 de 1

LUGAR: Zona de influencia del Proyecto
FECHA: 18 de Noviembre - 2022
ACTIVIDAD: Visita de Seguimiento
TEMA: Importancia del trabajo en equipo.

Firmo en constancia de que he recibido instrucciones sobre los requisitos establecidos en el programa de seguridad y salud laboral, y por lo tanto me responsabilizo de aplicar diariamente durante el desarrollo de las actividades asignadas.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Naves Sambrano	1052092283	Aux. campo	Naves Sambrano
2	Odimar Rodriguez	9269371	Tecnico	Odimar R
3	Carlos Escobar	1041610902	Aux. campo	Carlos Escobar
4	Jaime Rico	1002141583	Aux. campo	Jaime Rico
5	Jader Flores	73429817	Tecnico	Jader Flores
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	Responsable: Felissio Suarez			
19	Aux. SST.			
20				



FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMELLAS

Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2019
Código: GTH-F-78

Nombre del responsable de la inspección:

Felissa Alvarez Sandoval.

Año:

Cargos: Auxiliar SST
Fecha de inspección: 10-11-2022

CAMELLAS

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

CONDICIÓN DE CAMELLA

No.	N. DE CAMELLA	USUCACIÓN PISO	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	ESTADO DEL SOPORTE	INSTALACIÓN A PARED	CORREAS DE SEGURIDAD	LIMPIEZA	INMOVILIZADOR	OBSERVACIONES
1	4	Vivero	B	B	B	B	B	B	B	
2										
3										
4										
5										

BOTIQUIN

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

CONDICIONES DEL BOTIQUIN

No.	N. DE BOTIQUIN	USUCACIÓN PISO	MORRAL - ESTADO GENERAL (Limpio, señalado, etc.)	GASAS LIMPIAS PAQUETE (20 Unidades)	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" (1 Unidad)	BAJALENGUAS (Paq. X 20)	QUANTES DE LATEX (Caja x 100 unidades)	VENDA ELASTICA 2 x 5 YARDAS (1 Unidad)	VENDA ELASTICA 3 x 5 YARDAS (1 Unidad)	VENDA ELASTICA 5 x 5 YARDAS (1 Unidad)	SOLUCIÓN SALINA 250 o 500 c.c (2 Unidades)	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO (1 Unidad)	ALCOHOL ANTISEPTICO (Frasco 275 ml)	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	MICROPOR (1 Unidad)	CURAS	APLICADORES (1 Paquete)	LINTERNA	PARCHE OCULAR	PITO	TAPABOCAS	TIJERAS DE TRAUMA	BOLSA ROJAS	BOLSAS TRANSPARENTES	OBSERVACIONES
1	01	Vivero	B	B	B	B	B	NC	B	B	B	B	NC	B	NA	B	B	B	NA	B	B	B	NA	NA	01 par de guantes de latex
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									



FORMATO DE INSPECCION PARA EPF


Codigo: SG-SST-IEPP-02

Version: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP28 de Octubre 2022
Helissa Huarez S.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPAJIDOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Carlos Escobar	Aux. Campo	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

x 
NOMBRE Carlos Escobar
CEDULA 1041610902



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: SG-SST-IEPP-02

Versión: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP

28 de Octubre / 22
Héctor Hualte

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPAJODOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jader Fontes	Teenew	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

50201
Firma
Jader Fontes
NOMBRE
CEDULA 78429847



FORMATO DE INSPECCION PARA EPF


Codigo: SG-SST-IEPP-02

Version: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP28 de Octubre 2022
Helissa Huarez S.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPADIDOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Carlos Escobar	Aux. Campo	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

x 

NOMBRE Carlos Escobar
CEDULA 1041610902



FORMATO DE INSPECCION PARA EPP

Código: SG-SST-IEPP-02

Versión: 1

Vigente desde: 01/06/2022

Fecha
Realizado por
Dependencia/DIAP

28 de Octubre / 22
Héctor Hualte

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		MASCARILLA		TAPAJODOS		BOTAS SEG		CASCO		TRAJE PARA AMBIENTES		OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jader Fontes	Teenier	✓		✓		-		-		✓		✓		✓		Las actividades a realizar no exponen al trabajador a altos niveles de ruido o a productos químicos, por ende, no requieren protección auditiva ni respiratoria.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

50201
Firma
Jader Fontes
NOMBRE
CEDULA 78429847



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Naiver Jambrano
Jaime Rico.**

**Naiver Jambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas


Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

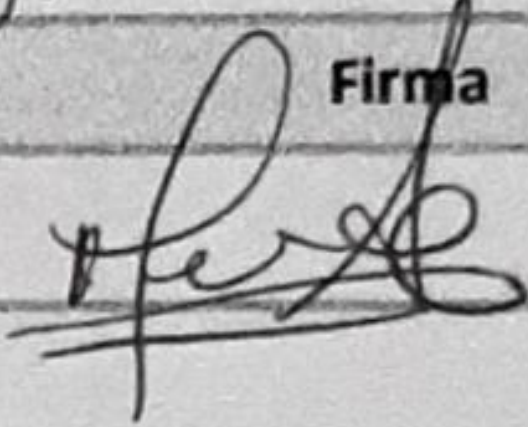EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res:	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☒ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño cc 1062072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez cc 9269371	Odimar R8
Carlos Escobar cc 1041610902	WW
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felissa Alvarez cc 10493218609	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP Inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	Mordeduras de serpientes Picaduras de insectos Caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de EPP
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de Elementos de protección personal

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Plataformas.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 Personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RR HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Área/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El balneario**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

No requiere Permiso.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Nável Lambrano cc 1052092287
Odimar Rodriguez cc 9267871
Carlos Escobar cc 1041610902

Nável Lambrano
Odimar Rf
Carlos Escobar

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Moto cicletas para el traslado a las Veredas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicletas hacia las Veredas previamente programadas	Accidente de tránsito	choques golpes caídas	Uso de EPP (casco) inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes picaduras de insectos caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de elementos de protección personal.
Finalizadas las visitas en las demás Veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Lambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez ce 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGABROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **V. el Hobo, Caracoli**

Lugar de Trabajo: **Bajo Grande, mala noche**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento
Revisión de Siembra.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Naliver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar**

**Naliver Lambrano
Jaime Rico**
[Signature]

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x motos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Sambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Sambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez cc 1049348699

Firma





ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Área/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El Bolson**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGÍA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	No requiere Permiso.

Cédula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Náyer Lombardo c.c. 1052092287	Náyer Lombardo
Edimar Rodríguez c.c. 9267371	Edimar Rf
Carlos Escobar c.c. 1041610902	u

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	x Motocicletas para el traslado a las Veredas.
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	10 escaleras.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, botas de seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RR HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP inspecciones preoperacionales
Llegada a los Piesgos lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Peligros biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes Picaduras de insectos caídas al mismo nivel golpes.	Uso de EPP.
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de Elementos de protección personal

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño ce 1052072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez ce 9269371	Odimar RS
Carlos Escobar ce 1041610902	UW
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felissa Alvarez ce 10493418607	Felissa



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Área/Proceso: **Operativo**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rrol**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Nauver Jambrano
Jaime Rico.**

**Nauver Jambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motociclos, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, bafas, botas de seguridad.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Recurso humano.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
*Traslado en motocicletas hacia las veredas previamente programadas	• Accidente de tránsito.	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP (casco) Inspecciones preoperatorias.
* Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias.	• Riesgos Biológicos. (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de Serpientes Picaduras de insectos. caídas al mismo nivel. Golpes	Uso de Elementos de protección personal
Finalizadas las visitas en las demás veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re:
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Sí, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar

Firma

Naiver Lambrano
Jaime Rico
Carlos Escobar

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez Sanabria

Firma

Felissa Alvarez Sanabria



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**

Lugar de Trabajo: **Paral, piedra azul**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Revisión de siembra, visita de seguimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

**Carlos Escobar
Naiver Jambrano
Jaime Rico.**

**Naiver Jambrano
Jaime Rico**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas


Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x fotos para el transporte a las Veredas.

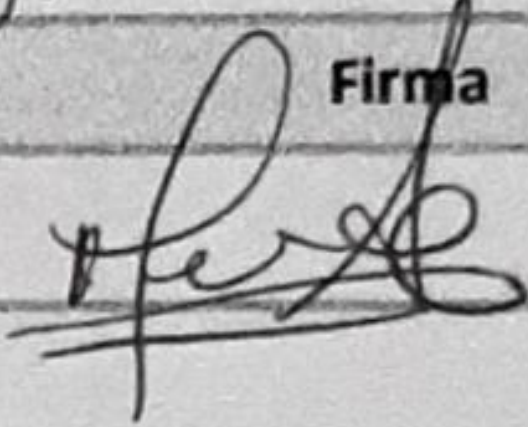EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res:	
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	
☒ Si, proceda con la tarea.	
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	
Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Naiver Lambraño cc 1052072287	Naiver Lambraño
Odimar Rodriguez cc 9269371	Odimar R8
Carlos Escobar cc 1041610902	WW
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Felissa Alvarez cc 10493213609	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicleta hacia las Veredas previamente programadas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de EPP Inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	Mordeduras de serpientes Picaduras de insectos Caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de EPP
Finalizadas las actividades en las demás Veredas retornan en las motocicletas.	Accidente de tránsito	Choques Golpes Caídas	Uso de Elementos de protección personal

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Plataformas.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Bafas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 Personas
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RR HH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie Resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF** Ciudad: **El Carmen de Bolívar**
Área/Proceso: **Operativo** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Z. Rural**
Lugar de Trabajo: **V. Sta Rita, El balneario**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am** Hora de Finalización (a.m./p.m.): **04:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

**Visita de seguimiento:
Revisión de Siembra**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

No requiere Permiso.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Nável Lambraño cc 1052092287
Odmar Rodríguez cc 9267871
Carlos Escobar cc 1041610902

Nável Lambraño
Odmar Rf
Carlos Escobar

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Moto cicletas para el traslado a las Veredas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en motocicletas hacia las Veredas previamente programadas	Accidente de tránsito	choques golpes caídas	Uso de EPP (casco) inspecciones preoperacionales
Llegada a los lotes en compañía del Beneficiario para realizar las recomendaciones necesarias	Riesgos Biológicos (presencia de animales) Superficies resbaladizas	mordeduras de serpientes picaduras de insectos caídas al mismo nivel Golpes.	Uso de elementos de protección personal.
Finalizadas las visitas en las demás Veredas, retornan en las motocicletas	Accidente de tránsito	Choques Golpes caídas	Uso de EPP.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	motocicletas, Vehículo
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Inspecciones de Seguridad
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Botas, Botas de Seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	05 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RRHH
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Superficie resbaladiza, terreno inestable, la actividad está sujeta a cambios climáticos.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.


¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar
Naiver Lambrano
Jaime Rico


Firma


Naiver Lambrano
Jaime Rico

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez ce 1049348699

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **INGAGROF**

Área/Proceso: **Operativo**

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. El Hobo, B. grande, Caracoli**

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00 pm**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y Descargue de material Vegetal.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores

(Ejecutor)

Firma

**Odimar Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes**

**Odimar R.G.
JADER MONTES**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para el transporte de material Vegetal

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)

La actividad se realiza a nivel.
vehículo, motos

N/A

N/A

inspecciones de Seguridad.

Botas de Seguridad, casco, gafas
guantes.

Recurso humano.

No

Si

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picaduras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
-llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual)	Presencia de animales (insectos, reptiles)	Picaduras mordeduras.	Uso de elementos de protección personal.
-Cargue de canastillas al carro	Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas.	lesiones musculo-esqueleticos	Charlas sobre higiene postural (ayudas mecánicas, si es posible)
-Descargue de canastillas en el carro.			pausas activas
-Traslado a los lotes en el carro.	Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.	lesiones musculo esquelético traumas Golpes.	Revisiones Preventivas y periódicas (inspección preoperacional)
-Descargue del carro en el lote	Movimientos repetitivos sobre-esfuerzo posturas prolongadas mantenidas. exposición a altas Temperaturas.	lesiones musculo esquelético lumbalgias Golpe de calor insolación Quemaduras.	Charlas sobre higiene postural y ergonomía. pausas activas uso de vestimenta adecuada para la actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y ren.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.


Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Odimar Rodriguez
Carlos Escobar
Jader Montes.


Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Helissa Alvarez S.

Firma


Luis
SANCHEZ MONTES L

Firma





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Empresa: **IngagroF**

Área/Proceso:

Operativa.

Hora de Inicio (a.m./p.m.): **07:00 am.**

Descripción de la tarea a realizar:

Carga y des carga de material vegetal.

Ciudad: **El Carmen de Bolívar**

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Lugar de Trabajo: **V. Carabaja.**

Hora de Finalización (a.m./p.m.): **05:00pm.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

No requiere permisos.

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

**Carlos
Nancy
Jaime**

Firma

**Nancy Latorre
Jaime**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

x Vehículo para transporte de material vegetal.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

la actividad se realiza a nivel
velocidad, motos.

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

N/A.

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

N/A.

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección
requeridos?

inspecciones de seguridad.

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

Botas de seguridad, casco, gafas
guantes. 07 personas.

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

Recurso humano.

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?

NO

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área
de trabajo?

SI

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?

(chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza,
superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas,
etc.)

Superficies resbaladizas, cargas
pesadas, picaduras de insectos
mordeduras de animales, exposición
a altas temperaturas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
<p>llenar las canastillas con el material vegetal. (la actividad se realiza de forma manual).</p> <p>Cargue de canastillas al carro.</p> <p>Descargue de las canastillas en el carro</p>	<p>Presencia de animales (insectos, reptiles)</p> <p>Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p>	<p>• mordeduras • picaduras</p> <p>lesiones musculoesquelético</p>	<p>uso de elementos de protección personal.</p> <p>Charlas sobre higiene postural - Ayudas mecánicas (si es posible) pausas Activas</p>
<p>Traslado a los lotes en el carro</p> <p>Descargue del carro en el lote.</p>	<p>Accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.</p> <p>movimientos repetitivos Sobre esfuerzo posturas prolongadas mantenidas</p> <p>Exposición a altas temperaturas</p>	<p>lesiones musculoesquelético Traumas, golpes.</p> <p>lesiones musculoesquelético - lumbalgias.</p> <p>golpe de calor insolación quemaduras.</p>	<p>Revisiones preventivas (inspecciones pre-operacionales de Vehículo)</p> <p>- Charlas higiene postural + Ergonomía - pausas Activas.</p> <p>- Uso de Vestimenta adecuada para la actividad - protectores solares.</p>

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y re-
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Carlos Escobar 10111610902
Nover Lambraño 1052092287
Jaime Pico 10024411583

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Felissa Alvarez S. 1019348699

Firma

Nover Lambraño
Jaime Pico

Firma

Felissa Alvarez

ANEXO No. 4

CORRESPONDENCIA

Barranquilla, 22 de noviembre de 2022

JET.BS - 028.11.22

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

Atn.: Ing. Hernán Alberto Peláez Ríos

Supervisor del Contrato

Cartagena


REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Estado del contrato No LP-CARDIQUE-003-2021

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada a esta interventoría el día 21 de noviembre de 2022 y en cumplimiento de nuestras obligaciones, se envía el presente comunicado, en donde se evidencia el estado actual del proyecto a través del porcentaje de ejecución de la obra con respecto a la programación y el porcentaje de ejecución presupuestal.

A fecha del presente comunicado el contrato de obra presenta un avance en su ejecución del 92.58% con respecto a una programación del 83.71%, evidenciando un avance del 8.87%. A continuación se presenta la curva seguimiento en donde se ilustra la ejecución del contrato.

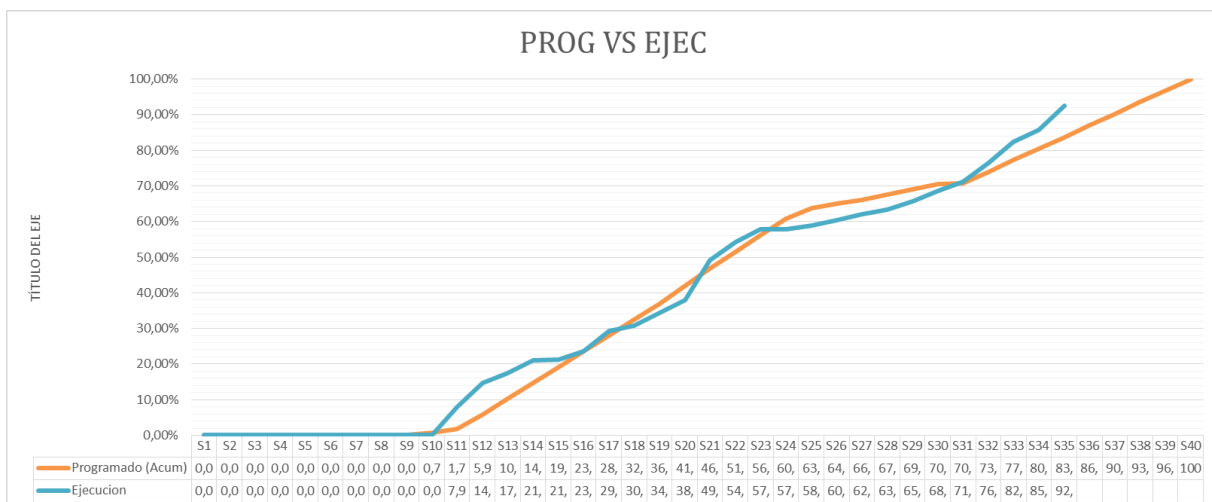

Condiciones actualizadas.

RESTAURACION	ESTABLECIMIENTO Y PRIMER MANTENIMIENTO				
RESTAURACION ACTIVA	Und	Inicial	Adición	Costo Unitario	Costo Total
AISLAMIENTO	Km	17,86	7,5	10.816.000,00	274.293.760,00
REFORESTACION PROTECTORA	Ha	119	50	7.085.000,00	1.197.365.000,00
MANTENIMIENTO REFORESTACION PROTECTORA	Ha	119	50	1.974.834,47	333.747.025,42
CAPACITACIONES	Gbl	1	0	15.938.000,00	15.938.000,00
COSTO TOTAL					1.821.343.785,42

Ejecución del contrato.

RESTAURACION	ESTABLECIMIENTO Y PRIMER MANTENIMIENTO			
RESTAURACION ACTIVA	Und	Ejecutado	Costo Unitario	Costo Total
AISLAMIENTO	Km	22	10.816.000,00	237.952.000,00
REFORESTACION PROTECTORA	Ha	169	7.085.000,00	1.197.365.000,00
MANTENIMIENTO REFORESTACION PROTECTORA	Ha	119	1.974.834,47	235.005.301,92
CAPACITACIONES	Gbl	1	15.938.000,00	15.938.000,00
COSTO TOTAL				1.686.260.301,92


Con respecto al porcentaje de ejecución presupuestal, se ha avalado el pago en un 60% del valor inicial del contrato equivalente a 772.339.236,94 pesos MTE de acuerdo a la forma de pago establecida en él.

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA LP-003-2021						
Valor inicial del contrato		\$ 1.287.232.061,92		70.67%		
Valor Adición 1		\$ 534.111.723,08		29.33%		
Valor total contrato de obra		\$1.821.343.785,00		100%		
Concepto	Valor facturado	%	Amortización y descuentos	%	Valor neto recibido	Fecha de pago
Acta Parcial No. 1	\$386.169.618,47	30%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
Acta Parcial No. 2	\$386.169.618,47	30%	N/A	N/A	\$386.169.618,47	Pagada
TOTAL	\$772.339.236,94	60%	N/A	N/A	\$772.339.236,94	-

Se anexan a este oficio copia el informe mensual No 7 presentado por el contratista de obra y el informe mensual No 7 de la interventoría, en donde queda plasmada la información de las áreas intervenidas con su respectiva georreferenciación, adicionalmente las actas de recibo a satisfacción por la comunidad e interventoría con los registros fotográficos de las diferentes capacitaciones y actividades realizadas.

Agradecemos de antemano por la atención.

Atentamente,



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S



JET INGENIERÍA S.A.S. - NIT: 802.024.876-8

El Carmen de Bolívar, 29 de noviembre de 2022

JET.BS - 029.11.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Apremio por incumplimiento en entrega de información

Cordial saludo,

Conforme con nuestras obligaciones como garantes del cumplimiento del contrato de licitación pública No LP-CARDIQUE-003-2021, se reitera la solicitud presentada por esta interventoría a través del comunicado JET.BS – 026.10.2022, en donde se solicitaron los siguientes documentos que se enlistan, de acuerdo a la modificativa No 3 con la finalidad de ampliar el alcance del contrato.

- Diagnóstico e identificación de las zonas a intervenir.
- Plan de establecimiento forestal y manejo forestal.
- Programación de actividades en Project.
- Visita previa de los sitios a intervenir con el fin de registrar datos de campo.
- Listado de los nuevos beneficiarios del proyecto donde se relacione nombres completos, numero de documento de identidad, nombre de vereda, nombre del predio, numero celular.
- Acta de concertación que incluya la georreferenciación de las áreas a intervenir.
- Realizar y presentar registros fotográficos.

Esta solicitud deberá presentarse a la interventoría en las próximas 24 horas o se dará inicio a un presunto incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que no se cumple a satisfacción las obligaciones del contratista contempladas en los estudios previos documento integral del contrato de obra inciso 10.

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: hpelaez@cardique.gov.co – Ing. Hernán Peláez Ríos – Supervisor entidad contratante



El Carmen de Bolívar, 13 de diciembre de 2022

JET.BS - 030.12.22

Señores,
Ingenieros Agroforestales S.A.S
Atn.: Carlos Alberto Rendón Polo
Representante Legal
El Carmen de Bolívar

REF.: Objeto – Contrato de obra pública No. LP-CARDIQUE-003-2021 “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE BOSQUE SECOS Y BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS QUE FAVOREZCAN LA POLINIZACION EN ÁREAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE”.

ASUNTO: Solicitudes varias

Cordial saludo,

En concordancia con la ejecución del contrato de la referencia y teniendo en cuenta que las actividades en obra entran en la etapa de culminación y entrega del proyecto, se solicita que se realicen las actividades y entrega de documentación PENDIENTES.

- Realizar las actividades de mantenimiento de reforestación protectora para evitar la invasión de arvenses, la aparición de plagas y enfermedades, mejorar el estado general de las plantaciones utilizando las practicas silviculturales necesarias para mantener el buen desarrollo de los arboles establecidos.
- Entregar el informe final de la obra en donde se indique datos completos del contratista, relación de las garantías del contrato con sus modificaciones y la aseguradora respectiva, debe incluir número de las pólizas, vigencias y valores respectivos asegurados.
- Entregar planos record (corresponde a un anexo del informe final de obra que incluye las actas de concertación y georreferenciación de las áreas intervenidas)
- Entregar memoria descriptiva de la ejecución/desarrollo del contrato con registro fotográfico que evidencie el antes y después de las zonas intervenidas.
- Entregar copia de liquidación, paz y salvos de todos los trabajadores del contratista teniendo en cuenta los profesionales y tecnólogos.
- Entregar certificación del Revisor Fiscal del contratista en el que conste que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con seguridad social (EPS, AFP y ARL, parafiscales, pago de impuestos, liquidaciones económicas por prestación de servicios entre otros). Esta certificación se debe hacer por todo el plazo del contrato.
- Entregar manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones, en donde especifique los tiempos de mantenimiento, control de plagas, control de maleza, entre otras.

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
C.C. 72.214.607
REPRESENTANTE LEGAL JET INGENIERIA S.A.S

Copia: Supervisor del contrato - hpelaez@cardique.gov.co – Ing. Hernán Peláez Ríos.
