

insergroup.

engineering

INFORME

DE

INTERVENTORIA

02

CONTRATO 1342 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICION DE
MOBILIARIO ESCOLAR
PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
MUNICIPIOS NO
CERTIFICADO EN
EDUCACION EN EL
DEPARTAMENTO DEL
HUILA."

**GOBERNACION DEL HUILA- SECRETARIA DE EDUCACION
HUILA CRECE**

INSERGROUP ISG SAS - FIRMA INTERVENTORA

**MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
REPRESENTANTE LEGAL**

**MICHAEL STEVEEN BOLAÑOS TORRES
DIRECTOR DPTO DE INTERVENTORIAS**

**EDWIN VEGA MONTENEGRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATO 1342 DE 2022**

**NEIVA - HUILA
2022**



2022/11/10 10:39

Contenido

Introducción.....	6
Información Contractual.....	7
Información de Avance.....	10
Informe Jurídico.....	12
Documentación:.....	13
Conceptos Técnicos, aprobaciones y modificaciones:.....	13
Multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.....	13
Informe Administrativo.....	14
Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:.....	15
Actas de inicio:.....	15
Registro presupuestal:.....	15
Pago de Impuestos de legalización:.....	15
Control de garantías:.....	15
Reuniones y comités técnicos:.....	16
Comunicaciones oficiales:.....	16
Control de plazo de ejecución:.....	19
Informe Financiero.....	20
Presupuesto oficial:.....	21
Ejecución presupuestal:.....	21
Ejecución presupuestal por municipio:.....	22
Informe Técnico.....	28
Mobiliario y segmentación:.....	30
REVISIÓN, APROBACIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS DE LOTES:.....	31
Información técnica de distribución:.....	36
Verificación de entrega e instalación del mobiliario:.....	39
Conclusiones y anexos.....	44

Introducción

La firma de consultoría profesional INSERGROUP ISG SAS presenta el siguiente INFORME DE INTERVENTORIA PARCIAL 02 en cumplimiento de sus obligaciones en la ejecución del contrato de Interventoría No. 1342 de 2022.

Se describen las actividades desarrolladas para el primer corte de avance, una vez culminado en su totalidad el proceso de entrega de mobiliario de la ORDEN DE COMPRA No. 93232.

El informe presenta las obligaciones jurídicas, administrativas, técnicas y financieras desarrolladas durante el periodo evaluado.

Se tomó como base lo establecido en el MANUAL DE DOTACIONES del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL para realizar el proceso de verificación de las diferentes etapas en la fabricación, distribución, entrega e instalación del mobiliario escolar.

De igual forma se utilizaron las guías para la ejecución de los acuerdos marco de precios específicamente las de entrega de dotación escolar.

El equipo de interventoría registro mediante software propio, la evidencia de las entregas evaluadas en sitio las cuales son anexadas al presente informe de interventoría.

Información Contractual

ORDEN DE COMPRA 93232

CONTRATO No.	: ORDEN DE COMPRA 93232
FECHA DE LA ORDEN:	: 12/07/2022
OBJETO	: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE	: DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT No.	: 800103913
CONTRATISTA	: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
NIT No.	: 800028446 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
CEDULA	: 19266902
VALOR INICIAL	: \$ 1.131.043.902,41 M/CTE
VALOR ADICIONAL	: \$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 1.131.043.902,41 M/CTE
PLAZO INICIAL	: Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022
PLAZO ADICIONAL	: hasta el 10 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	: 10 de OCTUBRE de 2022
PRÓRROGA 1	: 54 días calendarios
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	: 100 %

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1342 DE 2022

CONTRATO No.	: 1342 DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	: 26/09/2022
OBJETO	: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADO EN EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE	: DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT No.	: 800103913
CONTRATISTA	: INSERGROUP ISG SAS
NIT No.	: 900973970 - 9
REPRESENTANTE LEGAL	: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
CEDULA	: 1075224712
VALOR INICIAL	: \$ 105.977.984,41 M/CTE
VALOR ADICIONAL	: \$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 105.977.984,41 M/CTE
PLAZO INICIAL	: CUATRO (04) MESES CALENADARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO ADICIONAL	:
FECHA DE INICIO	: 10 de OCTUBRE de 2022
PRÓRROGA 1	:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	: 100 %

Información de Avance

Orden 93232

865

Puestos de comedor entregados
- 100%

6.920

Sillas tipo auditorio entregadas - 100%

34

MUNICIPIOS COMPLETADOS
100%

ACEVEDO	NATAGA
AGRADO	OPORAPA
AIPE	PAICOL
ALGECIRAS	PALERMO
ALTAMIRA	PALESTINA
BARAYA	PITAL
CAMPOALEGRE	RIVERA
COLOMBIA	SALADOBLANCO
ELIAS	SAN AGUSTIN
GARZON	SANTA MARIA
GIGANTE	SUAZA
GUADALUPE	TARQUI
HOBO	TELLO
IQUIRA	TERUEL
ISNOS	TESALIA
LA ARGENTINA	TIMANA
LA PLATA	VILLAVIEJA



518

SEDES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS
100%



\$1.131.043.902

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 100%

PLAZO DE EJECUCION: **100%**

insergroup.
900973970-9


GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR


HUILA
CRECE

Informe Jurídico

En el marco de las actividades de carácter Jurídico, el equipo de interventoría desarrollo las siguientes actividades:

Documentación:

Se elaboraron y redactaron los siguientes documentos:

- a. Acta de inicio ORDEN DE COMPRA 93232.
- b. ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSI No 01 - ORDEN DE COMPRA N. 93232 DE 2022
- c. MODIFICACIÓN DE ÓRDEN DE COMPRA – 93232
- d. ACTA FINAL

Conceptos Técnicos, aprobaciones y modificaciones:

- El día 10 de octubre de 2022, se recibió por medio electrónico, una solicitud de ampliación de tiempo de 54 días calendarios es decir hasta el 10 de diciembre de 2022, por parte de la empresa MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Dicha solicitud fue estudiada y aprobada como firma interventora, teniendo en cuenta que los argumentos presentados corresponden a situaciones ajenas al contratista y de fuerza mayor.

Para lo cual se redactó la respectiva ACTA DE JUSTIFICACION 01 con fecha de 11 de octubre de 2022.

Multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento

Durante la ejecución de la orden de compra No. 93232 no se requirió de la realización de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, teniendo en cuenta que el contratista desarrollo satisfactoriamente el contrato, cumpliendo con todas sus obligaciones.

Se ha dado cumplimiento pleno, en las etapas de fabricación, distribución e instalación del mobiliario, así mismo se ha cumplido con el tiempo de ejecución establecido para desarrollar el contrato.

Informe Administrativo

Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

La firma interventora verifico que cada orden de compra, cumpliera con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para dar inicio a las actividades contractuales.

Actas de inicio:

El 10 de octubre de 2022 se firmó el acta de inicio para la orden de compra No. 932312

Se utilizaron los formatos establecidos por la GOBERNACION DEL HUILA, en su calidad de entidad contratante.

Registro presupuestal:

Se verifico el respectivo registro presupuestales para dicha orden de compra.

Se evidencio que el mismo se encontraba debidamente expedido garantizando la disponibilidad de los recursos económicos.

Control de garantías:

ORDEN DE COMPRA 93232

No. DE POLIZA	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
15-44-101265110	CUMPLIMIENTO	\$ 113.104.390,20	12/07/2022	10/06/2023
15-44-101265110	CALIDAD DE LOS BIENES	\$ 113.104.390,20	12/07/2022	10/12/2023
15-44-101265110	SALARIOS	\$ 56.552.195,10	12/07/2022	10/12/2025

Reuniones y comités técnicos:

- El día 12 de octubre de 2022, se realizó una visita por parte del equipo de interventoría a la fábrica de la empresa MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. ubicada en el municipio de Tenjo Cundinamarca.

Se abordaron entre otros temas, la aprobación de los diseños y prototipos del mobiliario, recomendaciones de entrega e instalación, elaboración de actas de entrega e información de distribución.

Comunicaciones oficiales:

A continuación, se relacionan las comunicaciones oficiales enviadas de manera virtual para cada orden de compra.

ORDEN DE COMPRA 93232

FECHA	MEDIO DE ENVIO	ASUNTO	REMITE	DESTINATARIO
3/10/2022	CORREO ELECTRONICO	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022	INSERGRUOP ISG SAS	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
10/10/2022	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD TRAMITE MODIFICACIÓN 1 ORDEN DE COMPRA – AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN – ORDEN DE COMPRA No. 93232	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
11/10/2022	CORREO ELECTRONICO	ACUERDO PARA DESCUENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
10/10/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE ACTA DE INICIO FIRMADA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
11/10/2022	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD TRAMITE MODIFICACIÓN 1	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
11/10/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSI No 01	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
14/10/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE ACTA DE MODIFICACIÓN No 01 – AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN - FIRMADA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS

26/10/2022	CORREO ELECTRONICO	APROBACION PROTOTIPOS - ORDEN DE COMPRA No. 93232 - GOB HUILA	INSERGRUOP ISG SAS	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
27/10/2022	CORREO ELECTRONICO	INFORMACION PARA ENTREGA Y DISTRIBUCION FINAL - ORDEN DE COMPRA No. 93232	INSERGRUOP ISG SAS	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
27/10/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS No 1	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
28/10/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE MANUAL DE USO – MANTENIMIENTO Y GARANTIA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
19/10/2022	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DIRECTORIO – LISTA DE DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
20/10/2022	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA SOLICITUD DIRECTORIO – LISTA DE DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN	INSERGRUOP ISG SAS	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
28/10/2022	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LAS DOTACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
28/10/2022	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA SOLICITUD DOCUMENTOS Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LAS DOTACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSERGRUOP ISG SAS	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
31/10/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 01	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
31/10/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 02	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
03/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 03	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
08/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 04	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS

11/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 06	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
11/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 07	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
21/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 08	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
21/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 09	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
24/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 10	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
27/11/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE ANEXO 1 A LA POLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA MODIFICACIÓN 1 DE: – ORDEN DE COMPRA No. 93232	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
28/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 11	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
28/11/2022	CORREO ELECTRONICO	DESPACHO REALIZADO No 12	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
17/12/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE BORRADOR DE FACTURACION TOTAL PARA: – ORDEN DE COMPRA No. 93232 DEPTO DEL HUILA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
19/12/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PARA: – ORDEN DE COMPRA No. 93232 DPTO DEL HUILA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS
20/12/2022	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE FACTURACION TOTAL PARA: – ORDEN DE COMPRA No. 93232 DEPTO DEL HUILA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	INSERGRUOP ISG SAS

Control de plazo de ejecución:

Con corte al 10 de diciembre de 2022, se presenta el siguiente avance de tiempo en la ejecución de la orden de compra 93232.


Cuadro control plazo de ejecucion

FECHA DE LA ORDEN:	12/07/2022
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2022
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022
PRORROGA 1	54 días calendarios
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	hasta el 10 de diciembre 2022
FECHA DEL INFORME:	10 de diciembre de 2022
TOTAL DIAS EJECUTADOS:	62 días calendarios
% DE EJECUCION:	100%
% DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	100%

PLAZO TOTAL



AVANCE EN TIEMPO

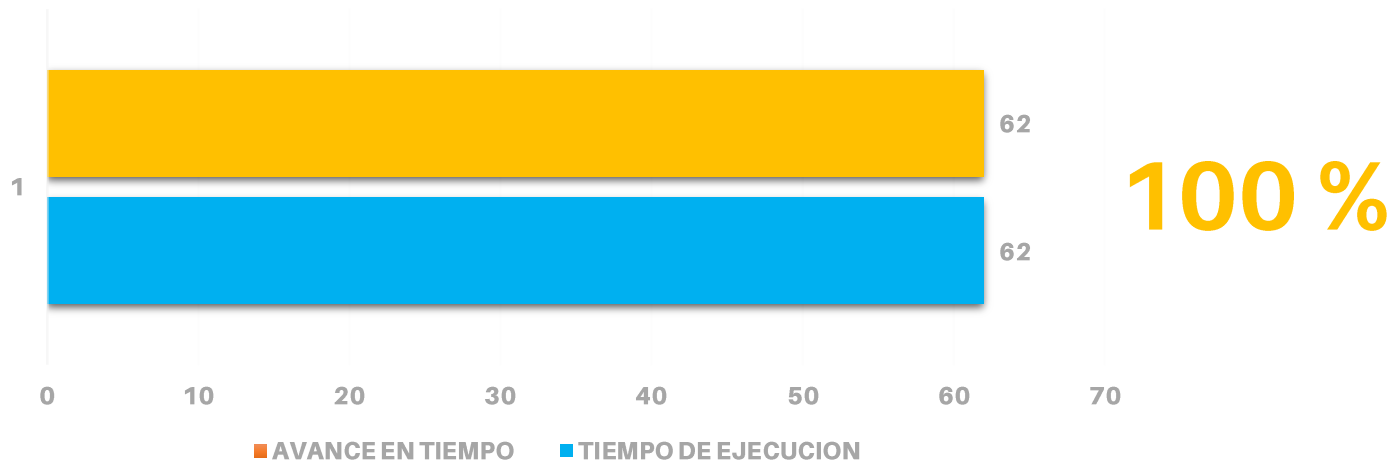

Informe Financiero

Presupuesto oficial:

A continuación, se presenta el respectivo presupuesto oficial para la orden de compra 93232.

Cuadro de presupuesto oficial

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	dts02--237 Puesto de comedor	865	\$ 1.098.794,29	\$ 950.457.060,85
SUBTOTAL				\$ 950.457.060,85
IVA				\$ 180.586.842
TOTAL GENERAL				\$ 1.131.043.902,41

Ejecución presupuestal:


Con corte al 10 de diciembre de 2022 se presenta la respectiva ejecución presupuestal para la orden de compra 93232.

Cuadro acta final

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR TOTAL ENTREGADO
1	dts02--237 Puesto de comedor	865	\$ 1.098.794,29	\$ 950.457.060,85	865	\$ 950.457.060,85
SUBTOTAL				\$ 950.457.060,85	SUBTOTAL	\$ 950.457.060,85
IVA				\$ 180.586.842	IVA	\$ 180.586.842
TOTAL GENERAL				\$ 1.131.043.902,41	TOTAL ENTREGADO	\$ 1.131.043.902,41

La orden de compra No. 93232 registra al 10 de diciembre de 2022 una ejecución presupuestal del

100%

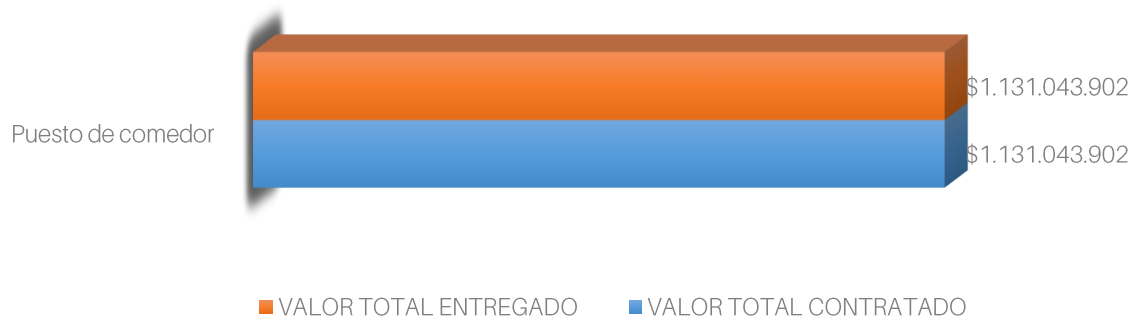

Ejecución presupuestal por municipio:

Con corte al 10 de diciembre de 2022 se presenta la respectiva ejecución presupuestal para la orden de compra 93232 por municipio beneficiario.

Cuadro ejecucion por municipio

No.	MUNICIPIO	SEDES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS	UNIDADES PUESTO DE COMEDOR ENTREGADOS	VALOR ENTREGADO
1	ACEVEDO	36	75	\$98.067.390
2	AGRADO	9	17	\$22.228.608
3	AIPE	9	12	\$15.690.782
4	ALGECIRAS	30	62	\$81.069.043
5	ALTAMIRA	3	3	\$3.922.696
6	BARAYA	8	8	\$10.460.522
7	CAMPOALEGRE	28	37	\$48.379.913
8	COLOMBIA	24	24	\$31.381.565
9	ELIAS	4	6	\$7.845.391
10	GARZON	38	82	\$107.220.347
11	GIGANTE	11	26	\$33.996.695
12	GUADALUPE	16	29	\$37.919.391
13	HOBO	2	6	\$7.845.391
14	IQUIRA	14	19	\$24.843.739
15	ISNOS	6	8	\$10.460.522
16	LA ARGENTINA	6	12	\$15.690.782

17	LA PLATA	53	107	\$139.909.477
18	NATAGA	5	14	\$18.305.913
19	OPORAPA	22	24	\$31.381.565
20	PAICOL	5	12	\$15.690.782
21	PALERMO	16	16	\$20.921.043
22	PALESTINA	6	8	\$10.460.522
23	PITAL	9	13	\$16.998.348
24	RIVERA	11	13	\$16.998.348
25	SALADOBLANCO	3	3	\$3.922.696
26	SAN AGUSTIN	51	77	\$100.682.521
27	SANTA MARIA	23	30	\$39.226.956
28	SUAZA	6	15	\$19.613.478
29	TARQUI	22	45	\$58.840.434
30	TELLO	20	26	\$33.996.695
31	TERUEL	1	1	\$1.307.565
32	TESALIA	1	2	\$2.615.130
33	TIMANA	12	25	\$32.689.130
34	VILLAVIEJA	8	8	\$10.460.522
TOTAL		518	865	\$1.131.043.902

Cuadro ejecucion por institucion educativa

ITEM	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS	UNIDADES ENTREGADAS	VALOR ENTREGADO
1	AGROPECUARIA DE AIPE	3	3	\$ 3.922.696
2	ALTO DEL OBISPO	6	6	\$ 7.845.391
3	ALTO HORIZONTE	5	12	\$ 15.690.782
4	ANACLETO GARCIA	6	6	\$ 7.845.391
5	ANTONIO BARAYA	3	3	\$ 3.922.696
6	ANTONIO RICAURTE	1	2	\$ 2.615.130
7	BARRIOS UNIDOS	3	8	\$ 10.460.522
8	BATEAS	4	8	\$ 10.460.522
9	BETANIA	2	4	\$ 5.230.261
10	BORDONES	3	3	\$ 3.922.696
11	BUENOS AIRES	2	2	\$ 2.615.130

12	CAMPESTRE SAN JOSE	3	5	\$ 6.537.826
13	CANSARROCINES	6	9	\$ 11.768.087
14	CARLOS RAMON REPIZO	5	8	\$ 10.460.522
15	CASCAJAL	3	7	\$ 9.152.956
16	CE LA UNION	1	1	\$ 1.307.565
17	CE MAJO	3	5	\$ 6.537.826
18	CE POLONIA	2	2	\$ 2.615.130
19	COSANZA	2	4	\$ 5.230.261
20	CRISTOBAL COLON	2	3	\$ 3.922.696
21	DIVINO SALVADOR	3	3	\$ 3.922.696
22	ECOPETROL	2	3	\$ 3.922.696
23	EL CARMELO	3	5	\$ 6.537.826
24	EL CARMEN	15	20	\$ 26.151.304
25	EL CISNE	2	2	\$ 2.615.130
26	EL JUNCAL	2	2	\$ 2.615.130
27	EL PARAISO	11	21	\$ 27.458.869
28	EL ROSARIO	8	10	\$ 13.075.652
29	EL TEJAR	5	11	\$ 14.383.217
30	EL VERGEL	4	9	\$ 11.768.087
31	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	2	5	\$ 6.537.826
32	ESPERANZA	1	2	\$ 2.615.130
33	ESTEBAN ROJAS TOVAR	3	6	\$ 7.845.391
34	EUGENIO FERRO FALLA	8	9	\$ 11.768.087
35	GABRIEL PLAZA	1	1	\$ 1.307.565
36	GALLARDO	1	3	\$ 3.922.696
37	GALLEGO	3	4	\$ 5.230.261
38	IE AGROP. DEL HUILA	3	6	\$ 7.845.391
39	IE CAGUANCITO	3	8	\$ 10.460.522
40	IE EL DESCANSO	1	3	\$ 3.922.696
41	IE ISMAEL PERDOMO BORRERO	1	3	\$ 3.922.696
42	IE JENARO DIAZ JORDAN	2	6	\$ 7.845.391
43	IE JOSE MIGUEL MONTALVO	2	6	\$ 7.845.391
44	IE LOS NEGROS	3	5	\$ 6.537.826
45	IE LUIS CALIXTO LEIVA	1	3	\$ 3.922.696
46	IE QUEBRADON SUR	2	5	\$ 6.537.826
47	IE SAN GERARDO	6	11	\$ 14.383.217
48	IE SANTA MARTA	2	5	\$ 6.537.826

49	IE SIMON BOLIVAR	3	9	\$	11.768.087
50	JOAQUIN GARCIA BORRERO	1	1	\$	1.307.565
51	JORGE ELIECER GAITAN	3	4	\$	5.230.261
52	JORGE VILLAMIL ORTEGA	1	2	\$	2.615.130
53	JOSE ACEVEDO Y GÒMEZ	4	8	\$	10.460.522
54	JOSE EUSTACIO RIVERA	1	1	\$	1.307.565
55	JOSE HILARIO LOPEZ	2	4	\$	5.230.261
56	JUAN XXIII	8	17	\$	22.228.608
57	KUE DSI J	2	5	\$	6.537.826
58	LA ARCADIA	6	14	\$	18.305.913
59	LA ARGENTINA	4	5	\$	6.537.826
60	LA CABAÑA	3	3	\$	3.922.696
61	LA CEJA MESITAS	2	3	\$	3.922.696
62	LA GAITANA	2	3	\$	3.922.696
63	LA LEGIOSA	3	3	\$	3.922.696
64	LA MINA	1	1	\$	1.307.565
65	LA PLANTA	15	27	\$	35.304.261
66	LA TROJA	3	3	\$	3.922.696
67	LA ULLOA	5	5	\$	6.537.826
68	LA VEGA	12	15	\$	19.613.478
69	LA VICTORIA	6	10	\$	13.075.652
70	LAS ACACIAS	2	3	\$	3.922.696
71	LAS JUNTAS	6	6	\$	7.845.391
72	LAS MERCEDES	2	6	\$	7.845.391
73	LAS TOLDAS	4	8	\$	10.460.522
74	LAUREANO GOMEZ	2	2	\$	2.615.130
75	LAURELES	1	3	\$	3.922.696
76	LOS CAUCHOS	9	11	\$	14.383.217
77	LUIS CARLOS TRUJILLO	2	4	\$	5.230.261
78	LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ	5	12	\$	15.690.782
79	LUIS ONOFRE ACOSTA	1	2	\$	2.615.130
80	MARIA AUXILIADORA	5	6	\$	7.845.391
81	MARTICAS	7	16	\$	20.921.043
82	MISAEEL PASTRANA BORRERO	1	2	\$	2.615.130
83	MONSERRATE	1	2	\$	2.615.130
84	MONTESITOS	2	6	\$	7.845.391
85	NICOLAS GARCIA BAHAMON	3	5	\$	6.537.826

86	NTRA. SRA. DEL SOCORRO	6	7	\$ 9.152.956
87	NUCLEO EL GUADUAL	5	7	\$ 9.152.956
88	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1	2	\$ 2.615.130
89	OBANDO	6	13	\$ 16.998.348
90	OSPINA PEREZ	4	4	\$ 5.230.261
91	PACARNI	1	2	\$ 2.615.130
92	PALESTINA	1	1	\$ 1.307.565
93	PATIO BONITO	2	5	\$ 6.537.826
94	PAULO VI	5	5	\$ 6.537.826
95	POTRERO GRANDE	6	6	\$ 7.845.391
96	PROMOCION SOCIAL	3	3	\$ 3.922.696
97	PUERTO QUINCHANA	8	16	\$ 20.921.043
98	QUITURO	4	8	\$ 10.460.522
99	RAMON ALVARADO SANCHEZ	5	8	\$ 10.460.522
100	RICABRISA	6	12	\$ 15.690.782
101	RIVERITA	1	1	\$ 1.307.565
102	ROBERTO SUAZA MARQUINEZ	2	6	\$ 7.845.391
103	ROBLE	1	1	\$ 1.307.565
104	SALEN	1	3	\$ 3.922.696
105	SAN ADOLFO	6	13	\$ 16.998.348
106	SAN ALFONSO	4	4	\$ 5.230.261
107	SAN ANDRES	11	15	\$ 19.613.478
108	SAN ANTONIO	3	6	\$ 7.845.391
109	SAN ANTONIO ALTO	3	3	\$ 3.922.696
110	SAN ANTONIO DEL PESCADO	4	8	\$ 10.460.522
111	SAN ISIDRO	3	7	\$ 9.152.956
112	SAN JOAQUIN	5	6	\$ 7.845.391
113	SAN JOSE	9	9	\$ 11.768.087
114	SAN JOSÉ DE RIECITO	4	9	\$ 11.768.087
115	SAN JUAN BOSCO	4	8	\$ 10.460.522
116	SAN MARCOS	3	5	\$ 6.537.826
117	SAN MIGUEL	8	16	\$ 20.921.043
118	SAN ROQUE	5	6	\$ 7.845.391
119	SAN SEBASTIAN	2	6	\$ 7.845.391
120	SAN VICENTE	7	16	\$ 20.921.043
121	SANTA ANA	7	7	\$ 9.152.956
122	SANTA JUANA DE ARCO	10	16	\$ 20.921.043

123	SANTA LUCIA	2	3	\$ 3.922.696
124	SANTA RITA	4	6	\$ 7.845.391
125	SANTA ROSALIA	7	7	\$ 9.152.956
126	SILVANIA	1	3	\$ 3.922.696
127	SOSIMO SUAREZ	1	3	\$ 3.922.696
128	TECNICO AGRICOLA	4	12	\$ 15.690.782
129	TULIO ARBELAEZ	2	2	\$ 2.615.130
130	VALENCIA DE LA PAZ	5	5	\$ 6.537.826
131	VILLA DE LOS ANDES	7	13	\$ 16.998.348
132	VILLALOSADA	3	7	\$ 9.152.956
133	YACHAY WASI RUNA YANACUNA	3	6	\$ 7.845.391
134	YU LUUCX PISHAU	4	7	\$ 9.152.956
135	(en blanco)	4	6	\$ 7.845.391
TOTAL		518	865	\$ 1.131.043.902

Informe Técnico



Actividades desarrolladas:

A continuación, se describen las actividades de carácter técnico desarrolladas por el equipo de interventoría para el presente informe parcial 02.

Mobiliario y segmentación:

Las condiciones técnicas para la orden de compra se describen a continuación:

Cuadro Condiciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	dts02--237 Puesto de comedor	865

(c) Conjunto del Segmento 2: Mobiliario de Cocina y comedor

Tabla 14 Conjuntos de Productos del Segmento 2

Conjunto	Descripción
Puesto de comedor	Ocho (8) sillas cafetería – auditorio. Un (1) mesa de cafetería plegable.

Fuente: MEN.

REVISIÓN, APROBACIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS DE LOTES:

ORDEN DE COMPRA 93232

El día 12 de octubre de 2022, el equipo técnico de interventoría, realizó una visita de inspección a la fábrica de la empresa MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. ubicada en el municipio de Tenjo Cundinamarca.

El objetivo de la misma, se centró principalmente en la verificación de las condiciones técnicas del mobiliario contratado, de acuerdo lo establecido en el MANUAL DE DOTACION ESCOLAR del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

Se verifico cada una de las condiciones establecidas en la ficha técnica para cada mobiliario contratado.

Igualmente se ejecutaron las siguientes activadas descritas en el MANUAL DE DOTACIONES ESCOLARES:

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN
MUESTRAS DE LOTES
MARCACIÓN
EMPAQUE Y EMBALAJE
MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para realizar dicha actividad, se utilizó el software de interventoría de la empresa, mediante el cual se registran en tiempo real todos los resultados del proceso de verificación en la fábrica.

Mediante **ANEXO No. 1**, de adjunta el **ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION MOBILIARIO ESCOLAR - MESA DE CAFETERIA**

Mediante **ANEXO No. 2**, de adjunta el **ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION MOBILIARIO ESCOLAR - SILLA CAFETERÍA**


A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades desarrolladas en la fábrica:

Registro Fotográfico Aprobación De Prototipos







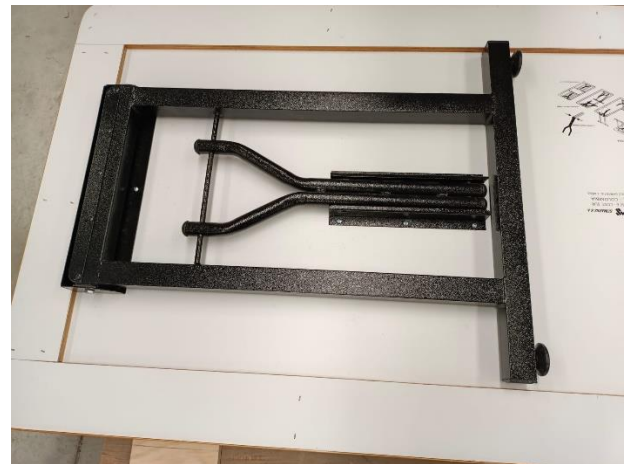

Información técnica de distribución:

El día 07 de octubre de 2022, el supervisor del contrato de interventoría el señor ALFONSO MONROY ZUÑIGA, envió vía correo electrónico la información referente a la distribución del mobiliario escolar por cada sede beneficiaria.

Dicha información contenía la cantidad de unidades a entregar, el tipo de las mismas y la sede educativa con su respectivo municipio e institución educativa principal.

Como firma interventora, enviamos la información a los correos electrónicos oficiales para los contratistas de las órdenes de compra No. 93231 y 93232.

A continuación, se presenta el resumen de la información de distribución del mobiliario:

Cuadro distribucion por municipio ORDEN DE COMPRA 93232

No.	MUNICIPIO	PUESTO DE COMEDOR
1	ACEVEDO	75
2	AGRADO	17
3	AIPE	12
4	ALGECIRAS	62
5	ALTAMIRA	3
6	BARAYA	8
7	CAMPOALEGRE	37
8	COLOMBIA	24
9	ELIAS	6
10	GARZON	82
11	GIGANTE	26
12	GUADALUPE	29
13	HOBO	6
14	IQUIRA	19
15	ISNOS	8
16	LA ARGENTINA	12
17	LA PLATA	107
18	NATAGA	14
19	OPORAPA	24
20	PAICOL	12
21	PALERMO	16

22	PALESTINA	8
23	PITAL	13
24	RIVERA	13
25	SALADOBLANCO	3
26	SAN AGUSTIN	77
27	SANTA MARIA	30
28	SUAZA	15
29	TARQUI	45
30	TELLO	26
31	TERUEL	1
32	TESALIA	2
33	TIMANA	25
34	VILLAVIEJA	8
TOTAL		865

MUNICIPIO	Cuenta de SEDES EDUCATIVAS
ACEVEDO	36
AGRADO	9
AIPE	9
ALGECIRAS	30
ALTAMIRA	3
BARAYA	8
CAMPOALEGRE	28
COLOMBIA	24
ELIAS	4
GARZON	38
GIGANTE	11
GUADALUPE	16
HOBO	2
IQUIRA	14
ISNOS	6
LA ARGENTINA	6
LA PLATA	53
NATAGA	5
OPORAPA	22
PAICOL	5

PALERMO	16
PALESTINA	6
PITAL	9
RIVERA	11
SALADOBLANCO	3
SAN AGUSTIN	51
SANTA MARIA	23
SUAZA	6
TARQUI	22
TELLO	20
TERUEL	1
TESALIA	1
TIMANA	12
VILLAVIEJA	8
Total general	518

Verificación de entrega e instalación del mobiliario:

Completados los procesos de aprobación de prototipos, y de entrega de la información técnica de distribución, se dio inicio a las actividades de entrega e instalación del mobiliario contratado por cada sede educativa beneficiaria.

El equipo técnico de interventoría, acompañó el proceso de entrega del mobiliario en las diferentes sedes educativas beneficiarias, para lo cual se tomó registro de dicha actividad mediante el software de interventoría, el cual permite evaluar el proceso de entrega y registrar las diferentes evidencias fotográficas y documentales.

Así mismo se utilizó el formato de ACTA DE ENTREGA suministrado por la GOBERNACION DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACION el cual se diligencio por cada una de las sedes educativas en la que se entregó el mobiliario escolar.

Mediante **ANEXO No. 3**, se adjuntan **ACTA DE INTERVENTORIA – ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93231 DE 2022**

Para el informe presentado de manera física, se adjuntan la totalidad de actas desarrolladas Mediante **ANEXO No. 4**, se adjuntan las **ACTA DE INTERVENTORIA – ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022**, Formato Gobernación Del Huila.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de dichas actividades realizadas por el equipo de interventoría.

Registro Fotográfico entrega e instalación de mobiliario









Conclusiones y anexos

Conclusiones

La firma interventora realizó la verificación de las obligaciones de carácter técnico, administrativo financiero y legal, para la orden de compra No. 93232, certificando el correcto desarrollo de las mismas por parte del contratista MANUFACTURAS SUMAPAZ S.

Todos los procesos de fabricación, distribución e instalación se han desarrollado cabalmente, resaltando el compromiso del contratista MANUFACTURAS SUMAPAZ de realizar las entregas en cada sede educativa beneficiaria, aun cuando las condiciones climáticas generan dificultades y contratiempos al momento de realizar dichas entregas.

En lo concerniente a la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 93232 desarrollada por la empresa MANUFACTURAS SUMAPAZ S. se aprueba el desembolso del pago final por valor de \$ 1.131.043.902,41 M/CTE, teniendo en cuenta que dicha empresa cumplió con la entrega total del mobiliario contratado en cada una de las sedes educativas beneficiarias dentro del plazo establecido para ello.

Neiva Huila, 20 de diciembre Neiva Huila.

MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
C.C. 1.075.224.712 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORO: EDWIN VEGA MONTENEGRO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Tabla de anexos:

NO.	NOMBRE	ELABORADO POR
ANEXO No. 1	ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION MOBILIARIO ESCOLAR - MESA DE CAFETERIA	INSERGROUP ISG SAS
ANEXO No. 2	ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION MOBILIARIO ESCOLAR - SILLA CAFETERÍA	INSERGROUP ISG SAS
ANEXO No. 3	ACTA DE INTERVENTORIA – ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93231 DE 2022	INSERGROUP ISG SAS
ANEXO No. 4	ACTA DE INTERVENTORIA – ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022	INSERGROUP ISG SAS

ANEXO No. 1

ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION
MOBILIARIO ESCOLAR - MESA DE CAFETERIA



ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION MOBILIARIO ESCOLAR - MESA DE CAFETERIA

Completada

Puntuación	97,78 %	Elementos marcados	0	Acciones	0
------------	---------	--------------------	---	----------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERTGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE FABRICACION:

LUGAR:

Km 6 costado sur Via a Siberia -
fábrica manufacturas somapaz

UBICACION:

50, Tenjo, Cundinamarca,
Colombia
(4.7811008, -74.1858515)

IMAGENES:



Foto 1



Foto 2



Foto 3

ELABORADO POR:

EDWIN VEGA MONTENEGRO -
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:

10.10.2022 09:00 -05

VERIFICACION CONDICIONES TECNICAS

95,24 %

CONDICIONES TECNICAS

100 %

DESCRIPCIÓN TÉCNICA				
PORTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patatas	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2
Paraales	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2
Sistema de plegado	Acero	Tubo cold rolled sección redonda de 1" diámetro mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2
Tornillos	Acero	Tornillo autoperforante de 1/4"	Zincado	18
Antideslizantes	Caucho	Diámetro 38 mm altura 10 mm	Negro	4
Superficie	Madera	Contrachapada de 18 mm, reengrosada por sus cuatro caras en madera contrachapada de 12 mm	Laminado decorativo de alta presión en la cara tono gris claro espesor 1 mm y balance espesor 0,6 mm en la contracara, canto a la vista con sellador y laca catalizada transparente semimate	1

IMAGEN DEL PRODUCTO:



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

PATAS:

100 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 10



Foto 11



Foto 12

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 13



Foto 14

ACABADO:

CUMPLE



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

CANTIDAD: 2



Foto 19

PARALES: 100 %

MATERIAL: CUMPLE



Foto 20

ESPECIFICACIONES: CUMPLE



Foto 21

ACABADO: CUMPLE



Foto 22



Foto 23



Foto 24

CANTIDAD 4

CAMBRANA: 93,33 %

MATERIAL: CUMPLE



Foto 25



Foto 26

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 27



Foto 28

ACABADO:

CUMPLE



Foto 29



Foto 30

CANTIDAD:

2

SISTEMAS DE PLEGADO:

91,67 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 31



Foto 32



Foto 33

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 34

ACABADO:

CUMPLE



Foto 35

Foto 36

Foto 37

CANTIDAD

2

TORNILLOS:

88,89 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 38



Foto 39

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 40

ACABADO:

CUMPLE



Foto 41



Foto 42

CANTIDAD

24

ANTIDESLIZANTES:

83,33 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 43

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 44

Foto 45

ACABADO:

CUMPLE



Foto 46

CANTIDAD:

4

SUPERFICIE:

66,67 %

MATERIAL:



Foto 47



Foto 48

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52

ACABADO:

CUMPLE



Foto 53



Foto 54

CANTIDAD:

1

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

100 %

REQUERIMIENTO 1. La estructura trabaja de forma horizontal y debe permitir acomodar (8) ocho sillas

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 55



Foto 56

REQUERIMIENTO 2. La estructura debe soportar superficies de madera de 2.000 mm x 800 mm

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

REQUERIMIENTO 3. La estructura debe ser abatible de forma vertical y debe dividir la estructura en dos secciones iguales.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 61



Foto 62

REQUERIMIENTO 4. Las patas externas de la estructura deben terminar en antideslizantes de caucho de 38 mm de diámetro espesor 10 mm unidos mediante tornillos a la estructura

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 63



Foto 64

REQUERIMIENTO 5: El plegado o desplegado de la estructura debe poder ser realizado por una sola persona.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 65



Foto 66



Foto 67

REQUERIMIENTO 6: La estructura debe ser de fácil manejo para plegar y desplegar rápidamente.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 68




Foto 69



Foto 70

REQUERIMIENTO 7: La estructura debe ser de fácil transporte y almacenaje.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 71

REQUERIMIENTO 8: La estructura debe tener un sistema que permita asegurar tanto plegada como desplegada la estabilidad del conjunto.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 72



Foto 73



Foto 74

REQUERIMIENTO 9: La estructura debe ser independiente de la superficie.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 75



Foto 76

REQUERIMIENTO 10: El sistema debe funcionar como una unidad, es decir, sin piezas sueltas y/o aditamentos.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 77

REQUERIMIENTO 12: La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 78



Foto 79



Foto 80

REQUERIMIENTO 13: La superficie debe sujetarse a la estructura por debajo mediante tornillos auto perforantes.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 81



Foto 82



Foto 83

REQUERIMIENTO 14: Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas en un radio mínimo de 30 mm.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 84

Foto 85

REQUERIMIENTO 15: La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 86

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 87



Foto 88

REQUERIMIENTO 17: Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE

durante la prueba realizada, se observo que la superficie presento deformacion en la parte central del mueble



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94

REQUERIMIENTO 18: Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura sin que presente deformación alguna en su superfi-cie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101

REQUERIMIENTO 19: Si en la construcción de la estructura se genera como resultante una punta de perfil expuesta esta debe tener el tapón correspondiente.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105

REQUERIMIENTO 20: En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos ni puntas que representen un riesgo en el uso.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109

REQUERIMIENTO 20: MARCACIÓN

Todos los elementos a dotar deben estar marcados como mínimo con la siguiente información:

- A. Nombre de proveedor en Colombia
- B. Dirección de proveedor en Colombia
- C. Ciudad donde se ubica el proveedor en Colombia
- D. Número telefónico de contacto del proveedor en Colombia
- E. Año de entrega de la dotación
- F. Tiempo de la garantía

La marcación debe ser legible y de acuerdo al elemento a dotar, en lo posible se deben evitar adhesivos que puedan ser retirados por los estudiantes, resistir el rayado, las agresiones con bisturí, el jabón, el hipoclorito de sodio y los elementos químicos básicos utilizados por los servicios de limpieza.

CUMPLE



Foto 110




Foto 111



Foto 112

DIMENSIONES:

100 %

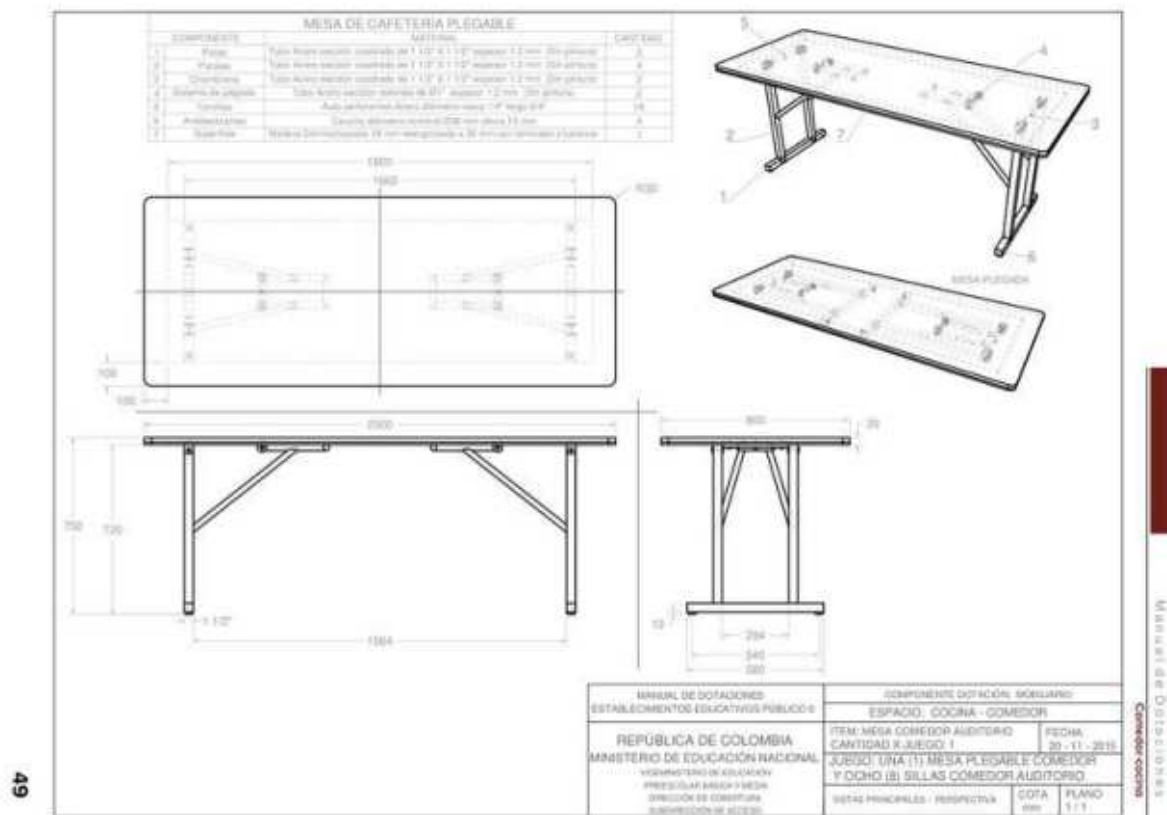

ITEM 1. Altura del Plano de la mesa - 750 mm

100 %

DIMENSION::

CUMPLE



Foto 113



Foto 114

ITEM 2: Ancho del Plano de cada superficie - 2.000 mm

100 %

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 115

ITEM 3: Profundidad del Plano de cada mesa - 800 mm

DESCRIPCION:

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 116



Foto 117

ITEM 4: Espesor de la superficie de madera - 30 mm

100 %

DESCRIPCION:

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 118



Foto 119

VERIFICACION PLANTA DE PRODUCCION:

SOLDADURA:



Foto 120



Foto 121

PINTURA:



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125

ENSAMBLE:



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129

CORTE Y DOBLADO



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133

MADERA:



Foto 134



Foto 135



Foto 136

PLASTICOS:



Foto 137

Foto 138

Foto 139

OBSERVACIONES Y FIRMA:

OBSERVACIONES:

NINGUNA

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

EL PROTOTIPO EVALUADO,
CUMPLE CON LAS PRUEBAS Y
REVISIONES REALIZADAS, POR
LO CUAL SE APRUEBA SU
FABRICACION

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

INGENIERO INDUSTRIAL
EDWIN VEGA MONTENEGRO - 1
.075.226.674

ENTIDAD Y CONTACTO:

insergroup isg sas - contratacio
nisc@gmail.com

FIRMA:



Foto 140

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

ARQUITECTO JUAN FELIPE
PEREZ CASTILLO -79155142

ENTIDAD Y CONTACTO:

insergroup isg sas - contratacio
nisc@gmail.com

FIRMA:



Foto 141

FIRMA FUNCIONARIO 3:

NOMBRE Y CEDULA:

ENTIDAD Y CONTACTO:

FIRMA:

FIRMA FUNCIONARIO 4:

NOMBRE Y CEDULA:

ENTIDAD Y CONTACTO:

FIRMA:

Apéndice



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41

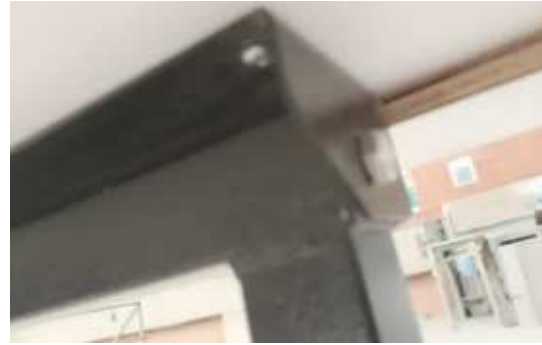


Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56

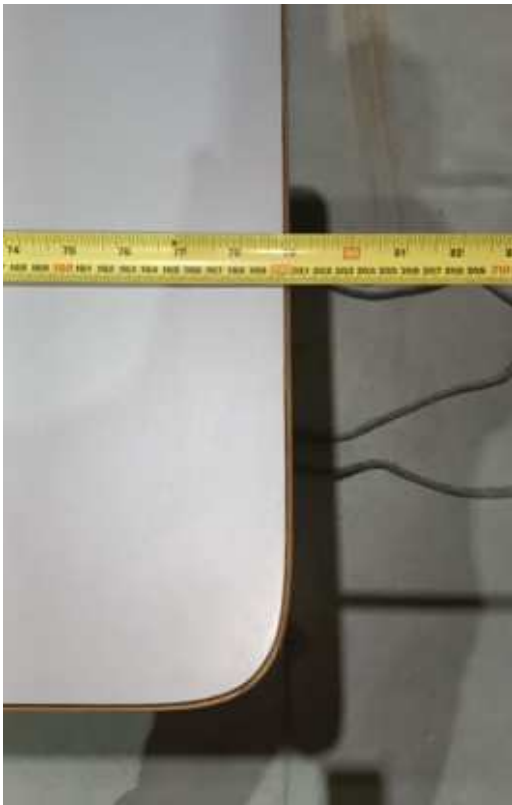


Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67

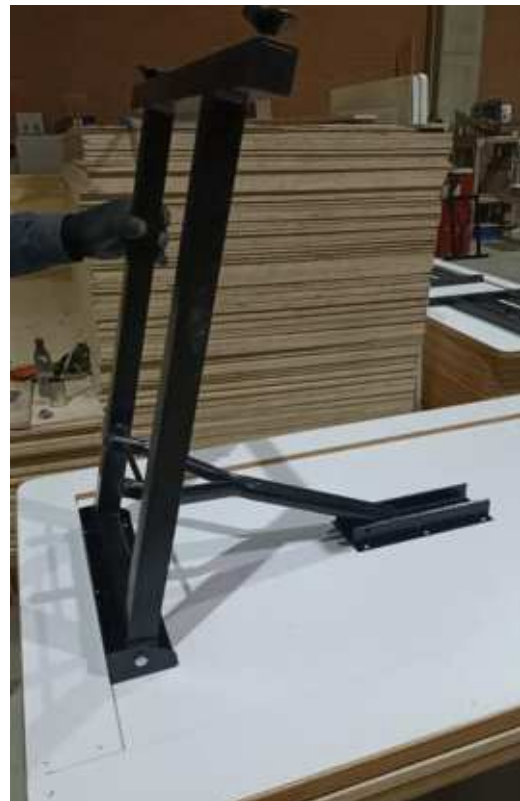


Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74

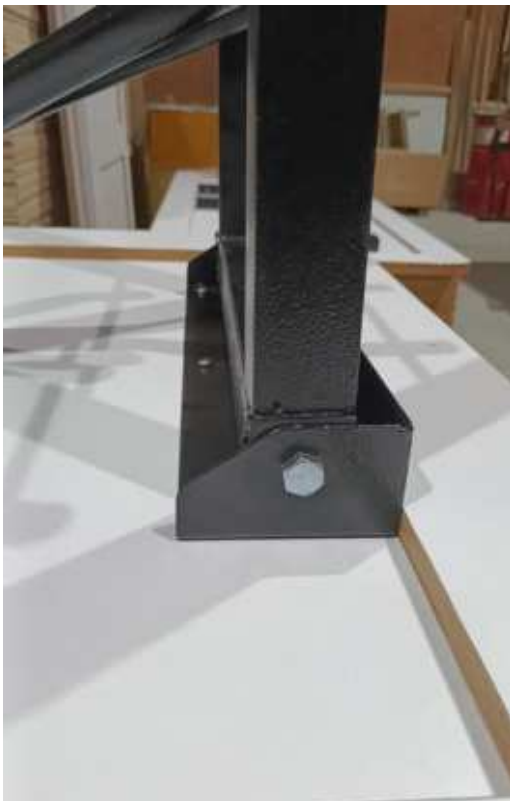


Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109

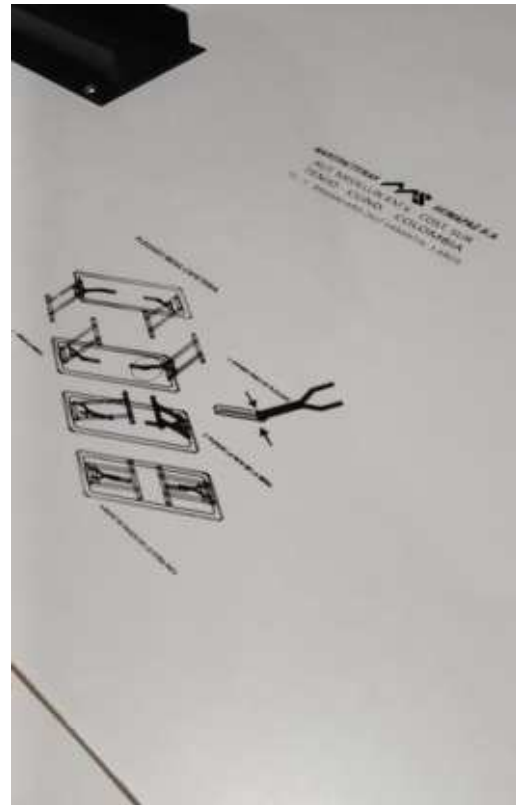


Foto 110



Foto 111

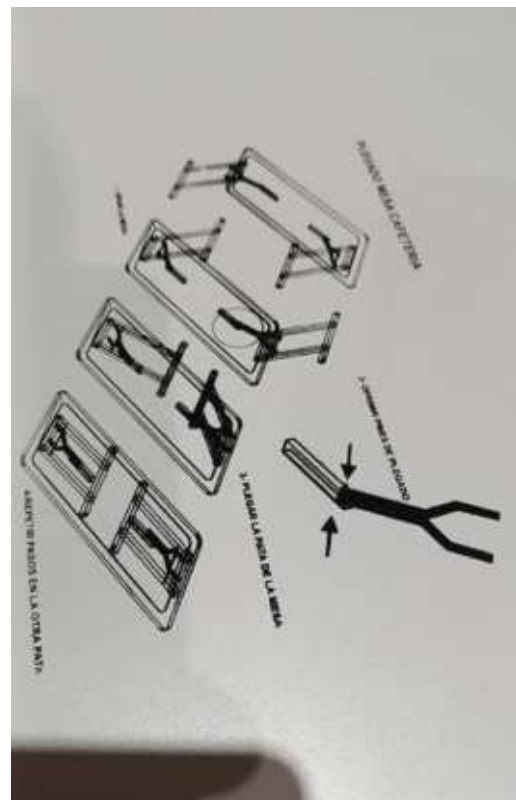


Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

Foto 140

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacqueline". The signature is fluid and cursive, with a large initial "J" and a stylized "P" at the end.

Foto 141

ANEXO No. 2

ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION
MOBILIARIO ESCOLAR - SILLA CAFETERÍA



ACTA DE INTERVENTORIA - VERIFICACION MOBILIARIO ESCOLAR - SILLA CAFETERÍA

Completada

Puntuación	97,73 %	Elementos marcados	0	Acciones	0
------------	----------------	--------------------	----------	----------	----------

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERTGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE FABRICACION:

LUGAR:

Km 6 costado sur Via a Siberia
fábrica manufacturas sumapaz

UBICACION:

50, Tenjo, Cundinamarca,
Colombia
(4.7631911, -74.1632871)

IMAGENES:



Foto 1



Foto 2

ELABORADO POR:

EDWIN VEGA MONTENEGRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:

10.10.2022 17:00 -05

VERIFICACION CONDICIONES TECNICAS

94,44 %

CONDICIONES TECNICAS

100 %

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	2
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	1
Asiento	Polipropileno Copolimero	Injectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color azul oscuro	1
Espaldar	Polipropileno Copolimero	Injectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color azul oscuro	1
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno injectado semiesférico interno con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar	Color negro	4

IMAGEN DEL PRODUCTO:



Foto 3




Foto 4



Foto 5

PATAS:

100 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 6



Foto 7

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 8



Foto 9

ACABADO:

CUMPLE



Foto 10

CANTIDAD: 2

Asiento-Espaldar: 66,67 %

MATERIAL: CUMPLE



Foto 11



Foto 12



Foto 13

ESPECIFICACIONES: CUMPLE



Foto 14



Foto 15

ACABADO:



Foto 16



Foto 17

CANTIDAD 1

Amarres: 100 %

MATERIAL: CUMPLE



Foto 18



Foto 19



Foto 20

ESPECIFICACIONES: CUMPLE



Foto 21



Foto 22



Foto 23

ACABADO:

CUMPLE



Foto 24



Foto 25

CANTIDAD:

2

En la ficha técnica en la hoja 50 en el cuadro descripción técnica aparece un amarre y en la página 51 aparecen dos amarres

Asiento:

100 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 26



Foto 27

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 28



Foto 29

ACABADO:

CUMPLE



Foto 30



Foto 31

CANTIDAD

1

Espaldar:

100 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 32



Foto 33

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 34



Foto 35



Foto 36

ACABADO:

CUMPLE



Foto 37



Foto 38

CANTIDAD

1

Tapones:

100 %

MATERIAL:

CUMPLE



Foto 39



Foto 40

ESPECIFICACIONES:

CUMPLE



Foto 41



Foto 42



Foto 43

ACABADO:

CUMPLE



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47

CANTIDAD:

4

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

100 %

REQUERIMIENTO 1. Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 48

REQUERIMIENTO 2. El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 49

REQUERIMIENTO 3. La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 50

REQUERIMIENTO 4. La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 51

REQUERIMIENTO 5: El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construcción de la estructura de la silla las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 52



Foto 53

REQUERIMIENTO 6: La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 54



Foto 55

REQUERIMIENTO 7: La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 56



Foto 57

REQUERIMIENTO 8: Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 58



Foto 59



Foto 60

REQUERIMIENTO 9: La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)

100 %

EVALUACION:

CUMPLE




Foto 61



Foto 62




Foto 63



Foto 64



Foto 65

REQUERIMIENTO 10: El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 66



Foto 67

REQUERIMIENTO 11: El asiento debe tener un sistema de inserción o pestañas que permitan la fijación a la estructura metálica

100 %

EVALUACION:

CUMPLE




Foto 68




Foto 69



Foto 70

REQUERIMIENTO 12: El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop

100 %

EVALUACION:

CUMPLE




Foto 71



Foto 72

REQUERIMIENTO 13: La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura. .

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79

REQUERIMIENTO 14: La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84

EVALUACION:

CUMPLE

REQUERIMIENTO 16: Todos los perfiles metálicos deben tener tapones .

100 %

EVALUACION:

CUMPLE



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89

REQUERIMIENTO 17: MARCACIÓN
Todos los elementos a dotar deben estar marcados como mínimo con la siguiente información:
A. Nombre de proveedor en Colombia
B. Dirección de proveedor en Colombia
C. Ciudad donde se ubica el proveedor en Colombia

CUMPLE

D. Número telefónico de contacto del proveedor en Colombia

E. Año de entrega de la dotación

F. Tiempo de la garantía

La marcación debe ser legible y de acuerdo al elemento a dotar, en lo posible se deben evitar adhesivos que puedan ser retirados por los estudiantes, resistir el rayado, las agresiones con bisturí, el jabón, el hipoclorito de sodio y los elementos químicos básicos utilizados por los servicios de limpieza.




Foto 90



Foto 91

DIMENSIONES:

100 %

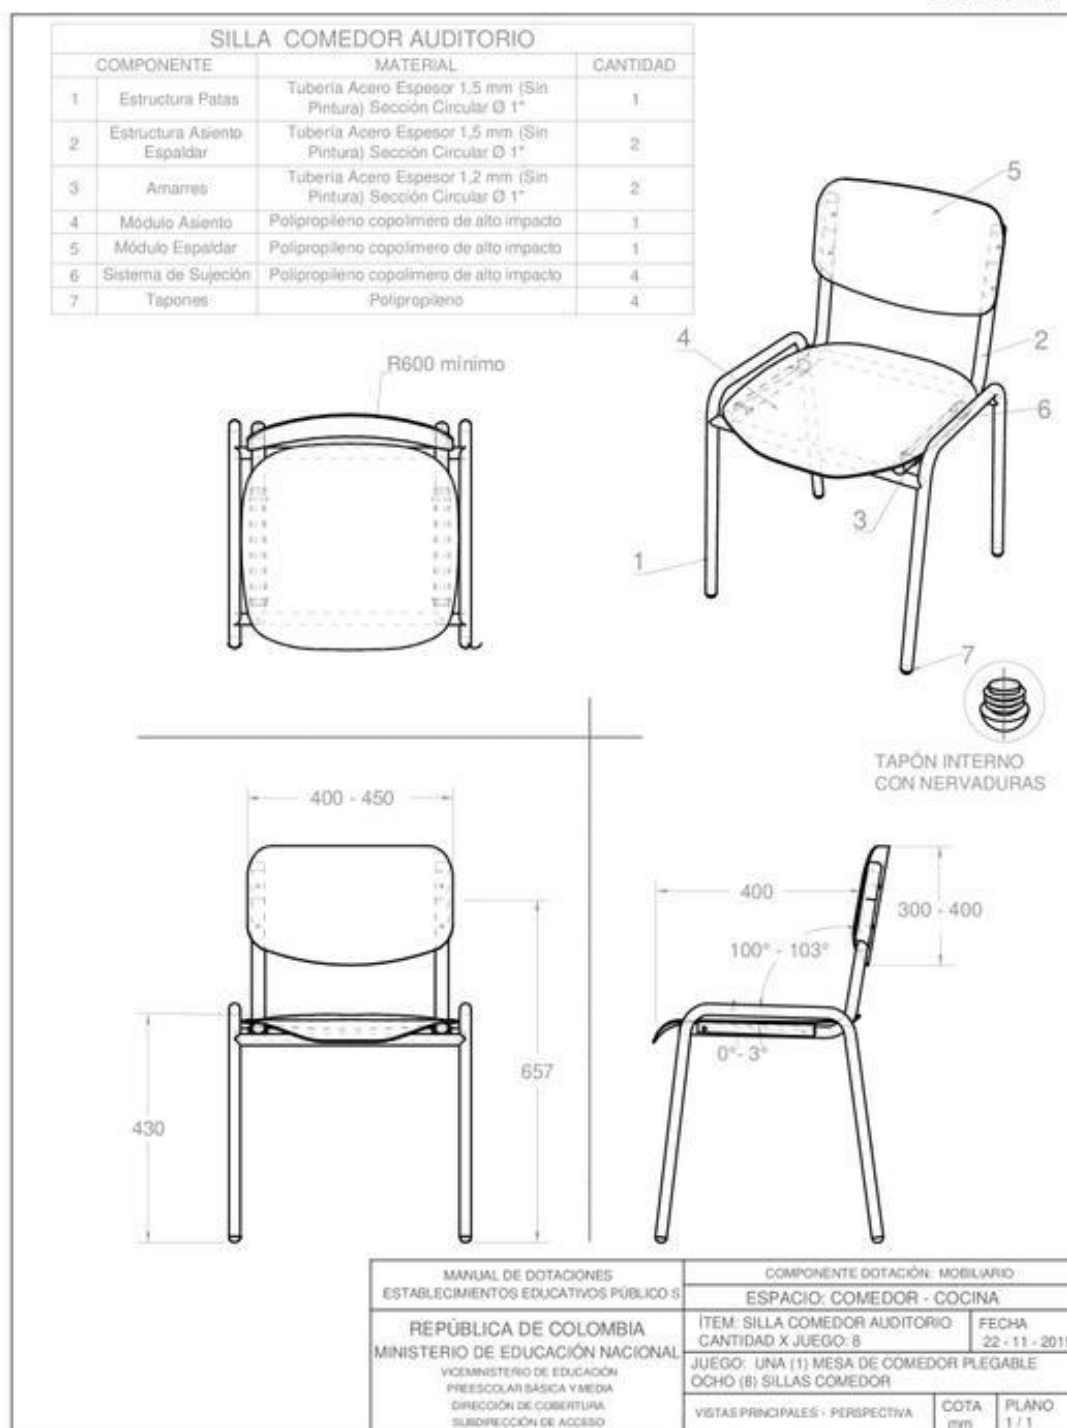

51

ITEM 1. Altura del plano del asiento desde el piso - 430 mm

100 %

DIMENSION::

CUMPLE



Foto 92

ITEM 2: Profundidad del asiento - 400 mm

100 %

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 93



Foto 94

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 95



Foto 96

ITEM 4: Ancho del espaldar - 400 - 450 mm

100 %

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 97



Foto 98

ITEM 4: Altura del espaldar - 300 - 400 mm

100 %

DESCRIPCION:

CUMPLE



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102

ITEM 5: Altura al punto medio del espaldar del

100 %

espaldar desde el piso - 657 mm

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 103



Foto 104

ITEM 6: Radio de curvatura del espaldar 600 mm

100 %

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109

ITEM 7: Inclinación del asiento respecto a la horizontal - 4°

100 %

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 110

ITEM 8: Angulo del plano del asiento con el espaldar 94°

100 %

DIMENSION:

CUMPLE



Foto 111

VERIFICACION PLANTA DE PRODUCCION:

SOLDADURA:



Foto 112

PINTURA:



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116

ENSAMBLE:



Foto 117



Foto 118

CORTE Y DOBLADO



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122

MADERA:



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127

PLASTICOS:



Foto 128

Foto 129

Foto 130

Foto 131

Foto 132

Foto 133

OBSERVACIONES Y FIRMA:

OBSERVACIONES:

el mueble evaluado, cumple
con todas las especificaciones
tecnicas solicitadas

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

ninguna

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

INGENIERO INDUSTRIAL -
EDWIN VEGA MONTENEGRO - 1
.075.226.674

ENTIDAD Y CONTACTO:

insergroup isg sas - contratacio
nisc@gmail.com

FIRMA:



14.10.2022 09:39 -05

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

ARQUITECTO JUAN FELIPE
PEREZ CASTILLO - 79155142

ENTIDAD Y CONTACTO:

insergroup isg sas - contratacio
nisc@gmail.com

FIRMA:



14.10.2022 09:40 -05

FIRMA FUNCIONARIO 3:

NOMBRE Y CEDULA:

Mercedes Laverde (
Coordinadora de Proyectos)

ENTIDAD Y CONTACTO:

manufacturas sumapaz - info@
manufacturassumapaz.com

FIRMA:

FIRMA FUNCIONARIO 4:

NOMBRE Y CEDULA:

ENTIDAD Y CONTACTO:

FIRMA:

Apéndice



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

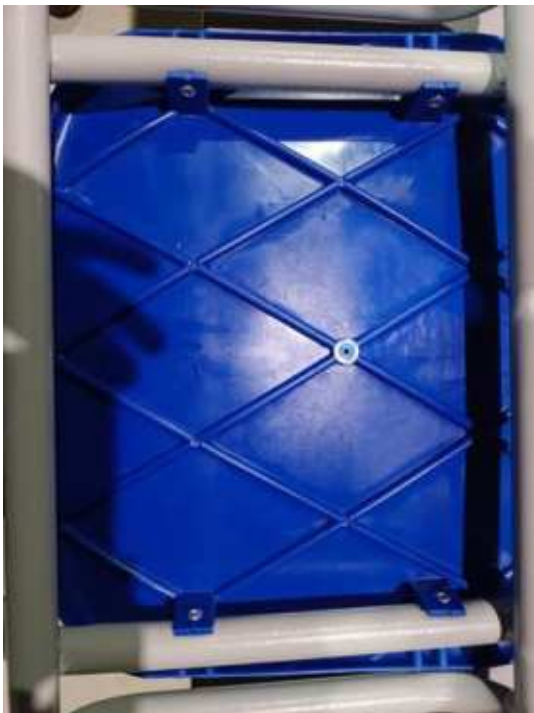


Foto 61



Foto 62

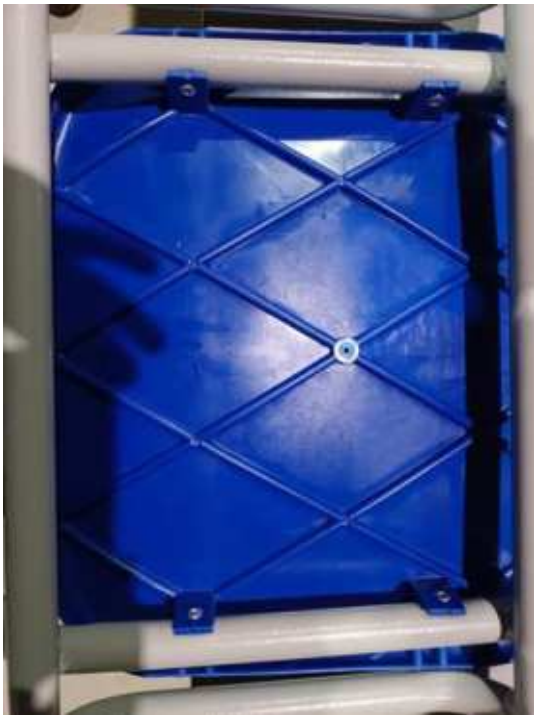


Foto 63



Foto 64



Foto 65

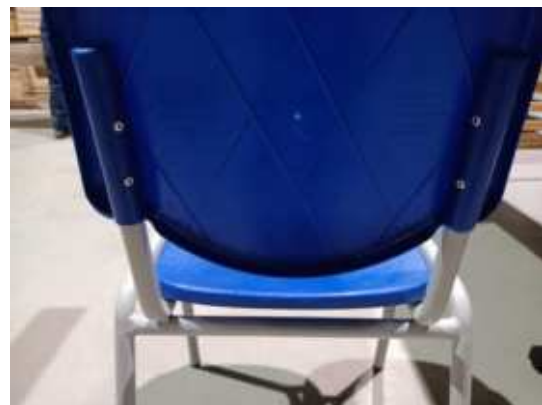


Foto 66



Foto 67

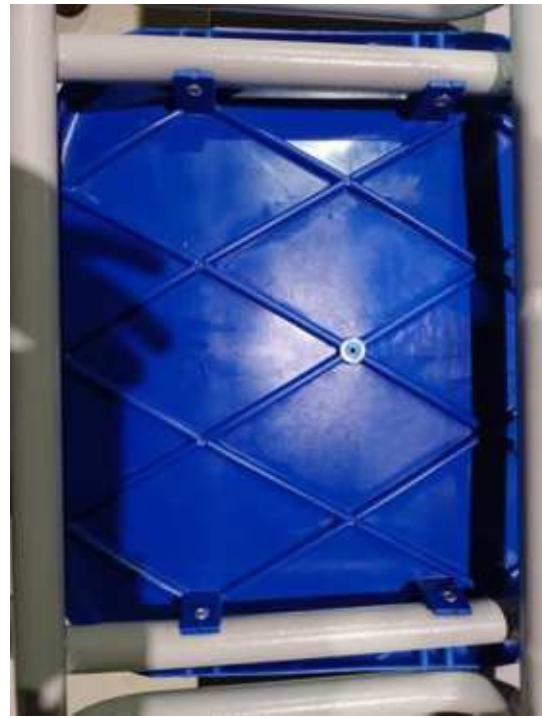


Foto 68

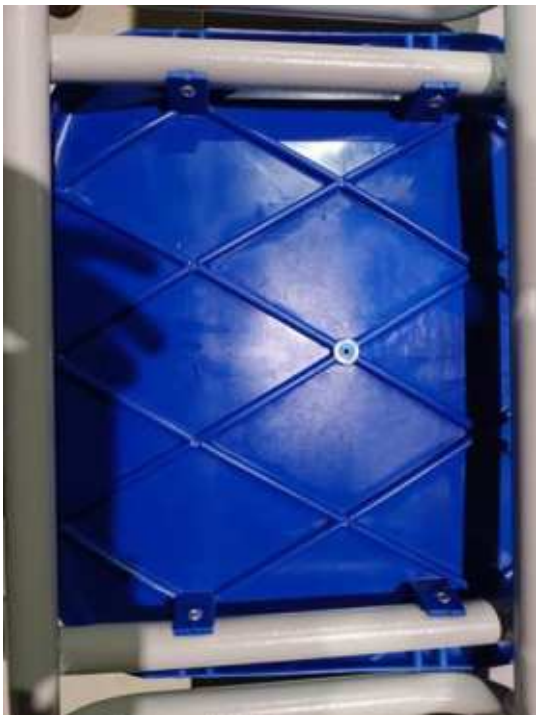


Foto 69



Foto 70

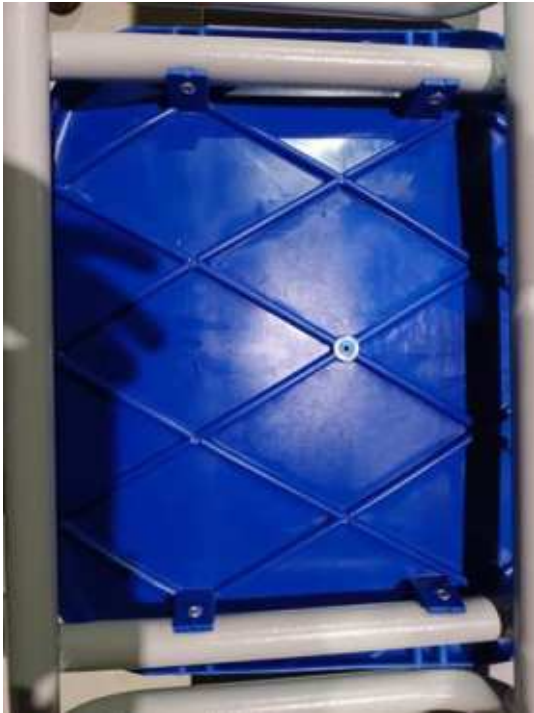


Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92

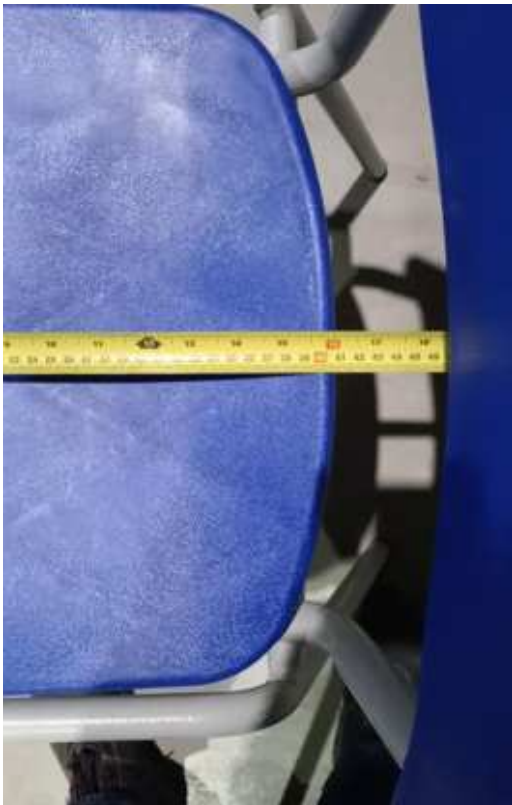


Foto 93



Foto 94



Foto 95

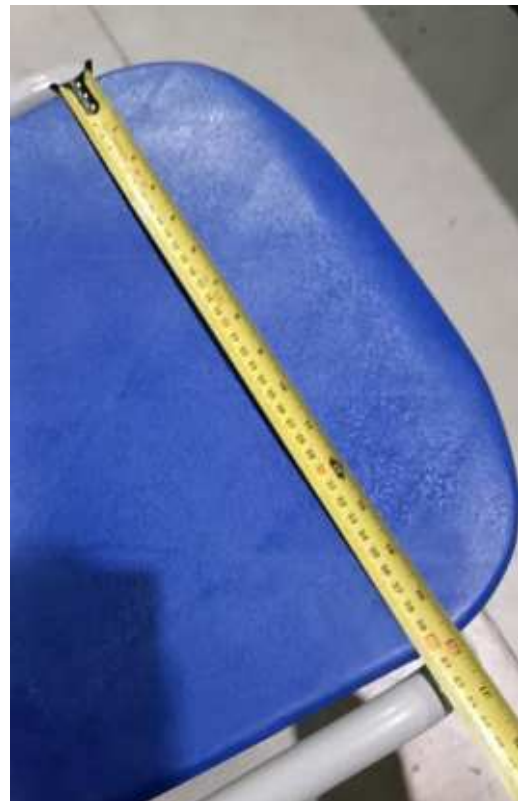


Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133

ANEXO No. 3

ACTA DE INTERVENTORIA – ENTREGA
MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA
93231 DE 2022



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA PLATA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Villa de los Andes Sede el
arrayan



Photo 1

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

09.11.2022 20:19 UTC

UBICACION:



Photo 2



Photo 3



Photo 4




Photo 5


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

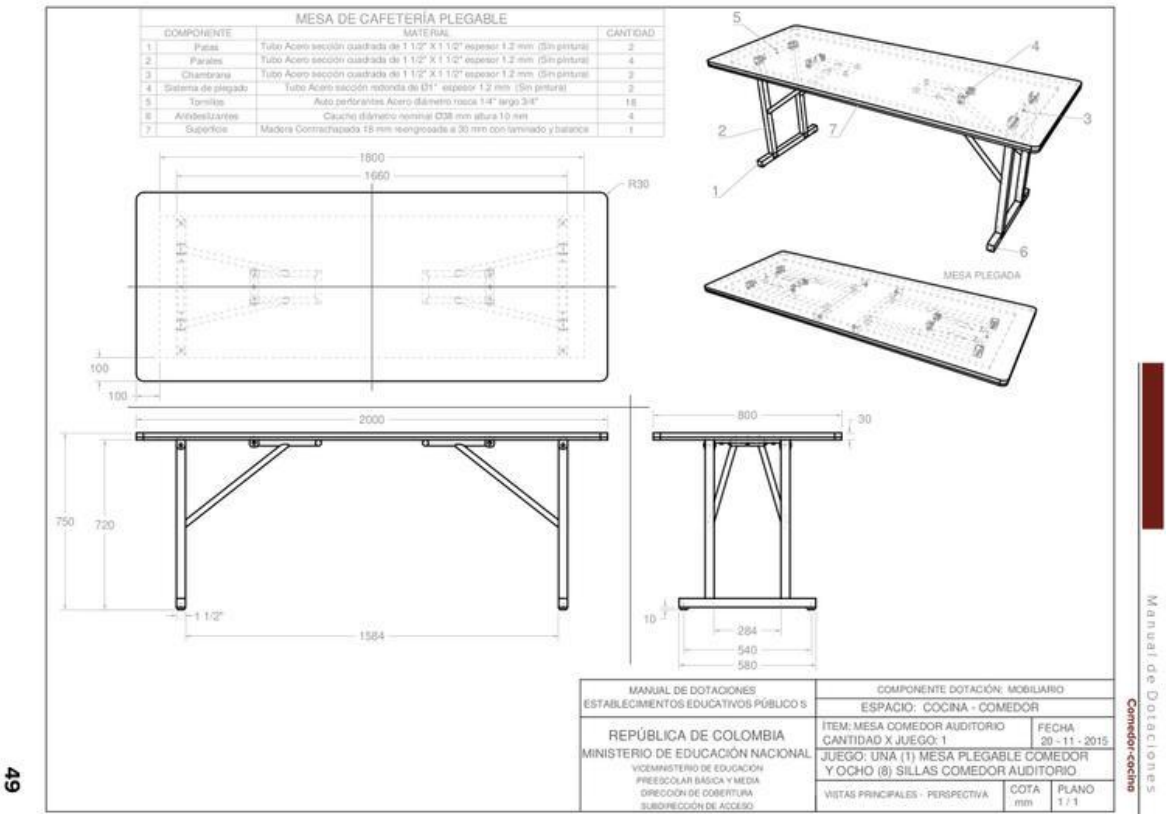

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 6




Photo 7



Photo 8



Photo 9


CANTIDADES ENTREGADAS:

2

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

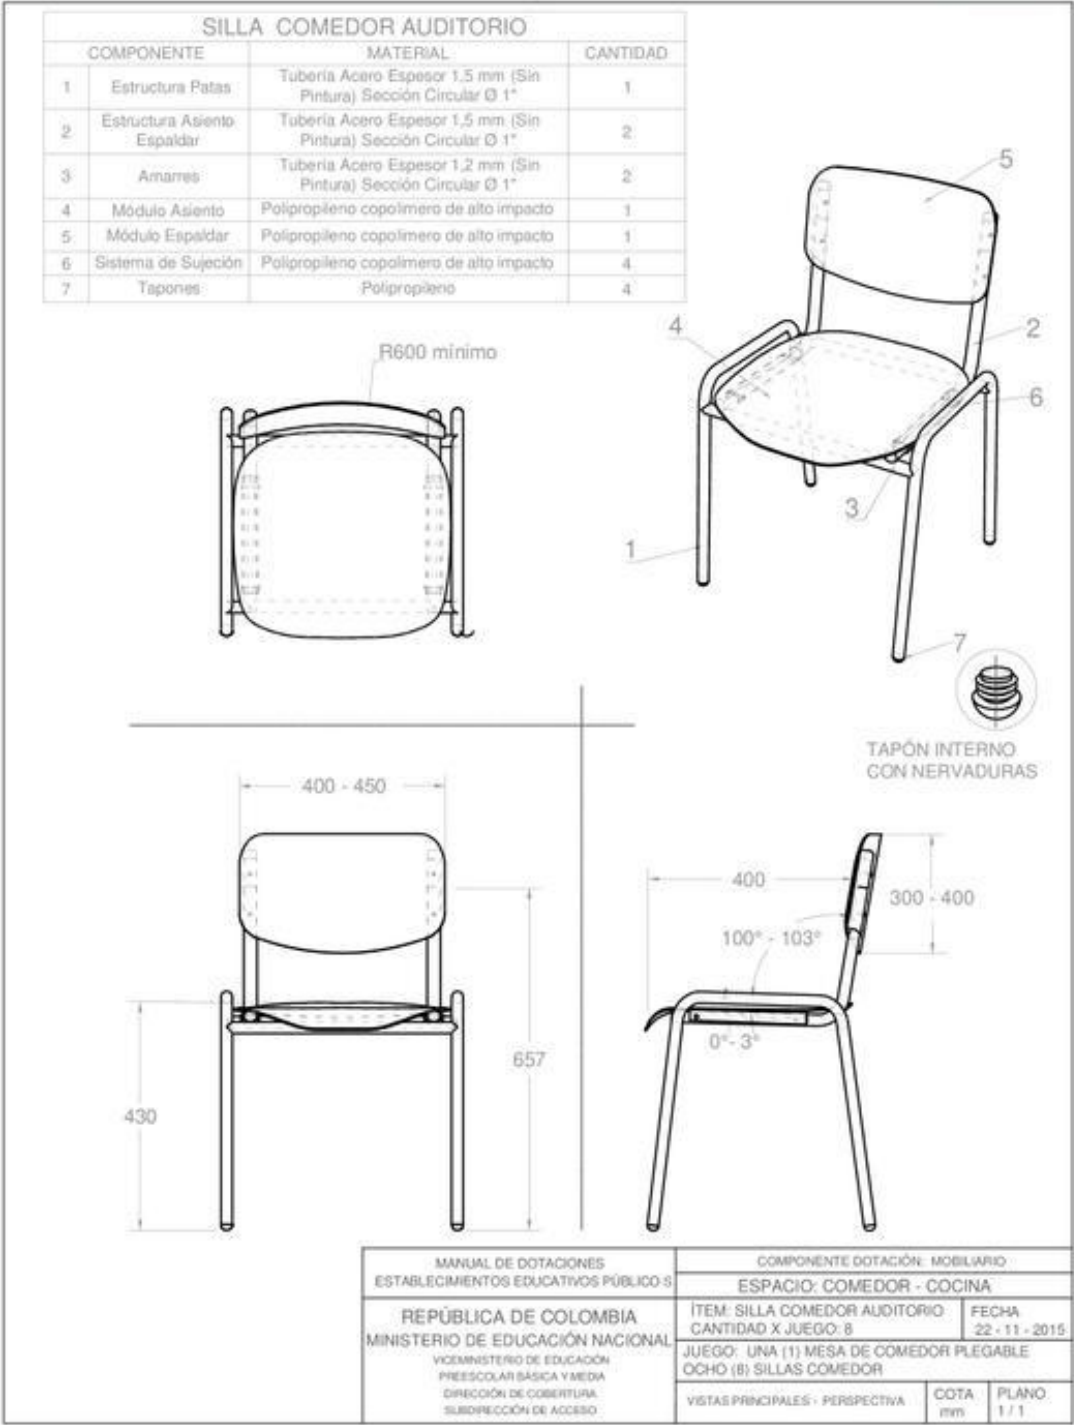

EVALUACION:

CUMPLE




Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

CANTIDADES ENTREGADAS:

16

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE




Photo 15




Photo 16




Photo 17




Photo 18




Photo 19

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE




Photo 20




Photo 21




Photo 22

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE




Photo 23




Photo 24




Photo 25

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE




Photo 26




Photo 27




Photo 28




Photo 29

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 30




Photo 31

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 32



Photo 33

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Dumar Benavides Gómez cc
76293562

ENTIDAD Y CONTACTO:

El arrayan

FIRMA:



dumar Benavides Gómez
09.11.2022 20:26 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
09.11.2022 20:26 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

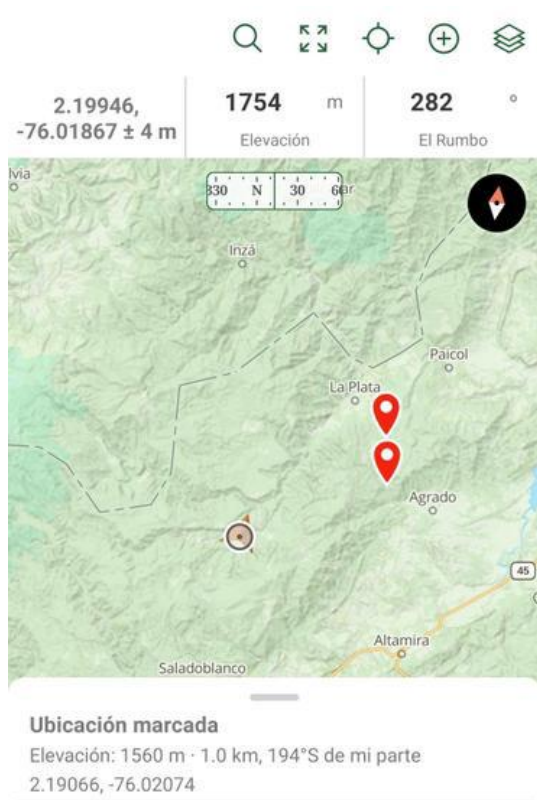


Photo 5

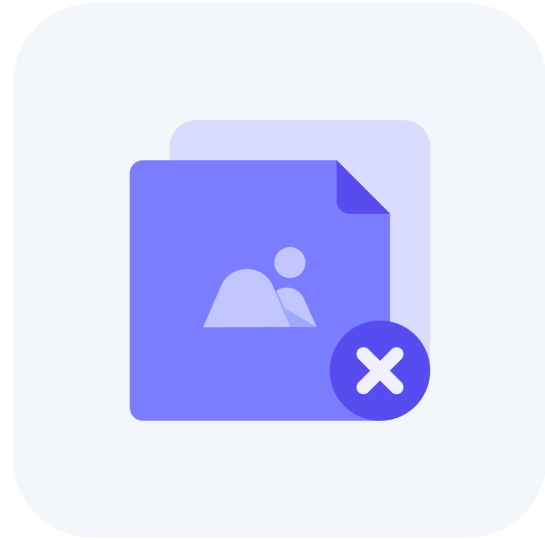


Photo 6

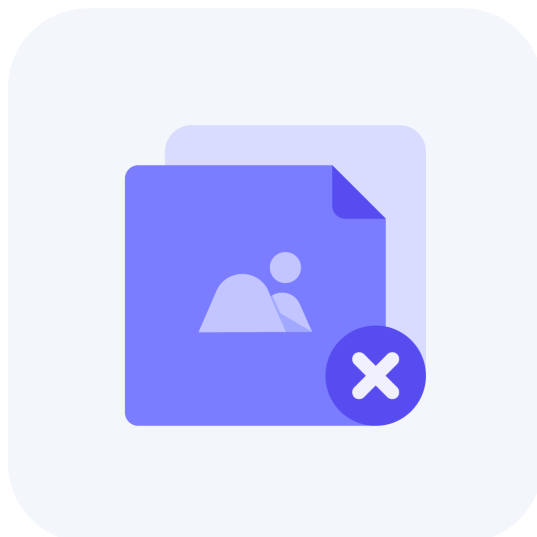


Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13

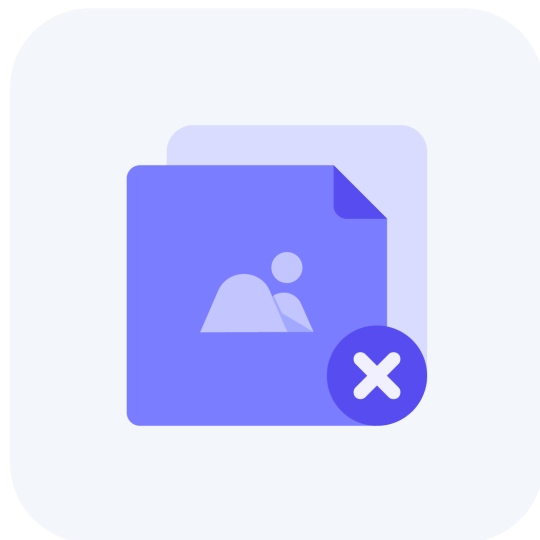


Photo 14



Photo 15

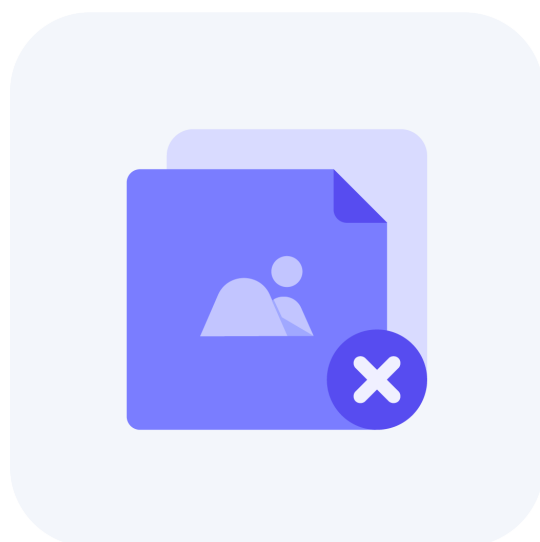


Photo 16



Photo 17

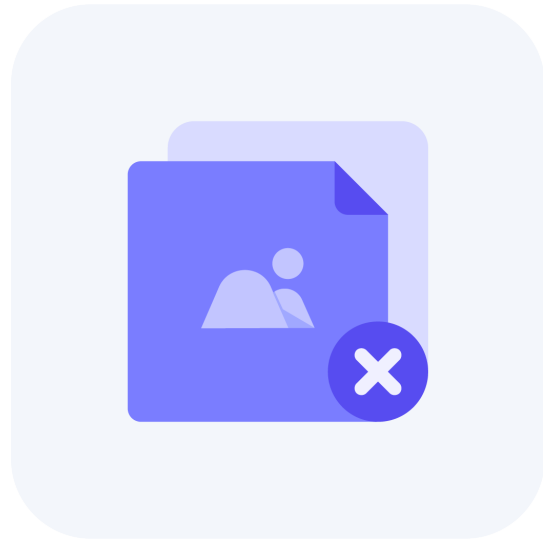


Photo 18



Photo 19

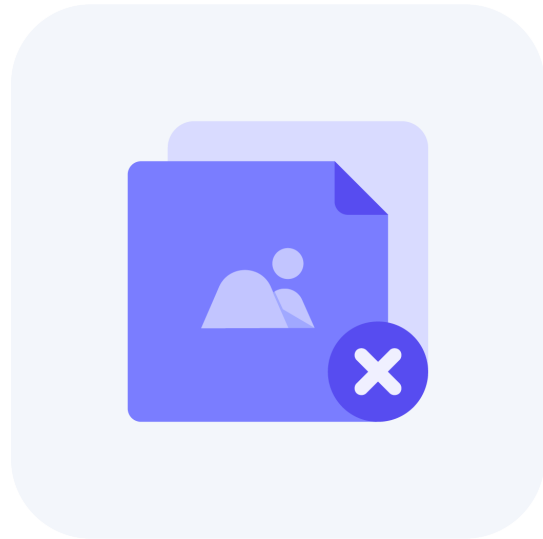


Photo 20

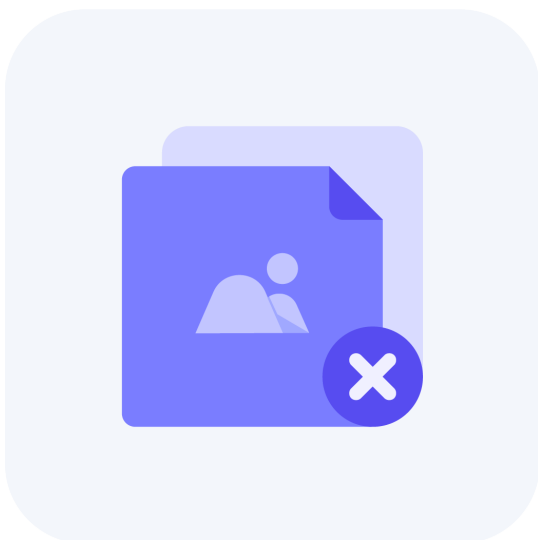


Photo 21

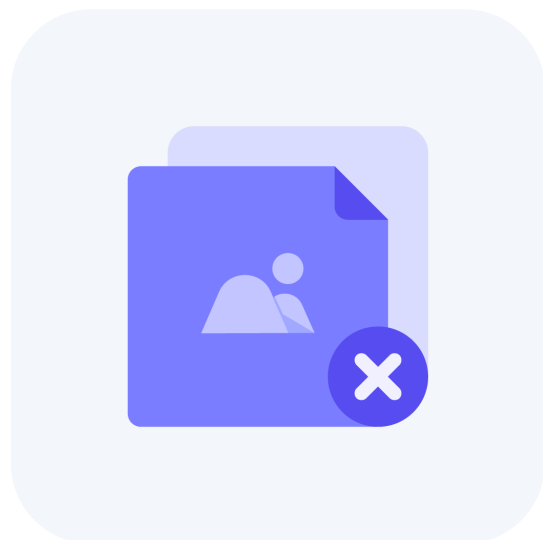


Photo 22



Photo 23

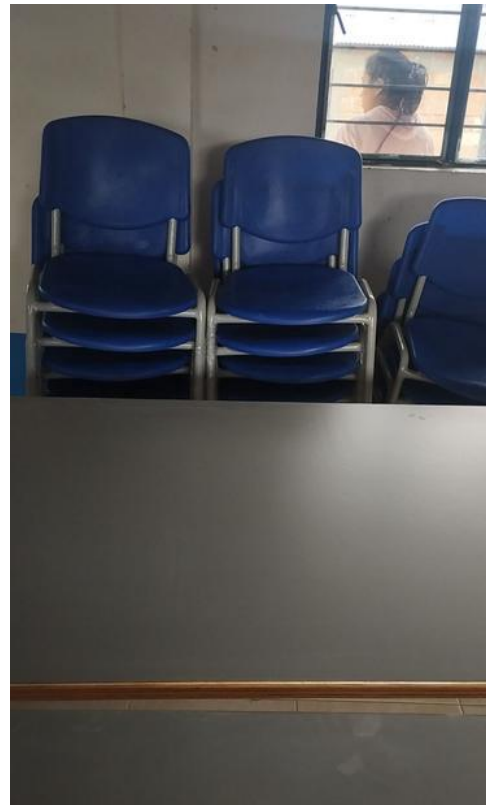


Photo 24

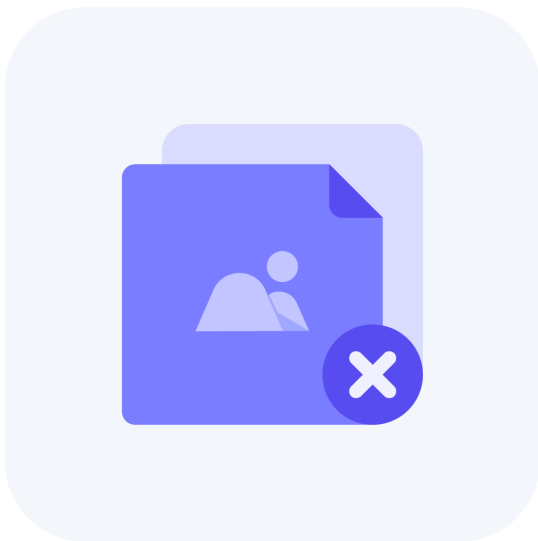


Photo 25

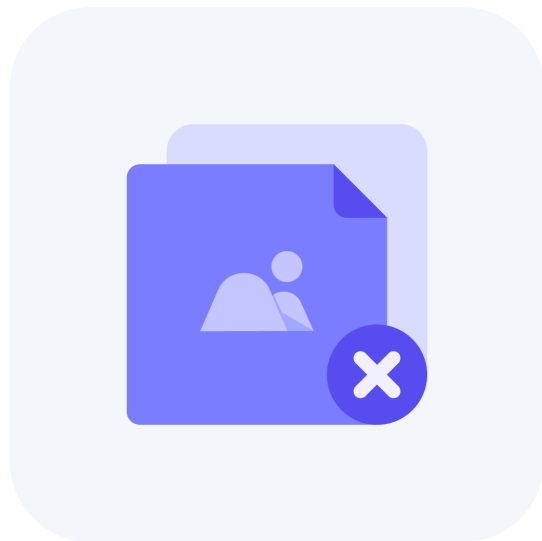


Photo 26



Photo 27



Photo 28

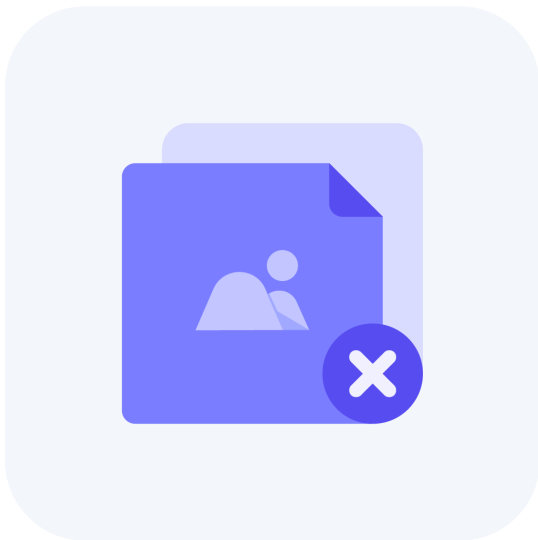


Photo 29

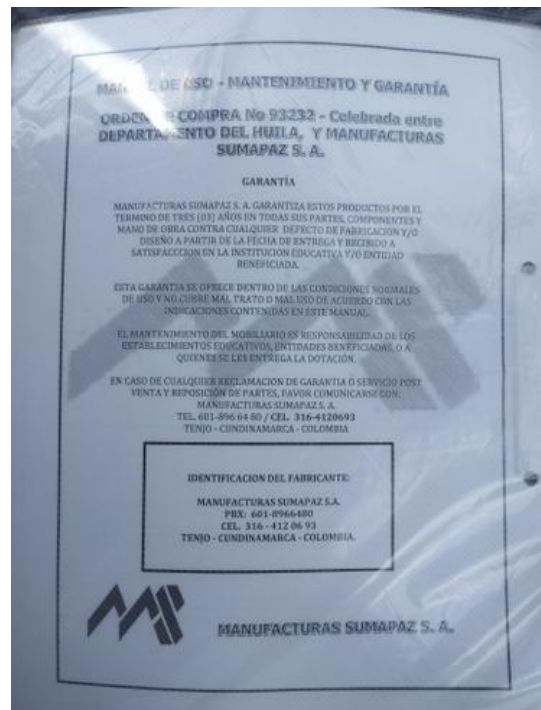


Photo 30

Photo 33



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERTGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA ARGENTINA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Betania



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

IMAGENES:




Photo 5




Photo 6

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERTGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

08.11.2022 18:24 UTC

UBICACION:

57, Cra. 3 #N° 10 - 04, La
Argentina, Huila, Colombia
(2.199507,
-75.98005800000001)



Photo 7




Photo 8


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

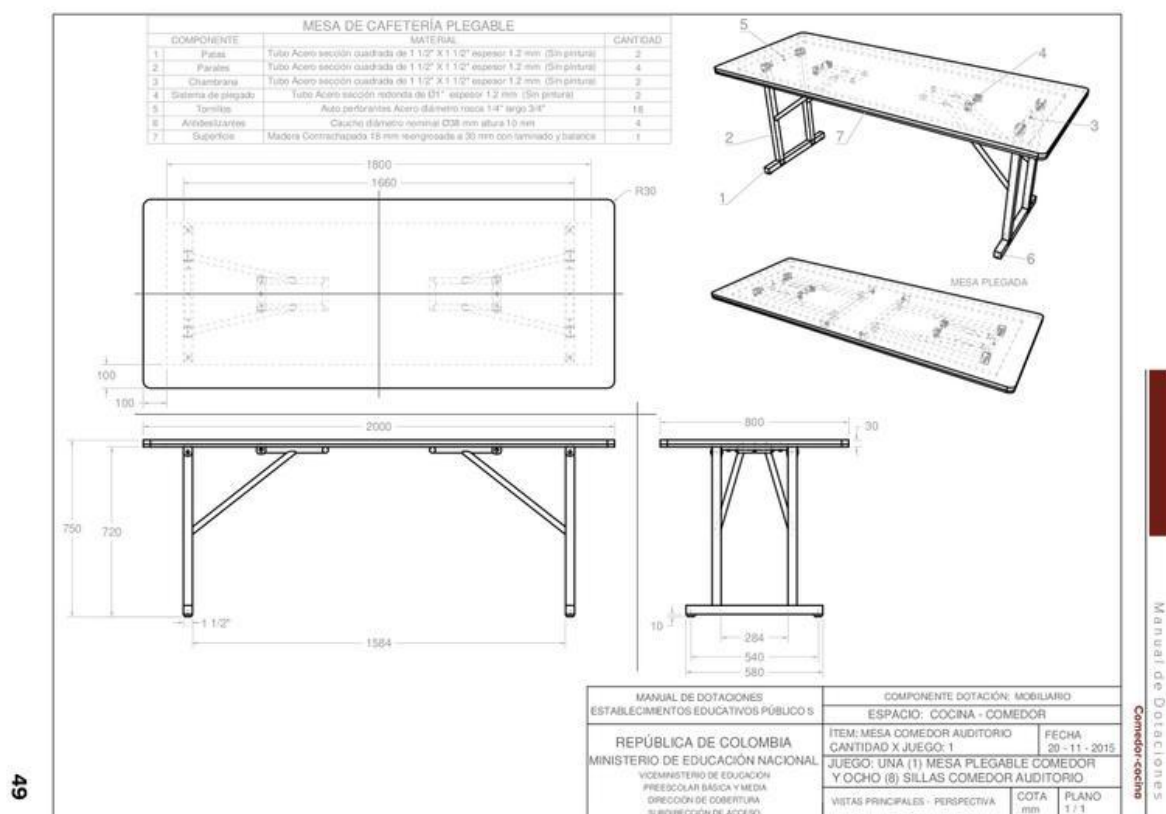

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15

CANTIDADES ENTREGADAS:

4

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

Manual de Dotaciones

Comedor-cocina

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Anillos	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

400 - 450

657

430

300 - 400

100° - 103°

0° - 3°

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO		FECHA	
CANTIDAD X JUEGO: 8		22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE			
OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:



Photo 16



Photo 17



Photo 18




Photo 19



Photo 20



Photo 21

CUMPLE

CANTIDADES ENTREGADAS:

32

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26




Photo 27




Photo 28

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE




Photo 29



Photo 30




Photo 31




Photo 32



Photo 33



Photo 34

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE




Photo 35




Photo 36




Photo 37

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 38

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 39




Photo 40




Photo 41



Photo 42

OBSERVACIONES Y FIRMA:

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Jesús hermando gaitán cc
1490521

ENTIDAD Y CONTACTO:

Betania

FIRMA:



Jesús hermando gaitán
08.11.2022 18:16 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
08.11.2022 18:18 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25

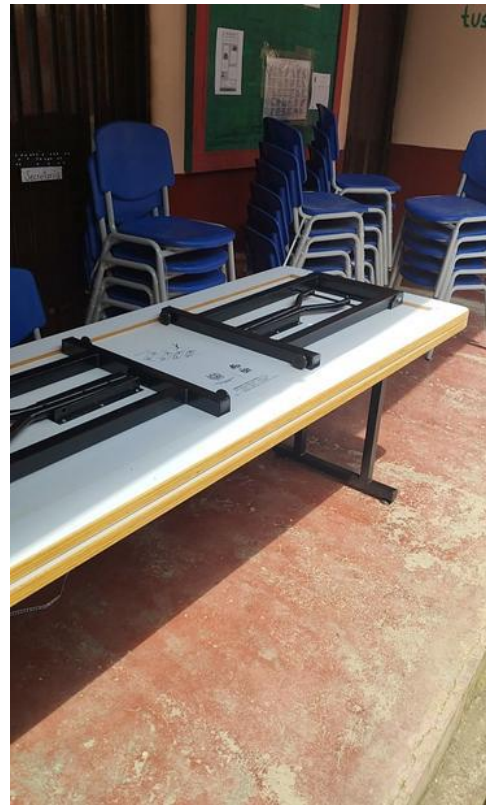


Photo 26



Photo 27



Photo 28

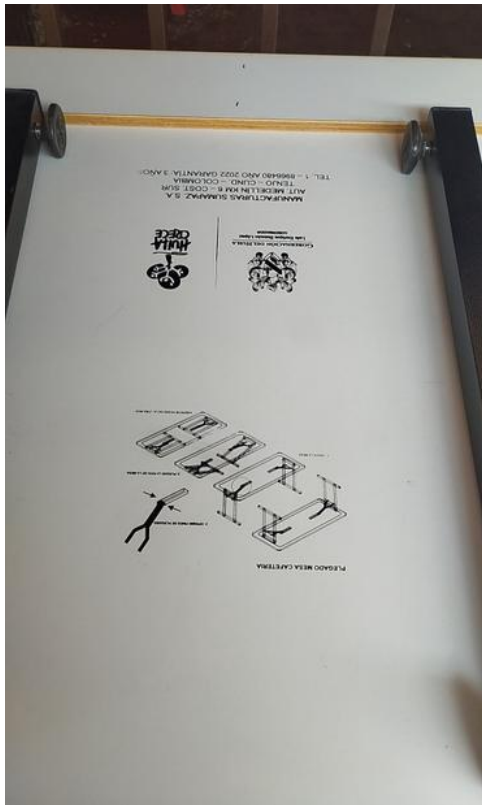


Photo 29



Photo 30



Photo 31

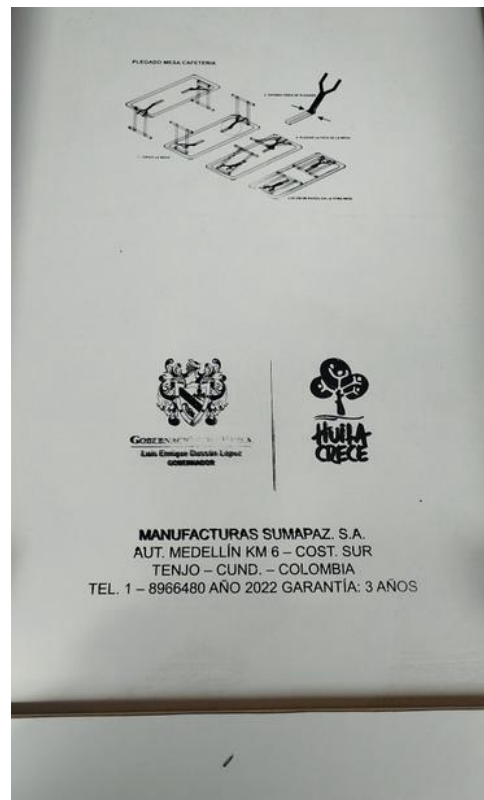


Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37

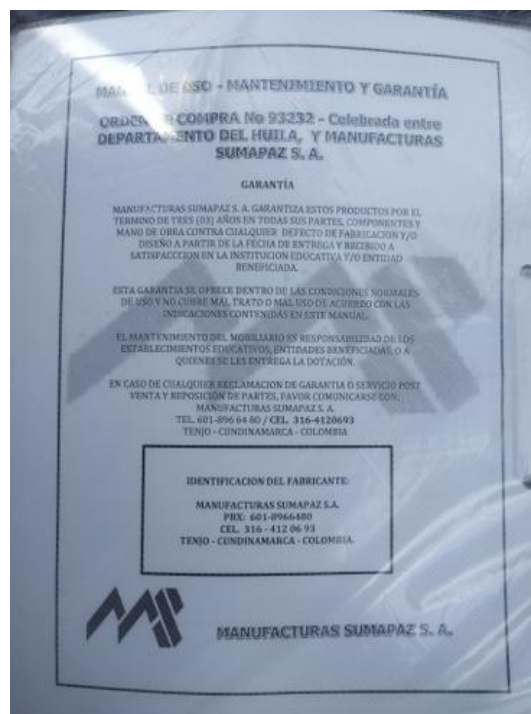


Photo 38

GOBERNACIÓN DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO
Código: 90N-C043-F06
Fecha Aprobación: 15/01/2018
Versión: 1
Página 3 de 12

ACTA DE ENTREGA - RECIBO

X CONTRATO DE CONVENIO DE	ORDEN DE COMPRA	Nº	AÑO
		93232	2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA O CONVENIENTE:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. (Unión Temporal o Consorcio) NIT O CC: 800038446-5 REPRESENTANTE LEGAL Y A cada uno de los integrantes: JAIME ALIRIO CARRERO MORENO CC: 10266902		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
VALOR DE CONTRATO:	\$ 1.131.043.952,41 MCTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022		
FECHA DE INICIO (dd/mm/aa):	10 DE OCTUBRE DE 2022		
DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO IDENTIFICACIÓN: 1.075.224.712 CARGO: P.L. INSERGROUP ISO SAS INTERVENTORIA		
DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: Jesús Hernando Gaitán Velasco IDENTIFICACIÓN: 1490541 CARGO: Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA: BETANIA SEDE: BLANCA LUCIA RICHARD		

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huil.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 39

GOBERNACIÓN DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO
Código: 90N-C043-F06
Fecha Aprobación: 15/01/2018
Versión: 1
Página 4 de 12

RELACION DE LA ENTREGA:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	LA ARGENTINA Institución educativa BETANIA Sede: BLANCA LUCIA RICHARD
0402-237	Puesto de comedor	Ocho (8) sillas cafetería - auditorio. Una (1) mesa de cafetería plegable.	1	\$1.098.794
SUBTOTAL				\$1.098.794
IVA 19%				\$208.771
TOTAL				\$1.307.565

En el Municipio de LA ARGENTINA, a los _____ se deja constancia que **MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO** en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría profesional **INSERGROUP ISO SAS** firma Interventoria, entrega los bienes a satisfacción, ya que cumple con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Número 93232.

Alejandra Torres Ninco
Quién Entrega

Jesús Hernando Gaitán Velasco
Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huil.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 40

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: SGN-C842-F06
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO	Fecha Aprobación: 15/01/2014
		Versión: 1
		Página 1 de 12

ACTA DE ENTREGA - RECIBO

X CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA	N°:	93232	AÑO:	2022
CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION				
CONTRATISTA O CONVIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A			
	NIT O CC:	800028446 - 5			
	REPRESENTANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO			
	CC:	19266902			

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR DE CONTRATO:	VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CERO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	10 DE OCTUBRE DE 2022				

DATOS DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
	IDENTIFICACIÓN: 1.075.224.712
	CARGO: RL INSEGROUP ISG SAS INTERVENTORIA

DATOS DE QUIEN RECIBE	NOMBRE: Jesús Hernando Gaitán Velasco
	IDENTIFICACIÓN: 1490524
	CARGO: Rector
	INSTITUCION EDUCATIVA: BETANIA

SEDE: BETANIA

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina Neiva - Huila - Colombia PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co Twitter @HuilaGov Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 41

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO Código: SGN-C842-F06 Fecha Aprobación: 15/01/2014 Versión: 1 Página 1 de 12	
---	--

RELACION DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANT
8000-207	Unidad de almacenamiento	\$ 1.000.000,00	3
8000-208	Unidad de almacenamiento	\$ 1.000.000,00	3
8000-209	Unidad de almacenamiento	\$ 1.000.000,00	3
SUBTOTAL		\$ 3.000.000,00	
IVA 19%		\$ 570.000,00	
TOTAL		\$ 3.570.000,00	

Este es el documento de la ADMINISTRACIÓN, a los fines de la entrega de los bienes, el cual debe ser firmado por el representante legal de la institución, en el momento de la entrega, y por el representante legal de la institución, en el momento de la recepción de los bienes.

Alcides Ben Nino
Rector

Jesús Hernando Gaitán Velasco
Rector

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina Neiva - Huila - Colombia PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co Twitter @HuilaGov Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 42



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA ARGENTINA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Las tolas sede el mirador



Photo 1



Photo 2



Photo 3

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

08.11.2022 22:18 UTC

UBICACION:



Photo 4

100%

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE



Comedor-cocina

CUMPLE



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



3

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

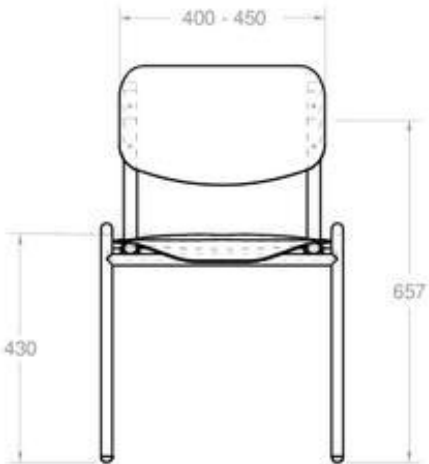

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO		FECHA	
CANTIDAD X JUEGO: 8		22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 11

Photo 12

Photo 13

CANTIDADES ENTREGADAS:

24

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 28

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 29



Photo 30

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Emid Gómez cc 55212085

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede el mirador

FIRMA:



emid Gómez
08.11.2022 22:24 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
08.11.2022 22:24 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27

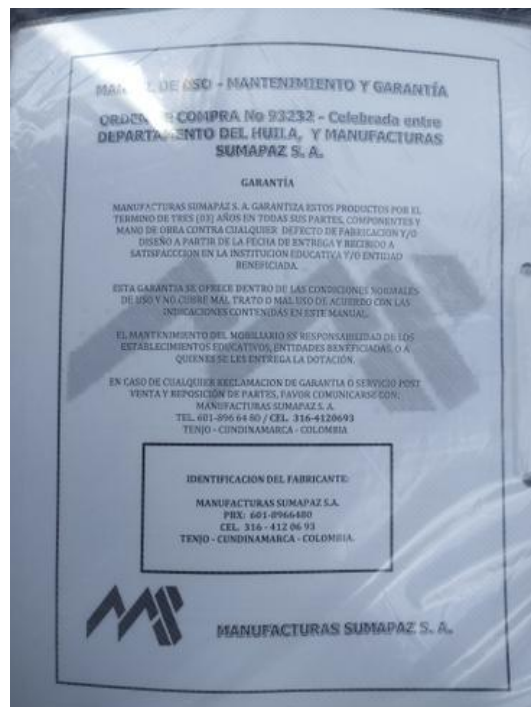


Photo 28

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: SGN-C042-F06	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Fecha Aprobación: 15/01/2018	
			Versión: 1	
			Página 5 de 12	

ACTA DE ENTREGA - RECIBO

X CONTRATO DE CONVENIO DE:	ORDEN DE COMPRA	N°:	93232	AÑO:	2022
----------------------------	-----------------	-----	-------	------	------

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
CONTRATISTA O CONVIENTE:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Unión temporal o Consorcio)	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A			
	NIT O CC:	800026446 - 5			
	REPRESENTANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO			
	CC:	19289602			

OBJETO:	S 1131 043 902 X1 MCIE				
VALOR DE CONTRATO:	VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES, CERCO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCIE INCLUIDO IVA				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022				
FECHA DE INICIO (dd/mm/aa):	10 DE OCTUBRE DE 2022				

DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO				
	IDENTIFICACIÓN: 1.875.224.712				
	CARGO: R.L. INSENGROUP ISG SAS INTERVENTORIA				

DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: <u>Emis Camacho Alvarado</u>				
	IDENTIFICACIÓN: <u>55212085</u>				
	CARGO: <u>Secretario</u>				
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LAS TOLDAS				
	SEDE: EL MIRADOR				

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57-8) 8671300
www.huil.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 29

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: SGN-C042-F06	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Fecha Aprobación: 15/01/2018	
			Versión: 1	
			Página 6 de 12	

RELACIÓN DE LA ENTREGA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANT.	LA ARGENTINA Institución educativa LAS TOLDAS Sede: EL MIRADOR
dt02-237 Puesto de comedor	Ocho (8) sillas cafetería - auditorio Una (1) mesa de cafetería plegable	\$1.098.794,20	3	\$3.296.383
SUBTOTAL				\$3.296.383
IVA 19%				\$626.313
TOTAL				\$3.922.696

En el Municipio de LA ARGENTINA, a los _____ se deja constancia que MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría profesional INSENGROUP ISG SAS firma interventora, entrega los bienes a satisfacción ya que cumple con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Número 93232

Alejandra Torres Nino Quién Entrega [Firma] Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57-8) 8671300
www.huil.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 30



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERTGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA: 100%

DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NATAGA

INSTITUCION EDUCATIVA: Sede los laureles



Photo 1



Photo 2



Photo 3

IMAGENES:

ELABORADO POR: CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD: INSERGROUP ISG SAS - FIRMA INTERVENTORA

FECHA:

UBICACION:


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

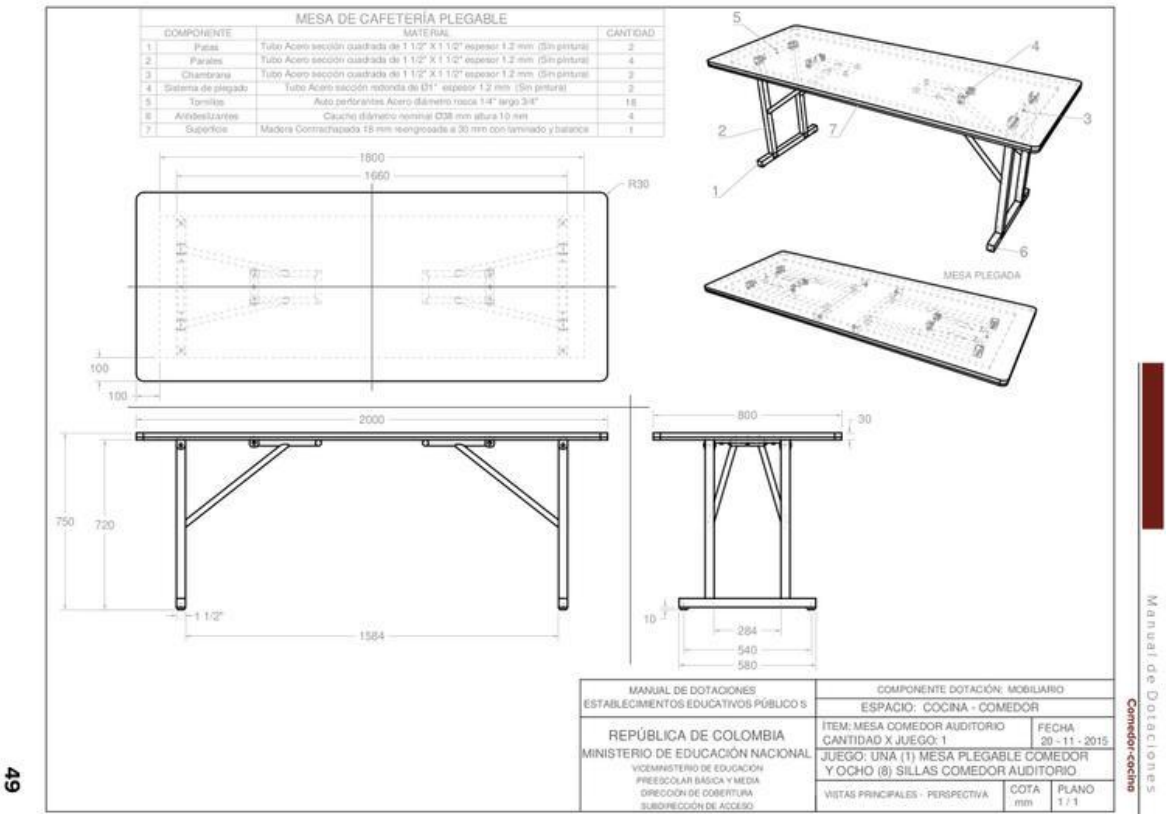

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 4



Photo 5

CANTIDADES ENTREGADAS:

3

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

400 - 450

430

657

1 2 3 4 5 6 7

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

400

300 - 400

100° - 103°

0° - 3°

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO		FECHA	
CANTIDAD X JUEGO: 8		22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE			
OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 6

Photo 7

CANTIDADES ENTREGADAS:

24

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 8



Photo 9




Photo 10

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE




Photo 11




Photo 12



Photo 13

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE



Photo 14



Photo 15




Photo 16



Photo 17

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE

OBSERVACIONES Y FIRMA:

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

ENTIDAD Y CONTACTO:

FIRMA:

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

ENTIDAD Y CONTACTO:

FIRMA:

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA ARGENTINA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Las tolas sede el mirador



Photo 1



Photo 2



Photo 3

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

08.11.2022 22:18 UTC

UBICACION:



Photo 4

100%

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE



Comedor-cocina

CUMPLE



Photo 10

3

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

400 - 450

430

657

400

300 - 400

100° - 103°

0° - 3°

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO		FECHA	
CANTIDAD X JUEGO: 8		22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 11

Photo 12

Photo 13

CANTIDADES ENTREGADAS:

24

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 28

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 29



Photo 30

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Emid Gómez cc 55212085

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede el mirador

FIRMA:



emid Gómez
08.11.2022 22:24 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
08.11.2022 22:24 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27

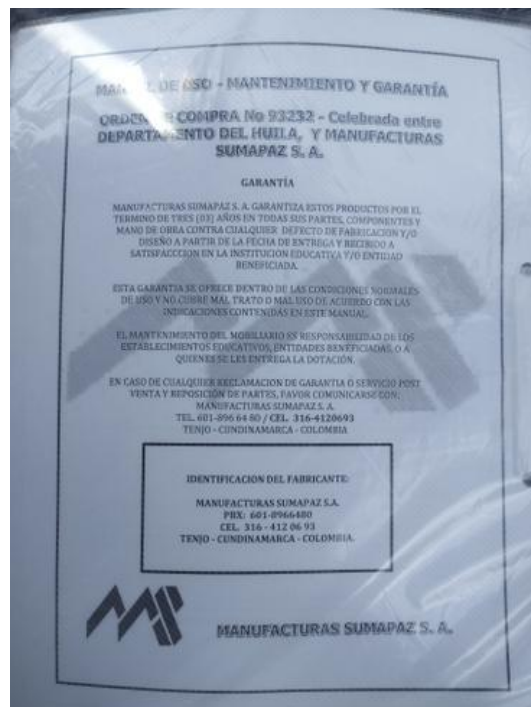


Photo 28

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: SGN-C042-F06	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Fecha Aprobación: 15/01/2018	
			Versión: 1	
			Página 5 de 12	

ACTA DE ENTREGA - RECIBO				
X CONTRATO DE CONVENIO DE:	ORDEN DE COMPRA	N°:	93232	AÑO: 2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
CONTRATISTA O CONVIENTE:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. NIT O CC: 800028446 - 5 REPRESENTANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO CC: 19289902			
OBJETO:	S 11311943192-41 MCIE			
VALOR DE CONTRATO:	VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES, CERCO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCIE INCLUIDO IVA.			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022			
FECHA DE INICIO (dd/mm/aa):	10 DE OCTUBRE DE 2022			
DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO IDENTIFICACIÓN: 1.875.224.712 CARGO: R.L. INSENGROUP ISG SAS INTERVENTORIA			
DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: <u>Emis Camacho Alvarado</u> IDENTIFICACIÓN: <u>55212085</u> CARGO: <u>Secretario</u> INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LAS TOLDAS SEDE: EL MIRADOR			

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57-8) 8671300
 www.huil.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 29

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: SGN-C042-F06	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Fecha Aprobación: 15/01/2018	
			Versión: 1	
			Página 6 de 12	

RELACIÓN DE LA ENTREGA:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANT.	LA ARGENTINA Institución educativa LAS TOLDAS Sede: EL MIRADOR
dt02-237 Puesto de comedor	Ocho (8) sillas cafetería - auditorio. Una (1) mesa de cafetería plegable.	\$1.098.794,20	3	\$3.296.383
SUBTOTAL				\$3.296.383
IVA 19%				\$626.313
TOTAL				\$3.922.696

En el Municipio de LA ARGENTINA, a los _____ se deja constancia que MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría profesional INSENGROUP ISG SAS firma interventoria, entrega los bienes a satisfacción ya que cumple con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Número 93232.

 Quién Entrega
  Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57-8) 8671300
 www.huil.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 30



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA PLATA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Sede alto rico



Photo 1



Photo 2




Photo 3

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERTGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

09.11.2022 18:10 UTC

UBICACION:

La Plata, Huila, Colombia
(2.2255121, -76.0242922)


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

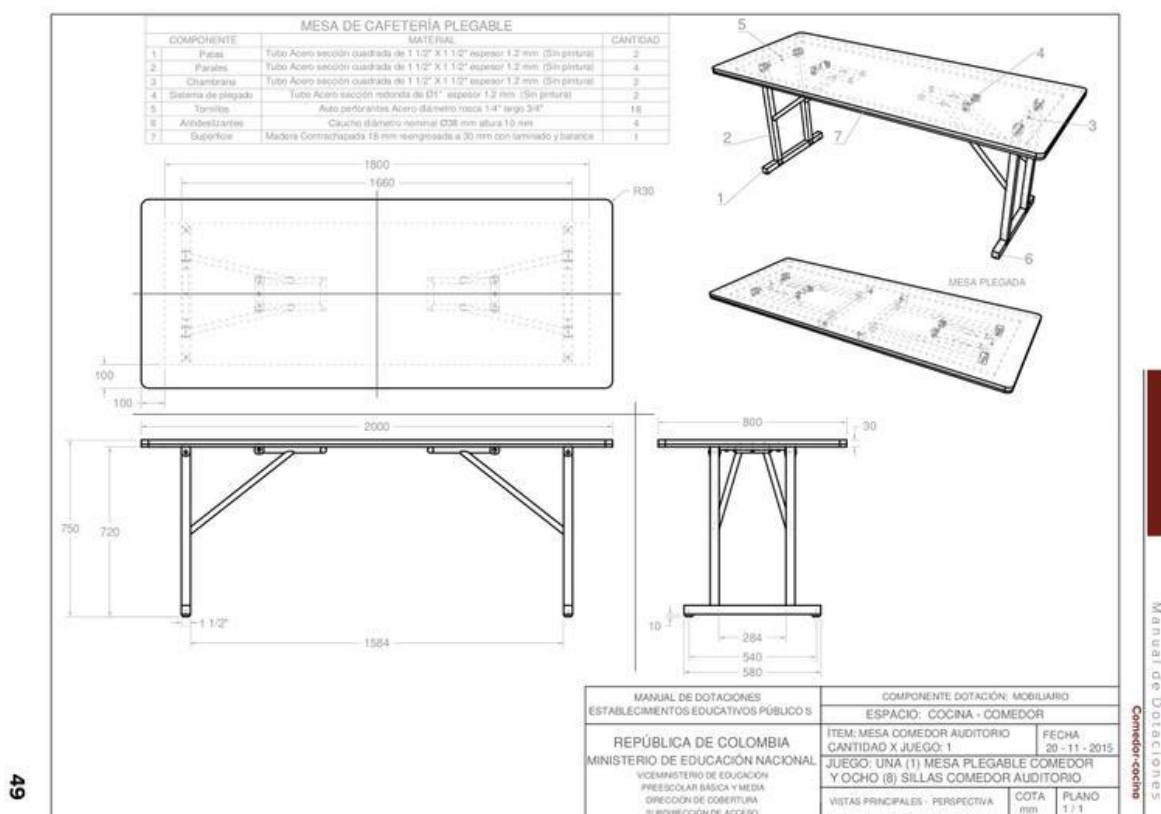

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7


CANTIDADES ENTREGADAS:

1

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

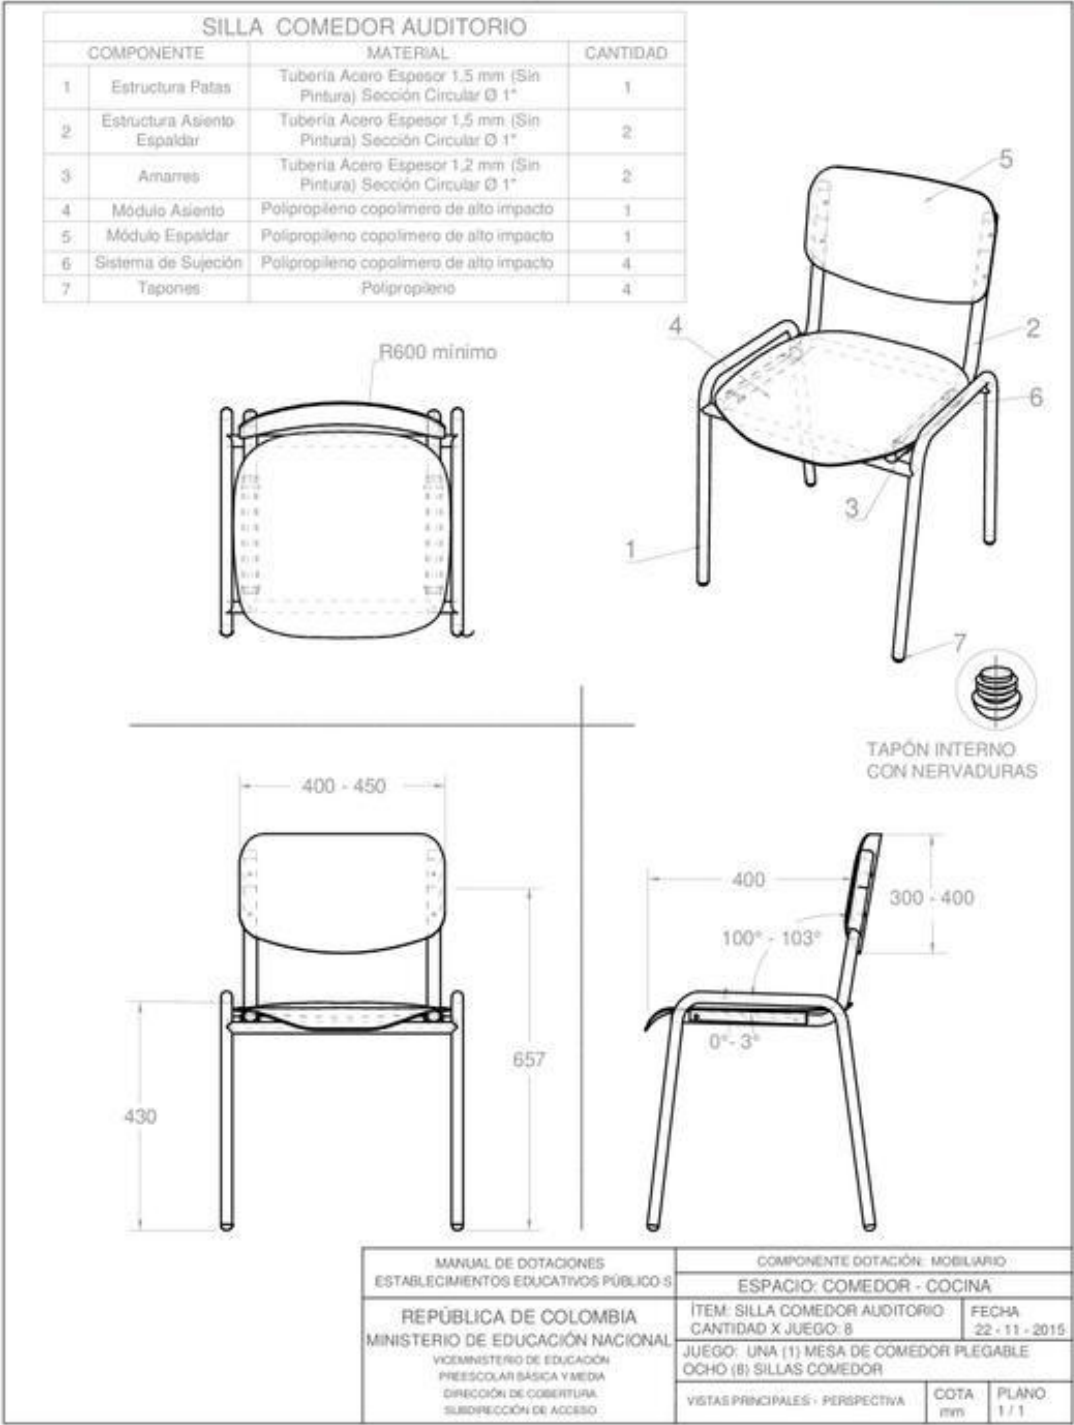

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

CANTIDADES ENTREGADAS:

8

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15




Photo 16

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE



Photo 17



Photo 18



Photo 19

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE



Photo 20



Photo 21



Photo 22




Photo 23

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE



Photo 24




Photo 25



Photo 26



Photo 27

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 28

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 29




Photo 30

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Angela luna pizo cc 34326512

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede alto rico

FIRMA:



Angela luna pizo
09.11.2022 18:16 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
09.11.2022 18:14 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2

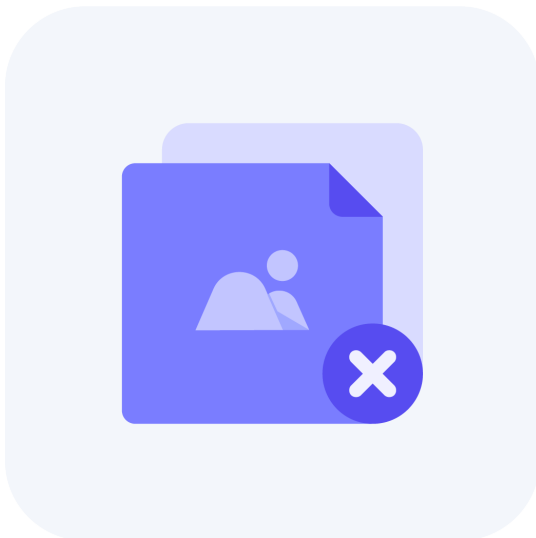


Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18

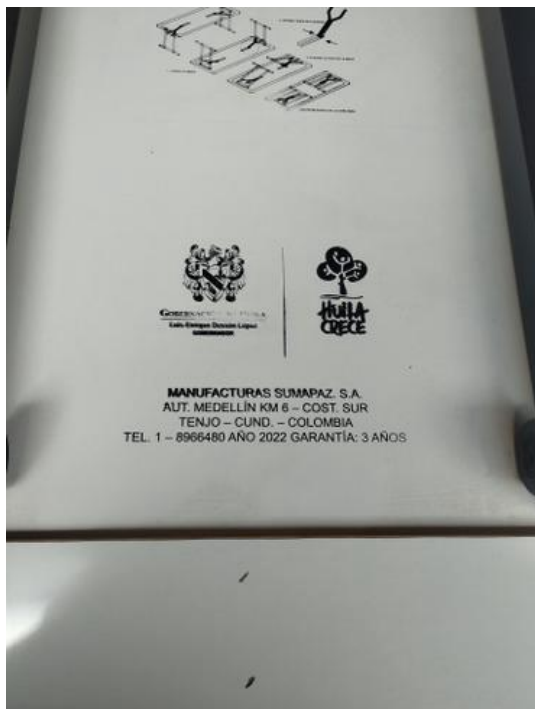


Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27

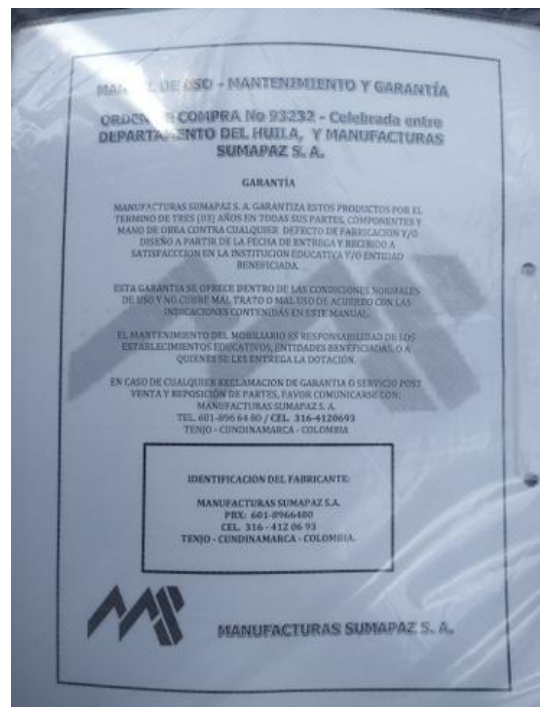


Photo 28

GOBERNACIÓN DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: SGM-0442-FRM
Formato: ACTA DE ENTREGA - RECIBO Fecha Actualización: 15/01/2018 Versión: 1 Página 19 de 108

ACTA DE ENTREGA - RECIBO

A. CONTRATO DE CONVENIO DE:	ORDEN DE COMPRA	N°	93232	AÑO	2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Unión temporal o Consorcio):	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.				
NIT O C.C.	80028446 - 5				
REPRESENTANTE LEGAL Y/o cada uno de los integrantes:	JAIIM ALIRIO CARRERO MORENO				
C.C.	1808962				
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR DE CONTRATO:	\$ 1.131.043.902,41 MCTE				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022				
FECHA DE INICIO (dd/mm/aa):	10 DE OCTUBRE DE 2022				
DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO IDENTIFICACIÓN: 1.675.224.712 CARGO: R.L. INSERGROUP IBG SAS INTERVENTORIA				
DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: <u>Angela Luna Pizo</u> IDENTIFICACIÓN: <u>34.326.512</u> CARGO: <u>Docente</u> INSTITUCIÓN EDUCATIVA: VILLA DE LOS ANDES SEDE: ALTO RICO				

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 29

GOBERNACIÓN DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: SGM-0442-FRM
Formato: ACTA DE ENTREGA - RECIBO Fecha Actualización: 15/01/2018 Versión: 1 Página 19 de 108

RELACION DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	LA PLATA
div02-237	Puestos de comedor	\$1.098.794,29	1	\$1.098.794
	Ocho (8) sillas cafetería - auditorio.			
	Una (1) mesa de cafetería pagafas.			
	SUBTOTAL			\$1.098.794
	IVA 19%			\$208.771
	TOTAL			\$1.307.565

En el Municipio de LA PLATA, a los _____ de _____ de _____, se deja constancia que **MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO**, en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría profesional **INSERGROUP IBG SAS**, firma Interventoría, entrega los bienes a satisfacción, ya que cumplen con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Número **93232**.

Alejandra Torres Ninco. Angela Luna Pizo
Quién Entrega Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 30



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Incomplete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA PLATA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Misael Pastrana Borrero



Photo 1



Photo 2



Photo 3




Photo 4

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERTGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

08.11.2022 14:23 UTC

UBICACION:

Cl. 9 #954, La Plata, Huila,
Colombia
(2.3952385,
-75.89406269999999)


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

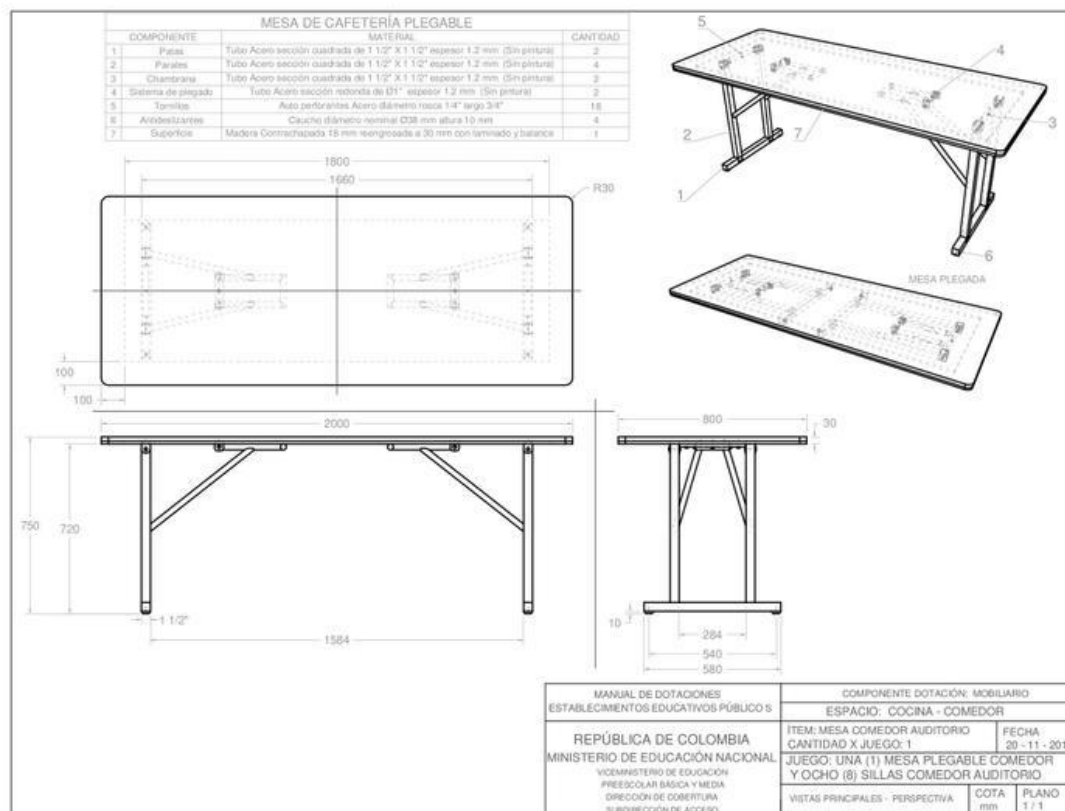

EVALUACION:

CUMPLE




Photo 5




Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9

CANTIDADES ENTREGADAS:



MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

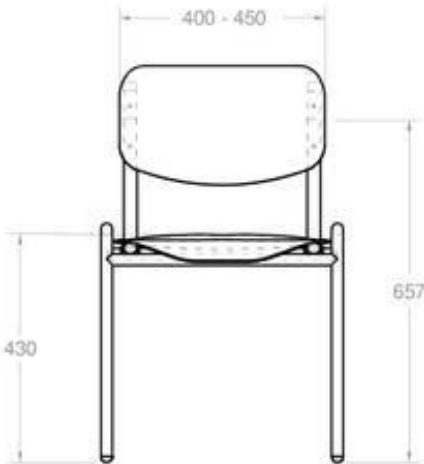

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO-S		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO CANTIDAD X JUEGO: 8		FECHA 22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15



Photo 16

CANTIDADES ENTREGADAS:

16

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE




Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33




Photo 34

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE



Photo 35



Photo 36



Photo 37




Photo 38




Photo 39

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 40




Photo 41

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Jesús Elías manchola cc
83233422

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede coop la plata

FIRMA:



Jesús Elías manchola
08.11.2022 14:29 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Marcos barrera cc 80498810

ENTIDAD Y CONTACTO:

Contratista

FIRMA:



Marcos barrera
08.11.2022 14:28 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39

GOBIERNO DEL HULA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: SIN-CG-EP-01

Formato: ACTA DE ENTREGA - RECIBO

Fecha Actualización: 19/03/2018

Versión: 1

Página 18 de 108

ACTA DE ENTREGA - RECIBO

X. CONTRATO DE CONVENIO DE	ORDEN DE COMPRA	Nº	ABO.	2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HULA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
CONTRATISTA O CONVIENTE:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. (Unión temporal o Consorcio) NIT O CC: 80028466-0 REPRESENTANTE LEGAL Y Ojalá uno de los integrantes: JAIMÉ ALFREDO CARRERO MORENO CC: 19266002			
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE "MUEBLARIO" ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MENORPORNO CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HULA			
VALOR DE CONTRATO:	\$ 1.131.043.902,41 MCTE			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES, CERO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA.			
FECHA DE INICIO (días/mes/año):	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022			
DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO IDENTIFICACIÓN: 1.075.224.712 CARGO: R.L. INSERGROUP ISG SAS INTERVENTORIA			
DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: <u>Jesús Elías Sánchez Collier</u> IDENTIFICACIÓN: <u>52233422</u> CARGO: <u>Coordinador</u> INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MISAEI PASTRANA BORRERO SEDE: COL-COOP-LA PLATA			

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Nohu - Hula - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.hula.gov.co - Twitter @HulaGov - Facebook Gobernación del Hula - El Camino es la Educación

Photo 40

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE LA SALUD		FORMULARIO DE RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIOS FORMULARIO PARA LA EMISIÓN DE RECIBO		FECHA DE EMISIÓN DEL RECIBO FECHA DE RECEPCIÓN DEL RECIBO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
00001-227	Costo de medicamentos y suministros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
00002-227	Costo de honorarios de médicos	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
00003-227	Costo de honorarios de enfermeras	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 6.000,00
00004-227	Costo de honorarios de personal de enfermería	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 8.000,00
00005-227	Costo de honorarios de personal de apoyo	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 10.000,00
00006-227	Costo de honorarios de personal de limpieza	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 12.000,00
00007-227	Costo de honorarios de personal de seguridad	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 14.000,00
00008-227	Costo de honorarios de personal de mantenimiento	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 16.000,00
00009-227	Costo de honorarios de personal de transporte	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 18.000,00
00010-227	Costo de honorarios de personal de alimentación	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 20.000,00
00011-227	Costo de honorarios de personal de alojamiento	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 22.000,00
00012-227	Costo de honorarios de personal de transporte público	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 24.000,00
00013-227	Costo de honorarios de personal de transporte privado	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 26.000,00
00014-227	Costo de honorarios de personal de transporte aéreo	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 28.000,00
00015-227	Costo de honorarios de personal de transporte marítimo	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 30.000,00
00016-227	Costo de honorarios de personal de transporte terrestre	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 32.000,00
00017-227	Costo de honorarios de personal de transporte por carretera	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 34.000,00
00018-227	Costo de honorarios de personal de transporte por ferrocarril	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 36.000,00
00019-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 38.000,00
00020-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 40.000,00
00021-227	Costo de honorarios de personal de transporte por helicóptero	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 42.000,00
00022-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 44.000,00
00023-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 46.000,00
00024-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 48.000,00
00025-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 50.000,00
00026-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 52.000,00
00027-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 54.000,00
00028-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 56.000,00
00029-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 58.000,00
00030-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 60.000,00
00031-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 62.000,00
00032-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 64.000,00
00033-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 66.000,00
00034-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 68.000,00
00035-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 70.000,00
00036-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 72.000,00
00037-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 74.000,00
00038-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 76.000,00
00039-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 78.000,00
00040-227	Costo de honorarios de personal de transporte por avión de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	\$ 80.000,00
00041-227	Costo de honorarios de personal de transporte por barco de carga y pasajeros	\$ 1.000,00	2	\$ 2.00	



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA PLATA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Villa de los Andes



Photo 1



Photo 2




Photo 3



Photo 4

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

09.11.2022 14:28 UTC

UBICACION:



Photo 5


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

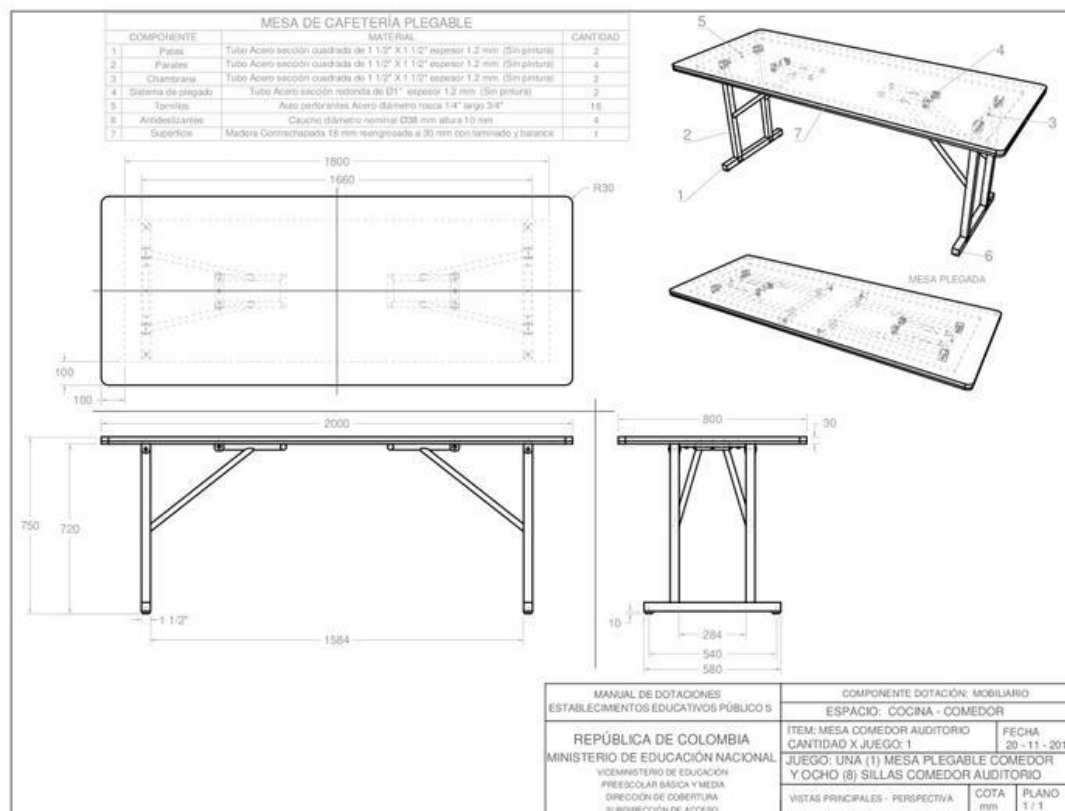

49

Manual de Dotaciones
Comedor-cocina

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 6



Photo 7



Photo 8




Photo 9


CANTIDADES ENTREGADAS:

2

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

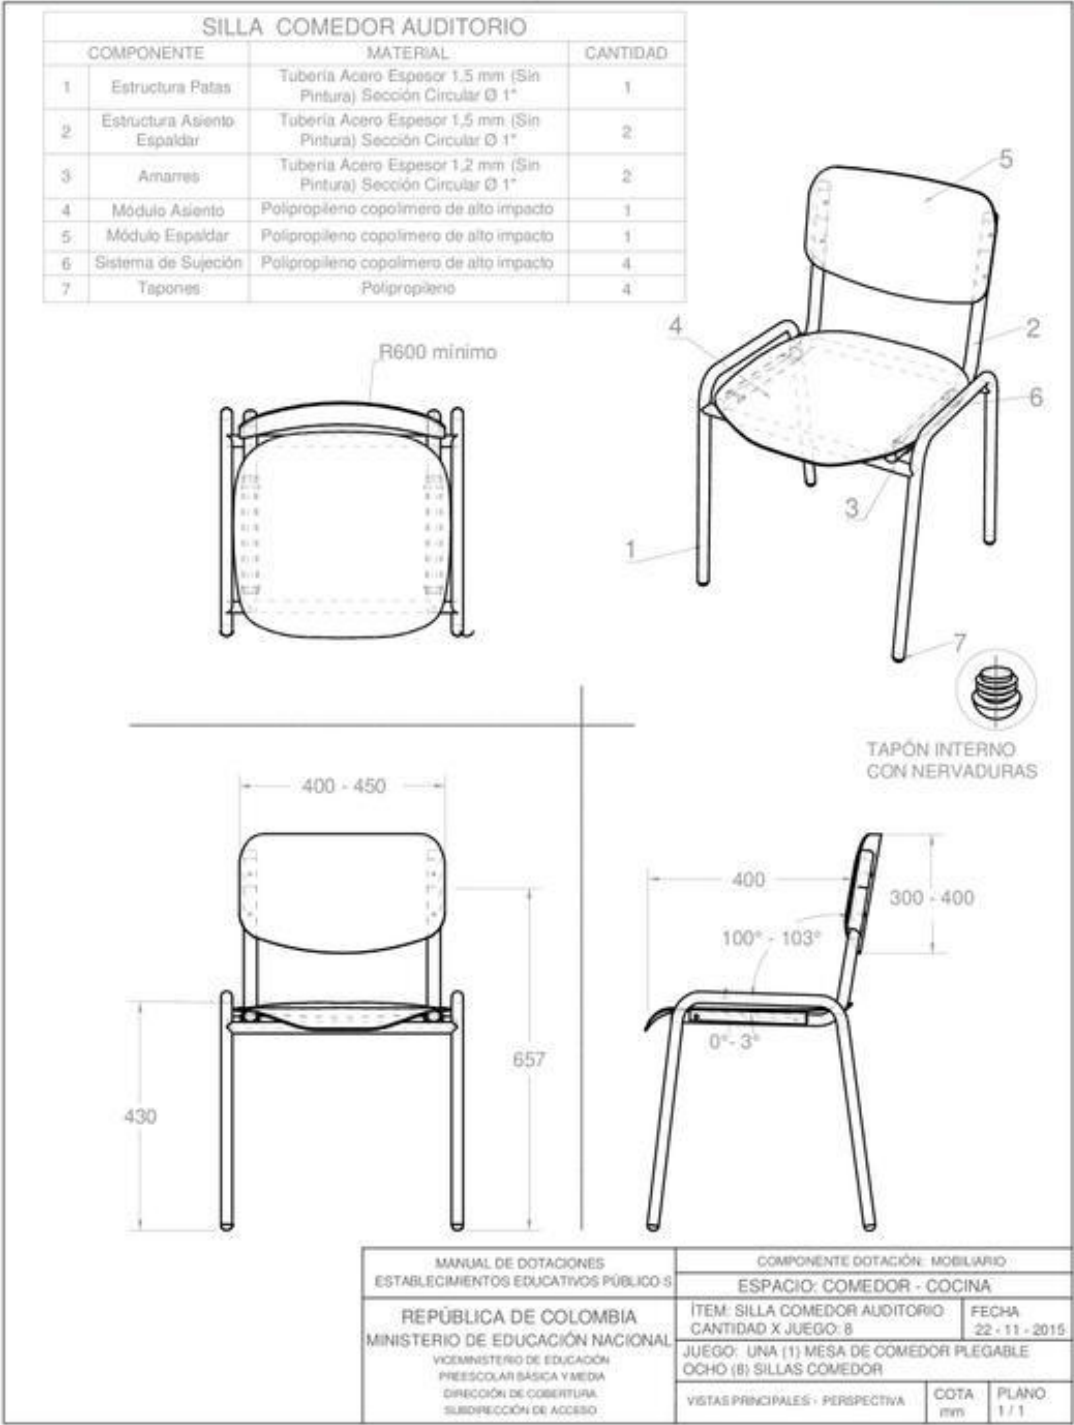

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

CANTIDADES ENTREGADAS:

16

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22




Photo 23

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE



Photo 28



Photo 29



Photo 30

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 35

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 36



Photo 37

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Dilia mayela Calvache cc
25670424

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede la María

FIRMA:



dilia mayela Calvache
09.11.2022 14:37 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
09.11.2022 14:35 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

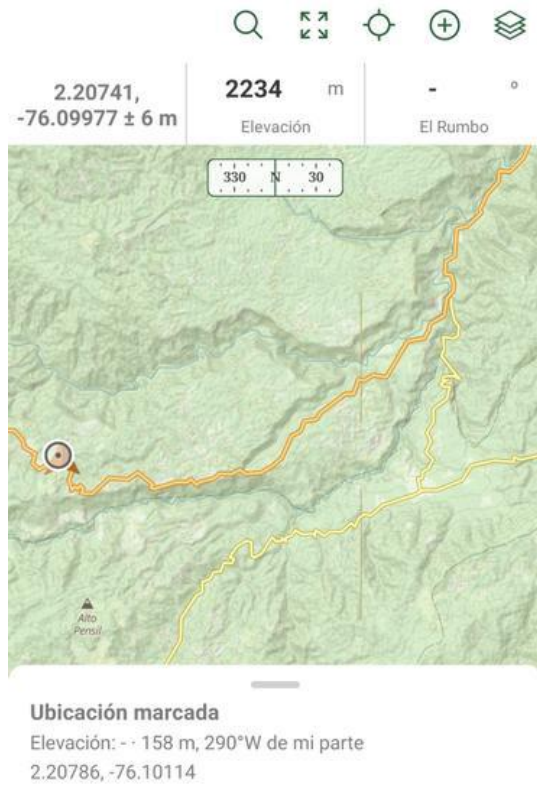


Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: 910N-CS42-F96
FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Fecha Aprobación: 15/01/2018
		Versión: 1
		Página 53 de 106
GOBERNACIÓN DEL HUILA		
ACTA DE ENTREGA - RECIBO		
☒ CONTRATO DE	ORDEN DE COMPRA	Nº: 93232 AÑO: 2022
CONVENIO DE		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	
(Unión temporal o Consorcio)		
NIT O CC:	800028445 - 5	
CONTRATISTA O CONVIENTE:	REPRESENTANTE LEGAL Y a cada uno de los integrantes	
CC:	19266902	
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	
VALOR DE CONTRATO:	VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CERO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022	
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2022	
(dd/mm/aa)		
DATOS DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO	
	IDENTIFICACIÓN: 1.675.224.712	
	CARGO: R.L. INSERGROUP ISG SAS INTERVENTORIA	
DATOS DE QUIEN RECIBE	NOMBRE: Dilia Mayela Calzado Gómez	
	IDENTIFICACIÓN: 25630424	
	CARGO: Docente	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA: VILLA DE LOS ANDES	
	SEDE: LA MARIA	

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 36

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN		FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ATLAS DEL ESPESALMIL - MEDIO FECHA DE ENTREGA: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: _____	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ATLAS DEL ESPESALMIL		FECHA DE RECEPCIÓN: _____	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	CANT.
1	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
2	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
3	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
4	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
5	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
6	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
7	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
8	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
9	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
10	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
11	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
12	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
13	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
14	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
15	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
16	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
17	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
18	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
19	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
20	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
21	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
22	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
23	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
24	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
25	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
26	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
27	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
28	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
29	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
30	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
31	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
32	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
33	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
34	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
35	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
36	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
37	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
38	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
39	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
40	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
41	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
42	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
43	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
44	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
45	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
46	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
47	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
48	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
49	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
50	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
51	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
52	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
53	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
54	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
55	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
56	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
57	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
58	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
59	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
60	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
61	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
62	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
63	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
64	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
65	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
66	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
67	Atlas del Espesalmil - Medio	1.000.000.000	1
68			



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA ARGENTINA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Las tolvos sede las aguilas



Photo 1



Photo 2



Photo 3




Photo 4

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INERGROUO ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

08.11.2022 22:54 UTC

UBICACION:

La Argentina-Oporapa, La
Argentina, Huila, Colombia
(2.1856031, -76.0033485)




Photo 5


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

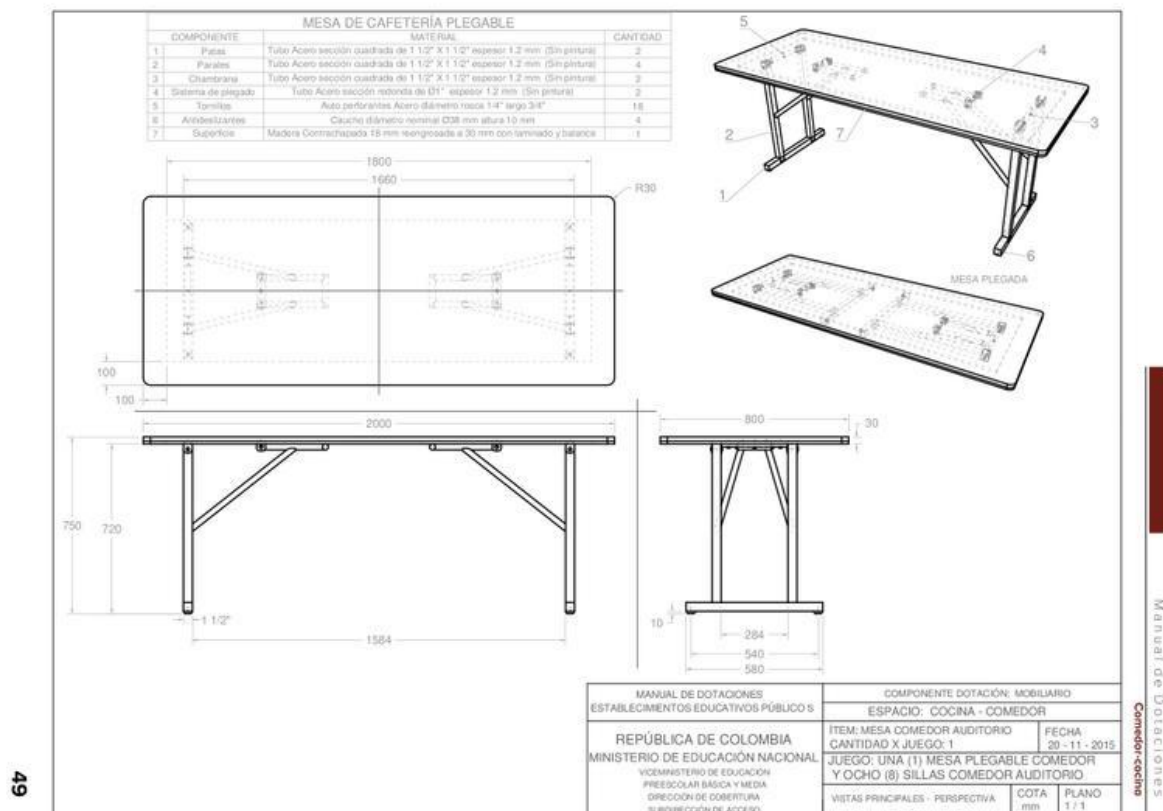

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 6




Photo 7



Photo 8



Photo 9




Photo 10

CANTIDADES ENTREGADAS:

2

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO			
COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2	Estructura Asiento Espalдар	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3	Amarres	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4	Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5	Módulo Espalдар	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6	Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7	Tapones	Polipropileno	4



MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO-S	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: COMEDOR - COCINA		
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO CANTIDAD X JUEGO: 8	FECHA 22-11-2015	
VICE-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA	JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE OCHO (8) SILLAS COMEDOR		
DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA	COTA mm	PLANO 1/1

EVALUACION:

CUMPLE





Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

CANTIDADES ENTREGADAS:

16

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 17



Photo 18



Photo 19




Photo 20



Photo 21



Photo 22




Photo 23




Photo 24

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE




Photo 25



Photo 26



Photo 27

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE



Photo 32



Photo 33



Photo 34

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 35

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 36




Photo 37

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Emid Gómez cc 55212085

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede el mirador

FIRMA:



emid Gómez
08.11.2022 23:01 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
08.11.2022 23:02 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6

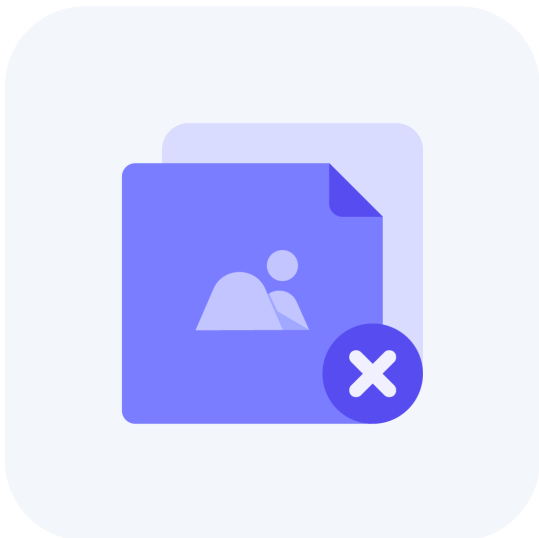


Photo 7



Photo 8



Photo 9

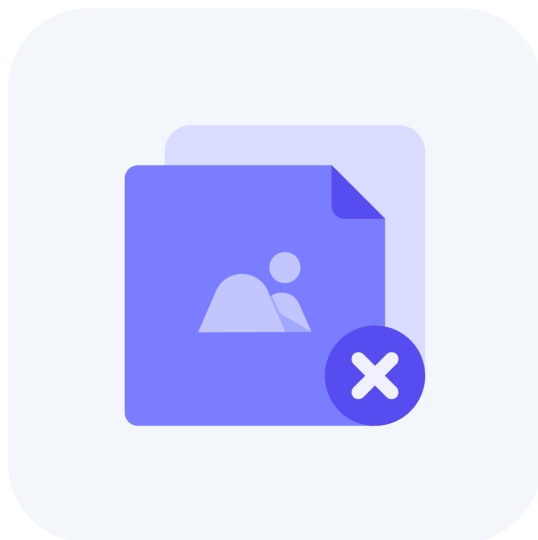


Photo 10

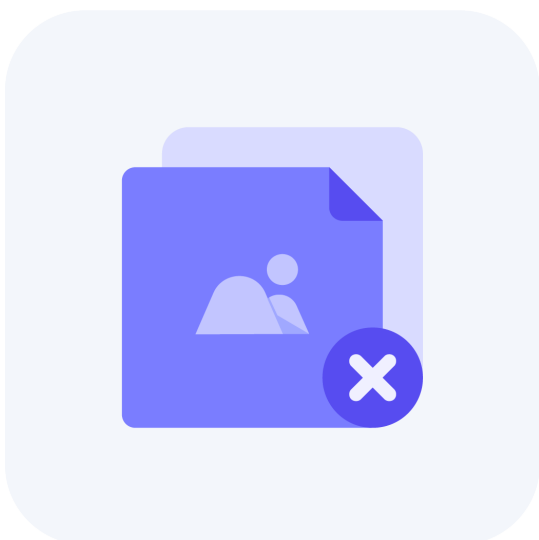


Photo 11



Photo 12



Photo 13

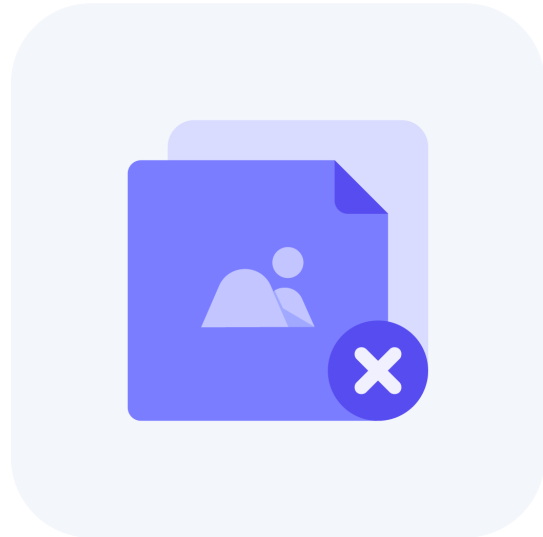


Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19

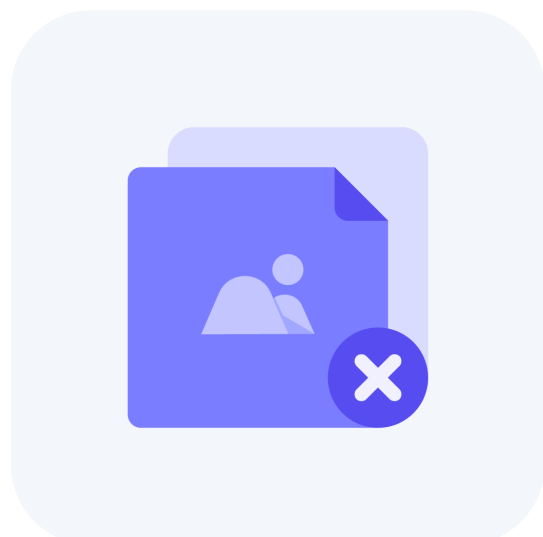


Photo 20



Photo 21



Photo 22

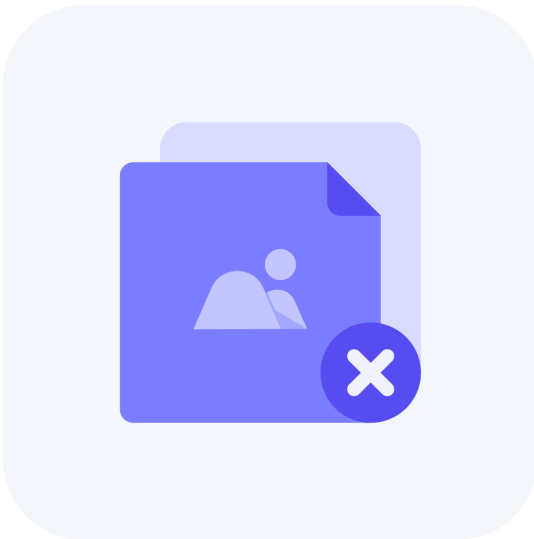


Photo 23

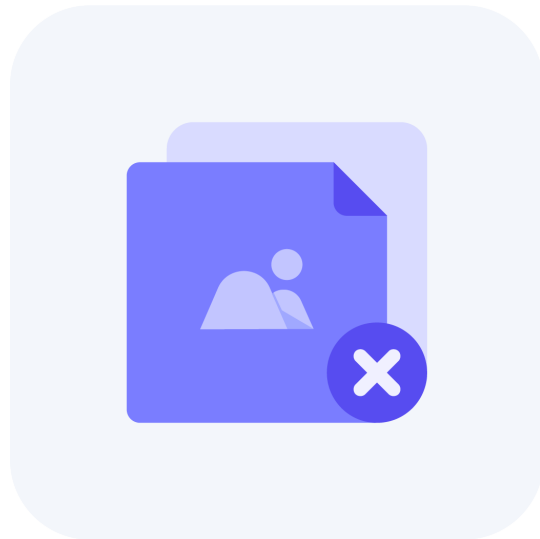


Photo 24

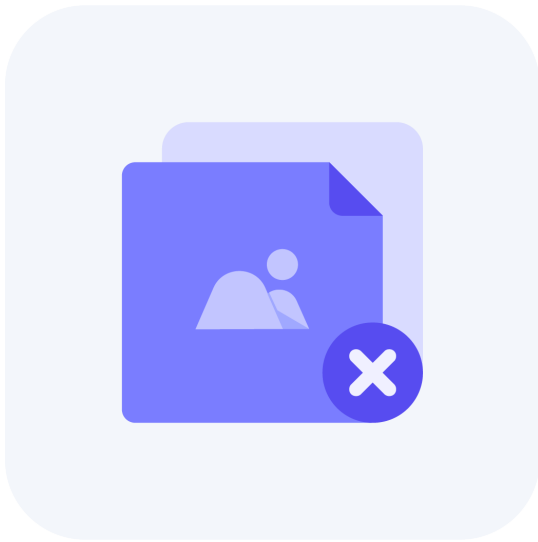


Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34

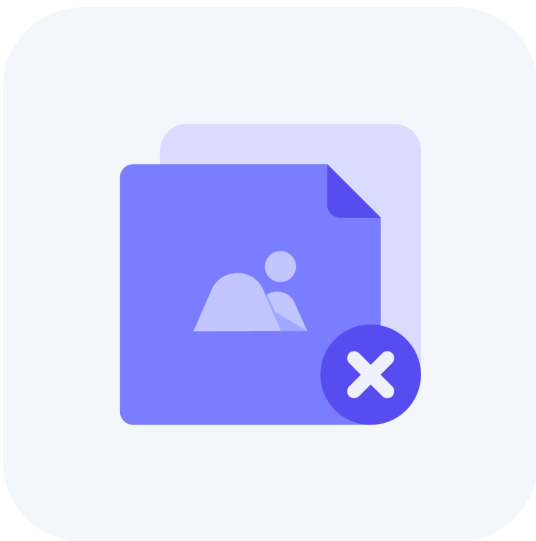


Photo 35

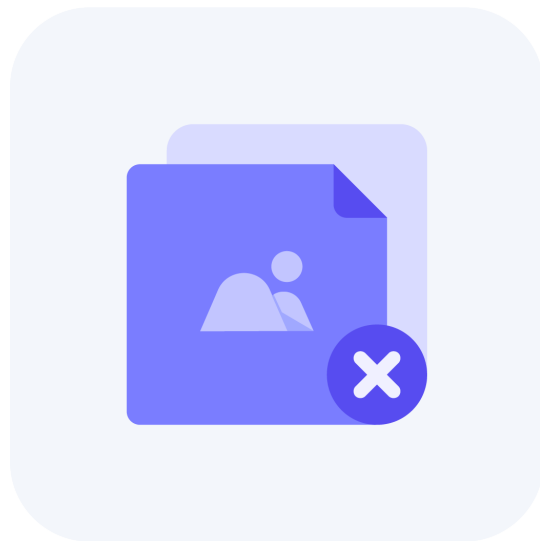


Photo 36

GOBERNACIÓN DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FORMATO ACTA DE ENTREGA - RECIBO

Código: SGH-CG3-FB8

Fecha Aprobación: 18/07/18

Versión: 1

Página 12 de 12

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	LA ARGENTINA Institución educativa LAS AGUILAS Sede: LAS AGUILAS
0002-237 Punto de conexión	Cable (8) alba telefonía - audio, Una (1) mesa de telefonía plegable	\$1.096.794,29	2	\$2.193.589
SUBTOTAL				\$2.193.589
IVA 19%				\$417.542
TOTAL				\$2.611.130

En el Municipio de LA ARGENTINA, a los _____ se deja constancia que
MAKIA ALEJANDRA TORRES NINCO en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría
INERGROUP ISO SAS firma interviene, entrega los bienes a satisfacción, ya que cumplen
 con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Número **93232**

Alejandra Torres Ninco
 Quién Entrega

[Firma]
 Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
 www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 37



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERTGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA PLATA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Sede la florida




Photo 1



Photo 2




Photo 3




Photo 4



Photo 5

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERTGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

09.11.2022 18:45 UTC

UBICACION:

La Plata, Huila, Colombia
(2.225991, -76.0555942)



Photo 6


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

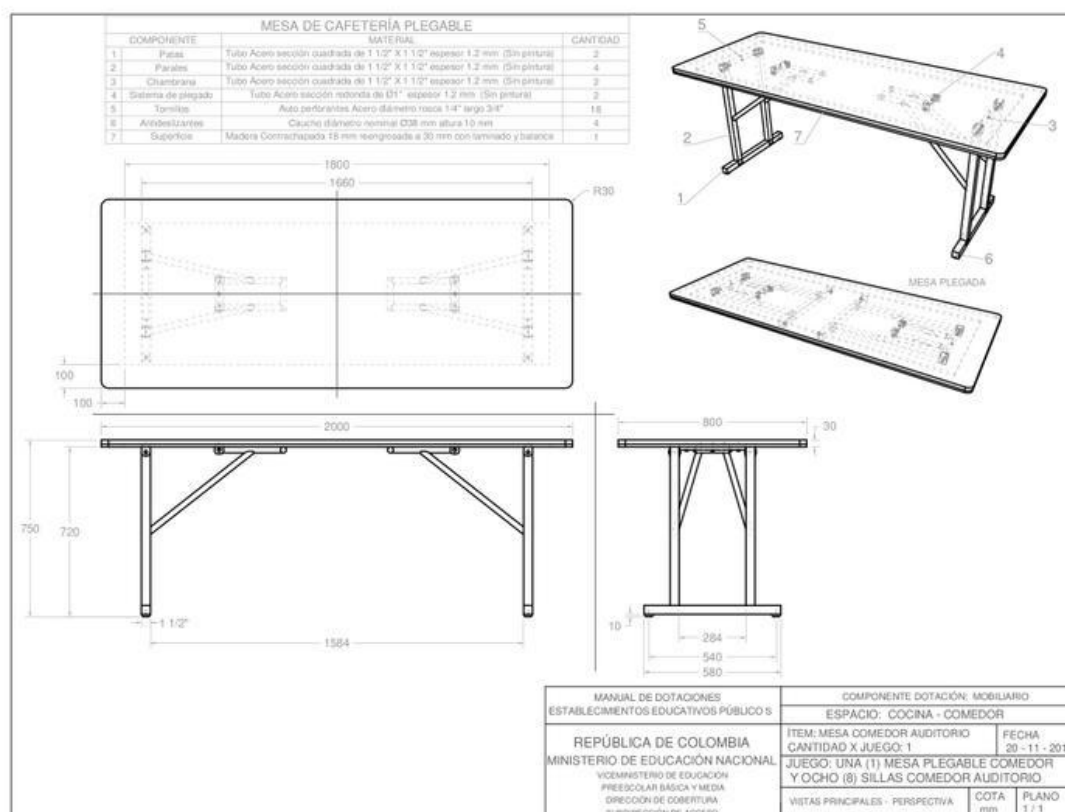

EVALUACION:

CUMPLE




Photo 7




Photo 8




Photo 9

CANTIDADES ENTREGADAS:

1

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1,5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1,5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1,2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

400 - 450

657

430

400

300 - 400

100° - 103°

0° - 3°

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO		FECHA	
CANTIDAD X JUEGO: 8		22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE			
OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:

CUMPLE



Photo 10

Photo 11

Photo 12

CANTIDADES ENTREGADAS:

8

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 13




Photo 14




Photo 15

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE




Photo 16



Photo 17




Photo 18

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE




Photo 19




Photo 20




Photo 21




Photo 22



Photo 23

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE



Photo 24




Photo 25




Photo 26

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE




Photo 27

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 28



Photo 29

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Nilda Bermeo cc 34637590

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede la florida

FIRMA:



Nilda dangelly
09.11.2022 18:52 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
09.11.2022 18:53 UTC

Appendix

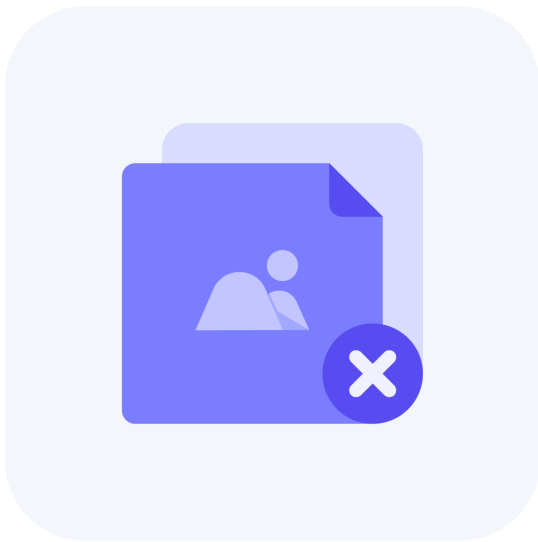


Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15

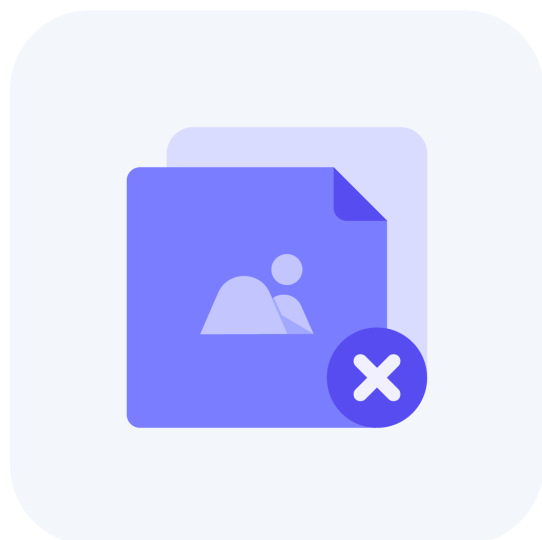


Photo 16



Photo 17

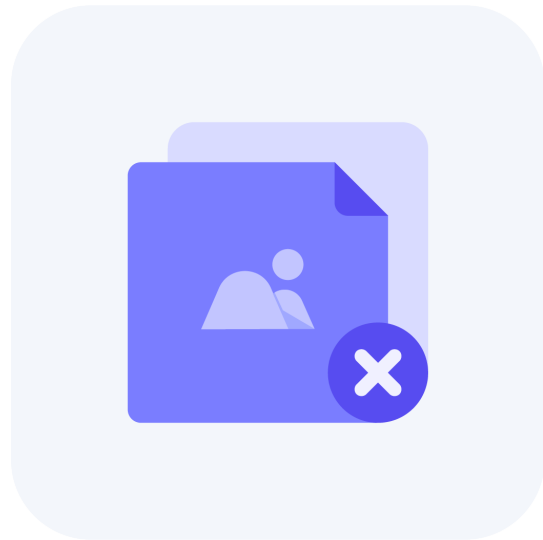


Photo 18



Photo 19

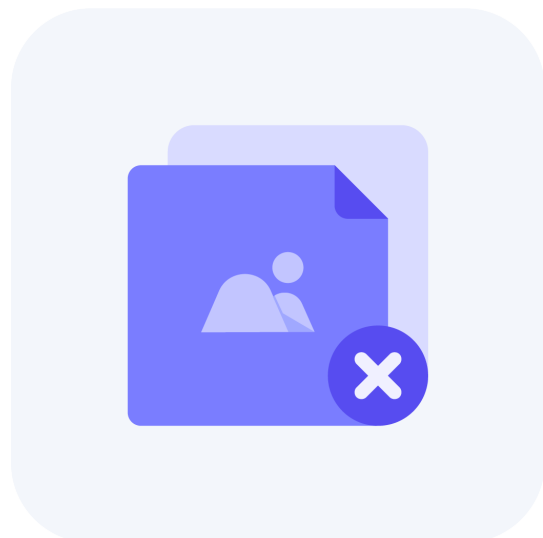


Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26

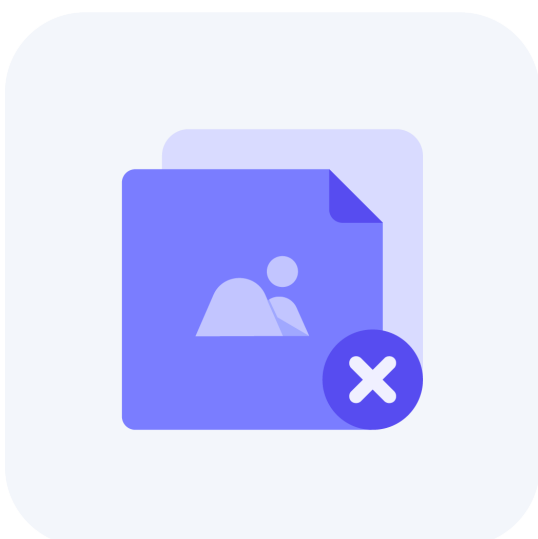


Photo 27

GOBERNACIÓN DEL HUILA		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: SGM-043-FRM
		FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Fecha Actualización: 15/01/2018
				Versión: 1
				Página 87 de 108
ACTA DE ENTREGA - RECIBO				
☒ CONTRATO DE CONVENIO DE	ORDEN DE COMPRA	N°	9322	AÑO 2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MANUFACTURAS SUNAPAZ S.A.			
(Nómina temporal o Contrato)	820038446 - S			
CONTRATISTA O CONVIENTE:	NIT O CC:			
REPRESENTANTE LEGAL y/o cada uno de los integrantes	JAIME ALVARO CARRERO MORENO			
CC:	15266692			
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	8.131.543.952,41 MCTE			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VALOR EN LETRAS: OCHO CIENTO TREINTA Y UN MILLONES, CINCO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CIENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA			
FECHA DE INICIO:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022			
(dd/mm/aa)	10 DE OCTUBRE DE 2022			
DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO			
	IDENTIFICACIÓN: 1.875.224.712			
	CARGO: R.L. INSERGROUP ISG SAS INTERVENORIA			
DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: Nilsa Pangelly Pardo			
	IDENTIFICACIÓN: 24.633.590			
	CARGO: Docente			
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA: VILLA DE LOS AÑOS			
	SEDE: LA FLORIDA			

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Nerva - Huila - Colombia - PBX: (5748) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 28

GOBERNACIÓN DEL HULLA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: SGH-CGSI-FRM
FORMATO ACTA DE ENTREGA - RECIBO Fecha Aprobación: 04/01/2011
 Versión: 1
 Página 16 de 108

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	LA PLATA
0900-237	Puesto de control			Institución educativa VILLA DE LOS ANDES, Sector LA FLOREDA
	Onho (8) 8000 (cañería) - auctuono	\$1.098.794,29	-	
	Onho (1) 7000 (cañería) - auctuono			
	SUBTOTAL			\$1.098.794
	IVA 19%			\$208.771
	TOTAL			\$1.307.565

En el Municipio de LA PLATA, a los _____ de _____ del 2011, en presencia de **MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO** en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría profesional **RESERVAOUP SAS** firma interventora, entrega los bienes a satisfacción ya que cumplen con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Número **93232**.

Alejandra Torres Ningo Quién Entrega
Nilda Dangel Bermeo D Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
 www.hulla.gov.co - Twitter @hullacol - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 29



ACTA DE INTERVENTORIA - ENTREGA MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA 93232 DE 2022

Complete

Score	100%	Flagged items	0	Actions	0
-------	------	---------------	---	---------	---

ENTIDAD CONTRATANTE:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



INFORMACION GENERAL:

ORDEN DE COMPRA No. 93232 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA: INSERTGROUP ISG SAS



CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DATOS LUGAR DE ENTREGA:

100%

DEPARTAMENTO:

HUILA

MUNICIPIO:

LA PLATA

INSTITUCION EDUCATIVA:

Yu luucx pishau



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4




Photo 5

IMAGENES:

ELABORADO POR:

CAMILO ANDRES CORTES VERGEL

ENTIDAD:

INSERGROUP ISG SAS - FIRMA
INTERVENTORA

FECHA:

09.11.2022 14:10 UTC

UBICACION:



Photo 6


VERIFICACION CONDICIONES DE ENTREGA:

100%

MOBILIARIO ENTREGADO 1: MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE

100%

MESA DE CAFETERIA PLEGABLE

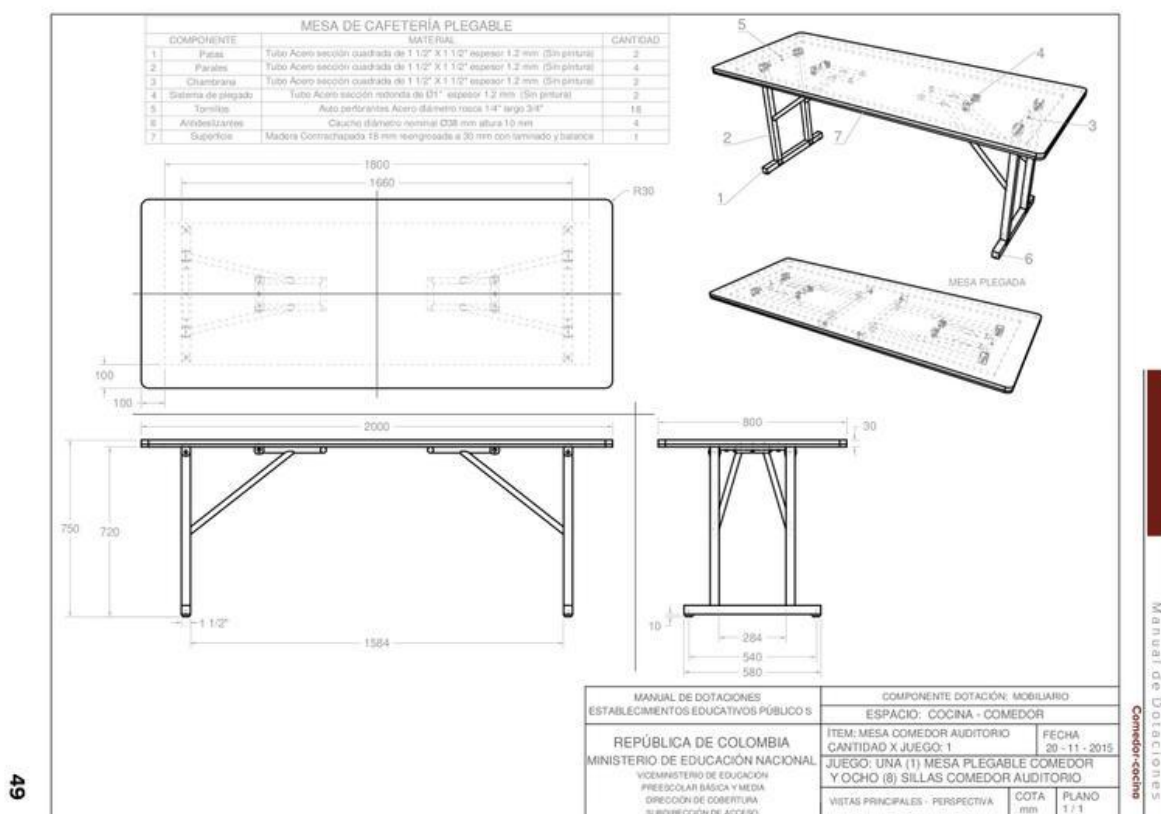

EVALUACION:

CUMPLE




Photo 7




Photo 8




Photo 9

CANTIDADES ENTREGADAS:

1

MOBILIARIO ENTREGADO 2: SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

100%

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO

SILLA COMEDOR AUDITORIO		
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	1
2 Estructura Asiento-Espaldar	Tubería Acero Espesor 1.5 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1.2 mm (Sin Pintura) Sección Circular Ø 1"	2
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6 Sistema de Sujeción	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4

R600 mínimo

400 - 450

430

400

300 - 400

100° - 103°

0° - 3°

TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		ESPACIO: COMEDOR - COCINA	
ITEM: SILLA COMEDOR AUDITORIO CANTIDAD X JUEGO: 8		FECHA 22 - 11 - 2015	
JUEGO: UNA (1) MESA DE COMEDOR PLEGABLE OCHO (8) SILLAS COMEDOR			
VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm	PLANO 1 / 1

EVALUACION:

CUMPLE




Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

CANTIDADES ENTREGADAS:

8

1. Calidad de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional

CUMPLE



Photo 15




Photo 16



Photo 17



Photo 18




Photo 19

2. Marcación de la Dotación Escolar

100%

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.

CUMPLE



Photo 20



Photo 21



Photo 22

3. Empaque y embalaje

100%

100% de los Productos deben entregarse empacados y embalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Dotaciones

CUMPLE




Photo 23




Photo 24




Photo 25




Photo 26

4. Instalación

100%

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega.

CUMPLE




Photo 27




Photo 28



Photo 29



Photo 30

5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

100%

Es necesario entregar un documento para las dotaciones que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los ítems debe ser emitido por el productor o comercializador de las dotaciones, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración

CUMPLE



Photo 31

6. formatos de entrega y remision:

100%

Es necesario diligenciar los formatos de ACTA DE ENTREGA aprobados por la GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACION

CUMPLE




Photo 32



Photo 33

OBSERVACIONES Y FIRMA:

**OBSERVACIONES CONCLUSIONES -
COMPROMISOS**

OBSERVACIONES CONCLUSIONES - COMPROMISOS

FUNCIONARIO 1:

NOMBRE Y CEDULA:

Nelson mulcue cc 76318666

ENTIDAD Y CONTACTO:

Sede peñón talaga

FIRMA:



Nelson mulcue
09.11.2022 14:15 UTC

FIRMA FUNCIONARIO 2:

NOMBRE Y CEDULA:

Camilo Andrés cortez

ENTIDAD Y CONTACTO:

Insergroup

FIRMA:



Camilo Andrés cortez
09.11.2022 14:16 UTC

Appendix



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5

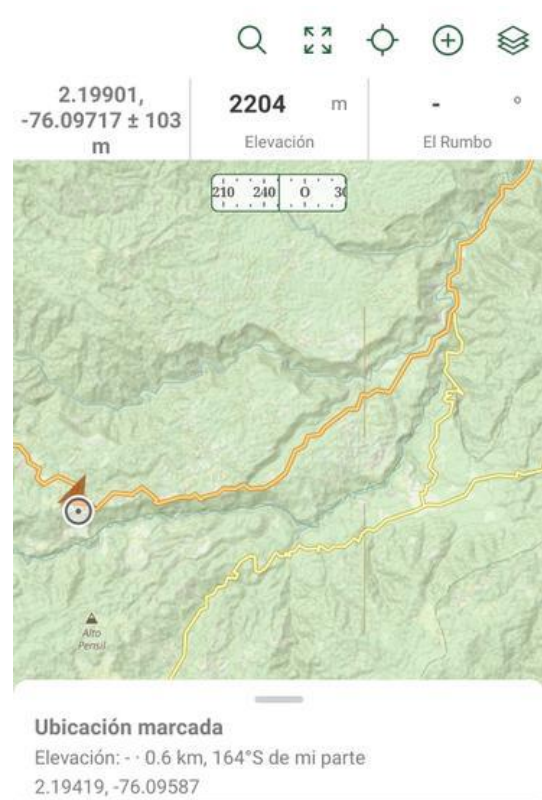


Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15

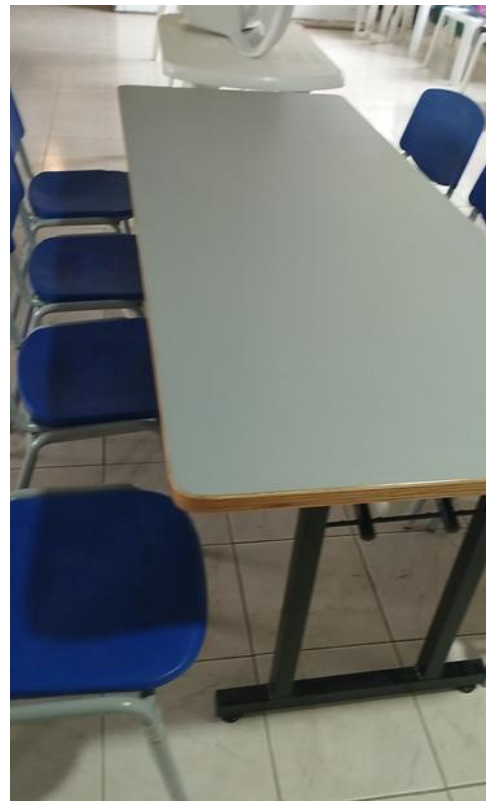


Photo 16



Photo 17

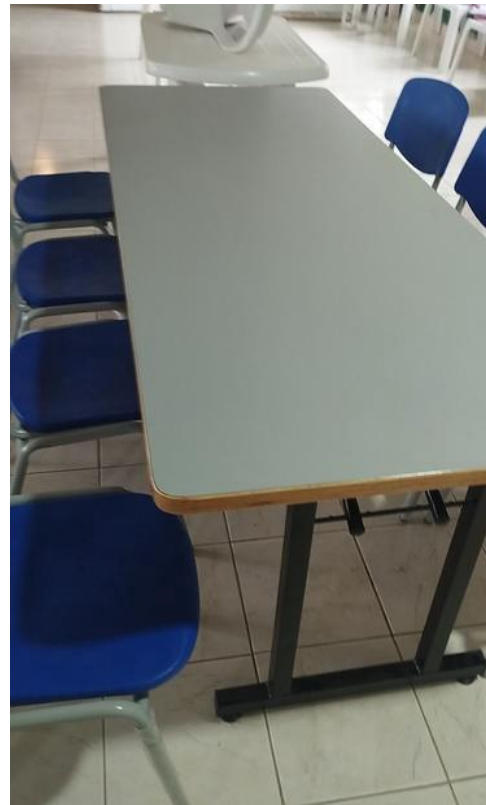


Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30

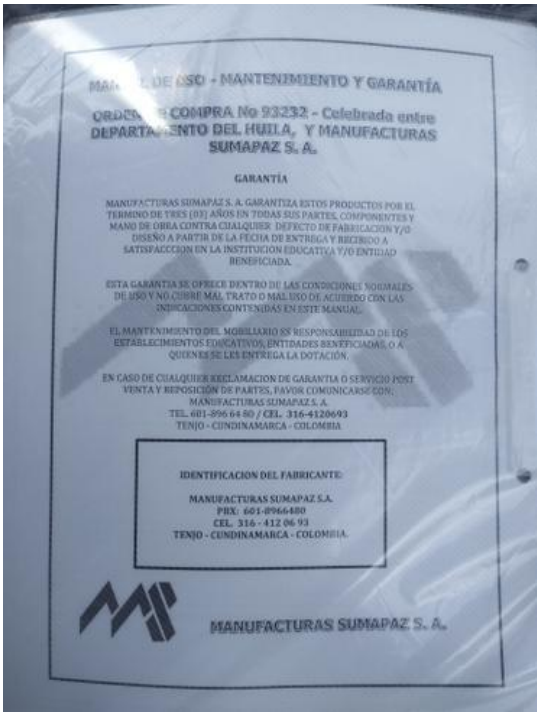


Photo 31

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: SGN-0542-F96
GOBERNACIÓN DEL HUILA		Fecha Aprobación: 15/01/2018
FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO		Versión: 1
		Página 155 de 156
ACTA DE ENTREGA - RECIBO		
X. CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA	Nº: 93232 AÑO: 2022
CONVENIO DE:		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA O CONVIENTE:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: (Unión temporal o Consorcio) MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. NIT O CC: 800028446 - 5 REPRESENTANTE LEGAL Y O CADA UNO DE LOS INTEGRANTES: JAIME ALIRIO CARRERO MORENO CC: 19266902	
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CERO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE INCLUIDO IVA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	10 DE OCTUBRE DE 2022	
DATOS DE QUIEN ENTREGA:	NOMBRE: MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO IDENTIFICACIÓN: 1.075.224.712 CARGO: R.L. INSERGROUP ISG SAS INTERVENTORIA	
DATOS DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE: <i>[Handwritten Signature]</i> IDENTIFICACIÓN: <i>[Handwritten ID]</i> CARGO: <i>[Handwritten Title]</i> INSTITUCIÓN EDUCATIVA: YU LUUX PISHAU SEDE: PENON DE TALAGA	

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 32

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: SGN-0042-196
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA - RECIBO	Fecha Aprobación: 15/01/2018
		Versión: 1
		Página 108 de 108

RELACIÓN DE LA ENTREGA:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	LA PLATA
				Institución educativa YU LUDICK PISHALI Sede: PEÑON DE TALAGA
dt02-237 Puesto de comedor	Ocho (8) sillas cafetería – auditorio. Una (1) mesa de cafetería plegable.	\$1.098.794,29	1	\$1.098.794
SUBTOTAL				\$1.098.794
IVA 19%				\$208.771
TOTAL				\$1.307.565

En el Municipio de LA PLATA, a los _____ se deja constancia que **MARU ALEJANDRA TORRES NINCO** en calidad de Representante Legal de la firma de consultoría profesional **INSEGROUP ISO SAS** firma Interventora, entrega los bienes a satisfacción ya que cumplen con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra Numero **93232**.

Alejandra Torres Ningo
Quién Entrega


Quién Recibe

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva - Huila - Colombia - PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook Gobernación del Huila - El Camino es la Educación

Photo 33

ANEXO No. 4

ACTA DE INTERVENTORIA – ENTREGA
MOBILIARIO ESCOLAR - ORDEN DE COMPRA
93232 DE 2022
