

INFORME DE GESTIÓN Y AVANCE No.14

CONTRATO NÚMERO 4600105143 DE 2025

OBJETO: REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

MEDELLÍN, AGOSTO DE 2026

CONTRATISTA: CIVILEC S.A.S.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

2. ÁREA TÉCNICA

2.1 SUMINISTROS

2.2 REPROGRAMACIONES

2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

2.4 MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

2.5 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

2.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 PERSONAL

4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

4.2 CONTROL DE PAGOS

4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA

5. INFORME JURÍDICO

6. ANEXOS

6.1 ANEXO 1 – SUMINISTRO DE REPUESTOS

6.2 ANEXO 2 – FORMATO DE SEGUIMIENTO DIARIO DE ACTIVIDADES

6.3 ANEXO 3 – FORMATO DE MANTENIMIENTO DE CONTROLADORES

6.4 ANEXO 4 – PÓLIZAS

6.5 ANEXO 5 – SEGURIDAD SOCIAL

6.6 ANEXO 6 – SG-SST

6.7 ANEXO 7 – CERTIFICADOS

6.8 ANEXO 8 – ACTAS

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO No.	4600105143 DE 2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – Secretaría De Suministros y Servicios
NIT	890.905.211 – 1
CONTRATISTA	CIVILEC SAS
NIT	890.941.557 – 7
OBJETO	Realizar el soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín.
VALOR TOTAL	SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L (\$7.002.492.500) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN	760 días calendario
FECHA DE INICIO	26 – 06 – 2025

2. ÁREA TÉCNICA

Durante agosto de 2026, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecutó actividades correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del Contrato No. 4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

- El suministro de controladores locales marca SWARCO – PEEK TRAFFIC y sus elementos de repuesto.
- El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos instalados en vía.
- La operación y soporte técnico del sistema central de gestión de tráfico RMS (Remote Monitoring System).
- La programación y reprogramación de los controladores locales que integran la red semafórica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:

- La atención oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la Secretaría de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadanía y el grupo de coordinación operativa.
- La ejecución de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de tráfico instalados en vía, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilización de gabinetes y sellado de ductos.
- La intervención técnica para la corrección de fallas de comunicación, sincronización de relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.
- El acompañamiento y coordinación con operadores de terceros para la atención de daños en la red de comunicaciones de fibra óptica asociada al sistema de semaforización.
- La reprogramación de planes de tráfico solicitada por la unidad de prospectiva de la Secretaría de Movilidad, la cual incluyó simulación, validación y carga de nuevos parámetros en los controladores SWARCO – PEEK TRAFFIC.

Las actividades aquí reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante registros técnicos, bitácoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotográficos y evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

2.1 SUMINISTROS

Durante el periodo reportado se realizó el suministro de dos (2) tarjetas de control o unidades procesadoras destinadas a controladores de tráfico SWARCO–PEEK Traffic. Estos elementos permiten garantizar la correcta operación y procesamiento de las funciones de control de los equipos, contribuyendo a mantener la disponibilidad, confiabilidad y continuidad operativa de los controladores que hacen parte de la infraestructura semafórica del Distrito.

La relación detallada de los elementos entregados, se encuentra en el Anexo 1 – Suministro de repuestos

<i>ITEM</i>	<i>DESCRCIÓN</i>	<i>CANT</i>
3	Suministro de tarjeta de control, unidad central del procesador, para controladores locales de semáforos	2

2.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramación enviadas por el equipo técnico de planeación semafórica de la Secretaría de Movilidad.

Cada intervención es gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S., siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepción y validación de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.
2. Simulación de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad operativa.
3. Verificación funcional de la configuración ajustada, en laboratorio o por software.
4. Carga definitiva de los parámetros en las tarjetas de control de los equipos marca SWARCO – PEEK TRAFFIC.
5. Registro técnico en bitácora y verificación en sitio del comportamiento de la intersección.

Durante el periodo reportado se realizaron actividades de reprogramación de los controladores asociados a diferentes corredores viales de la ciudad, como parte del proceso de reconfiguración de la infraestructura de comunicaciones de la red semafórica. Estas actividades contemplaron la reorganización y actualización del direccionamiento IP de los controladores, de acuerdo con la sectorización establecida para la red, con el fin de mantener una estructura de direccionamiento organizada y garantizar la adecuada comunicación, supervisión y gestión de los equipos desde la

plataforma central. A continuación, se relacionan los corredores y controladores en los cuales se ejecutaron las reprogramaciones durante el periodo reportado.

En total se realizaron 35 reprogramaciones.

FECHA	CONTROLADOR	SOLICITADA POR	MOTIVO	DESCRIPCIÓN
4/8/2026	4649	CIOS	Cambio en detectores	Se elimina el LD2. SG sin detección
5/8/2026	2720S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
5/8/2026	25B20AS	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
5/8/2026	2512S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
6/8/2026	2212S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
6/8/2026	2505S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
6/8/2026	2502S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
7/8/2026	2503	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
7/8/2026	2510	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
7/8/2026	321212A	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
10/8/2026	3210	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
10/8/2006	3207	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
10/8/2026	3201S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
10/8/2026	3205S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
11/8/2026	3209S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
11/8/2026	3216AS	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
12/8/2026	29A05S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC

FECHA	CONTROLADOR	SOLICITADA POR	MOTIVO	DESCRIPCIÓN
12/8/2026	341010A	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
12/8/2026	343507	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
14/8/2026	3401S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
14/8/2026	3405S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
14/8/2026	3409S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
17/8/2026	3411B	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
17/8/2026	4818CS	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
17/8/2026	4817S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
17/8/2026	43A17S	CIOS	Reconfiguración de direccionamiento IP	Se actualiza la dirección IP del LC
19/8/2026	2505S	Nelson Rangel	Configuración de plano	Se agregan 2 planos COS P16 y P19
19/8/2026	4056	Otto Medina	Cambio de tiempos	Se asigna más tiempo al verde del SG1
19/8/2026	39404250	Otto Medina	Cambio de tiempos	Se ajustan planos COS P6 y P8
19/8/2026	4052	Otto Medina	Cambio de tiempos	Se ajusta plano P6
19/8/2026	2947	Lina Álvarez	Cruce nuevo	Se configura nueva intersección
21/8/2026	4052	Otto Medina	Cambio de tiempos	Se ajusta desfase de grupo 5(11). Se dejan en tiempos fijos peatonales 8(311) y 9(315) puesto que ya no hay pulsadores
21/8/2026	4056	Otto Medina	Cambio de tiempos	Se modifica P6, P8 y P12 asignando mayor tiempo al flujo 1. Se cambia horario del P12
26/8/2026	2505S	CIOS	Cambio de configuración	Se definen 2 entradas en la tarjeta IO1616 para operar con los radares
27/8/2026	3216AS	Nelson Rangel	Cambio TOD	Se adelanta el plano P8 de las 17:00 a las 15:00 de L-V

2.3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante el mes de agosto de 2026, el personal técnico especializado de CIVILEC S.A.S. realizó múltiples intervenciones correctivas y de soporte en campo, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el objeto del contrato.

Las principales actividades se agrupan en las siguientes líneas de acción:

Atención a eventos correctivos

Se atendieron novedades reportadas por:

- El grupo operativo de la Secretaría de Movilidad (vía WhatsApp y presencial).
- El personal del CIOS.
- El Sistema de Monitoreo Remoto (RMS).
- Reportes ciudadanos gestionados por el contratante.

Cada evento fue evaluado por el técnico responsable, quien realizó el diagnóstico en sitio y aplicó la solución correspondiente.

Soporte a equipos fuera de línea

Se realizaron visitas periódicas a intersecciones cuyo controlador local (LC) se encontraba sin conectividad con el sistema central. En estos casos, se realizaron las siguientes acciones:

- Sincronización manual del reloj interno del controlador.
- Revisión de estado de comunicación física (puertos, conectores, fibra o cobre).
- Revisión de configuración de red (IP, máscara, gateway).
- Verificación del comportamiento en vía de los grupos semafóricos.

Coordinación con terceros

En aquellos casos donde las fallas detectadas requerían intervención fuera del alcance técnico de este contrato —como daños en la red troncal de comunicaciones, estructuras físicas, canalizaciones o suministro eléctrico externo—, se procedió a:

- Generar el informe técnico y diagnóstico correspondiente.
- Reportar formalmente al personal técnico encargado de la supervisión del contrato por parte de la Secretaría de Movilidad.
- Brindar acompañamiento técnico en sitio al personal externo cuando fue requerido, con el fin de asegurar la continuidad del servicio y proteger los componentes del sistema de semaforización.

Soporte al sistema central RMS

Durante este período, se llevaron a cabo todas las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo asociadas al sistema de gestión de semaforización RMS, en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el contrato.

Entre las acciones desarrolladas se destacan:

- Verificación funcional del servidor central y los equipos de campo conectados a la plataforma.
- Revisión de la conectividad y sincronización entre los controladores locales y el sistema RMS.
- Evaluación del estado de la base de datos, su integridad, estructura y almacenamiento.

- Revisión del correcto funcionamiento del sistema de alarmas y notificaciones automáticas.
- Control y seguimiento de la sincronización horaria de los equipos.
- Validación de accesos de usuario y sus privilegios dentro del sistema.
- Ejecución de tareas de respaldo (backups) y mantenimiento lógico de la base de datos.

Estas acciones garantizan el funcionamiento continuo del sistema RMS como núcleo de gestión centralizada del sistema semafórico de la ciudad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DEL APOYO A LA OPERACIÓN

Las siguientes fueron las actividades correspondientes al mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos, las cuales se realizan con el propósito de garantizar la disponibilidad del sistema.

Actividades de mantenimiento preventivo

Durante agosto de 2026 se realizaron actividades para garantizar la operación del sistema RMS mediante respaldos diarios, verificación de servicios, seguimiento de controladores, validación de sincronización NTP y recuperación automática ante degradación de servicios.

Ajustes en la configuración del reinicio preventivo (franja horaria protegida)

Tras el evento del 28 de julio (ver "Actividades de mantenimiento correctivo"), se ajustó el mecanismo de reinicio preventivo del Communicator (UTMS_OOM_Recovery.ps1) para que el disparo por umbral de threads (6.000) se difiera fuera del horario 07:00-19:00, evitando interrupciones visibles durante el horario de operación. Se añadió además un reinicio diario incondicional a las 06:00 am (script UTMS_Daily_Restart.ps1), después de las tareas de actualización de controladores (04:00-05:00), para mantener bajo el conteo de threads acumulado por el leak conocido de NettySocketManager/NioEventLoopGroup. Ambos cambios se desplegaron y confirmaron activos en producción el 29 de julio. Agosto fue el primer mes completo con el mecanismo activo: se registraron 2.859 eventos de diferimiento (umbral de 6.000 threads alcanzado en horario protegido, reinicio pospuesto hasta después de las 19h) y cero reinicios de emergencia por el umbral crítico de 10.000 threads. El reinicio diario incondicional a las 06:00 am se ejecutó los 31 días del mes, dentro de un total de 80 reinicios completos (Full_Restart) registrados por UTMS_OOM_Recovery.ps1 en agosto.

Actividades de mantenimiento correctivo

Durante agosto no se presentaron incidentes correctivos mayores; los hallazgos del mes (ver más abajo) fueron identificados durante la revisión mensual, no reportados como falla por usuarios. Como antecedente: en julio, la caída inesperada de UTMS Central Service el 19 de julio (7h45min de indisponibilidad en horario no laboral) motivó el diseño de UTMS_Central_Healthcheck.ps1, y un reinicio preventivo del Communicator en horario laboral el 28 de julio motivó la franja horaria protegida implementada el 29 de julio (ver "Actividades de mantenimiento preventivo"). Ninguno de los dos eventos se repitió en agosto.

- **Entrega de informes de controladores**

Durante agosto se realizó la entrega de informes de estado de controladores, requeridos por diferentes procesos de la secretaría de movilidad.

- **Agosto 28 – Anomalía en el tamaño reportado de los backups (NAS)**

Los backups nocturnos en el recurso compartido de la NAS (TrueNAS, 192.168.50.105) mostraban un tamaño aparentemente idéntico y sospechosamente alto (5.592.445.290 bytes) desde el 24 de julio, pese a que el proceso de respaldo (RMS_Backup.ps1) registraba tamaños reales correctos y variables cada noche. Se confirmó mediante inspección directa del sistema de archivos de la NAS que el tamaño real en disco coincidía con el tamaño sano registrado por el script: no hubo pérdida ni corrupción de datos, solo un artefacto de tamaño aparente (archivo disperso) en la forma en que Samba reporta el tamaño lógico del archivo. Como corrección se agregó el parámetro "strict allocate = yes" al recurso compartido de la NAS el 28 de agosto. Sin embargo, el reporte automatizado de agosto (RMS_Monthly_Report.ps1), que recalcula el tamaño de backup a partir del listado de archivos en la ruta remota, continúa mostrando un tamaño aparente uniforme de 5.333,4 MB para prácticamente todos los días del mes, incluidos los posteriores al 28 de agosto, por lo que la corrección no puede darse por confirmada todavía. Los indicadores de esta sección usan los tamaños reales registrados por RMS_Backup.ps1 en el momento de cada respaldo, no los del reporte automatizado; queda pendiente verificar directamente en la NAS si el ajuste de Samba tomó efecto para los backups más recientes.

- **Purga histórica automática inactiva desde marzo (hallazgo nuevo)**

Se detectó que la tarea programada RMS_Purge_Historical, que debería ejecutar mensualmente la purga de datos históricos (device_triggers, alarmas cerradas, event_log) y liberar espacio en la base de datos, no ha registrado una sola línea en su log (RMS-Purge.log) desde la ejecución manual inicial del 6 de marzo, pese a que el Programador de tareas de Windows confirma ejecuciones cada 4 semanas (la más reciente, el 23 de agosto) con un código de resultado de error genérico. La causa raíz identificada es que esta tarea, a diferencia de todas las demás tareas del sistema (que corren como Administrador con inicio de sesión interactivo), está configurada para ejecutarse como SYSTEM con tipo de inicio de sesión "ServiceAccount", una configuración que impide que el script complete su ejecución sin dejar rastro en su propio log. Esto explica en parte el crecimiento continuo de reporting.device_triggers, que pasó de 1,78 GB en julio a 2,39 GB en agosto sin que la purga automática haya actuado en ningún momento desde marzo. También se mantiene bajo seguimiento utms.alarm_node (2,01 millones de filas, 1.086 MB; ~526.500 alarmas activas nunca cerradas), que sigue creciendo tras la limpieza puntual realizada en agosto. Se preparó la corrección (reconfigurar el principal de la tarea a Administrador/Interactive, igual que el resto de tareas) para su aplicación.

Actividades de mantenimiento preventivo

- Instalación de actualizaciones: se realizaron las actualizaciones del mes de agosto. Las siguientes actualizaciones quedan registradas al cierre de la revisión:

KB / Identificador	Descripción
KB5120210	Actualización de seguridad de Microsoft Server Operating System versión 21H2. Estado: instalada y confirmada (02/08/2026).
KB5101010	Actualización de Microsoft Server Operating System versión 21H2. Estado: instalada y confirmada (02/08/2026).
KB5121650	2026-08 Actualización acumulativa para .NET Framework 3.5, 4.8 y 4.8.1 para Microsoft Server Operating System versión 21H2 para x64. Estado: instalación pendiente (al cierre de la revisión).
KB5120242	2026-08 Actualización acumulativa para Microsoft Server Operating System versión 21H2 para sistemas basados en x64. Estado: instalación pendiente (al cierre de la revisión).

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración [\(Ver directivas\)](#)



Actualizaciones disponibles
Última comprobación: hoy, 14:26

Actualización de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versión 1.459.28.0) - Canal actual (ampliado)
Estado: Instalación pendiente

Actualización para la plataforma antimalware Microsoft Defender Antivirus: KB4052623 (versión 4.18.26080.3) - Canal actual (ampliado)
Estado: Instalación pendiente

Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows x64, v5.144 (KB890830)
Estado: Instalación pendiente

2026-08 Actualización acumulativa para .NET Framework 3.5, 4.8 y 4.8.1 para Microsoft server operating system version 21H2 para x64 (KB5121650)
Estado: Instalación pendiente

2026-08 Actualización acumulativa para Microsoft server operating system version 21H2 para sistemas basados en x64 (KB5120242)
Estado: Instalación pendiente

Hay actualizaciones listas para instalarse

Instalar ahora

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración [\(Ver directivas\)](#)



Es necesario reiniciar
El dispositivo se reiniciará fuera de las horas activas.

2026-08 Actualización acumulativa para Microsoft server operating system version 21H2 para sistemas basados en x64 (KB5120242)
Estado: Reinicio pendiente

Reiniciar ahora

[Programar el reinicio](#)

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración ([Ver directivas](#))



¡Todo está actualizado!

Última comprobación: hoy, 14:26

Buscar actualizaciones

- **Tareas de realización periódica en mantenimiento preventivo**

TAREA	FRECUENCIA	DURACIÓN MEDIA-MÁXIMA
Revisión mensajes de alarmas	Diaria	30 min 90 min
Reconocer alarmas sistema	Diaria	30 min 90 min
Servidor RMS		
Revisar consumo CPU	Diaria	30 min 60 min
Revisar consumo memoria	Diaria	30 min 60 min
Revisar espacio Sistema de archivos	Diaria	30 min 60 min
Revisar Paginación del Sistema	Diaria	30 min 60 min
Revisar mensajes de error del Sistema	Diaria	30 min 90 min
Revisar Procesos de RMS	Diaria	30 min 60 min
Revisar ficheros "log" de aplicaciones y su tamaño	Diaria	30 min 90 min
Obtener Informe de consumo CPU, Memoria, Disco (Sistema)	Semanal	60 min 240 min
Obtener consumo CPU y Memoria de las aplicaciones	Semanal	30 min 60 min

Inicialización de ficheros de log	Mensual	30 min 60 min
Borrado de ficheros temporales	Mensual	30 min 60 min
Comunicaciones		
Revisar Registro de eventos relacionados con las comunicaciones	Mensual	30 min 60 min
Copias de Seguridad		
Revisar backups de archivos de configuración y bases de datos	Diaria	30 min 90 min
Realizar/Revisar backups de recuperación disco Sistema	Quincenal	30 min
Disponibilidad de los sistemas		
Comprobar disponibilidad de los sistemas que corren en cada servidor	Diaria	30 min 60 min

- **Se realizó la verificación del procedimiento automático de backup de la base de datos.**

Se verificó el correcto funcionamiento del procedimiento automatizado de backup (RMS_Backup.ps1). El mes de agosto registró 31 backups exitosos de 31 días posibles. No se presentaron alertas de backup ni errores de validación o rotación.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 RMS_31_08_2026.backup.sha256	31/08/2026 23:14	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_30_08_2026.backup	30/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_30_08_2026.backup.sha256	30/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_29_08_2026.backup	29/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_29_08_2026.backup.sha256	29/08/2026 23:14	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_28_08_2026.backup	28/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_28_08_2026.backup.sha256	28/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_27_08_2026.backup	27/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_27_08_2026.backup.sha256	27/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_26_08_2026.backup	26/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_26_08_2026.backup.sha256	26/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_25_08_2026.backup	25/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_25_08_2026.backup.sha256	25/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_24_08_2026.backup	24/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_24_08_2026.backup.sha256	24/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_23_08_2026.backup	23/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_23_08_2026.backup.sha256	23/08/2026 23:11	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_22_08_2026.backup	22/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_22_08_2026.backup.sha256	22/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_21_08_2026.backup	21/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_21_08_2026.backup.sha256	21/08/2026 23:11	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_20_08_2026.backup	20/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_20_08_2026.backup.sha256	20/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_19_08_2026.backup	19/08/2026 23:31	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_19_08_2026.backup.sha256	19/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_18_08_2026.backup	18/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_18_08_2026.backup.sha256	18/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_17_08_2026.backup	17/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_17_08_2026.backup.sha256	17/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_16_08_2026.backup	16/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_16_08_2026.backup.sha256	16/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_15_08_2026.backup	15/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_15_08_2026.backup.sha256	15/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_14_08_2026.backup	14/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_14_08_2026.backup.sha256	14/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 RMS_17_08_2026.backup	17/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_17_08_2026.backup.sha256	17/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_16_08_2026.backup	16/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_16_08_2026.backup.sha256	16/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_15_08_2026.backup	15/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_15_08_2026.backup.sha256	15/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_14_08_2026.backup	14/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_14_08_2026.backup.sha256	14/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_13_08_2026.backup	13/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_13_08_2026.backup.sha256	13/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_12_08_2026.backup	12/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_12_08_2026.backup.sha256	12/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_11_08_2026.backup	11/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_11_08_2026.backup.sha256	11/08/2026 23:12	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_10_08_2026.backup	10/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_10_08_2026.backup.sha256	10/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_09_08_2026.backup	09/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_09_08_2026.backup.sha256	09/08/2026 23:13	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_08_08_2026.backup	08/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_08_08_2026.backup.sha256	08/08/2026 23:09	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_07_08_2026.backup	07/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_07_08_2026.backup.sha256	07/08/2026 23:12	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_06_08_2026.backup	06/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_06_08_2026.backup.sha256	06/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_05_08_2026.backup	05/08/2026 23:24	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_05_08_2026.backup.sha256	05/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_04_08_2026.backup	04/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_04_08_2026.backup.sha256	04/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_03_08_2026.backup	03/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_03_08_2026.backup.sha256	03/08/2026 23:12	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_02_08_2026.backup	02/08/2026 23:25	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_02_08_2026.backup.sha256	02/08/2026 23:17	Archivo SHA256	1 KB
 RMS_01_08_2026.backup	01/08/2026 23:24	Archivo BACKUP	5.461.373 KB
 RMS_01_08_2026.backup.sha256	01/08/2026 23:10	Archivo SHA256	1 KB

Causa raíz del crecimiento de tamaño en agosto


El tamaño de los backups diarios pasó de ~140 MB (22-23 de agosto) a más de 5 GB desde el 24 de agosto en adelante. Se investigó si esto correspondía a un cambio en el procedimiento de respaldo o en la política de retención descrita arriba, y se descartó: el script no ha cambiado desde el 5 de agosto y la copia local (fuera de la política de retención) presenta el mismo crecimiento que la copia remota, confirmando que el origen es un crecimiento real de los datos, no un problema del proceso de backup.

Consultando directamente la base de datos se identificaron dos tablas responsables de casi todo el crecimiento: `utms.alarm_node` (1,89 GB, ~2,16 millones de filas) y `reporting.device_triggers` (1,78 GB). De las filas de `alarm_node`, cerca de 972.000 (~45%) están marcadas como “activas” (nunca cerradas), concentradas en un grupo puntual de nodos con miles de alarmas activas cada uno — el mismo patrón de alarmas que no cierran ya documentado para el nodo 50, ocurriendo a mayor escala en varios nodos adicionales. La rutina de purga histórica (`RMS_Purge_Historical.ps1`) sí incluye estas tablas, pero por diseño solo elimina alarmas ya cerradas, por lo que las activas se acumulan sin límite mientras persista la condición que las genera.

Esto identifica el crecimiento de tamaño en los backups como un síntoma, no como la causa: el origen probable es la misma inestabilidad de conectividad en nodos puntuales que también explica el aumento de colapsos JMS del mes. Se realizará una limpieza en la base de datos de las alarmas acumuladas en los nodos afectados.

Actividades de mantenimiento predictivo

- Se está realizando un respaldo periódico de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permitiría recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla que no pueda ser resuelta.



Métricas del sistema recolectadas en agosto

Los datos a continuación provienen del reporte automatizado generado por RMS_Monthly_Report.ps1 y los archivos consolidados en Monthly reports/2026-08, correspondientes al período 01-31 de agosto de 2026.

Controladores con timeout persistente

Durante agosto se identificaron 42 IPs inalcanzables y 56 timeouts de conexión. La concentración principal se trasladó a la red 172.16.6.x, con 13 IPs inalcanzables, equivalentes al 31% del total (172.16.8.x, la subred históricamente dominante, bajó a 10 IPs, 23,8%). Los controladores con mayor frecuencia de timeout fueron 172.16.8.44 (4), 172.16.8.166 (4), 172.16.8.131 (3), 172.16.8.173 (3) y 172.16.7.39 (2). Estos eventos se mantuvieron bajo seguimiento por su relación con la carga operativa del Communicator.

Eventos JMS

Se registraron 55 colapsos JMS (HQ119016) y 465 queue sender timeouts durante agosto, una disminución del 49% en colapsos frente a julio (108). No se observaron crash dumps JVM. El pico de threads Java del mes (9.523, el 7 de agosto) se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que julio (9.535), consistente con que la fuga de threads del Communicator sigue activa y sin corrección de código; la baja frente a julio es consistente con el mecanismo de diferimiento por horario protegido operando durante un mes completo (ver "Actividades de mantenimiento preventivo").

Eventos de servicio

Se registraron 192 eventos de servicio Windows asociados a detenciones e inicios de servicios UTMS/RMS (frente a 216 en julio, ~0,9x). La disminución es consistente con la baja en colapsos JMS del mes (253 eventos JMS_RESTART registrados, frente a 668 en julio). No se identificaron interrupciones no controladas de UTMS Central Service en agosto, a diferencia del evento del 19 de julio. UTMS_Central_Healthcheck.ps1, desplegado en agosto, no llegó a activar un reinicio propio en ningún momento del mes: todas sus corridas coincidieron con reinicios ya en curso por otros mecanismos, por lo que su efectividad ante una caída independiente de Central aún no ha sido puesta a prueba en un caso real. No se encontraron otros crashes de aplicación Java/UTMS en el período.

Reporte Mensual del Sistema RMS

Periodo: JULIO 2026 (01/07/2026 - 31/07/2026)

Servidor: WIN-4E1FV44RJ9R | Generado: 02/08/2026 18:03:56

1. Estado del Servidor

57.6%

RAM Usada (9.2 / 16 GB)

66%

CPU (al momento del reporte)

31 días operativo | reinicio
planificado el 05/07

Uptime del servidor

1.8.0_422 (64-bit)

Version de Java

Ruta Java detectada: C:\UTMS\java64\bin\java.exe

Discos

Unidad	Total (GB)	Libre (GB)	Uso (%)	Estado
C:	299.3	234.9	21.5%	OK

Indicadores claves del mes

Indicador	Valor
Uptime servidor (SO)	31 días del período evaluado; operación mantenida con reinicios controlados de servicios
CPU promedio mensual	25,7% promedio mensual
RAM promedio mensual	61,9% promedio mensual (agosto)
Disco C: disponible	21,9% uso promedio del mes (último dato: 22,1%; 233,2 GB libres de 299,3 GB)
Crash dumps JVM (OOM)	0 crash dumps JVM en el período
Reinicios automáticos Communicator	192 eventos de servicio Windows; reinicios controlados/automáticos (frente a 216 en julio)
Colapsos JMS (HQ119016)	55 colapsos JMS (HQ119016)
Backups realizados	31 de 31 días del mes — sin días sin backup en el período
Backup más pequeño	822,1 MB
Backup más grande	3.124,6 MB
Total backups del mes	41,1 GB
Alertas NTP	0 — sistema sincronizado; máximo 0,3 horas sin sincronización
Controladores en mantenimiento al cierre	42 IPs inalcanzables identificadas
Timeouts de controladores	56 timeouts de controladores
Último colapso JMS	Pico máximo de threads Java: 9.523 (7 de agosto); sin crash JVM asociado

2.4 MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Durante el mes de agosto de 2026, CIVILEC S.A.S. dispuso del equipo técnico requerido para garantizar la ejecución de las actividades diarias de mantenimiento, soporte y operación de la red semafórica del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

El equipo de campo estuvo conformado por tecnólogos en electrónica y un auxiliar de mantenimiento, quienes fueron los responsables de realizar las siguientes tareas:

- Ejecución de mantenimientos preventivos a equipos instalados en vía.
- Apoyo en el diagnóstico y solución de eventos correctivos.
- Intervención en intersecciones reportadas con fallas de comunicación, sincronización o mal funcionamiento.
- Visitas técnicas programadas según cronograma y priorización del contratante.
- Registro detallado de las actividades realizadas en los formatos de seguimiento diario.

Estas labores se ejecutaron bajo la supervisión del personal profesional designado por la firma contratista, cumpliendo con los protocolos técnicos y de seguridad establecidos.

El seguimiento de las actividades ejecutadas por el equipo técnico se realizó a través de formatos de seguimiento diario de actividades.

Este control operativo garantiza la trazabilidad, control y calidad de la mano de obra suministrada.

Ver Anexo 2 – Formatos de seguimiento diario de actividades.

Ver Anexo 3 – Formato de mantenimiento de controladores.

Durante el periodo reportado se dio inicio a la ejecución de la actividad de medición de los sistemas de puesta a tierra de los controladores locales, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Como parte de esta actividad, se realizan tres mediciones eléctricas en cada controlador: fase–neutro, fase–tierra y neutro–tierra, con el propósito de verificar las condiciones de alimentación eléctrica y puesta a tierra de los equipos. Durante el presente periodo, las labores se iniciaron en el sector de Guayabal, dando continuidad al proceso de verificación de las condiciones eléctricas de los controladores que conforman la red semafórica del Distrito.

A continuación, se relacionan los controladores locales en los cuales se realizaron las mediciones durante el mes de agosto, junto con los resultados obtenidos en cada una de las mediciones efectuadas.

CONTROLADOR	REFERENCIA	VOLTAJE			PUENTE
		Fase-Neutro	Fase-Tierra	Neutro-Tierra	
ZOOLOG	EC - 1 ARM	116,6	116,6	0,000	AJUSTE
5214	EC - 1 ARM	117,2	117,2	0,000	OK
5210	EC - 2	128,2	128,2	0,000	OK
5110	EC - 1 ARM	119,3	119,3	0,000	OK
NOEL	EC - 1 ARM	117,5	117,5	0,000	OK
5202S	EC - 1 ARM	117	117	0,000	OK
5102S	EC - 1 ARM	116	116	0,000	OK
50E02S	EC - 1 ARM	118,2	118,2	0,000	OK
5004S	EC - 1 ARM	117,8	117,8	0,000	OK
50FF08S	EC - 1 ARM	112,3	112,3	0,000	OK
50FF12S	EC - 1 ARM	121,5	121,7	0,000	OK
5213S	EC - 2	121,9	122,1	0,000	OK
5112S	EC - 1 ARM	119,7	119,8	0,000	OK
521212AS	EC - 1 ARM	119,9	119,9	0,000	OK
5209S10S	EC - 1 ARM	134,5	134,3	0,000	OK
52534S6S	EC - 1 ARM	126	126	0,020	OK
6580	EC - 1 ARM	122,1	122,1	0,003	AJUSTE
6502	EC - 2	121,3	121,2	3,201	AJUSTE
6505	EC - 1 ARM	125,5	125,3	0,010	AJUSTE
6508B	EC - 2	122,7	122,7	2,910	OK
5910	EC - 1 ARM	130,2	130,2	0,001	OK
6520	EC - 1 ARM	120,8	120,2	0,002	OK
6525	EC - 1 ARM	120,6	120,1	0,001	AJUSTE
6523	EC - 2	123,4	123,3	0,011	OK
6530	EC - 1 ARM	122,3	122,3	0,543	AJUSTE
6530A	FlowNode	119,5	118,8	0,733	AJUSTE
5530A	FlowNode	112,3	112,2	0,000	OK
5330A	EC - 1 ARM	118,7	118,6	0,000	OK
5530	EC - 1 ARM	129,9	129,1	0,238	OK
5230	EC - 2	116,5	116,4	0,000	OK
5330	EC - 1 ARM	115,8	115,7	0,230	OK
5228	EC - 2	118	118,3	0,387	AJUSTE
5225	EC - 1 ARM	122	122,1	0,000	OK

2.5 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades ejecutadas y facturadas por CIVILEC S.A.S. entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, con base en los ítems contractuales definidos en el presupuesto oficial del contrato No. 4600105143 de 2025.

Las cantidades aquí reportadas corresponden a las unidades efectivamente ejecutadas, verificadas por el equipo técnico y soportadas en los anexos incluidos en este informe.

Este resumen sirve como base para la elaboración del acta de pago del mes.


Ítem	Descripción	Un.	Vr. Parcial Total	Cant.	Vr. Parcial
CONTROLADORES SEMAFÓRICOS					
1	Suministro de controlador local de semáforos para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestión del centro de control de la central de semáforos de la SMM. Incluye gabinete	Un.	\$ 81.628.514	-	\$ -
2	Suministro de controlador local de semáforos para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestión del centro de control de la central de semáforos de la SMM. No incluye gabinete.	Un.	\$ 79.328.514	-	\$ -
3	Suministro de tarjeta de control, unidad central del procesador, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 11.075.422	2	\$ 22.150.843
4	Suministro de tarjeta de potencia, control y monitoreo de lámparas, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 9.305.376	-	\$ -
5	Suministro de tarjeta de MDU para controlador semafórico	Un.	\$ 7.650.000	-	\$ -
6	Suministro de Rack para controlador semafórico, incluye back plane.	Un.	\$ 16.400.000	-	\$ -
7	Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar controladores referencia EC-1 a funcionalidad EC-2	Un.	\$ 5.476.766	-	\$ -
8	Suministro de cables para conexión de tarjetas de potencia, control y monitoreo de lámparas, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 731.666	-	\$ -
9	Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 731.666	-	\$ -
10	Suministro de panel de extensión para tarjetas de potencia, control y monitoreo de lámparas para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 2.320.126	-	\$ -
11	Suministro de fuente de alimentación de 24 V DC para tarjetas de controladores locales de semáforos	Un.	\$ 2.162.536	-	\$ -
12	Suministro de transistor Mosfet canal N Ref. 07N60C3	Un.	\$ 15.000	-	\$ -
13	Suministro de circuito integrado PWM Ref. 200D4 encapsulado SOIC 8	Un.	\$ 15.000	-	\$ -
14	Suministro de circuito integrado PWM Ref. UC3842AN encapsulado PDIP 8	Un.	\$ 9.500	-	\$ -
15	Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref. IRF840	Un.	\$ 9.000	-	\$ -
16	Suministro de relevo de ocho terminales planas, dos contactos Normally Open. Bobina de 24vdc. Contactos de 250VAC 16 ^a	Un.	\$ 24.000	-	\$ -

Ítem	Descripción	Un.	Vr. Parcial Total	Cant.	Vr. Parcial
	CONTROLADORES SEMAFÓRICOS				
17	Suministro de relevo de arranque de seis terminales planas, dos contactos Normally Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a 16ª	Un.	\$ 24.000	-	\$ -
18	Suministro de fusible radial miniatura 3.15 A 250V	Un.	\$ 1.980	-	\$ -
19	Suministro circuito de intermitencia	Un.	\$ 300.000	-	\$ -
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE ESPECIALIZADO A CONTROLADORES INSTALADOS MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC				
20	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca SWARCO PEEK TRAFFIC instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales y la red de banda ancha de comunicaciones.	Día	\$ 2.965.499	31	\$ 91.930.456
21	Servicio de mantenimiento del software RMS marca Swarco Peek Traffic	Día	\$ 513.911	31	\$ 15.931.239
22	Programación de controladores local referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node	Un.	\$ 506.538	35	\$ 17.728.830
23	Diagnóstico y reparación de tarjeta de control EC-1 o EC-2	Un.	\$ 400.000	9	\$ 3.600.000
24	Diagnóstico y reparación de tarjeta de potencia EC-1 o EC-2	Un.	\$ 400.000	8	\$ 3.200.000
25	Diagnóstico y reparación de fuente de alimentación EC-1 o EC-2	Un.	\$ 400.000	5	\$ 2.000.000
SUBTOTAL			\$ 156.541.368		
IVA 19%			\$ 29.742.860		
VALOR TOTAL			\$ 186.284.228		


2.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Con el fin de brindar evidencia visual del desarrollo de las actividades técnicas ejecutadas durante el periodo reportado, se presenta un registro fotográfico organizado por tipo de intervención.

Las fotografías fueron tomadas por el personal técnico durante sus labores en campo y se consolidan como respaldo gráfico de las actividades ejecutadas, tal como lo exige la supervisión del contrato.

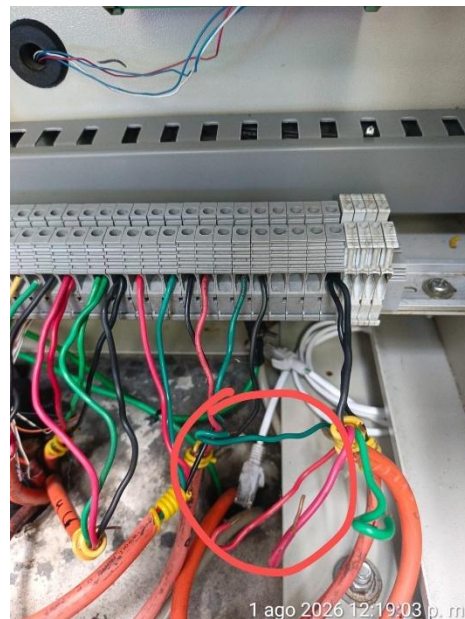


Reporte de daño en cable de control y desconexión en borneras

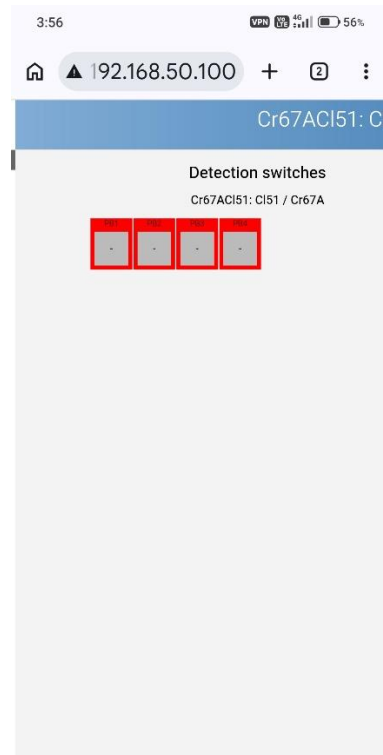




Revisión de pulsadores peatonales





Atención de falla en resistencia de potencia

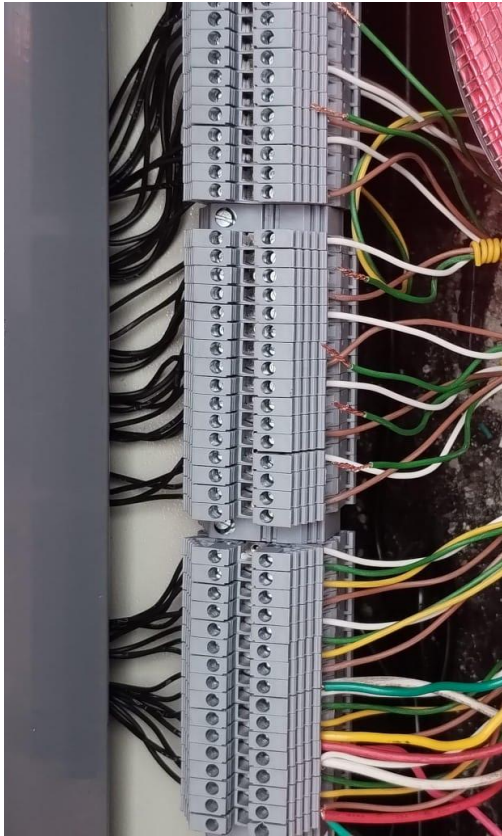

Detección de fallas en cable y lámparas de carrera 46 x calle 49

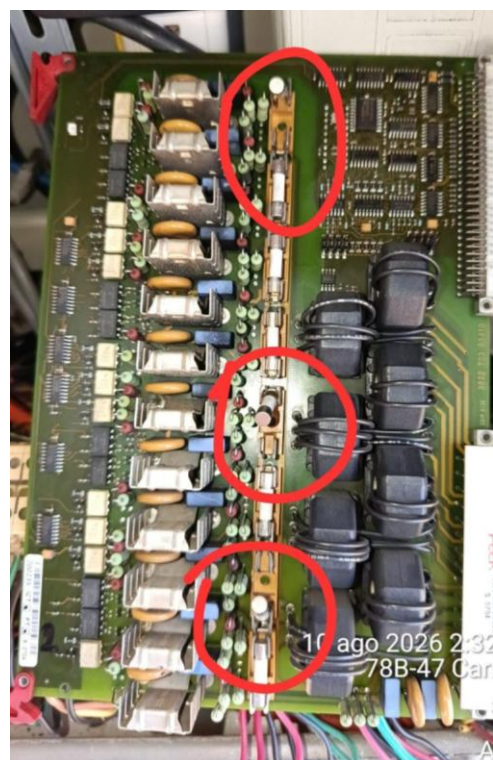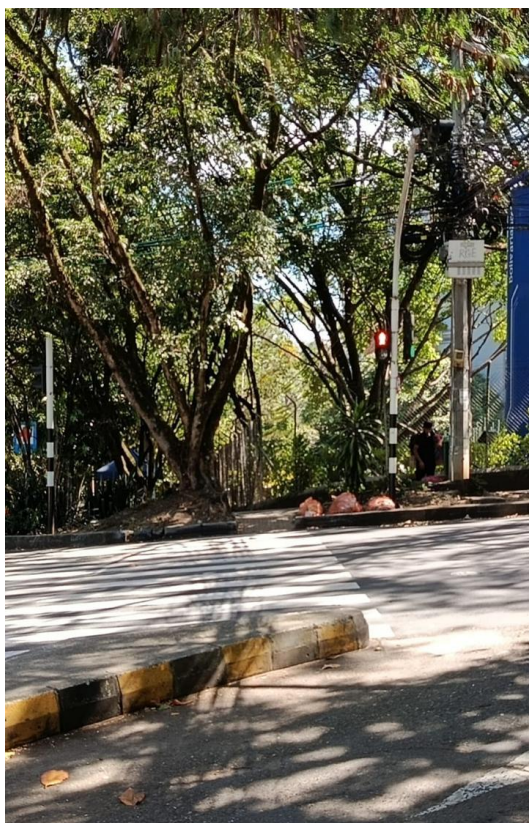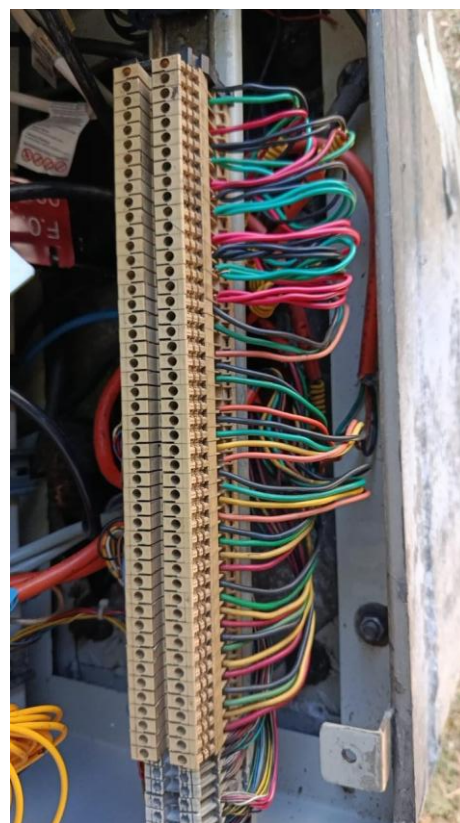


Cambio de fusibles y conexión de cables en borneras

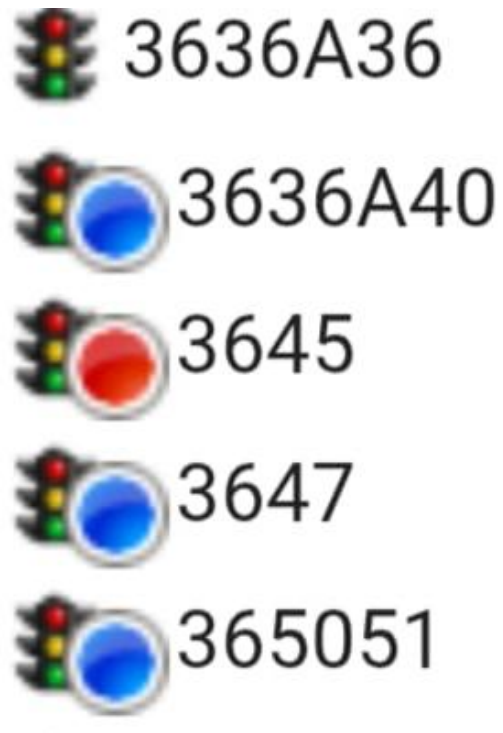
Date/Time	2026-08-10 / 21:23:11
CPU load	0.00 %
Mains voltage	95 volt / 0.0 Hz
Mains voltage 2	0.0 volt
Temperature (CPU)	0 degrees
System voltage	0.0 volt
CPU voltage	0.00 volt



LC apagado por falla en la acometida eléctrica

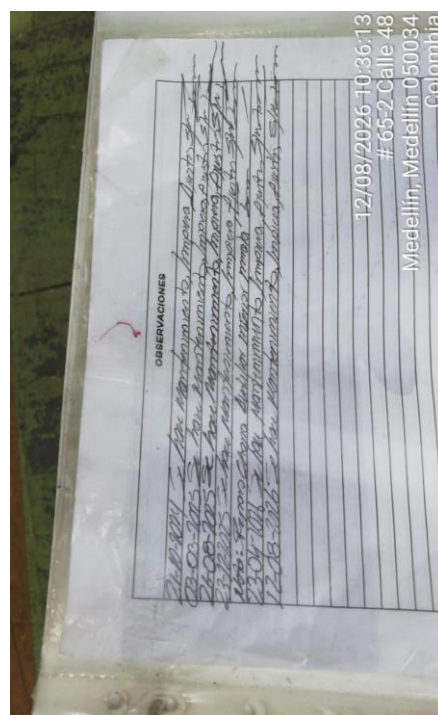

Mantenimiento y limpieza de controladores locales

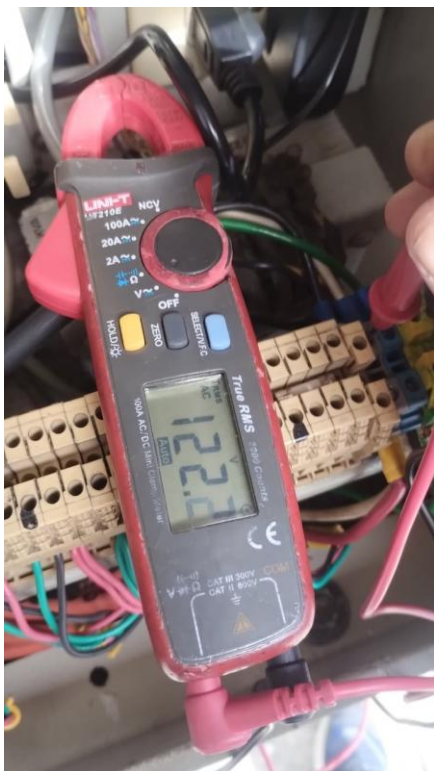

Medición de tierras

3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 PERSONAL

Durante el mes de agosto de 2026, CIVILEC S.A.S. garantizó la disponibilidad del personal técnico, operativo y profesional requerido para la ejecución del contrato No. 4600105143 de 2025, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales y las especificaciones técnicas del proceso.

El recurso humano vinculado al proyecto estuvo conformado por:

- Ingeniero director general del contrato, quien tiene a su cargo la coordinación general del proyecto y, además, apoya todas las actividades relacionadas tanto con los equipos marca SWARCO – PEEK (referencias EC – 1, EC – 1 ARM, EC – 2 y FlowNode), como con la plataforma de control central RMS.
- Ingeniero encargado de la organización y del mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y de las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos del sistema.
- Tecnólogos electrónicos quienes son el soporte para atender todo lo relacionado con el mantenimiento de los equipos de control local marca SWARCO – PEEK TRAFFIC, referencias EC – 1, EC – 1 ARM, EC – 2 y FlowNode. Igualmente, son los encargados del mantenimiento de los equipos de planta externa y demás elementos que no hacen parte de los controladores locales pero que están conectados a los mismos.
- Auxiliar de mantenimiento que se encarga de hacer el mantenimiento y limpieza de los controladores locales

Este equipo se encargó de llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico al sistema RMS, reprogramaciones y atención de novedades operativas.

Cada uno de los integrantes del equipo cumple con los perfiles establecidos en los términos contractuales y cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, conforme a la normatividad vigente.

Ver Anexo 5 – Seguridad social

4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

En este apartado se presenta el resumen financiero del contrato No. 4600105143 de 2025, el cual permite evidenciar la relación entre el avance físico de las actividades y la ejecución presupuestal del proyecto.

El seguimiento contable y financiero es fundamental para garantizar el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas.

Los datos aquí consignados se derivan de la facturación mensual, los registros de ejecución física y los soportes documentales que acompañan este informe, y constituyen la base para la elaboración de las actas de pago y el control presupuestal del contrato.

4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

El contratista presenta el decimocuarto avance de ejecución del contrato No. 4600105143 de 2025, correspondiente a un período de 31 días (1 al 31 de agosto de 2026).

El Acta No. 14 corresponde a un valor de \$ 186.284.228 (Ciento ochenta y seis millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiocho pesos).

A la fecha del presente informe, el contrato acumula 432 días de ejecución, durante los cuales se han desarrollado las actividades técnicas, administrativas y de soporte contempladas en el alcance contractual, cumpliendo con los lineamientos del cronograma y la disponibilidad presupuestal.

En los apartados siguientes se presenta el control de programación y flujo de inversión, así como el detalle de pagos efectuados al contratista y su correspondencia con los avances físicos registrados.

4.2 CONTROL DE PAGOS

En este apartado se presenta el consolidado de los pagos efectuados en el marco del contrato No. 4600105143 de 2025, correspondientes a los avances de obra reportados y aprobados por la supervisión del contrato. Este control permite evidenciar la relación entre la ejecución física de las actividades y el desembolso de recursos, garantizando la adecuada administración financiera del proyecto.

4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el detalle de los pagos realizados al contratista, en el cual se relacionan los periodos de ejecución, el valor de cada acta y el acumulado a la fecha de corte del presente informe:

No. Acta	Período de Ejecución	Valor Acta	Valor Acumulado
1	26/06/2025 – 31/07/2025	\$171.021.080	\$ 171.021.080
2	1/08/2025 – 31/08/2025	\$918.969.349	\$ 1.089.990.429
3	1/09/2025 – 30/09/2025	\$ 456.878.501,26	\$ 1.546.868.930
4	1/10/2025 – 31/10/2025	\$ 822.184.883,94	\$ 2.369.053.815
5	1/11/2025 – 30/11/2025	\$ 126.626.040,82	\$ 2.495.679.856
6	1/12/2025 – 31/12/2025	\$ 129.560.977,00	\$ 2.625.240.833
7	1/01/2026 – 31/01/2026	\$ 128.958.197,00	\$ 2.754.199.031
8	1/02/2026 – 28/02/2026	\$ 229.920.105,00	\$ 2.984.119.137
9	1/03/2026 – 31/03/2026	\$ 139.205.461,00	\$ 3.123.324.598
10	1/04/2026 – 30/04/2026	\$ 427.684.319,00	\$ 3.551.008.916
11	1/05/2026 – 31/05/2026	\$ 133.780.439,00	\$ 3.684.789.355
12	1/06/2026 – 30/06/2026	\$ 659.206.385,00	\$ 4.343.995.742
13	1/07/2026 – 31/07/2026	\$ 135.081.659,00	\$ 4.479.077.401
14	1/08/2026 – 31/08/2026	\$ 186.284.228,00	\$ 4.665.361.630

5. INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato No. 4600105143 de 2025, CIVILEC S.A.S. mantiene vigentes las garantías exigidas por el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Las pólizas han sido emitidas a favor del contratante, amparando las siguientes coberturas:

- Cumplimiento del contrato.
- Calidad del servicio.
- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
- Responsabilidad civil extracontractual.

Durante el periodo de este informe, las pólizas permanecen en vigor y cumplen con las condiciones y valores asegurados establecidos en los pliegos de condiciones y el contrato.

Ver Anexo 4 – Pólizas


6. ANEXOS

6.1 Anexo 1 – Suministro de repuestos

CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-026
			VERSIÓN 1
	SUMINISTRO DE REPUESTOS		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN					
NÚMERO DE CONTRATO		4600105143 DE 2025					
ÍTEM No	FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	No. SERIE	ENTREGADO A
3	18/08/2026	Suministro de tarjeta de control, unidad central del procesador, para controladores locales de semáforos	SWARCO / PEEK TRAFFIC	2	Un	CS22280177 CS21340456	CIOS


ENTREGA


RECIBE

6.2 Anexo 2 – Formato de seguimiento diario de actividades

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
01/08/2026	525346	CANDELARIA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
01/08/2026	434557	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
02/08/2026	4649	CANDELARIA	Falla eléctrica-Breaker disparado	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
03/08/2026	80D79	ROBLEDO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
03/08/2026	455556	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	ARM bloqueada. Se reinicia LC
03/08/2026	2505S	POBLADO	Falla en circuito de detectores	Revisión técnica	Radar sin cable de conexión en LC. Se reporta novedad
03/08/2026	50E02S	GUAYABAL	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
03/08/2026	64B50	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta circuito de pulsadores
03/08/2026	72A78B	ROBLEDO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
04/08/2026	4649	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Personal de mantenimiento reemplaza cable del circuito de acometida
04/08/2026	4654	CANDELARIA	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cable de control. Se reporta novedad
04/08/2026	4910	POBLADO	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	SG1 quemando fusible. Se reporta novedad
04/08/2026	51D5259	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
04/08/2026	67A51	LAURELES	Falla en circuito de pulsadores	Revisión técnica	Se restaura tarjeta de pulsadores
04/08/2026	2505S	POBLADO	Falla en circuito de detectores	Revisión de conexiones internas	Se conecta cable de radar
04/08/2026	72A78B	ROBLEDÓ	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC con bajo voltaje. Se reporta novedad
04/08/2026	7050	LAURELES	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
04/08/2026	4552	CANDELARIA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en SG4. Se reporta novedad
05/08/2026	321212A	POBLADO	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cables de varios grupos. Se reporta novedad
05/08/2026	554849	CANDELARIA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
05/08/2026	4910	POBLADO	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta cable del SG1 en borneras
05/08/2026	6543	LAURELES	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Se reemplaza resistencia de potencia
05/08/2026	3216AS	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reemplaza pigtail
05/08/2026	5757	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
06/08/2026	4649	CANDELARIA	Mantenimiento preventivo	Instalación de componentes	Se instala UPS
06/08/2026	4649	CANDELARIA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en SG 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Encienden rojo y verde simultáneamente. Se desconectan los verdes y se reporta novedad
06/08/2026	44454686	ARANJUEZ	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Personal de mantenimiento trabajando en instalación de amoblamiento
06/08/2026	4649	CANDELARIA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en lámpara del SG1. Además, se revisan empalmes en los SG 3 y 7. Se reporta novedad
06/08/2026	39B76	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
08/08/2026	5214	GUAYABAL	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta cable en borneras

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
09/08/2026	72A78B	ROBLEDO	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cable de control. Se reporta novedad
09/08/2026	3245	BUENOS AIRES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
09/08/2026	505135	CANDELARIA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en SG4. Se reporta novedad
10/08/2026	79AA44	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
10/08/2026	36A4547	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC con bajo voltaje. Se reporta novedad
10/08/2026	515236	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
10/08/2026	8444	LA AMÉRICA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
10/08/2026	72A78B	ROBLEDO	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se cambian fusibles de grupos peatonales
10/08/2026	455556	CANDELARIA	Falla de comunicación	Reemplazo de componente	Se cambia adaptador de router
11/08/2026	43444544	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
11/08/2026	3958	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
11/08/2026	504344	CANDELARIA	Falla de comunicación	Reemplazo de componente	Se cambia adaptador de router
11/08/2026	4654	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
11/08/2026	4649	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Cambio de semáforos peatonales
11/08/2026	5153	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
11/08/2026	435354	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
11/08/2026	435556	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
11/08/2026	555051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
12/08/2026	43B10	POBLADO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
12/08/2026	455556	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
12/08/2026	7634	LAURELES	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
12/08/2026	4247	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
12/08/2026	7634	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
12/08/2026	67A49B50	LAURELES	Falla en circuito de pulsadores	Revisión técnica	Falla en PB1. Se reporta novedad
13/08/2026	66B30A	BELÉN	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en cable y/o lámparas del SG7. Se reporta novedad
13/08/2026	67A49B50	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se revisa circuito de pulsadores. Funcionamiento OK
13/08/2026	36A4547	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Revisión de acometida eléctrica
13/08/2026	3245	BUENOS AIRES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
14/08/2026	6584	CASTILLA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en cable y/o lámparas. Se reporta novedad
14/08/2026	4910	POBLADO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC con bajo voltaje. Se reporta novedad
15/08/2026	515236	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
16/08/2026	52534S6S	GUAYABAL	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cables de control. Se reporta novedad
16/08/2026	43F1011	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
16/08/2026	5267	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
17/08/2026	7055	LAURELES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
17/08/2026	5254	CANDELARIA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en cables y/o lámparas de los SG 4 y 5. Se reporta novedad
18/08/2026	7347D48	LAURELES	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
18/08/2026	4366F67	MANRIQUE	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
18/08/2026	4638	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
18/08/2026	5149	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Personal de mantenimiento trabajando en instalación de amoblamiento
18/08/2026	ITM	ROBLEDOS	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
18/08/2026	77B50	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se restaura tarjeta ARM
19/08/2026	8565	ROBLEDOS	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
19/08/2026	65104	CASTILLA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
20/08/2026	7660	ROBLEDOS	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cables de control. Se reporta novedad
20/08/2026	52534S6S	GUAYABAL	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se reemplazan fusibles y se conectan cables en borneras

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
20/08/2026	51D5259	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
20/08/2026	4366F67	MANRIQUE	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
21/08/2026	7347D48	LAURELES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
21/08/2026	3201S	POBLADO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
21/08/2026	659697	CASTILLA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
21/08/2026	64C67	ROBLEDO	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en acometida eléctrica. Se reporta novedad
22/08/2026	7847D	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
22/08/2026	8028	BELÉN	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable sin continuidad entre 8028 y 8030A. Se reporta novedad
22/08/2026	7660	ROBLEDO	Apoyo operativo	Activación de modo de operación	LC en flash entre 12:00 y 19:00 por orden del subsecretario
23/08/2026	66B30A	BELÉN	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cables de control. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
23/08/2026	66B30A	BELÉN	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se cambian fusibles y se conectan cables en borneras
23/08/2026	8250	LA AMÉRICA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
23/08/2026	79AA44	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
24/08/2026	555051	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conectan cables de control y acometida eléctrica por cambio de gabinete
24/08/2026	5267	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
24/08/2026	6973	ROBLEDO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
24/08/2026	72A78B	ROBLEDO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
24/08/2026	66B01	LAURELES	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño por vandalismo	Daño en cables de semaforización y foto detección. Se reporta novedad
24/08/2026	64C67	ROBLEDO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
25/08/2026	7844	LAURELES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
25/08/2026	65677880	CASTILLA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Inducción en grupos 15 y 16. Se desconectan en borneras y se reporta novedad
25/08/2026	525758	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad
25/08/2026	66B01	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conectan cables en borneras y se revisa funcionamiento
25/08/2026	64C67	ROBLEDO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
25/08/2026	51D5259	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
25/08/2026	65677880	CASTILLA	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en transformador, se reemplaza
27/08/2026	65677880	CASTILLA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
27/08/2026	64C67	ROBLEDO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC con bajo voltaje. Se reporta novedad
27/08/2026	5153	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
27/08/2026	72A78B	ROBLEDO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
28/08/2026	50FF12S	GUAYABAL	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Sector sin servicio de energía comercial. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS AGOSTO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
28/08/2026	4590	ARANJUEZ	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
28/08/2026	4646A93	ARANJUEZ	Falla en circuito de potencia	Revisión técnica	Falla en grupos peatonales. Se reporta novedad
28/08/2026	65677880	CASTILLA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
28/08/2026	64C67	ROBLEDO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Se instala transformador
31/08/2026	72A78B	ROBLEDO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
31/08/2026	5667	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
31/08/2026	6530A	BELÉN	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

6.3 Anexo 3 – Formato de mantenimiento de controladores

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-025
		VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
4/08/2026	7635	EC - 2	✓		✓	
4/08/2026	7634	FlowNode	✓		✓	
4/08/2026	7833	EC - 1 ARM	✓		✓	
4/08/2026	8033	EC - 1 ARM	✓		✓	
4/08/2026	8035	EC - 1 ARM	✓		✓	
4/08/2026	7344	FlowNode	✓		✓	
4/08/2026	68A44	FlowNode	✓		✓	
5/08/2026	5944	EC - 1 ARM	✓		✓	
5/08/2026	6466B44	EC - 2	✓		✓	
5/08/2026	7444	FlowNode	✓		✓	
5/08/2026	7544	FlowNode	✓		✓	
5/08/2026	7844	FlowNode	✓		✓	
5/08/2026	6543	FlowNode	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		VERSIÓN 1
			ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
5/08/2026	6544	FlowNode	✓		✓	
6/08/2026	7847D	EC - 1 ARM	✓		✓	
6/08/2026	79AA44	FlowNode	✓		✓	
6/08/2026	808144	EC - 1 ARM	✓		✓	
6/08/2026	8046	EC - 2	✓		✓	
6/08/2026	8045G	EC - 2	✓		✓	
6/08/2026	8444	EC - 1 ARM	✓		✓	
6/08/2026	9044	EC - 2	✓		✓	
10/08/2026	9244	FlowNode	✓		✓	
10/08/2026	9235	EC - 1 ARM	✓		✓	
10/08/2026	10840	EC - 1 ARM	✓		✓	
10/08/2026	9943	EC - 2	✓		✓	
10/08/2026	9944	EC - 1 ARM	✓		✓	
10/08/2026	994547A	EC - 2	✓		✓	
10/08/2026	8747F48A	EC - 2	✓		✓	
11/08/2026	7047D48	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
11/08/2026	8047D48	EC - 1 ARM	✓		✓	
11/08/2026	8247D48	EC - 1 ARM	✓		✓	
11/08/2026	8747D47DD	EC - 2	✓		✓	
11/08/2026	8250	FlowNode	✓		✓	
11/08/2026	81A50	EC - 1 ARM	✓		✓	
11/08/2026	8154	EC - 2	✓		✓	
12/08/2026	7347D48	EC - 1 ARM	✓		✓	
12/08/2026	68A47D48	EC - 2	✓		✓	
12/08/2026	6548	EC - 2	✓		✓	
12/08/2026	6549B	FlowNode	✓		✓	
12/08/2026	67A49B50	FlowNode	✓		✓	
12/08/2026	6650	FlowNode	✓		✓	
12/08/2026	5750	EC - 1 ARM	✓		✓	
13/08/2026	64B50	FlowNode	✓		✓	
13/08/2026	6550	FlowNode	✓		✓	
13/08/2026	6551	FlowNode	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
13/08/2026	6559A	EC - 2	✓		✓	
13/08/2026	6555	FlowNode	✓		✓	
13/08/2026	67A51	FlowNode	✓		✓	
13/08/2026	7055	FlowNode	✓		✓	
14/08/2026	705153	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/08/2026	7050	FlowNode	✓		✓	
14/08/2026	735051	EC - 2	✓		✓	
14/08/2026	7450	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/08/2026	77B50	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/08/2026	8050NE	EC - 2	✓		✓	
14/08/2026	8050SW	EC - 2	✓		✓	
18/08/2026	737453	EC - 2	✓		✓	
18/08/2026	745560	FlowNode	✓		✓	
18/08/2026	7660	FlowNode	✓		✓	
18/08/2026	74B65	EC - 1 ARM	✓		✓	
18/08/2026	7765	EC - 1 ARM	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
18/08/2026	8065	EC - 1 ARM	✓		✓	
18/08/2026	805455	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/08/2026	7965	EC - 2	✓		✓	
19/08/2026	80A65	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/08/2026	8565	EC - 2	✓		✓	
19/08/2026	8965	EC - 2	✓		✓	
19/08/2026	9164	EC - 2	✓		✓	
19/08/2026	108BB62D	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/08/2026	8576	FlowNode	✓		✓	
20/08/2026	64C67	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/08/2026	64C57	FlowNode	✓		✓	
20/08/2026	6671	EC - 2	✓		✓	
20/08/2026	6773	EC - 2	✓		✓	
20/08/2026	6973	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/08/2026	7369	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/08/2026	ITM	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
21/08/2026	8074	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/08/2026	80D79	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/08/2026	8077B	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/08/2026	807879	EC - 2	✓		✓	
21/08/2026	8080	EC - 2	✓		✓	
24/08/2026	5154	EC - 1 ARM	✓		✓	
24/08/2026	5944	EC - 1 ARM	✓		✓	
24/08/2026	72A78B	EC - 1 ARM	✓		✓	
24/08/2026	65677880	EC - 1 ARM	✓		✓	
24/08/2026	6584	EC - 1 ARM	✓		✓	
24/08/2026	65818991	EC - 1 ARM	✓		✓	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 NIT. 800.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65			NO. POLIZA 65-40-101002447			ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2025			A LAS HORAS 06:00			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 07 2027			A LAS HORAS 23:59		
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA														

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CIVILEC S.A.S.** IDENTIFICACIÓN NIT: **800.941.557-7**
 DIRECCIÓN: **KR 76 A 26 A 34** CIUDAD: **MEDELLIN, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3104259077**

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
 ASEGURADO: **CIVILEC S.A.S.** IDENTIFICACIÓN NIT: **800.851.987-5**
 DIRECCIÓN: **KR 76 A 26 A 34** CIUDAD: **MEDELLIN, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3104256677**
 BENEFICIARIO: **89091557 - CIVILEC S.A.S.**

OBJETO DEL SEGURO
 CON SUSECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AÑADAN 14-05-2020 - 1008-P-04-90089-D-008-9918-9000 / 31-03-20-1318-P-04-90089-D-008-0024-0081, QUE PODRAN SUJETAR INFORMANTE DE LA CLIMA Y EL TOMADOR PODRAN SER: ENTREGA Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
 GARANTIZA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO 4400010341 DE 2020 CUANTO SE REALICEN EL DEPÓSITO, NOTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS ELÉCTRICOS PARA EL SUPLENIR Y SUMINISTRO DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE CIENFES, BUCKWAGIA O INNOVACION DE MEDIO.

AMPAROS
 RÍSGO: SUMINISTRO DE BOMBAS

AMPARO	DIRECCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FORMA ASES ACTUAL	FORMA ASES ANTERIOR
PÉRDIDA LABORAL Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.99 MMDV	26/06/2025	30/07/2027	\$989,400,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.99 MMDV	26/06/2025	30/07/2027	\$278,800,000.00	
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.99 MMDV	26/06/2025	30/07/2027	\$278,800,000.00	

ACELERACIONES
 POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE PAGO 25 DE JUNIO DE 2025, SE ACTIVA VIGENCIA ORIGINAL DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO 4400010341.
 LOS OTRAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICAN CONTINUAN EN VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAZO DE PAGO
\$ 1112,371,200.00	\$ 1112,200.00	\$ 1112,483,400.00	\$ 1112,200.00	\$ 1112,483,400.00	CONTADO

INTERMEDARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CAVIRIA NOROCCO ASESORES EN SEGUROS	8375	1.00 %			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPEDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-49 OFICINA 1406 - TELÉFONO: 2805860 - MEDELLIN

65-40-101002447
 FORMAL AUTORIZADA: Juan Luis Ospina, Vicepresidente de Fianzas

FORMAL TOMADOR

SE PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM
 OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 101 - 40, PISO 1 TELÉFONO: 80110077, 40-00000000
 DISTRIBUCION AFIPRO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 866.909.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
MEDELLIN						MEDELLIN						65		05-40-101082447		3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	HORAS	DÍA	MES	AÑO	DÍA	HORAS					
27	06	2025	26	06	2025	00:00		26	07	2027	23:59						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIVILEC S.A.S.										IDENTIFICACIÓN NIT: 886.941.557-7	
DIRECCIÓN: R.T. 16 A. 26 A. 34						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA				TELÉFONO: 3104252077	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO: CIVILEC S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 886.941.557-7	
DIRECCIÓN: KR 16 A 26 A 34		CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	
BENEFICIARIO: REMISSO - CIVILEC S.A.S.		TELÉFONO: 3104252077	

APORTE	DESCRIPCION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FORMA AERO ACTUAL	FORMA AERO ANTIGUA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PREMIO - Máximo: 1.00 MILLIV	26/06/2025	26/07/2027	\$176,830,680.00	
SAO ENFERMEDAD Y SOCIO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PREMIO - Máximo: 1.00 MILLIV	26/06/2025	26/07/2027	\$176,830,680.00	
PRESTACIONES EXTRA PATRONALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PREMIO - Máximo: 1.00 MILLIV	26/06/2025	26/07/2027	\$176,830,680.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA REGRAR EL PAGO DE LA PRIMA DIVULGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCAION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENCIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE NOTIFIEN URGENTEMENTE AL CLIENTE Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO. 45 OFICINA 100 - TELÉFONO: 289096 - MEDELLIN

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

05-40-101082447

FIRMA ASESOR/ASISTENTE: Juan Luis Ospina - Responsabilidad de Firmas

Martín Ospina

FIRMA TOMADOR

CERTIFICACION



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.
NIT. 800.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
MEDELLIN						MEDELLIN						65		65-40-101082447		3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
27	06	2025	26	06	2025	00:00		26	07	2027	23:59		ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIVLEC S.A.S. IDENTIFICACIÓN NIT: 898.841.557-7

DIRECCIÓN: RT 76 A 26 A 34 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104250977

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CIVLEC S.A.S. IDENTIFICACIÓN NIT: 898.841.557-7

DIRECCIÓN: RT 76 A 26 A 34 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104250977

BENEFICIARIO: BOMISSAT - CIVLEC S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DAÑA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA PAGAR EL PAGO DE LA PRIMA DIVIDENDADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTRATO QUEBA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO 40-45 OFICINA 1006 - TELÉFONO: 283906 - MEDELLIN

65-40-101082447

1998.847093225, Juan Luis Ospina - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CBS/MACHINER/001


SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 NIT. 860.008.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COO.SUC 65	NO.POLIZA 65-44-101248663	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 26 07 2026	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CIVLEC S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT: 696.941.557-7
 DIRECCIÓN: **KR 76 A 26 A 34** CIUDAD: **MEDELLIN, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3104259077**

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
 ASEGURADO / BENEFICIARIO: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS** IDENTIFICACIÓN: NIT: 886.804.211-1
 DIRECCIÓN: **CL 44 NRO. 52 - 165** CIUDAD: **MEDELLIN, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **4444144**
 ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción A LAS CONDICIONES ORIGINALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN DESTINOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA NORMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN ADECUAR SEGUROS Y BAJO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar el pago de los prestaciones contratadas del INTERVENIMIENTO DEL CONTRATO No. 46490195143 DE 2025 COMO SUJETO SE REALIZAN EL ESPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE DATOS ELECTRONICA PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.

AMPAROS
 KISSCO, SUMINISTRO DE BISSSES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MON. ASEG/ACTUAL	MON. ASEG/ANTIGUO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	26/07/2026	\$799,249,359.00	
REPOSICIÓN DEL FIANC ANTICUADO	26/06/2025	26/07/2026	\$79,024,325.00	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BISSSES	26/06/2025	26/07/2026	\$799,249,359.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LIGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/06/2025	26/07/2026	\$799,249,359.00	

ACLARACIONES
 POR HABER DEL INGRESO Y SE ACORDA A ACTA DE INICIO DE PÉGINA 26 DE JUNIO DE 2025, SE AUTORA VIGENCIA DEICIAL DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. 46490195143.

LOS BISSSES TECNICO Y CONDICIONES DE MODIFICACION CONTINUAN EN VIGENCIA.

VALOR PRIMA META	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****13.404.727.00	\$ ****25.000.00	\$ ****2.551.648.00	\$ ****15.081.375.00	\$ ****2.520.897.100.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUIDOR/COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GAVIRIA NORALDE AEROSPACE EN BISSSES	8774	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 52 NO 45-45 OFICINA 1800 - TELÉFONO: 3895860 - MEDELLIN


 FOMA AUTORIZADA: **Juan Luis Cárdena** - Vicepresidente de Finanzas


 FOMA TOMADOR: **Martín Zapata**

ESTE SE PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AV. REPÚBLICA NOROCC 8 161 - 40, PISO 4 TELÉFONO: 3895860, 3895863

DISTRIBUIDOR/COSEGURO: 1



DECRETO 1032 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLÍN				SUCURSAL MEDELLÍN				COD SUC 65		RD/POLIZA 05-44-101240663		ANEXO 2			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO				VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO				A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO				A LAS HORAS	
27 06 2025				26 06 2025				08:00		26 07 2030				22:59	
TIPO MOVIMIENTO															
ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA															

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
---------------------------------	--

NOMBRE D'RAZON SOCIAL		CIVILEC S.A.S.		DATOS DEL TOMADOR Y GARANTIZADO		IDENTIFICACION		MT: 888.841.557-7	
DIRECCION:		R# 16 A 25 A 34		CIUDAD:		MEDELLIN ANTIOQUIA		TELEFONO:	
								310425007	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
------------------------------------	--

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		IDENTIFICACIÓN: NIT: 886.965.211-1	
DIRECCIÓN: CL 44 N° 53 - 955	CUIDAD: MEDELLÍN, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4441151	

ADDITIONAL

TESTO AGLIANTONIO

QUEJA EXPRESAMENTE CONVENIO QUE LA OBLIGACION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO:

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE RESEGUR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASIGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO. 45-45 CHICHA TERN - TELÉFONO: 2780000 - MIGUELÍN

85-44-10460-2000

FERRAS, A. & TOPILAND, J. 1998. L'écologie des plantes : principes et applications.

Figure 1. The study area.

CRISTIAN CHIRIAC

RELACIÓN DE ANEXOS

Los siguientes documentos se incorporan al presente informe como anexos y se presentan a continuación, en el mismo orden en el que se relacionan:

6.5 ANEXO 5 – SEGURIDAD SOCIAL

6.6 ANEXO 6 – SG-SST

6.7 ANEXO 7 – CERTIFICADOS

6.8 ANEXO 8 – ACTAS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71777277
DESDE AGOSTO 2026 HASTA SEPTIEMBRE 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					890941557					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					71777277														
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:										CIVILEC S.A.S.					APELLIDOS:					LOPEZ ALVAREZ NOMBRES:					LUIS FELIPE														
CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA					CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA														
DIRECCIÓN:					CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:					7777777					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:																			
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO														
TIPO EMPRESA:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Comercio al por mayor de otros utensilios domésti					TIPO DE SALARIO:					FIJO																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI										COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									

PLANILLA No:	6033648472										TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				agosto - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				septiembre - 2026		FECHA DE PAGO:		31/08/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS			
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU					
																						FSP																					SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
\$ 9.457.555																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 9.457.555	\$ 1.513.300	\$ 47.300	\$ 47.300	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.607.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 9.457.555	\$ 378.400	\$ 0	\$ 378.400	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 9.457.555		\$ 411.500	30	\$ 9.457.555	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 378.400														

TOTAL PAGADO:

\$ 2.776.200



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71681533
DESDE AGOSTO 2026 HASTA SEPTIEMBRE 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					890941557					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					71681533														
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:										CIVILEC S.A.S.					APELLLIDOS:					HERRERA MONTOYA NOMBRES:					RODRIGO														
CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA					CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA														
DIRECCIÓN:					CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:					7777777					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:																			
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO														
TIPO EMPRESA:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Comercio al por mayor de otros utensilios domésti					TIPO DE SALARIO:					FIJO																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI										COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									

PLANILLA No:	6033648472										TIPO DE PLANILLA:	E			PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2026			FECHA DE PAGO:	31/08/2026			FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL			SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS											
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																							
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									ADMIN	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE					ADMIN	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
\$ 4.698.067									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	\$ 6.320.019	\$ 1.011.300		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.011.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 6.320.019	\$ 252.900	\$ 0	\$ 252.900	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 6.320.019		\$ 275.000	30	\$ 6.320.019	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 252.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

TOTAL PAGADO:	\$ 1.792.100
---------------	--------------



Entregado por: _____

Recibido por: _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		890941557	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		71702094	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIVILEC S.A.S.	APELLIDOS:	GARCIA ESCOBAR NOMBRES:		ISAIAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA	
DIRECCIÓN:	CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:		7777777	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:				NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de otros utensilios domésti	TIPO DE SALARIO:				FIJO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

PLANILLA No:	6033648472													TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2026	FECHA DE PAGO:	31/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:												001 - EMPLEADOS								
	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
\$ 2.294.082																25-14 COLPENSIONES	24	\$ 1.835.266	\$ 293.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 293.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	\$ 1.835.266	\$ 73.500	\$ 0	\$ 73.500	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	24	\$ 1.835.266		\$ 79.900	24	\$ 1.835.266	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 73.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.294.082												25-30				25-14 COLPENSIONES	6	\$ 458.817	\$ 73.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 73.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	\$ 458.817	\$ 18.400	\$ 0	\$ 18.400	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	6	\$ 458.817		\$ 0	6	\$ 458.817	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 18.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 630.900
----------------------	-------------------

Entregado por:

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71753008
DESDE AGOSTO 2026 HASTA SEPTIEMBRE 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					890941557					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					71753008														
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:										CIVILEC S.A.S.					APELLLIDOS:					JIMENEZ GARCES NOMBRES:					JOSE IGNACIO														
CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA					CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA														
DIRECCIÓN:					CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:					7777777					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:																			
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO														
TIPO EMPRESA:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Comercio al por mayor de otros utensilios domésti					TIPO DE SALARIO:					FIJO																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI										COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									

PLANILLA No:	6033648472										TIPO DE PLANILLA:	E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2026		FECHA DE PAGO:	31/08/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS										
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																	
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
\$ 4.698.067									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	\$ 6.375.948	\$ 1.020.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 6.375.948	\$ 255.100	\$ 0	\$ 255.100	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 6.375.948		\$ 277.400	30	\$ 6.375.948	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 255.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 1.807.800
---------------	--------------



Entregado por: _____

Recibido por: _____



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71777277
DESDE AGOSTO 2026 HASTA SEPTIEMBRE 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS DEL COTIZANTE						
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			890941557	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			71777277		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				CIVILEC S.A.S.	APELLIDOS:	LOPEZ ALVAREZ NOMBRES:			LUIS FELIPE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:			ANTIOQUIA	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:			ANTIOQUIA		
DIRECCIÓN:	CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:			7777777	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:					
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:			B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:			NO		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:			Comercio al por mayor de otros utensilios domésti	TIPO DE SALARIO:	FIJO					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI

PLANILLA No:	6033648472										TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				agosto - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				septiembre - 2026		FECHA DE PAGO:		31/08/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS				
NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																					
																		PENSIÓN										SALUD										ARP						CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																		ADMIN		DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE										
SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE						ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE																						ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE		
SALARIO BÁSICO		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE										
\$ 9.457.555																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 9.457.555	\$ 1.513.300	\$ 47.300	\$ 47.300	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.607.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 9.457.555	\$ 378.400	\$ 0	\$ 378.400	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 9.457.555		\$ 411.500	30	\$ 9.457.555	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 378.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										

TOTAL PAGADO: \$ 2.776.200



Entregado por:

Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		890941557	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		75102799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIVILEC S.A.S.	APELLIDOS:	GIRALDO MONTOYA NOMBRES:		WILSON FERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:		7777777	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de otros utensilios domésti	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
				SI			

PLANILLA No:	6033648472										TIPO DE PLANILLA:	E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2026		FECHA DE PAGO:	31/08/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS										
	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD									EMPLEADOR	EMPLEADO	IBC	ADMIN					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE				
\$ 5.891.386																		231001-COLFONDOS	30	\$ 5.891.386	\$ 942.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 942.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 5.891.386	\$ 235.700	\$ 0	\$ 235.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 5.891.386		\$ 30.800	30	\$ 5.891.386	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 235.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 1.444.900
----------------------	---------------------



Entregado por:

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1017243048
DESDE AGOSTO 2026 HASTA SEPTIEMBRE 2026


DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					890941557					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1017243048														
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:										CIVILEC S.A.S.					APELLLIDOS:					ZAPATA NOMBRES:					JUAN JOSE														
CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA					CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA														
DIRECCIÓN:					CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:					7777777					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:																			
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO														
TIPO EMPRESA:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Comercio al por mayor de otros utensilios domésti					TIPO DE SALARIO:					FIJO																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI										COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									

PLANILLA No:	6033648472										TIPO DE PLANILLA:	E			PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2026			FECHA DE PAGO:	31/08/2026			FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL			SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS													
	NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																					SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									IBC	ADMIN	IBC	TOTAL APORTE									IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
\$ 4.698.067								01-30									230201-PROTECCION	30	\$ 6.320.019	\$ 1.011.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.011.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 6.320.019	\$ 252.900	\$ 0	\$ 252.900	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 6.320.019		\$ 275.000	30	\$ 6.320.019	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 252.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							

CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Civilec S.a.s.**, identificada con **NI 890941557** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **3/03/2026** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2025** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **93,00%**, **ACEPTABLE**.


Resultados Evaluación por Ciclo

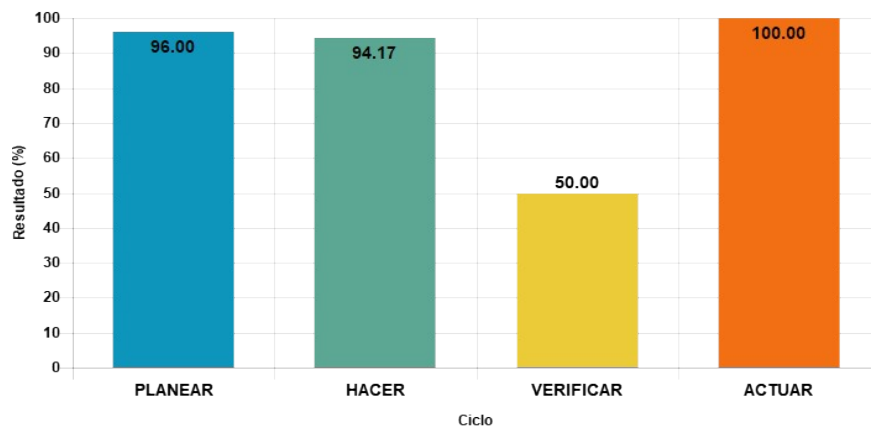

CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	24,00%	96,00%
HACER	60,00%	56,50%	94,17%
VERIFICAR	5,00%	2,50%	50,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	93,00%	93,00%

Resultados Evaluación por Estándar





ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	14,00%	93,33%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	19,00%	95%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	27,50%	91,67%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	2,50%	50%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	93,00%

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de expedición: **11 agosto 2026.**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:

Para verificación de Positiva



VERSIÓN 1/ ENERO 2026

CÓDIGO: SGSST-FTINDPT

No PAG: 1

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2026

[illegible]

[illegible]

<div>CIVILEC SAS</div> <div>NIT 890.941.557-7</div>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																												VERSIÓN 1/ ENERO 2026					
	PLAN DE TRABAJO ANUAL 2026																												CÓDIGO: SGSST-FTINDPT					
																													No PAG: 1					
			Reporte plan de mejoramiento ARL (Según aplique)	Líder SGSST	Profesional y AuPiliar a cargo										P		P										P		P					
	INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBR												
	Número de horas programadas(P)-Número de actividades programadas										5,0	0,0	6,0	0,0	7,0	0,0	8,0	0,0	10,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	6,0	0,0	7,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0		
	Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas										0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	Porcentaje de cumplimiento del mes										0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	META										85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%			
	Lina Maria Giraldo Botero										Martín Jaramillo Rendón																							
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORA										NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																							

Medellín, 31 de agosto de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

REF: Contrato No. 4600105143 DE 2025

**OBJETO: REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES
ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**

En mi calidad de Representante Legal de Civilec S.A.S, me permito certificar que la firma que represento cumple a cabalidad con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al Sistema de Gestión para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, SG-SST, el cual es implementado y autoevaluado en forma permanente con la asesoría de la ARL Positiva. El cumplimiento de la autoevaluación, de acuerdo con la última revisión de la ARL Positiva, es del 93,00%.

Igualmente, Civilec S.A.S cumple totalmente con lo estipulado en el protocolo de Bioseguridad aprobado por el Municipio de Medellín en la plataforma de Empresas de Medellín me cuida, para la ejecución de trabajos previniendo a sus trabajadores de posibles contagios del Covid 19.

Sin otro particular

Cordialmente,

**Martín E. Jaramillo R**
Gerente

Medellín, 31 de agosto de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

REF: CONTRATO 4600105143 DE 2025

Objeto: Realizar el soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y el hardware de la red semafórica del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Por medio de la presente me permito certificar que, a 31 de agosto de 2026, la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Sin otro particular

Cordialmente,



Yakelin Bustamante Barrera
Revisora Fiscal
CC 1035424673
TP 212976-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1A6301776EC7B761

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035424673 de COPACABANA. (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 212976-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

212976-T

YAKELIN
BUSTAMENTE BARRERA
C.C. 1035424673

RESOLUCION INSCRIPCION 12
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 29/01/2016

225662



215776


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.




www.jccps.com

 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>		CONTRATO 4600105143 DE 2025 OBJETO: REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN CONTRATISTA: CIVILEC S.A.S SUPERVISOR: MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES				FECHA DE INICIO		26/06/2025		PERIODO ACTA	
						AMPLIACIONES		N/A		01/08/2026 -38/07/2026	
						DURACIÓN		760 DÍAS			
						VALOR INICIAL		\$ 7.002.492.500			
						ADICIONES		\$ -		FECHA ACTA 1/09/2026	
VALOR CON ADICIONES		\$ 7.002.492.500									
% EJECUTADO EN EL PERIODO		2,66%		% EJECUTADO ACUMULADO		66,62%					
CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
Item	Descripción	Un.	Cant	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total		
CONTROLADORES SEMAFÓRICOS											
1	Suministro de controlador local de semáforos para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestión del centro de control de la central de semáforos de la SMM. Incluye gabinete	Un	1,00	\$ 81.628.514,00	\$ 81.628.514		-	24,00	1.959.084.336,00		
2	Suministro de controlador local de semáforos para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestión del centro de control de la central de semáforos de la SMM. No incluye gabinete.	Un	1,00	\$ 79.328.514,00	\$ 79.328.514		-	-	-		
3	Suministro de tarjeta de control, unidad central del procesador, para controladores locales de semáforos	Un	1,00	\$ 11.075.421,68	\$ 11.075.422	2,00	22.150.843,00	4,00	44.301.687,00		
4	Suministro de tarjeta de potencia, control y monitoreo de lámparas, para controladores locales de semáforos	Un	1,00	\$ 9.305.376,00	\$ 9.305.376		-	15,00	139.580.640,00		
5	Suministro de tarjeta de MDU para controlador semafórico	Un	1,00	\$ 7.650.000,00	\$ 7.650.000		-	2,00	15.300.000,00		
6	Suministro de Rack para controlador semafórico, incluye back plane.	Un	1,00	\$ 16.400.000,00	\$ 16.400.000		-	2,00	32.800.000,00		
7	Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar controladores referencia EC-1 a funcionalidad EC-2	Un	1,00	\$ 5.476.766,08	\$ 5.476.766		-	8,00	43.814.129,00		
8	Suministro de cables para conexión de tarjetas de potencia, control y monitoreo de lámparas, para controladores locales de semáforos	Un	1,00	\$ 731.666,00	\$ 731.666		-	18,00	13.169.988,00		
9	Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales de semáforos	Un	1,00	\$ 731.666,00	\$ 731.666		-	-	-		
10	Suministro de panel de extensión para tarjetas de potencia, control y monitoreo de lámparas para controladores locales de semáforos	Un	1,00	\$ 2.320.126,00	\$ 2.320.126		-	11,00	25.521.386,00		
11	Suministro de fuente de alimentación de 24 V DC para tarjetas de controladores locales de semáforos	Un	1,00	\$ 2.162.536,40	\$ 2.162.536		-	5,00	10.812.682,00		
12	Suministro de transistor Mosfet canal N Ref. 07N60C3	Un	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000		-	-	-		
13	Suministro de circuito integrado PWM Ref. 200D4 encapsulado SOIC 8	Un	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000		-	-	-		
14	Suministro de circuito integrado PWM Ref. UC3842AN encapsulado PDIP 8	Un	1,00	\$ 9.500,00	\$ 9.500		-	-	-		
15	Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref. IRF840	Un	1,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000		-	-	-		
16	Suministro de relevo de ocho terminales planas, dos contactos Normally Open. Bobina de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A	Un	1,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000		-	-	-		
17	Suministro de relevo de arranque de seis terminales planas, dos contactos Normally Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a 16A	Un	1,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000		-	-	-		
18	Suministro de fusible radial miniatura 3.15 A 250V	Un	1,00	\$ 1.980,00	\$ 1.980		-	-	-		
19	Suministro circuito de intermitencia	Un	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000		-	-	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE ESPECIALIZADO A CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC								\$ -	\$ -		
20	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca SWARCO PEEK TRAFFIC instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales y la red de banda ancha de comunicaciones.	Día	1,00	\$ 2.965.498,58	\$ 2.965.499	31,00	91.930.456,00	432,00	1.281.095.387,00		
21	Servicio de mantenimiento del software RMS marca Swarco Peek Traffic	Día	1,00	\$ 513.910,94	\$ 513.911	31,00	15.931.239,00	432,00	222.009.527,00		
22	Programación de controladores local referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node	Un	1,00	\$ 506.538,00	\$ 506.538	35,00	17.728.830,00	242,00	122.582.196,00		
23	Diagnóstico y reparación de tarjeta de control EC-1 o EC-2	Un	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000	9,00	3.600.000,00	10,00	4.000.000,00		
24	Diagnóstico y reparación de tarjeta de potencia EC-1 o EC-2	Un	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000	8,00	3.200.000,00	9,00	3.600.000,00		
25	Diagnóstico y reparación de fuente de alimentación EC-1 o EC-2	Un	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000	5,00	2.000.000,00	7,00	2.800.000,00		
SUBTOTAL					\$ 222.395.014	SUBTOTAL		156.541.368,00	SUBTOTAL ACUMULADO	3.920.471.958,00	
IVA					19,00%	IVA 19%		29.742.860,00	IVA 19%	744.889.672,00	
VALOR TOTAL					\$ 264.650.067	VALOR TOTAL		186.284.228,00	VALOR TOTAL ACUMULADO	4.665.361.630,00	

1516992500


Martín Eladio Jaramillo Rendón
Representante Legal Civilec S.A.S



Mario Alfonso Pérez Linares
Supervisor del contrato 4600105143
