

CONTRATO N° CM-012-2023

CONTRATISTA:

FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR

INFORME N° 7 ESTADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL PROYECTO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE””.

**GOBERNACIÓN DE SUCRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
10 DE JULIO -10 DE AGOSTO2024**

OBJETO DEL PROYECTO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE””.

CONTRATISTA:

**FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR
R.L.NEVER CARLOS CASTRO CASTRO**

VALOR INICIAL: \$14.017.400.687

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES

SINCELEJO, JULIO-AGOSTO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.1	INTRODUCCION.....	5
1.2	JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE LOGRA SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.....	5
1.3	ALCANCE DEL PROYECTO.....	6
1.4	OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	7
1.4.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
1.4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2.	CAPÍTULO II.....	8
2.1	ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO.....	8
2.1.1	CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO PRODUCTIVO.....	8
2.1.2	CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	9
2.2	POLIZAS DEL CONTRATO.....	10
3.	CAPÍTULO III.....	13
3.1	DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	13
3.1.1	LOCALIZACION.....	13
4.1	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	15
4.1.1	ACTAS LEGALES SUSCRITAS.....	15

4.1.2	BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	16
4.1.3	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	18
5.	BALANCE CRONOLOGICO DEL PROYECTO	19
5.1	BALANCE FISICO EJECUTADO DEL PROYECTO	21
6.	CONTROL DE DISPOSICIONES LEGALES	21
6.1	CUADRO DE PLANTA DE PERSONAL	21
7.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS.....	22
7.1.	Visita de evaluación de predio – F001 – LP-012.....	23
7.2.	Visita técnica a predio – F002 – LP-012	23
7.3.	Capacitación grupal: Escuela de Campo (ECA) – F-ECA-001 – LP-012.	24
7.4.	Listado de asistencia ECA – F-ECA-002 – LP-012.	24
7.5.	Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.	24
7.6.	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos. .	27
•	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.....	27
7.7	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	36

1.1 INTRODUCCION.

La gobernación de Sucre adjudicó bajo la modalidad de licitación pública, al consorcio Campo Verde, el contrato N° LP-012-2023 cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

El presente informe mensual N°7 registra la ejecución y desarrollo del proyecto, se describe los sucesos y acciones ms relevantes que sucedieron en el desarrollo y avance del contrato de ejecución de proyecto productivo e Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambiental ; enmarcadas bajo las cláusulas de los contratos, especificaciones técnicas y toda la normativa vigente aplicable a este tipo de contratos, al igual las observaciones y recomendaciones efectuadas por la supervisión del proyecto a cargo de la Gobernación de Sucre

Se describen las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo transcurrido entre el 10 de julio -10 de agosto de la presente anualidad, el cual representa el (7) septimo mes de ejecución correspondiente al desarrollo de los trabajos de las actividades en referencia al contrato de interventoría.

1.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE LOGRA SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Este proyecto de inversión permite fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional a nivel local mediante el enfoque principal de agronegocios hortofrutícolas intensivos, en coherencia con la política pública y con los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional 2018–2022, así como con los planes Departamental y Municipal 2020–2023, orientados a garantizar el acceso estable y suficiente a alimentos. En particular, el objeto “Implementación de Agronegocios Hortofrutícolas Intensivos con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el Departamento de Sucre” se justifica porque consolida una intervención integral que no se limita a la producción, sino que estructura capacidades para producir, gestionar y comercializar: fortalecimiento técnico-productivo, buenas prácticas e inocuidad, manejo poscosecha, organización y gestión empresarial, y articulación a canales de abastecimiento. De esta manera, se aporta a una institucionalidad más robusta y a un sistema territorial que promueve la provisión continua de alimentos, contribuyendo a reducir riesgos de desnutrición y a mejorar la competitividad del abastecimiento agropecuario desde lo local hacia lo departamental, regional y nacional, mitigando condiciones de escasez y mejorando la sostenibilidad de la agricultura familiar.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa no solo se beneficiará la población rural directamente vinculada, sino que también se fortalecerá el abastecimiento de alimentos en las zonas de influencia del proyecto, al incrementar la oferta hortofrutícola con criterios de calidad, continuidad y eficiencia propios de un agronegocio. Esto permitirá mejorar el aporte nutricional y la calidad de los alimentos destinados al consumo humano, al tiempo que se convierte en un estímulo para que otras familias y productores repliquen el modelo, al evidenciarse resultados concretos en productividad, organización y acceso a mercados.

A las familias directamente beneficiadas por el proyecto se originará una reducción significativa en el costo de la canasta familiar, en la medida en que disminuya el gasto asociado a la compra de verduras y productos hortofrutícolas, permitiendo que dichos recursos se reasignen a necesidades prioritarias como salud, educación y bienestar del hogar. Paralelamente, el enfoque de agronegocios garantiza mejoras en la calidad e inocuidad de los alimentos, incorporando prácticas de manejo adecuado y aprovechamiento de residuos orgánicos para la elaboración de abono, lo cual genera un aporte ambiental por la reducción y correcta disposición de residuos sólidos orgánicos. En conjunto, esto contribuye a mejorar la calidad de vida, fomentar entornos saludables, fortalecer capacidades y cultura productiva, y mejorar la nutrición y salud de los pobladores; adicionalmente, los beneficiarios contarán con una alternativa complementaria de comercialización de excedentes, generando ingresos que les permitirán mejorar sus condiciones de vida y consolidar unidades productivas con vocación de permanencia en el mercado.

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO.

El proyecto busca ejecutar actividades orientadas al fortalecimiento integral de la actividad agrícola en el Departamento de Sucre, con intervención directa en los municipios de Guaranda, Sucre y Majagual, ubicados en la Mojana sucreña, territorio con alto potencial para el desarrollo de la hortofruticultura. En este marco, el alcance comprende la implementación de un esquema de apoyo productivo y empresarial para pequeños productores, mediante la provisión de asistencia técnica, capacitaciones, entrega de insumos y herramientas, implementación de sistemas de riego, y acciones de fortalecimiento comercial y asociativo, con el propósito de mejorar la productividad, la calidad de los cultivos y la capacidad de comercialización de la producción.

En ese orden, el proyecto contempla el establecimiento de 300 hectáreas de cultivo hortofrutícola, distribuidas en cuatro productos: melón, patilla, berenjena y plátano. Cada productor contará con los insumos, herramientas y elementos necesarios para el establecimiento de una (1) hectárea, la cual se organizará en un esquema diversificado de $\frac{1}{4}$ de hectárea por producto. Del total de las áreas a establecer, se asignan 75 hectáreas para plátano, 75 hectáreas para berenjena, 75 hectáreas para melón y 75 hectáreas para patilla, garantizando una distribución equilibrada y una oferta productiva variada dentro del territorio.

La población beneficiaria del proyecto está conformada por 300 productores agropecuarios de la zona rural de los municipios de Majagual, Sucre y Guaranda, pertenecientes a familias campesinas tradicionalmente dedicadas a la agricultura. Estos productores actualmente no cuentan con una forma organizativa que los represente, por lo cual el alcance del proyecto incluye la constitución y fortalecimiento de una estructura asociativa durante la ejecución, como base para mejorar la gestión colectiva, la negociación, el acceso a mercados y la sostenibilidad del modelo de agronegocio.

Así mismo, el proyecto incorpora un proceso de selección, focalización y priorización de beneficiarios, mediante la realización de eventos de convocatoria en cada municipio, dirigidos a potenciales productores, utilizando como soporte las bases de datos disponibles tanto en el Departamento de Sucre como en las administraciones municipales. Este proceso garantizará la transparencia y pertinencia en la selección de los participantes y la correcta asignación de los apoyos.

Finalmente, dentro del componente de activos productivos e insumos, el proyecto contempla la entrega de herramientas para el mejoramiento del proceso de cultivo, fortaleciendo las capacidades productivas de los beneficiarios y asegurando condiciones técnicas adecuadas para el establecimiento, manejo y sostenimiento de las unidades hortofrutícolas definidas en el alcance.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Aumentar los niveles de productividad hortofrutícola en los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.
- Diseñar el modelo de inversión y negocio por unidad productiva hortofrutícola.
- Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.
- Prestar asistencia técnica y de apoyo para el establecimiento de cultivos y riego.
- Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas
- Acompañar los procesos de formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo

2. CAPÍTULO II

2.1 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO.

2.1.1 CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO PRODUCTIVO

INFORMACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS:

CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO PRODUCTIVO NRO N° LP-012-2023, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Datos generales del Contrato de ejecución de proyecto productivo.

Ciudad:	Sincelejo	Fecha:	11 de agosto 2024	Periodo Reportado:	10/07/2024 - 10/08/2024
Contrato No.		LP-012-2023			
Objeto		IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCR			
Municipio		Majagual, Guaranda, Sucre			
Departamento		Sucre			
Contratante		Gobernación de Sucre			
Contratista		Consorcio Campo Verde			
NIT		901762098-9			
Interventoría		Fundación para Volver a Vivir			
NIT		823002076			
Supervisor		Álvaro López Herrera			
CODIGO BPIN:		2020000020058			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$14.017.400.687,00			

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIAL:	23 de octubre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	12 meses

2.1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS:

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE PROYECTO PRODUCTIVO NRO 012-2023 cuyo objeto es:

“Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto cuyo objeto es implementación de patios productivos para la producción de alimentos agropecuarios de alto poder nutricional, calidad para consumo y reactivación económica, con enfoque agroecológico, de género y étnico en familias rurales de puerto libertador”

Datos generales del Contrato de ejecución de proyecto productivo.

Ciudad:	Majagual, Guaranda, Sucre	Fecha:	24 de agosto 2024	Periodo Reportado:	10/07/2024 - 10/08/2024
Contrato No.	012 de 2023				
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE””				
Municipio	Majagual, Guaranda, Sucre				
Departamento	Sucre				
Contratista	Gobernación de Sucre				
Contratante	Consorcio Campo Verde				
NIT	901762098-9				
Interventoría	Fundación para Volver a Vivir				
NIT	823002076				

Supervisor	Álvaro López Herrera
CODIGO BPIN:	2020000020058
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$504.472.064,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIAL:	29 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	12 meses

2.2 POLIZAS DEL CONTRATO

POLIZA CONTRATO PRODUCTIVO

Póliza del Contrato de O No. LP-012-2023

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Compañía aseguradora:	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS			
Número de póliza:	71484/endoso 0			
Fecha de expedición:	18 octubre de 2023			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
Cumplimiento del Contrato	12/10/2023	12/04/2025	\$ 1.041.470.068,70	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	12/10/2023	12/10/2027	\$ 1.041.470.068,70	Cumple
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	12/10/2023	12/10/2027	\$ 1.041.470.068,70	Cumple
Calidad del servicio	12/10/2023	12/04/2025	\$ 1.041.470.068,70	Cumple

Tabla. Actualización de Póliza de acuerdo con acta de inicio del Contrato de Obra No. 012-2023

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Compañía aseguradora:	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS			
Número de póliza:	71484/endoso 1			
Fecha de expedición:	23/10/2023			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
Cumplimiento del Contrato	12/10/2023	12/04/2025	\$ 1.041.470.068,70	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	12/10/2023	12/10/2027	\$ 1.041.470.068,70	Cumple
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	12/10/2023	12/10/2027	\$ 1.041.470.068,70	Cumple
Calidad del servicio	12/10/2023	12/04/2025	\$ 1.041.470.068,70	Cumple

POLIZAS CONTRATO INTERVENTORIA

Póliza del Contrato de O No. NRO. 012-2023

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Compañía aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			
Número de póliza:	CG-1051125			
Fecha de expedición:	10-01-2024			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
Cumplimiento del Contrato	29/12/2023	30/06/2025	\$50.447.206,40	Cumple
Buen manejo del anticipo	29/12/2023	30/06/2025	\$151.341.619.20	Cumple

Salarios y Prestaciones	29/12/2023	31/12/2027	\$25.223.603,20	Cumple
Calidad del servicio	29/12/2023	30/06/2025	\$50.447.206,40	Cumple

Tabla No. 12. Actualización de Póliza de acuerdo con acta de inicio del Contrato de interventoría No. NRO.CM 012-2023

Póliza del Contrato de O No. NRO. CM 012-2023

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Compañía aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			
Número de póliza:	CG-1051125			
Fecha de expedición:	10-01-2024			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
	INICIAL	FINAL		
Cumplimiento del Contrato	10/01/2024	30/06/2025	\$50.447.206,40	Cumple
Buen manejo del anticipo	10/01/2024	30/06/2025	\$151.341.619.20	Cumple
Salarios y Prestaciones	10/01/2024	31/12/2027	\$25.223.603,20	Cumple
Calidad del servicio	10/01/2024	30/06/2025	\$50.447.206,40	Cumple

3. CAPÍTULO III

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.1 LOCALIZACION.


En la Figura 1. “Localización General de Colombia”, se presenta la ubicación del Departamento de Córdoba con respecto a la posición geográfica de Colombia y la localización del Municipio de Puerto libertador



**UBICACIÓN SUBREGIÓN
MOJANA EN SUCRE Y
COLOMBIA**



Figura No. 2. Municipios de Guaranda, Majagual y Sucre.

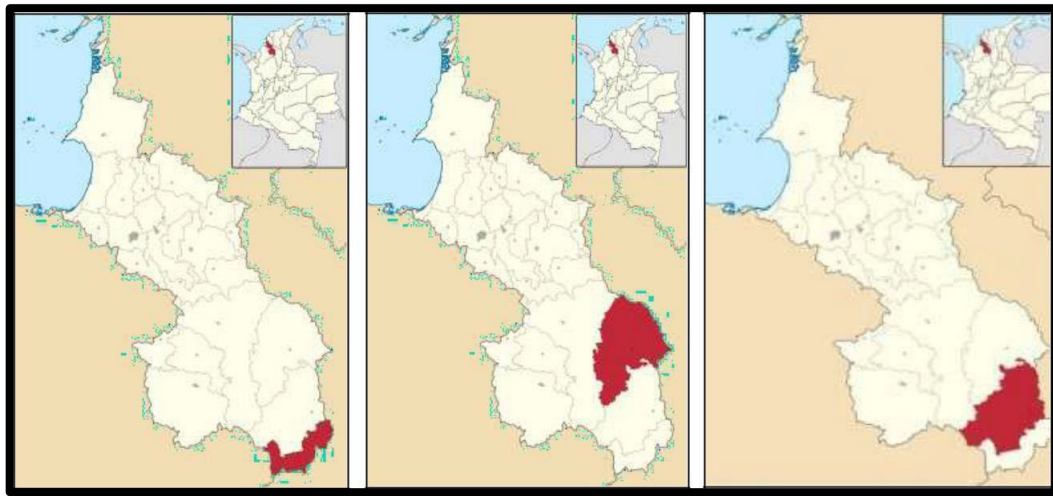

La Subregión Mojana se localiza en el extremo sur del departamento, como lo indican las Figuras; Conformada por los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 2.337 kilómetros cuadrados (el 22.6% del total departamental). En ella domina un clima típico del bosque húmedo tropical. La mayor parte de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por un complejo de caños, ríos, ciénagas y zápales, que hacen parte de la Depresión Momposina, zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.

Tabla 1. Municipios dentro del proyecto.

DEPARTAMENTO	SUBREGIÓN	Municipios
Sucre	Mojana	Majagual
		Sucre
		Guaranda

4.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

En el primer mes la interventoría revisa los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar el proyecto en el periodo, se verifica el cumplimiento de la experiencia de los profesionales que se han incorporado en el transcurso del mes al proyecto se revisó que la semilla suministrada llegara con la certificación del ICA.

Se realizó acompañamiento por parte de la interventoría, a las asistencias técnicas y a las entregas, se realizó seguimientos al listado de los beneficiarios que pertenecerían al proyecto, se revisaron actas de entrega de insumos y semillas, con lo cual se determina dar inicio de manera satisfactoria a la entrega de los materiales y equipos por la parte productiva, proceso de establecimiento de hortalizas e iniciar con la organización de la unidad productiva;

4.1.1 ACTAS LEGALES SUSCRITAS

Para el Contrato de No. **LP-012-2023**

ACTA No.	FECHA	TIPO DE ACTA	OBSERVACIÓN
01	23/10/2023	Acta de Inicio de Obras	
02	28/02/2024	Acta de comite	


Para el Contrato de No. **012-2023**

ACTA No.	FECHA	TIPO DE ACTA	OBSERVACIÓN
01	10/01/2024	Acta de Inicio de Obras	

4.1.2 BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA


Valor Inicial del Contrato de Obra	100,00%	\$ 14.017.400.687,00
Valor pagado acta parcial 1. acta parcial 2 Y 3(pago efectuado).	77,17%	\$ 10.817.903.428,00
Valor ejecutado a 10 de agosto 2024	92,40%	\$ 12.951.596.927
Valor por ejecutar	7,60%	\$ 1.065.803.760

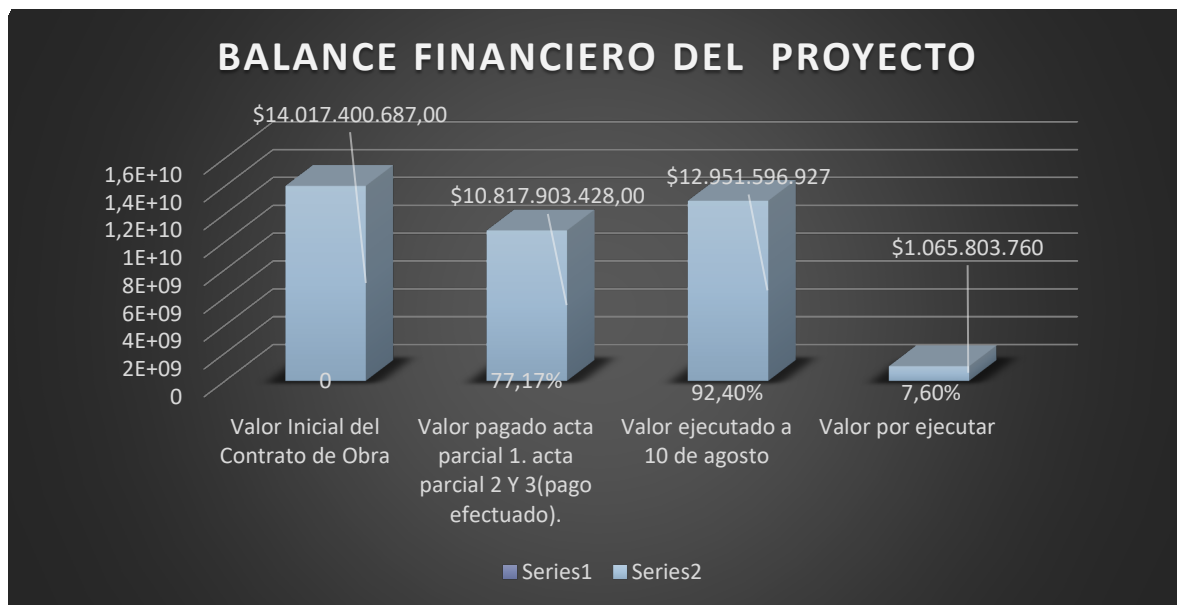

El avance financiero del proyecto a la fecha de 10 de agosto de 2024 corresponde al 77.17% equivalente a un rubro de \$6.233.559.103,00 SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (\$6.233.559.103,00). Moneda Corriente legal) correspondiente al 9 mes y 18 días de ejecución del contrato LP-012-2023 y el séptimo mes de ejecución del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Inicial del Contrato De interventoría	100%	\$ 504.472.064,00
Valor anticipo	30%	\$ 151.341.619,20
Valor ejecutado a agosto 10 de 2024	58,33%	\$ 294.275.370,67
Valor por ejecutar	41,67%	\$ 210.196.693,33

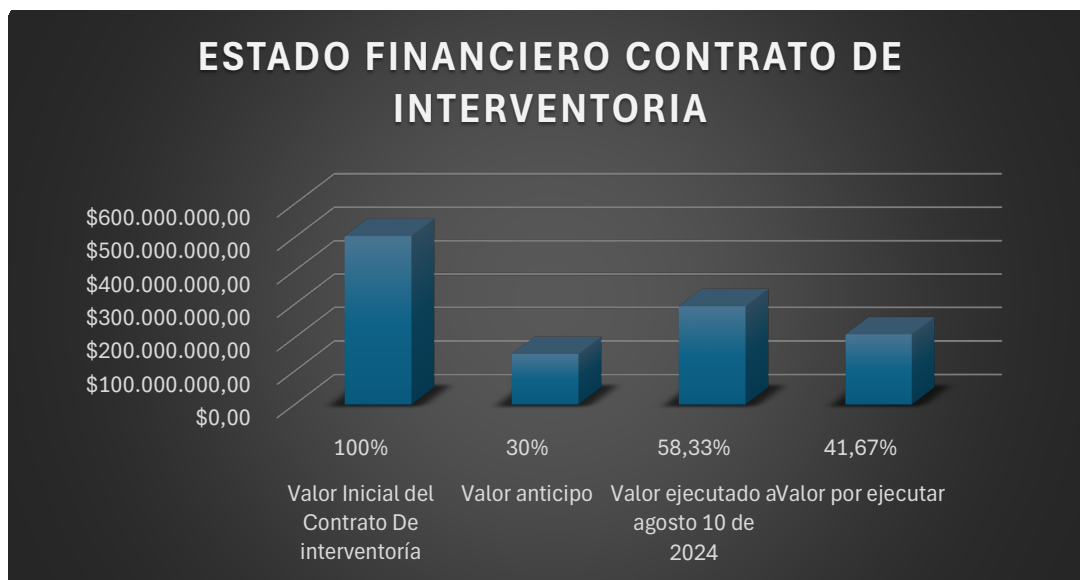

El avance financiero del proyecto a la fecha corresponde al 58.33% equivalente a un rubro de Doscientos Noventa Y Cuatro Millones Doscientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Pesos M/Cte Con Sesenta Y Siete Centavos (\$294.275.370,67).. correspondiente al séptimo mes de ejecución



4.1.3 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

AVANCE DE EJECUCIÓN ACOMULADO (23/10/2023-10/08/2024)					
No.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	VALOR PARCIAL	ACUMULADO	% ACUMULADO
1	Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.	60 días	\$ 57.387.600	\$ 57.387.600	100%
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización	30 días	\$ 30.393.600	\$ 30.393.600	100%
1.2	Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.	60 días	\$ 26.994.000	\$ 26.994.000	100%
1.3	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos	150 días	\$ 11.156.451.810	\$ 10.825.827.543	97%
1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	60 días	\$ 1.123.440.000	\$ 1.123.440.000	100%
1.3.2	Sistema de Riego	90 días	\$ 5.039.766.000	\$ 5.039.766.000	100%
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha	30 días	\$ 216.057.000	\$ 216.057.000	100%
1.3.4	Insumos Cultivo	150 días	\$ 4.723.203.810	\$ 4.392.579.543	93%
1.3.5	Análisis de Suelos	30 días	\$ 53.985.000	\$ 53.985.000	100%
2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	240 días	\$ 261.422.600	\$ 235.050.700	90%
2.1	Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	210 días	\$ 134.970.000	\$ 134.970.000	100%



2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	240 días	\$ 47.976.000	\$ 47.976.000	100%
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	150 días	\$ 42.888.000	\$ 34.310.400	80%
2.4	Realizar Seminarios	60 días	\$ 35.588.600	\$ 17.794.300	50%
3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortofructícolas.	210 días	\$ 201.038.600	\$ 93.414.014	46%
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	90 días	\$ 28.491.000	\$ 28.491.000	100%
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	120 días	\$ 35.588.600	\$ 35.588.600	100%
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofructícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	210 días	\$ 109.967.000	\$ 62.838.286	57%
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	30 días	\$ 26.992.000	\$ -	0%
4	ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	360 días	\$ 2.341.100.077	\$ 1.283.288.613	55%
	COSTO TOTAL		\$ 14.017.400.687	\$ 12.951.596.927	92%

5. BALANCE CRONOLOGICO DEL PROYECTO

CONTRATO DE EJECUCION PROYECTO PRODUCTIVO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de octubre de 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de octubre de 2023

Tiempo ejecutado: 9 meses y 18 días

Tiempo por ejecutar: 2 meses y 12 días



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de diciembre 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de enero de 2023

Tiempo ejecutado: 7 mes

Tiempo por ejecutar: 5 meses

5.1 BALANCE FISICO EJECUTADO DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FISICA PROYECTO PRODUCTIVO

El avance físico mensual mes N°10 del proyecto con respecto al 100% de la ejecución del proyecto equivale a un 92.4% Quedando por ejecutar un 7.60% como se puede observar en el diagrama.



6. CONTROL DE DISPOSICIONES LEGALES

Se Verifico los certificados de pagos de aportes a sistema general de seguridad social y se constató que encuentran incluidos el personal que se encuentra laborando en el proyecto para el periodo de julio 2024 correspondiente a un mes de ejecución y se anexa su respectiva copia.

Al igual la interventoría anexa certificado del pago de aportes a sistema general de seguridad social en el periodo de 10 de junio 2024 a 10 de julio de 2024 correspondiente a un mes de ejecución y se anexa su respectiva copia.

6.1 CUADRO DE PLANTA DE PERSONAL

Durante el transcurso de la obra, cada una de las entidades contó con un equipo de personal profesional que se relaciona a continuación:



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

AREA ADMINISTRATIVA					
CARGO	CANT	TIEMPO (MES)	POSTULADO	PERFIL PROFESIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN
			Nomina		
Coordinador General	1	12	Bruno Buelvas Solorzano	Ingeniero Agrícola	Contrato Laboral
Profesional Ambiental	1	12	Sara Mestra Argel	Ingeniero Agrónomo / Especialista en Gestión Ambiental	Contrato Laboral
Profesional de apoyo	1	12	Pedro Badran Basto	Ingeniero Agrícola	Contrato Laboral
Auxiliar Administrativo	1	12	Daniela Cochero Gutiérrez	Auxiliar administrativo	Contrato Laboral

El personal programado y presupuestado dentro del contrato, se realizó de manera oportuna y total, para esta etapa del contrato. Se verificó que el personal cumpliera con los perfiles profesionales exigidos y la experiencia solicitada.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

A continuación, presentamos las obras contratadas y ejecutadas en el mes 9 de ejecución del proyecto en periodo por parte del consorcio campo verde.

Las actividades ejecutadas desde el 10 de julio -10 de agosto hasta la fecha de elaboración del presente informe 11 de agosto de 2024

El proyecto “Implementación de agronegocios hortofrutícolas intensivos con pequeños productores de los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre” presentó, a la fecha de corte, un avance físico ejecutado de 12.951.596.927 millones, lo que corresponde a un porcentaje de avance de un 92.40% de ejecución.

En el marco del seguimiento contractual, la interventoría verificó que, para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto, se adelantaron procesos administrativos y operativos orientados a garantizar la adecuada ejecución del contrato, así:

- Alquiler de oficina para funcionamiento administrativo del proyecto y alquiler de bodega para almacenamiento. La interventoría constató que, con el fin de asegurar la recepción y el almacenamiento de insumos, herramientas y equipos adquiridos dentro del contrato, y para dar cumplimiento a los objetivos de este, se suscribió un contrato de arriendo de una bodega ubicada en el casco urbano del municipio de San Marcos, departamento de Sucre. De igual forma, verificó que, atendiendo la necesidad de contar

con espacios adecuados para las labores administrativas, la realización de reuniones del equipo coordinador del contrato, encuentros con el equipo de campo, atención a los productores seleccionados como beneficiarios del contrato, así como el procesamiento y almacenamiento de la información recolectada en las diferentes actividades y visitas del proyecto, se suscribió un contrato de arriendo sobre un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio de San Marcos.

- Oficina en Montería. La interventoría verificó que, durante la etapa precontractual y con el propósito de facilitar los procesos administrativos, se dispuso del arriendo de unas oficinas en la ciudad de Montería, ubicadas en el Barrio La Castellana Cra 11ª No. 55 – 21, en las cuales operaron los equipos administrativos, contables y de asesores legales.

La interventoría verificó que la contratación del personal programado y presupuestado dentro del clausulado del Contrato No. LP- 012 de 2023, cuyo objeto es **“Implementación de agronegocios hortofrutícolas intensivos con pequeños productores de los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre”**, se realizó de manera oportuna y total para esta etapa del contrato. Así mismo, constató que el personal administrativo y técnico cumplió con los perfiles profesionales exigidos y la experiencia solicitada. De igual manera, verificó que a cada miembro del personal contratado se le solicitó la afiliación a seguridad social y ARL al momento de la firma del contrato.

- Estructuración de formatos de calidad usados en el clausulado contrato N° LP-012 de 2023. La interventoría verificó que se estructuraron los siguientes formatos de calidad para el funcionamiento y control de las actividades a desarrollar, los cuales fueron aprobados por el supervisor del contrato al inicial el proyecto dado que la interventoría inicia 3 meses después

7.1. Visita de evaluación de predio – F001 – LP-012.

La interventoría verificó que este formato se utilizó para constatar el cumplimiento de los requisitos mínimos del predio y del productor para ser tenido en cuenta como beneficiario. Los requisitos mínimos evaluados fueron:

- Tipo de tenencia de la tierra.
- Disponibilidad de un área de 2 hectáreas, para la implementación y desarrollo del cultivo.
- Disponibilidad de Agua cercana al lote de producción.
- Área seleccionada debe estar limpio para el montaje de la unidad.
- El productor debe estar dispuesto a asumir los compromisos propios del proyecto.

7.2. Visita técnica a predio – F002 – LP-012

La interventoría verificó que este formato se **diligenció** como instrumento general de seguimiento de labores en los predios y con los productores, en cada visita realizada por el técnico o profesional al predio y a la unidad productiva. Así mismo, constató que en él se consignaron el diagnóstico de la situación encontrada, las actividades realizadas durante la visita, las recomendaciones emitidas al beneficiario y los compromisos generados a partir de dichas recomendaciones y del intercambio de saberes, tanto para el productor como para el profesional o técnico que realizó la visita. La interventoría verificó además que el formato incluyó un registro fotográfico con al menos cuatro (4) fotografías de cada uno de los componentes agrícola y de intercambio de saberes.

7.3. Capacitación grupal: Escuela de Campo (ECA) – F-ECA-001 – LP-012.

La interventoría verificó que este formato se **empleó** para la programación de los contenidos y la metodología utilizada en cada escuela de campo ECA, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y el énfasis definido por los profesionales conforme a la evaluación de las necesidades de los productores y del cultivo. Así mismo, constató que el formato permitió al profesional encargado describir de manera clara y completa cada actividad realizada y sus observaciones, y que contó con un anexo para el registro fotográfico de cada actividad.

7.4. Listado de asistencia ECA – F-ECA-002 – LP-012.

La interventoría verificó que este formato se **utilizó** para registrar a todos y cada uno de los beneficiarios que asistieron a las Escuelas de Campo ECA, consignando sus nombres, documentos, corregimiento, correo electrónico, número de contacto y firma.

7.5. Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.

- Realizar jornadas de identificación y socialización.

Se verificó la contratación de procesos de jornadas de identificación y socialización en el que se determinaron las siguientes actividades a ejecutar:

Recurso	Descripción	Cantidad	Unidad
---------	-------------	----------	--------



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Contratación de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesión con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Administrador Agropecuario para desarrollar 5 jornadas de identificación y socialización de 60 personas cada una, con una duración de 8 horas x jornada, para un total de 40 horas. (Dos profesionales x 40 horas= 80 horas)	80	Horas
Contratación de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesión a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Trabajador Social para desarrollar 5 jornadas de identificación y socialización de 60 personas cada una, con una duración de 8 horas x jornada, para un total de 40 horas. (Dos profesionales x 40 horas= 80 horas)	80	Horas
Contratación de 6 auxiliares de apoyo por día (Evento) para la toma de datos	Personal para apoyar el desarrollo de las jornadas costo x jornada de (\$60.000 x 6 auxiliares= 360.000) x 10 eventos.	10	Evento
Entrega de papelería a población	Entrega de kit de papelería a la población convocada (1 Lapicero, 1 encuesta, 1 guía de apoyo, 1 carpeta, 1 libreta de apuntes para distribuir individualmente a cada participante).	600	Personas
Alquiler de salones, video beam, sonido, computador por día	Un salón dotado de herramientas audiovisuales, sonido con micrófono inalámbrico, aproximadamente capacidad para 100 personas con igual número de sillas por día de evento y equipo de cómputo para presentaciones y toma de	10	Jornadas



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	información, costo x día de 500.000 x 10 días (Una jornada x día).		
Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Entrega de refrigerios durante el desarrollo de las 10 jornadas, donde se atenderán aproximadamente 600 personas. (Producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g; Bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa).	600	Unidad

Esta actividad fue ejecutada en un 100% durante el mes 1 y 2 de ejecución, en el desarrollo de esta se realizaron reuniones de socialización, entrega de papelería y refrigerios a 600 posibles beneficiarios en los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre. Donde se dio a conocer los objetivos, alcances y requisitos del proyecto para poder postularse como beneficiario, cabe resaltar que esta actividad fue recibida por el supervisor del proyecto

Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.

Se realizó la contratación de los procesos de caracterización y sistematización de la información, mediante los cuales se determinaron y ejecutaron las siguientes actividades:

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de Diez (10) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Técnicos Agropecuarios para desarrollar 60 visitas cada uno para la caracterización de los potenciales beneficiarios. (60 visitas por X 10 técnicos = 600 visitas)	600	Visitas



Esta actividad representa un acumulado de **\$26.994.000** equivalente a un **100%** de avance de la actividad.

7.6. Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos.

- **Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros**

- **Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros**

Se verifico la compra de activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales en el que se determinaron los siguientes materiales y actividades a ejecutar:

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Invernadero agrícola portátil 600 x 300 x 200 CM	1 invernadero agrícola portátil 600 x 300 x 200 CM (material en tubo de acero malla PE verde 135G/M2, función anti viento, anti escarcha, a prueba de polvo) por beneficiario	300	Unidad
Tanque para mezcla de 250 Litros	1 tanque de Almacenamiento de 250 Litros por Beneficiario	300	Unidad
Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	1 tanque de Almacenamiento de 2000 Litros por Beneficiario	300	Unidad
Plástico Mulch plata negra	Rollo de 1650 metros por productor (33 eras de 1.5 metros de ancho por 50 de largo)	300	Rollo
Bandejas de Semilleros (Semillero Melón y Berenjena)	36 bandejas de Semilleros de 125 alveolos por beneficiario	10.800	Unidad

Esta actividad representa un acumulado de **\$ 1.123.440.000** equivalente a un 100% de avance de la actividad.

- **Sistema de Riego**

Se verifico contratación de compra de materiales de sistema de riego en el que se determinaron los siguientes materiales y actividades a ejecutar:

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	1 Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS por Beneficiario	300	Unidad



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Granada de succión aluminio 2"	1 Granada de succión aluminio 2" por Beneficiario	300	Unidad
Manguera de succión corrugada 2° X 6 metros	1 manguera de succión corrugada 2° X 6 metros por Beneficiario	300	Unidad
Pieza en F importado de 2 pulgadas	2 Piezas en F importado de 2 pulgadas por Beneficiario	600	Unidad
Pieza tipo D	2 Piezas tipo D por Beneficiario	600	Unidad
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	1 Tanque de 200 litros por Beneficiario	300	Unidad
Manguera de succión corrugada 2° X 3 metros	1 Manguera de succión corrugada 2° X 3 metros por Beneficiario	300	Unidad
Adaptador hembra PVC 2"	1 Adaptador hembra PVC 2" por Beneficiario	300	Unidad
Tuberia PVC RDE 41 de 2 Pulgadas	50 Tuberias PVC RDE 41 de 2 Pulgadas por Beneficiario	15.000	Unidad
Codos de 2 Pulgadas PVC 45*	9 Codos de 2 Pulgadas PVC 45* por Beneficiario	2.700	Unidad
Valvula de paso de 2 Pulgadas	2 Valvulas de paso de 2 Pulgadas por beneficiario	600	Unidad
Codo de 2 Pulgadas PVC 90*	4 Codos de 2 Pulgadas PVC 90* por Beneficiario	1.200	Unidad
TEE PVC de 2 Pulgadas	4 TEE PVC de 2 Pulgadas por Beneficiario	1.200	Unidad
Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas	1 Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas por Beneficiario	300	Unidad
Tapon roscado PVC de 2 pulgadas	1 Tapon roscado PVC de 2 pulgadas por Beneficiario	300	Unidad
Collarin Derivación 2X1	3 Collarin Derivación 2X1 por Beneficiario	900	Unidad
Valvula de aire de 1 Pulgada	3 Valvulas de aire de 1 Pulgada por Beneficiario	900	Unidad
Adaptador Macho PVC de 1 Pulgada	3 Adaptadores Macho PVC de 1 Pulgada por Beneficiario	900	Unidad
Tuberia PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	36 Tuberias PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada por Beneficiario	10.800	Unidad
Buje PVC 2X1.1/2	4 Bujes PVC 2X1.1/2 por Beneficiario	1.200	Unidad
Codos PVC de 1.1/2	12 Codos PVC de 1.1/2 por Beneficiario	3.600	Unidad
Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas	4 Valvulas de Paso de 1.1/2 Pulgadas por Beneficiario	1.200	Unidad
Codo PVC de 1.1/2 45"	4 Codos PVC de 1.1/2 45" por Beneficiario	1.200	Unidad



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Adaptador Macho PVC de 1.1/2	4 Adaptadores Macho PVC de 1.1/2 por Beneficiario	1.200	Unidad
Tapon roscado PVC de 1.1/2 Pulgadas	4 Tapones roscado PVC de 1.1/2 Pulgadas por Beneficiario	1.200	Unidad
Silleta goma 16 Milímetros	120 Silletas goma 16 Milímetros por Beneficiario	36.000	Unidad
Conector 16 Milímetros	120 Conectores de 16 Milímetros por Beneficiario	36.000	Unidad
Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	1 Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS por Beneficiario	300	Unidad
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	120 Conectores Cinta a Manguera de 16 Milímetros por Beneficiario	36.000	Unidad
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS	3 Rollos de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS por Beneficiario	900	Unidad
Buje de reducción PVC 2X1	2 Bujes de reducción PVC 2X1 por Beneficiario	600	Unidad
Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	1 Tubería RDE21 DE 1 Pulgada por Beneficiario	300	Unidad
Codo PVC de 1 Pulgada de 90	4 Codos PVC de 1 Pulgada de 90 por Beneficiario	1.200	Unidad
Valvula de paso PVC de 1 Pulgada	2 Valvulas de paso PVC de 1 Pulgada por Beneficiario	600	Unidad
Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	5 Adaptadores Hembra PVC de 1 Pulgada por Beneficiario	1.500	Unidad
Inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	1 Inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios por Beneficiario	300	Unidad
Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	4 Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas por Beneficiario	1.200	Unidad
Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	2 filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto por Beneficiario	600	Unidad
Instalación por HA o Beneficiario	1	300	Unidad

Esta actividad representa un acumulado de \$5.039.766.000 equivalente a un 100% de avance de la actividad.

- **Herramientas Cosecha y Postcosecha**



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Se verifico la contratación de compra de materiales de herramienta, cosecha y postcosecha en el que se determinaron los siguientes materiales a ejecutar:

Recurso	Descripción	Cantidad	Unidad
Guantes para cosecha	4 Guantes para cosecha x beneficiario	1200	Unidad
Tijeras	2 Tijeras x beneficiario	600	Unidad
Rula	2 Rula x beneficiario	600	Unidad
Lima	2 Lima x beneficiario	600	Unidad
Pala con cabo	2 Pala con cabo x beneficiario	600	Unidad
Fumigadora Agrícola Plástica 20 lt	1 Fumigadora Agrícola Plástica 20 lt x beneficiario	350	Unidad
Regadera Plástica de 8 Lt	2 Regadera Plástica de 8 Lt x beneficiario	600	Unidad

Esta actividad representa un acumulado de **\$216.057.000** equivalente a un **100%** de avance de la actividad.

- **Insumos Cultivo**

Se verifico la compra de insumos del cultivo como semillas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas para el establecimiento de los cultivos: plátano, sandía, melón y berenjena, teniendo en cuenta el manejo agronómico que se le debe realizar de acuerdo al control de plagas y enfermedades, así mismo el plan de fertilización que se debe implementar de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada cultivo, para el que se determinaron los siguientes materiales y actividades a ejecutar:

Recurso	Descripción	Cantidad	Unidad
Fertilización Cultivo de Plátano - Materia Orgánica	400 kilos de materia orgánica - Abono por beneficiario (Presentación de bulto x 50 kilos, 8 bultos por beneficiario)	120	Bultos
Fertilización Cultivo Plátano Fosfato Diamonico 18 - 46 - 0	25 kilos de Fosfato Diamonico 18 - 46 - 0 por beneficiario (Presentación de bulto x 25 kilos, 1 bulto por beneficiario)	15	Bultos
Fertilización Cultivo Plátano Elementos secundarios 21-11-7.5 (N-CA-MG)	50 kilos de Elementos secundarios 21-11-7.5 (N-CA-MG) por beneficiario (Presentación de bulto x 50 kilos, 1 bulto por beneficiario)	15	Bultos
Fertilización Cultivo Plátano Compuesto Elementos mayores 15 - 4 - 23 - 4 (N-P-K-MG)	50 kilos de Compuesto Elementos mayores 15 - 4 - 23 - 4 (N-P-K-MG) por beneficiario (Presentación de bulto x 50 kilos, 1 bulto por beneficiario)	15	Bultos



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Fertilización Cultivo Plátano Elementos menores 15 – 1,0 - 2,2 (CALCIO, BORO, ZINC)	25 kilos de Compuesto Elementos menores 15 – 1,0 - 2,2 (CALCIO, BORO, ZINC) por beneficiario (Presentación de bulto x 25 kilos, 1 bulto por beneficiario)	15	Bultos
Fungicida plátano Azoxytop® Vecol 325 SC	100 cc de fungicida por beneficiario (Presentación de 1 Litro x 1)	1,5	Litros
Fungicida plátano TILT® 250 CE propiconazol	100 cc de fungicida por beneficiario (Presentación de 1 Litro x 1)	1,5	Litros
Fungicida plátano TDithane® NT Mancozeb	100 cc de fungicida por beneficiario (Presentación de 1 Litro x 1)	1,5	Litros
Ferilización Patilla (MELAZA)	2 kilos de Melaza por beneficiario (Presentación por kilo, 2 kilos por beneficiario)	30	Kilogramo
Ferilización Patilla (DAP)	5 kilos de DAP por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 5 kilos por beneficiario)	1,5	Bultos
Ferilización Patilla (SOLU NKP)	50 kilos de SOLU NKP por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 50 kilos por beneficiario)	15	Bultos
Ferilización Patilla (NITROCAL)	50 kilos de NITROCAL por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 50 kilos por beneficiario)	15	Bultos
Ferilización Patilla (BOROLIQ)	1 litro de BOROLIQ por beneficiario (Presentación por 1 litro, 1 litro por beneficiario)	15	Litros
Sustrato Pindstrup Pluss Orange Semillero cultivo de melón	67.5 Kilos de Sustrato Pindstrup Pluss Orange por beneficiario (Presentación de bulto x 55 kilos)	18,45	Unidades
Fertilización Melón (MELAZA)	2 kilos de Melaza por beneficiario (Presentación por kilo, 2 kilos por beneficiario)	30	Kilogramo
Ferilización Melón (DAP)	5 kilos de DAP por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 5 kilos por beneficiario)	1,5	Bultos
Ferilización Melón (Solufos 44)	22 kilos de Solufos 44 por beneficiario (Presentación por 25 kilos, 22 kilos por beneficiario)	13,2	Bultos



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Ferilización Melón (Sulfato de magnesio)	25 kilos de sulfato de magnesio por beneficiario (Presentación por 25 kilos, 25 kilos por beneficiario)	15	Bultos
Ferilización Melón (Nitrato de potasio)	23 kilos de Nitrato de potasio por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 23 kilos por beneficiario)	15	Bultos
Ferilización Melón (kcl Estándar)	25 kilos de KCI Estándar por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 25 kilos por beneficiario)	7,5	Bultos
Ferilización Melón (Micromenores)	6 kilos de micromenores por beneficiario (Presentación por 24 kilos, 6 kilos por beneficiario)	3,75	Bultos
Ferilización Melón (Nitrocal)	88 kilos de Nitrocal por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 88 kilos por beneficiario)	26,4	Bultos
Ferilización Melón (BORAX TECNICO)	0.5 Kilos de BORAX TECNICO por beneficiario (Presentación por 25 kilos, 0.5 kilos por beneficiario)	0,3	Bultos
Ferilización Melón (Sulfato de potasio)	48 kilos de sulfato de potasio por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 50 kilos por beneficiario)	14,4	Bultos
Sustrato Pindstrup Pluss Orange Semillero cultivo de berenjena	50,6 kilos de Sustrato Pindstrup Pluss Orange por beneficiario (Presentación de bulto x 55 kilos)	13,8	Bultos
Fertilización Berenjena (MELAZA)	2 kilos de Melaza por beneficiario (Presentación por kilo, 2 kilos por beneficiario)	30	Kilogramo
Ferilización Berenjena (DAP)	5 kilos de DAP por beneficiario (Presentación por 50 kilos, 5 kilos por beneficiario)	1,5	Bultos
Ferilización Berenjena (Solufos)	15 kilos de Solufos 44 por beneficiario (Presentación por 25 kilos, 15 kilos por beneficiario)	9	Bultos
Ferilización Berenjena (Solu NKP)	75 kilos de Solu NKP por beneficiario (Presentación por 25 kilos, 75 kilos por beneficiario)	45	Bultos



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Acetamiprid Control de Plagas Berenjena	60 gramos de Acetamiprid (Presentación de sobre de 150 gramos, 60 gramos por beneficiario)	6	Sobres
Deltametrina + thiacloprid Control de Plagas Berenjena	350 cc Deltametrina + thiacloprid (Presentación de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-Nnitroamina Control de Plagas Berenjena	40 gramos tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-Nnitroamina Control de Plagas Berenjena (Presentación 500 gramos, 40 por beneficiario)	1,2	Frasco
Fipronil 4 SC Control de Plagas Berenjena	Fipronil 4 SC 350 cc (Presentación de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
4 EC Clorpirifos Control de Plagas Berenjena	4 EC Clorpirifos 350 cc (Presentación de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de Plagas Berenjena	500 gramos por beneficiario, Presentación en frasco de 500 gramos	15	Unidad
Emamectina benzoato control de Plagas Berenjena	60 gramos de Emamectina benzoato (Presentación de sobre de 1 kilo, 60 gramos por beneficiario)	0,9	Kilos
Azoxystrobin+125 Difenconazol control de enfermedades Berenjena	Azoxystrobin+125 Difenconazol 350 cc (Presentación de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Carbendazim control de enfermedades Berenjena	Carbendazim 350 cc (Presentación de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhídrico control de enfermedades Berenjena	Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhídrico 300 cc (presentación de litro, 300 por beneficiario)	4,5	Litros
Acetamiprid Control de Plagas Melón	60 gramos de Acetamiprid (Presentación de sobre de 150 gramos, 60 gramos por beneficiario)	6	Sobres



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Deltametrina + thiacloprid Control de Plagas Melón	350 cc Deltametrina + thiacloprid (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-Nnitroamina Control de Plagas Melón	40 gramos tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-Nnitroamina Control de Plagas Berenjena (Presentación 500 gramos, 40 por beneficiario)	1,2	Frasco
Fipronil 4 SC Control de Plagas Melón	Fipronil 4 SC 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
4 EC Clorpirifos Control de Plagas Melón	4 EC Clorpirifos 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de Plagas Melón	500 gramos por beneficiario, Presentacion en frasco de 500 gramos	15	Unidad
Emamectina benzoato Control de Plagas Melón	60 gramos de Emamectina benzoato (Presentacion de sobre de 1 kilo, 60 gramos por beneficiario)	0,9	Kilos
Azoxystrobin+125 Difenconazol control de enfermedades Melón	Azoxystrobin+125 Difenconazol 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Carbendazim control de enfermedades Melón	Carbendazim 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhídrico control de enfermedades Melón	Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhídrico 300 cc (Presentacion de litro, 300 por beneficiario)	4,5	Litros
Acetamiprid Control de plagas Patilla	60 gramos de Acetamiprid (Presentacion de sobre de 150 gramos, 60 gramos por beneficiario)	6	Sobres
Deltametrina + thiacloprid Control de plagas Patilla	350 cc Deltametrina + thiacloprid (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-Nnitroamina Control de plagas Patilla	40 gramos tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-Nnitroamina Control de Plagas Berenjena (Presentación 500 gramos, 40 por beneficiario)	1,2	Frasco
Fipronil 4 SC Control de plagas Patilla	Fipronil 4 SC 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
4 EC Clorpirifos Control de plagas Patilla	4 EC Clorpirifos 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de plagas Patilla	500 gramos por beneficiario, Presentacion en frasco de 500 gramos	15	Unidad
Emamectina benzoato Control de plagas Patilla	60 gramos de Emamectina benzoato (Presentacion de sobre de 1 kilo, 60 gramos por beneficiario)	0,9	Kilos
Azoxystrobin+125 Difenconazol control de enfermedades Patilla	Azoxystrobin+125 Difenconazol 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Carbendazim control de enfermedades Patilla	Carbendazim 350 cc (Presentacion de litro, 350 por beneficiario)	5,25	Litros
Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhídrico control de enfermedades Patilla	Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhídrico 300 cc (Presentacion de litro, 300 por beneficiario)	4,5	Litros
Colinos de Plátano	440 colinos de plátano x beneficiario	6600	Colinos
Semilla de Melón	1 sobre de semilla de patilla x beneficiario (Se requiere aproximadamente 4.166 semillas por productor, por lo que se entregara un sobre de 5.000 semillas)	15	Sobre
Semilla de Berenjena	15 sobres de 200 semillas de berenjena x beneficiario	225	sobre



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Semilla de Patilla	1 sobre de semilla de patilla x beneficiario (Se requiere aproximadamente 833 semillas por productor, por lo que se entregara un sobre de 1000 semillas)	15	Sobre
--------------------	--	----	-------

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$236.160.191** lo que equivale a un **5%** del presupuesto a ejecutar.

Esta actividad representa un acumulado de **\$4.392.579.543** equivalente a un **93%** de avance de la actividad.

- **Análisis de suelos:** se verifico la contratación de servicio de análisis de suelos, con el fin de identificar los elementos y sus proporciones, para posteriormente realizar recomendaciones de fertilización.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Análisis de suelos completo intercambiable.	pH-C. E-CIC-1'-K-Ca-Mg-Na-S- Fe-Mn-Cu-Zn-B-Al-Textura- Materia Orgánica -N-N03- - N- NH4+ Recomendaciones de fertilización.	300	Unidad

Esta actividad presenta un acumulado de **\$53.985.000** equivalente a un **100%** de avance de la actividad.

7.7 Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.

- **Realizar visitas técnicas por unidad productiva.**

Se verifico contratación del personal necesario (Técnicos agropecuarios), para el desarrollo de las visitas técnicas por unidad productiva, donde los técnicos realizan acompañamiento a los beneficiarios en los procesos iniciales del establecimiento de los cultivos de: melón, sandía, plátano y berenjena. Realizando capacitación de manera individual acerca del manejo de semilleros de las mismas especies, preparación de suelos y manejo de sistema de riego.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
---------	-------------	----------	--------



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Contratación de (Diez 10) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Técnicos Agropecuarios desarrollando 300 visitas cada uno (10 visitas por cada unidad productiva) teniendo a cargo cada técnico 10 productores agropecuarios. (300 visitas X 10 técnicos = 3.000 visitas)	428,57	Visitas
--	---	--------	---------

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$19.281.429** lo que equivale a un 14% del presupuesto a ejecutar.

Esta actividad representa un acumulado de **\$134.970.000** equivalente a un **100%** de avance de la actividad.

- **.Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas).**

Se realizó la contratación del personal necesario (Técnicos agropecuarios), para el desarrollo de las visitas de Buenas prácticas agrícolas, donde los técnicos realizan acompañamiento a los beneficiarios en los procesos de manejo de residuos y contaminantes, como residuos de las actividades agrícolas realizadas en el establecimiento del cultivo.

Esta se realiza bajo el concepto de extensión agropecuaria que lo define como: Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer sostenible y competitiva su producción y al mismo tiempo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida familiar.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de Seis (6) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Un (1) Técnico Agropecuario brindará 8 horas de asistencia técnica a cada productor por 50 productores un total de 400 horas a cargo, los 10 técnicos sería un total de 2.400 horas de asistencia técnica en el establecimiento del cultivo a las unidades productivas hortofrutícolas beneficiarios. (400 horas X 6 técnicos = 2.400 horas)	800	Horas



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Esta actividad representa un acumulado de \$47.976.000 equivalente a un 100% de avance de la actividad.

Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.

- Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización	Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización para las 300 unidades productivas	300	Unidad

Esta actividad representa un acumulado de \$ 28.491.000 equivalente a un 100% de avance de la actividad.

• REALIZAR TALLERES PRODUCTIVOS AMBIENTALES.

Durante el desarrollo de esta actividad se atienden los 300 beneficiarios del proyecto integrado por 30 personas por taller para el total de los beneficiarios, cada taller tiene una duración de 24 horas (10 talleres x 24 horas = 240 horas) distribuidos en 6 jornadas de 4 horas cada una.

La actividad es dirigida por un profesional ambiental quien está capacitado para abordar los temas como: Sensibilización y entrenamiento sobre medidas de prevención y minimización del deterioro físico, químico y biológico del suelo, protección de las fuentes de agua y taludes, manejo adecuado de abonos y fertilizantes diversificando las fuentes y previniendo la eutrofización, método de siembra para evitar los procesos erosivos, reducir los costos y aumentar los beneficios y disposición y entrega de materiales y herramientas de control y análisis periódicos de suelos en características físicas, químicas y biológicas.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
---------	-------------	----------	--------



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los talleres productivos ambientales.	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin para los 300 beneficiarios del proyecto integrado por 30 personas por taller para el total de los beneficiarios, cada taller tendrá una duración de 24 horas (10 talleres x 24 horas = 240 horas) distribuidos en 6 jornadas de 4 horas cada una.	48	Horas
Contratación de 4 auxiliares de apoyo por día (Jornada) para la toma de datos	Personal para apoyar el desarrollo de las jornadas costo x jornada de (\$60.000 x 4 auxiliares= 240.000) x 60 jornadas	12	Jornadas
Entrega de papelería a población	Entrega de Cartilla a la población convocada (Cartilla tamaño carta 50 páginas en papel bond impreso full color, tapas en propalcote de 260 gramos acabado full color, barnizado con anillo metálico.	60	Unidad
Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Entrega de refrigerios durante el desarrollo de las 30 jornadas de 4 horas cada una para 30 personas. (Producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g; Bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa).	360	Unidad



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$8.577.600** lo que equivale a un **20%** del presupuesto a ejecutar, realizando 12 jornadas de talleres en los municipios de Majagual, Guaranda y Sucre.

Esta actividad representa un acumulado de \$34.310.400 equivalente a un 80% de avance de la actividad.

Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.

- **Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.**

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización	Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización para las 300 unidades productivas	300	Unidad

Esta actividad representa un acumulado de **\$ 28.491.000** equivalente a un **100%** de avance de la actividad.

- **Realizar Seminarios**

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de Dos (2) Administradores agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los seminarios	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión o a fin para desarrollar 5 seminarios de 30 personas de 32 horas en jornadas de 8 horas =160 horas. (160 horas X 2 profesionales = 320 horas)	160	Horas
Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x seminario)	Personal para apoyar el desarrollo de los seminarios (4 jornadas por seminario) este se realizará en 4 días cada uno costo x jornada de (\$ 80.000 x día x 2 orientadores= 160.000)	20	Jornadas



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Entrega de papelería a población	Entrega de Cartilla a la población convocada (Cartilla tamaño carta 50 páginas en papel bond impreso full color, tapas en propalcote de 260 gramos acabado full color, barnizado con anillo metálico.	150	Unidad
Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Se entregará refrigerio en cada seminario (40 jornadas por 30 personas = 1.200). (Producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g; Bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa).	600	Unidad

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$17.794.300** lo que equivale a un **50%** de ejecución.

- **Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.**

Se realizó contratación de personal requerido para el desarrollo de talleres en gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo, promoviendo la importancia de la asociatividad como enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto entre personas, ya que en desarrollo de esta se fortalecen los lazos de solidaridad, de cooperación y de confianza para el logro de un objetivo común.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de Dos (2) Administradores agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los seminarios	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión o a fin para desarrollar 5 seminarios de 30 personas de 32 horas en jornadas de 8 horas =160 horas. (160 horas X 2 profesionales = 320 horas)	320	Horas
Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x seminario)	Personal para apoyar el desarrollo de los seminarios (4 jornadas por seminario) este se realizará en 4 días cada uno costo x jornada de (\$ 80.000 x día x 2 orientadores= 160.000)	40	Jornadas



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Entrega de papelería a población	Entrega de Cartilla a la población convocada (Cartilla tamaño carta 50 páginas en papel bond impreso full color, tapas en propalcote de 260 gramos acabado full color, barnizado con anillo metálico.	300	Unidad
Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Se entregará refrigerio en cada seminario (40 jornadas por 30 personas = 1.200). (Producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g; Bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa).	1.200	Unidad

Esta actividad representa un acumulado de **\$35.588.600** equivalente a un **100%** de avance de la actividad.

- **Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.**

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	Consultoría para el desarrollo de la actividad	1	Unidad

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$ 15.709.571** lo que equivale a un **14%** del presupuesto a ejecutar.

Esta actividad representa un acumulado de \$62.838.286 equivalente a un 57% de avance de la actividad.

Conclusiones

- La interventoría realizó visitas de verificación a predios en los municipios de Majagual, Guaranda y Sucre, evidenciando atrasos en actividades de preparación/mecanizado asociados principalmente a las fuertes lluvias, lo cual incidió directamente en el ritmo de ejecución del proyecto.
- En los predios ya mecanizados se observó crecimiento constante de maleza, situación que puede afectar el montaje y continuidad de labores; estos hallazgos fueron informados al ejecutor y el Consorcio Campo Verde manifestó que suministraría insumos para control y contención de la maleza.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

- Se identificaron afectaciones en algunos semilleros por colapso parcial del plástico de cobertura debido a acumulación de agua por precipitaciones, generando pérdida de tensión en guayas y caída/desprendimiento de la estructura.
- Frente a lo anterior, se constató la adopción de medidas correctivas por parte del ejecutor, incluyendo: instalación de soportes adicionales, ajuste de parales para lograr inclinación del plástico $> 15^\circ$, y reducción del ancho del semillero en 20 cm (10 cm por lado) para mejorar el tensionamiento y reducir la formación de “camas de agua”. No obstante, la interventoría dejó indicado que persistía un riesgo que requiere seguimiento continuo.
- Estas novedades se presentaron dentro del contexto de las declaratorias de emergencia/calamidad emitidas por la Gobernación de Sucre y las alcaldías de Guaranda, Sucre y Majagual, por situación de riesgo, inundaciones y desastre en subregiones de La Mojana y San Jorge, lo cual explica las condiciones climáticas adversas que impactaron la ejecución
- Como bien se puede observar las actividades que se ejecutaron fueron:

2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	
2.1	Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	En ejecución acorde a cronograma
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	
2.4	Realizar Seminarios	
3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortofrutícolas.	
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	En ejecución acorde a cronograma
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	

- Todas estas son actividades que se pudieron seguir realizando, guardando las debidas precauciones de movilidad. El acompañamiento al pequeño productor beneficiario del proyecto se está realizando de manera integral, brindando apoyo y orientación en todas sus labores productivas, lo cual es algo que ellos mismos solicitan se continúe haciendo y que nosotros estamos dispuestos a hacer con el mayor profesionalismo.
- Los costos del transporte de los materiales, herramientas, insumos y semilla se vienen asumiendo por parte del consorcio, toda vez que el presupuesto del proyecto no lo contemplaba y debía ser asumido por el productor, pero en vista de las limitaciones económicas de los mismos y en aras de llevar todas las actividades contratadas a feliz término, el Consorcio Campo Verde ha asumido estos costos, los cuales son cada vez más elevados.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

- Por otro lado estas fueron las actividades que se vieron afectadas por los fenómenos climáticos

1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros
1.3.2	Sistema de Riego
1.3.2.1	Inversión en compra de materiales y equipos para riego



Fundación

Para Volver a V

Servimos para asegurar pro

1.3.2.2	Contratación de Personal para implementación de sistemas de riego
1.3.2.3	Levantamientos Topográficos de predios a intervenir
1.3.2.4	Diseño de Sistemas de Riego
1.3.2.5	Coordinación, delimitación y replanteo de diseños para labores de mecanización
1.3.2.6	Mecanización de zonas de siembra (arado)
1.3.2.7	Mecanización de zonas de siembra (aporcado)
1.3.2.8	Excavación para tuberías de riego
1.3.2.9	Montaje hidráulico del sistema
1.3.2.10	Montaje cabezal de riego
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha
1.3.4	Insumos Cultivo
1.3.5	Análisis de Suelos

- La rotura de CAREGATO y de los otros jarillones no han presentado amenaza directa a nuestras zonas de siembra, teniendo en cuenta que uno de las condiciones para elegir zonas de intervención, fue la escogencia de áreas que se vieran poco afectadas en épocas de lluvias, lo que nuestros beneficiarios llaman comúnmente Zonas Altas.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

- La mayor afectación se nos viene dando por el Fenómeno de La Niña y las precipitaciones asociadas. La alta frecuencia e intensidad de las mismas a ocasionado que, en un número significativo de predios, las aguas no drenen y se presente encharcamiento sostenido en los mismos. En la última semana se ha dado un periodo de disminución de las lluvias, lo que se conoce como El Veranillo de San Juan, y se ha notado un descenso en las áreas encharcadas.
- Muchos predios, en los que se habían realizado labores de mecanización en lo referente a arado y otros con arado y aporcado, se vieron afectados por las lluvias, las cuales generaron dificultades en las labores de montaje de sistemas de riego y deterioro en el estado de los suelos y los camellones que habían sido aporcados.
- El municipio que presenta mayor número de predios afectados es Majagual, sobre todo en los sectores de Palomar (10 ha), Paraíso (18 ha), Sectores aledaños a Tres Bocas (32 ha), El Tamaco (11 ha). Los municipios de Guaranda y Majagual presentan unas afectaciones cercanas a las 20 hectáreas cada uno, al día de hoy.
- La poca disponibilidad de maquinaria agrícola en los municipios ha sido un factor que ha generado retraso en las actividades. Por lo general, no existen aperos para labores de aporque, tanto así que el Consorcio Campo Verde asumió la compra de dos (2) taipas o aporcadoras para realizar estas labores en los municipios de Guaranda y Sucre, y se colocaron a disposición de los beneficiarios.

NOTA ACLARATORIA

Los anexos tales como facturas de compra, actas, listados de beneficiarios, remisiones, nota créditos, contratos de arrendamiento de inmuebles, proveedores, contrato personal del talento humano, pagos de seguridad social, talleres ambientales, seminarios, propuesta estudio de marketing, buenas prácticas agrícolas, estudio de suelo y planillas de nómina. En drive designado para el cargue de los diferentes soportes de la ejecución.

NEDER CARLOS CASTRO CASTRO

Representante Legal

FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR

NIT: 823.002.076-4



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Avances en el Municipio de Sucre - Sucre

A continuación, se mostrarán los avances del proyecto desde su inicio a la fecha en los tres municipios de la mojana como lo son Majagual, Guaranda y Sucre. Teniendo en cuenta cada uno de las etapas del proyecto con relación a cada beneficiario, teniendo en cuenta los beneficiarios que no podrán seguir con el proyecto por motivos de inundaciones en los predios.

Corregimiento Machetón

En este corregimiento detallaremos los avances hasta la fecha en el corregimiento de machetón, donde mostramos en detalle los avances en mecanización, semilleros, sistema de riego etc.

Semilleros Mecanización y montaje de Riego en el corregimiento de Machetón

Semilleros

En el corregimiento de Machetón se encuentran establecidos 70 de semilleros en el proceso de instalación, frente 26 terminados en su totalidad, esto debido a los fuertes vientos con lluvias en los que gran parte de estos semilleros en este corregimiento han sido afectados. Pero se le ha dado manejo a esto realizando modificaciones de inmediato como se mostrará a continuación en los diferentes registros fotográficos.

En este corregimiento de machetón contamos con varios beneficiarios, de los que se determinó realizar los semilleros algunos unidos en un mismo predio, o algunos individuales como se aprecia en los registros fotográficos. Cabe resaltar que en este predio las fuertes lluvias ocasionaron fuertes daños como rupturas de plásticos, desprendimientos de poli sombras, e incluso un árbol destruido por un rayo cayó sobre el semillero ocasionando algunos daños. Pero se le ha dado soluciones al mismo.




Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación y modificación de Semilleros en Sucre.

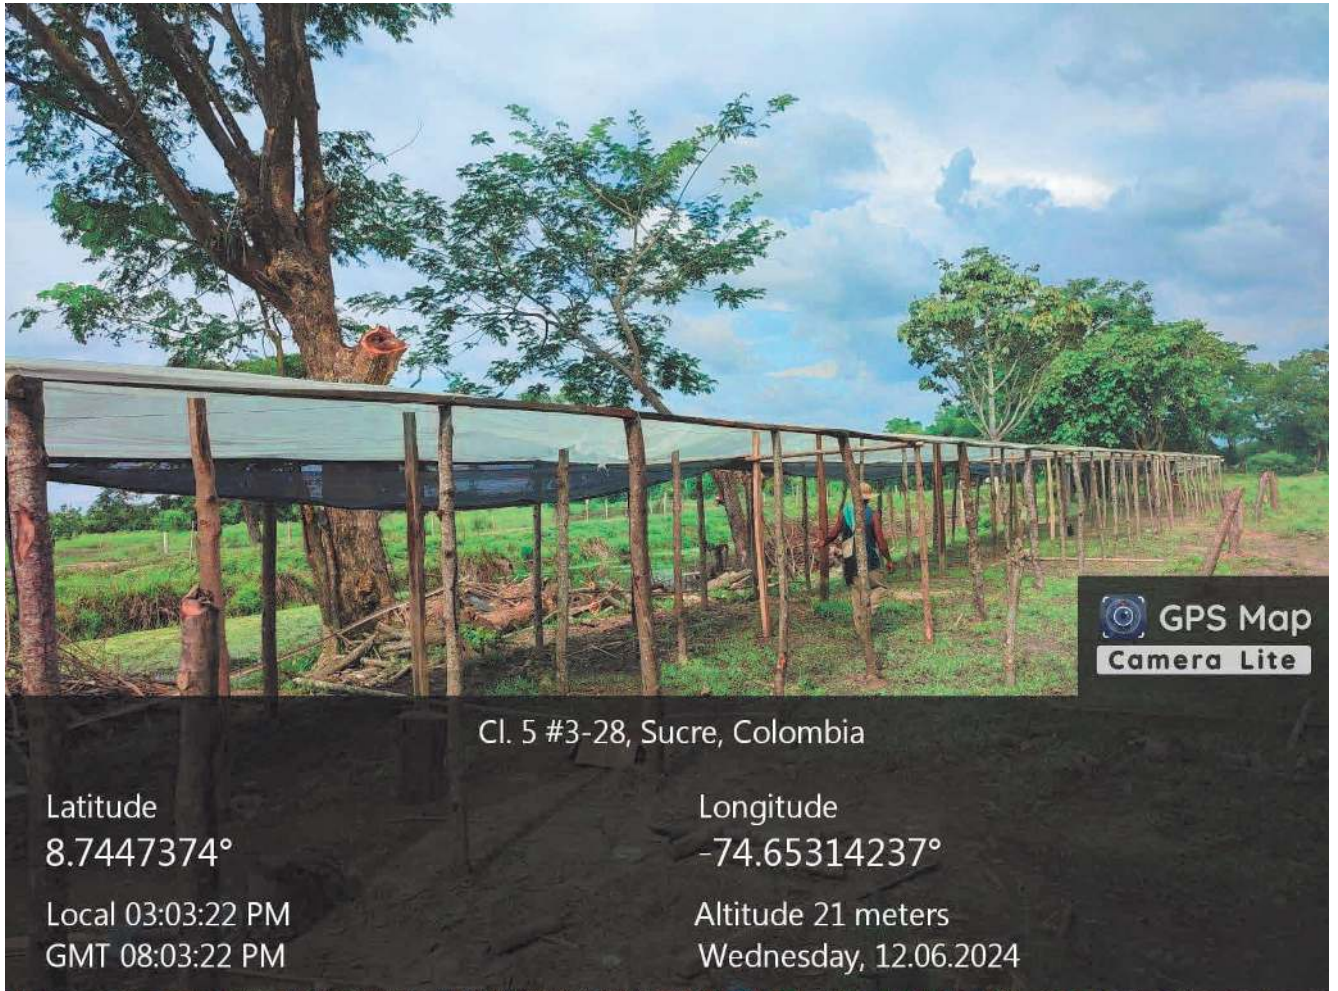

 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.7447374°

Longitude
-74.65314237°

Local 03:03:22 PM
GMT 08:03:22 PM

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.74450104°

Longitude
-74.65283657°

Local 03:06:47 PM
GMT 08:06:47 PM

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Sucre, Colombia

Latitude

8.74474878°

Longitude

-74.65311719°

Local 05:41:44 PM

GMT 10:41:44 PM

Altitude 20 meters

Tuesday, 25.06.2024



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



GPS Map
Camera Lite

Cl. 10 #2-21, Sucre, Colombia

Latitude

8.73463926°

Longitude

-74.62275598°

Local 05:08:10 PM

GMT 10:08:10 PM

Altitude 21 meters

Tuesday, 25.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



A continuación, se mostrarán algunas imágenes de beneficiarios en los que están armando nuevamente su semillero ya que por fuertes tempestades y vientos fueron destruidos, algunos han tocado modificarlos, reduciendo un poco más sus medidas laterales y frontales para darle un poco más de tensión al plástico mulch, elevando más los parales del medio para darle mayor inclinación logrando así que cuando llueva, el agua corra de mejor manera y no se estanque en el plástico. También se logró armar una sentadera o meza a este semillero para darle un poco más de fuerza. Cabe resaltar que cada beneficiario esta en una etapa diferente del proceso, pero ya existe un avance significativo.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.74473592°

Longitude
-74.65304246°

Local 03:11:11 PM
GMT 08:11:11 PM

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude

8.74472927°

Longitude

-74.65309961°

Local 03:11:24 PM

GMT 08:11:24 PM

Altitude 21 meters

Wednesday, 12.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Semilleros armados nuevamente con modificaciones





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



30 may 2024 9:31:14 a. m.
8 74700867N 74 66060476W

Altitud: -3.4m

Velocidad: 1.8km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 7:54:37 a. m.

Sucre

Altitud:43.5m

Velocidad:0.0km/h

Mecanización y montaje del sistema de riego.

Posterior a los semilleros pasamos a predios que ya han sido mecanizados en su totalidad y otros que les hace falta algún proceso en la mecanización como lo es el camelloneado o aporcado para seguir con la excavación y posterior montaje del sistema de riego. Cabe resaltar que los predios que ya tienen tuberías principales instaladas y aun no se ha instalado los demás complementos para el sistema de riego queden funcionando en su totalidad es por motivo de las lluvias o esperando algunos productos que el consorcio está enviando por medio de transporte marítimo, como lo apreciaremos a continuación en las diferentes fotos. Dando por conclusión un total de 67 predios en el proceso de mecanización frente a 23 predios con el proceso de mecanización terminados en su totalidad.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Mecanización de terrenos aporcado





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 10:39:32 a. m.
8.74735012N 74.65971174W

Sucre

Altitud: 6.1m

Velocidad: 0.0km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 7:57:37 a. m.

Sucre

Altitud: 24.8m

Velocidad: 1.8km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 7:34:29 a. m.

Sucre

Altitud: 0.7m

Velocidad: 0.0km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 7:37:56 a. m.
Sucre
Altitud: 68.2m
Velocidad: 3.2km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



14 jun 2024 12:12:04 p. m.
8°44'36,54"N -74°39'8,79"W
Hugo cure



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



14 jun 2024 12:11:44 p. m.
8°44'36,714"N -74°39'8,664"W
Hugo cure



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



GPS Map

Camera Lite

Sucre, Colombia

Latitude

8.749639°

Longitude

-74.6632288°

Local 11:20:45 AM


GMT 04:20:45 PM

Altitude 19 meters

Thursday, 27.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

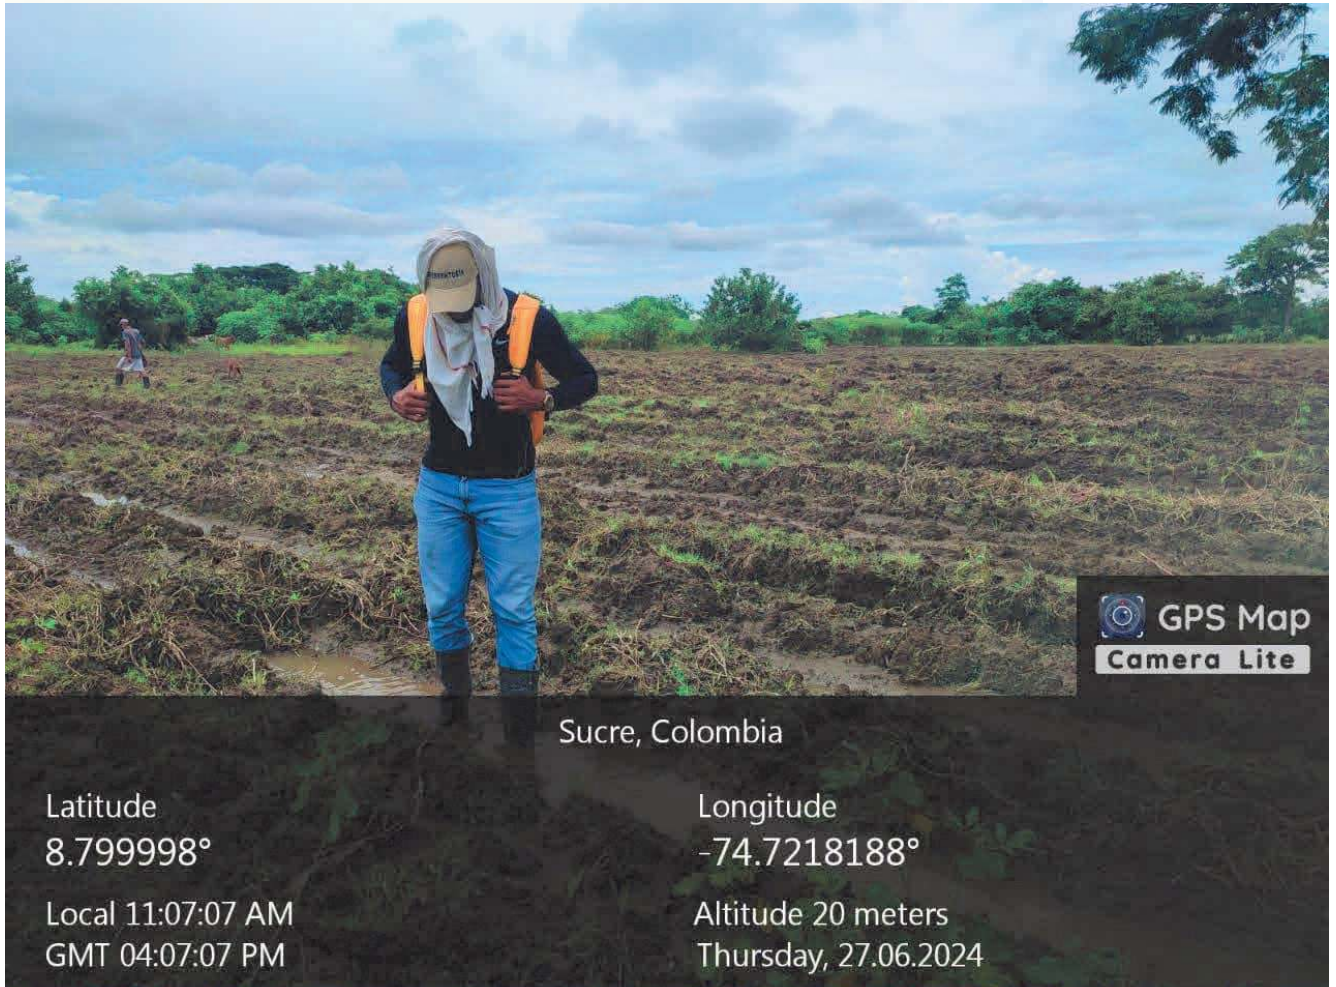

A continuación, vamos a mostrar los avances y registros fotográficos de los montajes de sistema de riego en los diferentes predios donde se está trabajando, o donde se ha finalizado estos montajes en su totalidad en el municipio de Sucre - Sucre. Posterior al haber finalizado con la mecanización se ha llevado a cabo una excavación para introducir tubería principal en las cuales existen 52 hectáreas con excavaciones para su posterior montaje de riego. para los demás acoples como laterales y cintas de riego para el montaje. Cabe resaltar que a cada montaje tiene un plano diferente en cada predio lo cual hace que cada montaje de riego sea diferente. En la etapa del sistema de riego contamos con un proceso finalizado a la fecha de hoy de 17 predios instalados en su totalidad, es decir solo para conectar la motobomba, cabe resaltar que existen 17 predios en proceso de excavación para insertar la tubería de 2 pulgada principal del sistema de riego para continuar con los respectivos montajes.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación de sistema de riego





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



17 jul 2024 11:20:12 a. m.
8.74708369N 74.66052512W
Altitud:14.3m
Velocidad:1.1km/h



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cra. 30a #19-53, Sincelejo, Sucre, Colombia

Latitude
8.74375723°

Longitude
-74.65249646°

Local 03:19:01 PM
GMT 08:19:01 PM

Altitude 200 meters
Thursday, 11.07.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Cra. 30a #19-53, Sincelejo, Sucre, Colombia

Latitude
8.74375951°

Local 03:18:57 PM
GMT 08:18:57 PM

Longitude
-74.65248692°

Altitude 200 meters
Thursday, 11.07.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación Cintas de riegos





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



14 jun 2024 12:09:17 p. m.
8°44'38,898"N -74°39'7,932"W
Hugo cure



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



17 jul 2024 11:20:12 a. m.
8.74708369N 74.66052512W
Altitud:14.3m
Velocidad:1.1km/h



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

En este proceso mostraremos algunos registros fotográficos en relación a las capacitaciones a los beneficiarios donde se muestra de manera teórico y practica como realizar el cultivo de plátano, desde que manera hacer unos huecos con las medidas adecuadas dependiendo el grosor y tamaño de cada colino, también como aplicar el abono orgánico en la siembra y cuál es el manejo a darle a este cultivo en caso de plagas y controles de malezas etc. También se hace capacitación sobre el funcionamiento del manejo de la motobomba, como es su función como realizar la respectiva ceba para su buen funcionamiento. De esta manera se coloca a prueba teniendo un éxito en su instalación y funcionamiento. Actualmente tenemos en predio diez mil semillas de plátano de los cuales se han sembrado

Capacitaciones siembra de colinos de plátano





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Seremos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Capacitación y prueba del sistema de riego





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Entregas de abonos, colinos de plátano y accesorios del sistema de riego

A continuación, se mostrará las entregas de materiales para los beneficiarios del municipio de Sucre, donde se entregan semillas de plátano, accesorios para el montaje del sistema de riego como tuberías, acoples, codos, válvulas, uniones, motobombas, también abonos orgánicos, plástico donde se evidencia entrega de herbicidas para las tierras ya mecanizadas que están para su posterior siembra de los colinos de plátano.





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Avances en el municipio de Majagual Sucre

A continuación, encontramos en el municipio de Majagual Sucre avances en diferentes procesos del proyecto en cuanto a mecanizaciones con distintas etapas como lo son arado, aporcado, excavaciones para el montaje de los sistemas de riego e instalaciones de las tuberías principales y sus adicionales como laterales de riego acoples entre otros procesos. Posterior a esto algunos predios en los que se está realizando capacitaciones para la siembra de colinos de plátano y su adecuado manejo en este cultivo. También se muestra las entregas de algunos materiales como abonos orgánicos, tuberías para el sistema de riego, colinos de plátano entre otros. Posterior a esto se muestran los registros fotográficos de cada uno de las actividades realizadas.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ANEXOS FOTOGRAFICOS

- ENTREGAS DE INSUMOS, MATERIALES DE RIEGO Y COLINOS DE PLATANO EN LOS MUNICIPIOS DE GUARANDA, MAJAGUAL Y SUCRE

Entrega de materiales en majagual





Fundación
Para Volver a Vivir
Seremos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Seremos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación Para Volver a Vivir

Seremos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación de riego en majagual sucre





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Municipio de Guaranda Sucre

Descripción general

El avance en el proyecto es significativo y se evidencia que hasta la fecha se ha visto adelanto en algunas de sus etapas. En adelante se hace descripción general y parcial de dicho avance.

Semilleros. El proyecto se ha concentrado en el corregimiento Puerto López del municipio de Guaranda donde hay 73 beneficiarios distribuidos en 19 predios, de los cuales 13 de los 19 predios tienen semilleros establecidos es decir para un total de 42 beneficiarios. El resto 31 ya tienen los materiales para la construcción de los mismos a espera de la continuidad del proyecto.

Es importante tener en cuenta que algunos de estos semilleros presentan algún grado afectación por fenómenos naturales, como las fuertes lluvias y vientos que se presenta en estas zonas en los últimos meses.

Preparación de terrenos, los 73 beneficiarios ya cuenta con la totalidad de latierra arada (preparada) , importante tener presente que algunos de estos predios presentan cierta cantidad de maleza, las cuales han surgido por las intensidades de las lluvias que han favorecidos condiciones para la proliferación de las misma. Por otra parte, esto terrenos algunos eran utilizados anteriormente en cultivos de arroz, hecho que permite el forjamiento de maleza que son de desarrollo rápido.

Aporcado. Hasta la fecha van 15 predios con camellones para un total de 62 beneficiario y solo 4 predio correspondiente a 11 beneficiarios aún faltan por camellones. Importante tener presente que, en el predio de **ACAPULCO**, hubo una afectación en los camellones debido a las fuertes lluvias que hizo que bajara el nivel de los camellones y así perdiera la altura indicada.

Riego. Hasta el momento solo 8 predio de 19, para un total de 25 beneficiariosha recibido algunos materiales de riego como tubería. El resto de predio 11. oseas 48 beneficiarios aún no han recibido material de riego.

Por otra parte, de los 25 beneficiarios que recibieron material de riego- 11 de estos beneficiarios ya cuenta con este material ubicado en las zanjas, los 14 restantes aún tienen el material están a la espera para su respectiva ubicación-



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Hasta la fecha en un solo predio denominado el recreo 2 vereda Puerto López. Es donde el sistema de riego lleva más adelante en un 60% donde se evidencia ya la instalación de muñecos, elevadores cintas, en l predio

Siembra de colinos de plátano. 22 beneficiarios de los 73 han recibido semillas de plátanos, de los cuales 15 beneficiarios ya han plantado.

Semilleros en Guaranda Sucre

Predio Europa. 1 beneficiario: Leonel Sambrano Martínez. Vereda Puerto López.



Tiempo: 11:23

Nota: predio tranquilidad vereda Puerto Lopez GUARANDA 8

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Tranquilandía veredas puerto López GUARANDA



Tiempo: 11:54

Nota: predio La conveccion 2, vereda Puerto López GUARANDA 14

Generated by MuloCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio La convección 2 beneficiarios Oscar David Martinez y Eduan Manuel Hernandez. Vereda Puerto López. GUARANDA

Este semillero aun no lo han armado, manifiestan los beneficiarios que por efectos de las fuertes lluvias y vientos lo han construido. Pero, dicen que ya tiene todos los materiales para su finalidad y que tan pronto se vaya a iniciar la siembra lo organizan.



Tiempo: 12:36

Nota: predio las paolas vereda Puerto Lopez GUARANDA 22



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Las Paolas: Filiberto Manuel Galvis, Gloria Elvira Mendoza, Robinson Antonio Hernandez. Vereda Puerto López.



Tiempo: 12:13

Nota: predio Villa hermosa vereda Puerto Lopez GUARANDA 18

POWERED BY ANDROID



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Villa Hermosa: Etelvira Maria Zambrano Zambrano, Lucila María Zambrano Zambrano, Johana Padilla Zambrano, Esteban Zmbrano Caro, Sol Angel Zambrano Zambrano.

Estos semilleros fueron contruidos al iniciar el proyecto, pero han presentado un grado de afectación por efectos de las fuertes lluvias y vientos que se presentaron en la zona- los beneficiario0s manifiestan que al momento del inicio de la germinación de las seÑillas, nuevamente lo organizan-.



Tiempo: 12:44

Nota: predio Villa katy vereda Puerto Lopez GUARANDA 24

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Villa Katy: Bartolo Galvis Díaz, Orlando Manuel Martínez Zambrano, Rubí Isabel Olivero Hernández, Helmer Enrique Olivera Hernández.

Este semillero no está terminado en su totalidad, manifiestan los beneficiarios, tener todos los materiales y que por fuertes vientos y lluvias no lo han terminado.





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio El Recreo 2: Wilmer Enrique Rodelo Aguas, Anuar Enrique Rodelo Aguas. Vereda Puerto López GUARANA.

Este semillero se ve afectado por las fuertes lluvias y vientos presentes en la zona, manifiestan los beneficiarios que cuentan con todos los materiales para la reconstrucción del mismo.



Tiempo: 14:15

Nota: predio el recreo 1 vereda Puerto López GUARANDA 36

Powered by NoteCam



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Recreo 1. Felix Mejia Manjarrez, Neiver Duvan Zambrano y Enoe Mejia Arreola. Vereda Puerto López, GUARANDA-

Se puede apreciar que este semillero presenta afectaciones por el problema de las fuertes lluvias y vientos.



Tiempo: 12:03

Nota: predio La conveccion 2 vereda Puerto López GUARANDA 15



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio convección 1: Deimer Jose Martinez Ordoñez, Eugenio Martinez Zambrano. Vereda Puerto López GUARANDA.



Tiempo: 14:22

Nota: predio vida tranquila vereda Puerto López GUARANDA 32

Powered by NetCam

Manifiestan beneficiarios contar con todos los materiales para la terminación del semillero, que están esperando que pase las fuertes lluvias y vientos para que no les deteriore el trabajo.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio vida tranquila: Jrge Martinez Medina, Elmer Enrique Baldovino Amaris. Vereda puerto López GUARANDA.

El semillero presenta afectación por las fuertes lluvias. Los beneficiarios cuentan con todos los materiales para la culminación.



Tiempo: 14:49

Nota: predio Acapulco vereda Puerto López GUARANDA 40

Powered by NotisCam



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Acapulco: Enilso Cortez Pérez, Anis Sandris Hernandez Galvis, Donaldo Enrique Zambrano, Luis Ángel Pabuena Benitez ,Eduardo Enrique Almanza Baldovino, Yoiner Enrique Almanza Martínez, Eleida Del Carmen Mejia Mejia, Nelfi De Carmen Pinto Zambrano.

Estos semilleros, presentan deterioro por las afectaciones de las fuertes lluvias y vientos que azotan a la zona.



Tiempo: 14:49

Nota: predio Acapulco vereda Puerto López GUARANDA 40

Powered by NetCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Preparación de terrenos y camellones e instalación de tuberías principales de riego



Tiempo: 11:32
Nota: predio Monterrey verde

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Monterrey: Milton Zambrano Moreno, Jarlinson Manuel Zambrano, Rigoberto Zambrano Zambrano. Vereda Puerto López

Este predio ya se encuentra arado y con los respectivos camellones, listo para la instalación de riego.



Tiempo: 12:27

Nota: predio Berlin vereda Puerto López GUARANDA 19

Powered by NoirCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Berlín: Hugo Enrique Martínez, Cesar Julio Martínez Acebedo. Vereda Puerto López. GUARANDA

Este predio ya se encuentra preparado y acamellonado.



Tiempo: 12:12

Nota: predio Villa hermosa vereda Puerto Lopez GUARANDA T7



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Las Paolas: Filiberto Manuel Galvis, Glora Elvira Mendoza Monterrosa, Robinson Antonio Hernández. Vereda Puerto Lopez. GUARANDA.

Terreno mecanizado y aporcado. Pero se observa mucha maleza que no se puede apreciar los camellones.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio El Paraíso: Yenis Paola Mejia Rua y Pedro Mejia Areola. Vereda



Tiempo: 14:09

Nota: predio Paraíso vereda Puerto Lopez GUARANDA 28

Powered by Google.com

Puerto López Guaranda

El predio presenta preparación de terreno con sus respectivos camellones, demás se evidencia avance en las zanjas e instalación de tubería principal.



Tiempo: 11:22

Nota: predio tranquilidad vereda Puerto López GUARANDA 7

Autogestión de Juntos Cam

Predio Villa Hermosa; Etelvina María Zambrano Zambrano, Lucila María Zambrano, Johana Padilla Zambrano, Amaranto Zambrano Zambrano, Esteban Zambrano Caro, Sol Angel Zambrano Zambrano-

Este predio está preparado con arado, camellones y la tubería principal de riego, además se observa al fondo donde se fumigo para la siembra del plátano es de notar que este predio se observa muchas malezas por la afectación de las lluvias y la demora en la siembra.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Tiempo: 11:18

Nota: predio tranquilidad vereda Puerto Lopez GUARANDA 6

Document by Misionero



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Tanquilandia: beneficiarios. Soleida Zambrano Martinez, Elkin Jose Zambrano Zambrano, Jorge Luis Zambrano Zambrano, Jhan Carlos Vanegas Baldovino, Adelfa Ribon De Hoyos, Rosi Antonio Pérez Soto, Miladis Agamez Villamizar, Gerquin Zambrano Martínez, Ramiro Rafael Suarez Zambrano, Martha Patricia Zambrano, Walter Zambranao Zambrano, Luis Alberto Zambrano Guzmán, Merly López Díaz, Fidel Segundo Zambrano Zambrano, Yorledia Zambrano Baldovino, Betty Mará Correas Laros.

Estos predios están divididos en varios sectores, pero en la misma finca. Ya están arado y acamellonados a espera de instalación de riego.

En algunos ya se evidencia la siembra de plátano



Tiempo: 14:48

Nota: predio Acapulco vereda Puerto Lopez GUARANDA 39

Powered by NanoCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio la sonrisa: Arnol Antonio Molina Arreola, Nubia Martínez, Nidia María Martínez López, Eusebio José Navarro

Predio arado y camellones, y también tiene el trazado para la excavación para la instalación del sistema de riego.



Latitud: 8°24'17"
Longitud: -74°36'42"
Altitud: 27.2±16 m
Precisión: 16.8 m
Tiempo: 09:30

Nota: corregimiento Puerto López predio burzo 3 ha.

Powered by NoteCam

Predio Dios es Amor: Jesús David Ballesteros Zambrano, Luis Fernando Ballesteros Mendoza, Amabis Zambrano Álvarez.

Este predio ya está la tierra arada y camellones, se evidencia los canales para meter la tubería principal para el sistema de riego.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Conveccion 2: Puerto López GUARANDA: Freddy Antonio Martínez Zambrano, Omar Martínez López.

Este predio ya este mecanizado, pero aún no se ha podido aporcar por la intensidad de las lluvias.



Tiempo: 11:57

Nota: predio Recreo 2. vereda Puerto López instalación de sistema riego

Powered By: NovaCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Tiempo: 12:08

Nota: predio Recreo 2, vereda Puerto Lopez instalación de sistema riego

Powered by NovaCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio recreo 2: Puerto López GUARANDA: Wuilmer Enrique Rode3lo Aguas, Anuar Enrique Rodelo Aguas.

Este predio se encuentra mecanizado, aporcado y con sus respectivos canales; además ya está sembrado el plátano y se evidencia el sistema de riego avanzado en un 60%.



Tiempo: 16:41

Nota: Predio Vida tranquila 3 ha. Inspección a instalacion sistema de riego. Vereda Puerto López. Gu

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio vida tranquila: Puerto López, GUARANDA: Jorge Martinez Medina, Elmer Enrique Amaris.

Terreno ya preparado y aporcado, también sus respectivas zanjas para la instalación del sistema de riego.



Tiempo: 16:32

Nota: predio La Envidia 2 ha. inspección e instalación sistema de riego.

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Latitud: 8°25'1"

Longitud: -74°36'37"

Elevación: 32.76±100 m

Precisión: 7.6 m

Tiempo: 10:28

Nota: predio la envidia 2 ha. Rafael A. Lirio A.

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Entrega de materiales y colinos de plátano en Guaranda





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!






Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación de riego en Guaranda

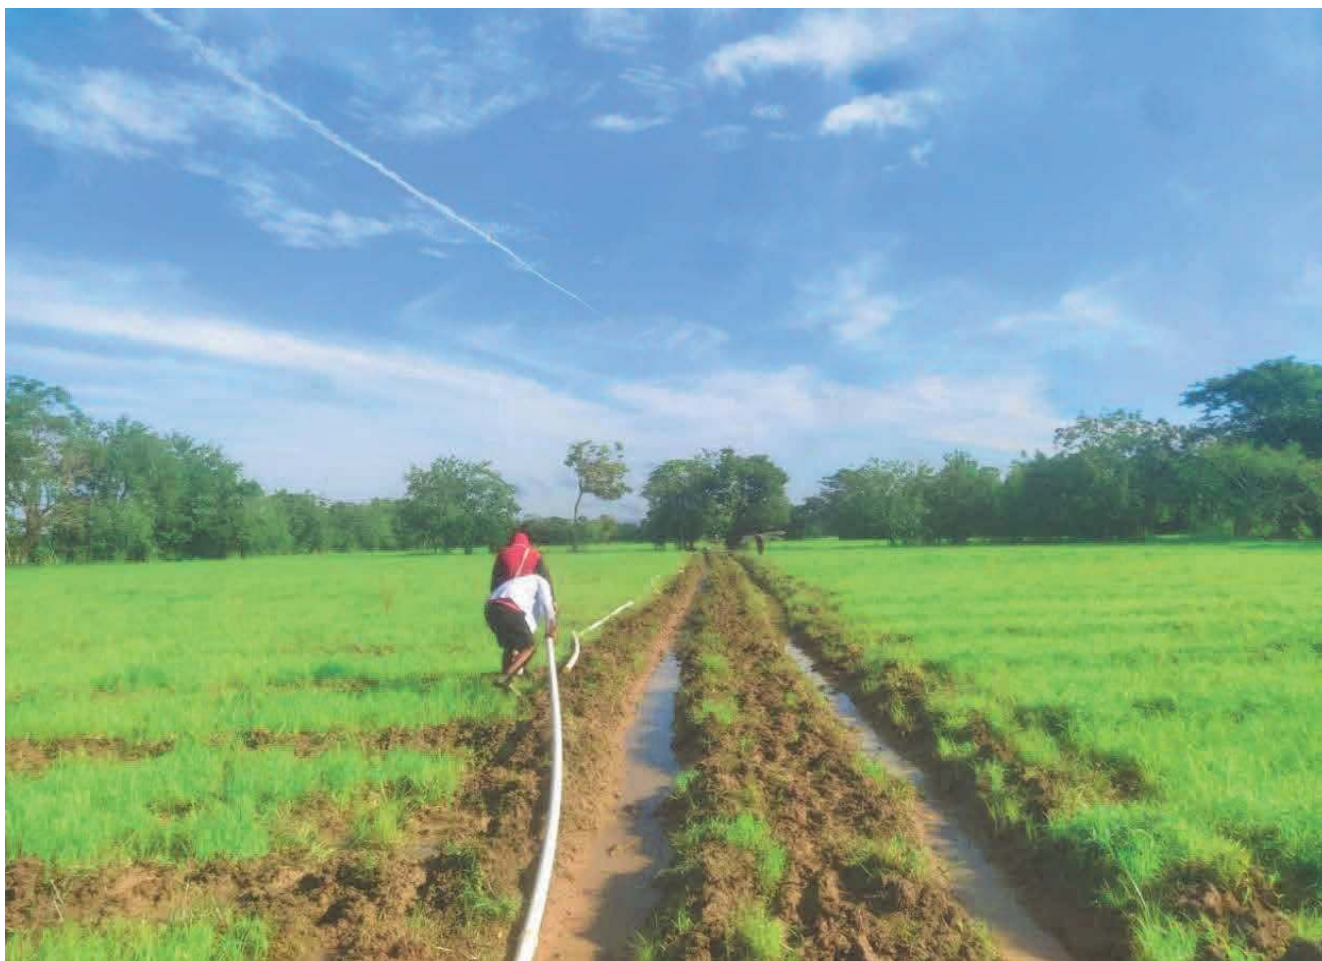



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Colinos de plátano municipio de Guaranda Sucre





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

