

DEPARTAMENTO DE SUCRE Y CONSORCIO CAMPO VERDE

Y

LA FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR

INFORME # 5

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE
AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE,
GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMPO VERDE

INTERVENTOR: FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR - REVIVIR

PERIODO DE EJECUCION:

01 DE MAYO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. POLIZAS DEL CONTRATO.	4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	5
2.1 Descripción del Proyecto.	5
2.1.1 Localización del proyecto.	5
2.1.2 Ubicación del Proyecto.	6
2.1.3 información del proyecto	7
3 DOMICILIO DEL CONSORCIO CAMPO VERDE.	7
3.1 Personal Vinculado al Contrato No LP- 012-2023.	8
3.2 RELACION DEL AVANCE TECNICO DEL CONTRATO No 012-2023	11
3.3 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO LP – 012- 2023	17



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

1. INTRODUCCIÓN

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	CM-012-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR – REVIVIR
VALOR:	QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$504.472.064) M/CTE. Amparado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 4923 del 22 de junio de 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de DOCE (12) MESES, previa suscripción del Acta de Inicio del contrato suscrito por las partes, en cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la ley. Para la suscripción del acta de inicio se requiere el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Para el perfeccionamiento se requiere la aprobación del contrato a través de la plataforma del SECOP II, aprobación de las garantías exigidas, expedición del registro presupuestal y el pago del porcentaje correspondiente de las estampillas que apliquen con ocasión al presente contrato.
FECHA DEL CONTRATO	La fecha de aprobación de las partes en el SECOP II
CORTE DE INFORME	01 al 31 DE MAYO DEL 2024

El presente documento contiene el informe de interventoría comprendido entre el 1 al 31 de Mayo de 2024, para el departamento de Sucre; y presenta los resultados de análisis técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental, adelantado por la **FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR** para seguir con las actividades de interventoría a la ejecución del proyecto que tiene como objeto contratado el de **"implementación de agronegocios hortofrutícolas intensivos con pequeños productores de los municipios de sucre, guaranda y majagual en el departamento de sucre"**

De lo anterior haremos una descripción pormenorizada de todas las actividades pertinentes necesarias para evaluar concienzudamente el proceso de control que la interventoría debe realizar al cumplimiento del desarrollo exitoso del proyecto, lo cual nos llevó a visitas permanentes a Majagual, Guaranda y Sucre. En este estado de actividades, hemos encontrado y registrado en campo cada uno de los eventos ocurridos.

1.1. POLIZAS DEL CONTRATO.

Tabla 1. Polizas del contrato de ejecución del proyecto N° LP-012-2023

Compañía aseguradora	BERKLY			
Numero de poliza	71484			
Fecha de Expedición	VIGENCIA		Valor asegurado	Estado
	Inicial	Final		
Cumplimiento total del contrato	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple
Pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	12-X-2023	12-X-2027	1.401.740.068.70	Cumple
Calidad del servicio	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipo suministrado	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.


2.1 Descripción del Proyecto.

2.1.1 Localización del proyecto.

Figura No. 1. Ubicación Subregión Mojana en Sucre y Colombia



Figura No. 2. Municipios de Guaranda, Majagual y Sucre

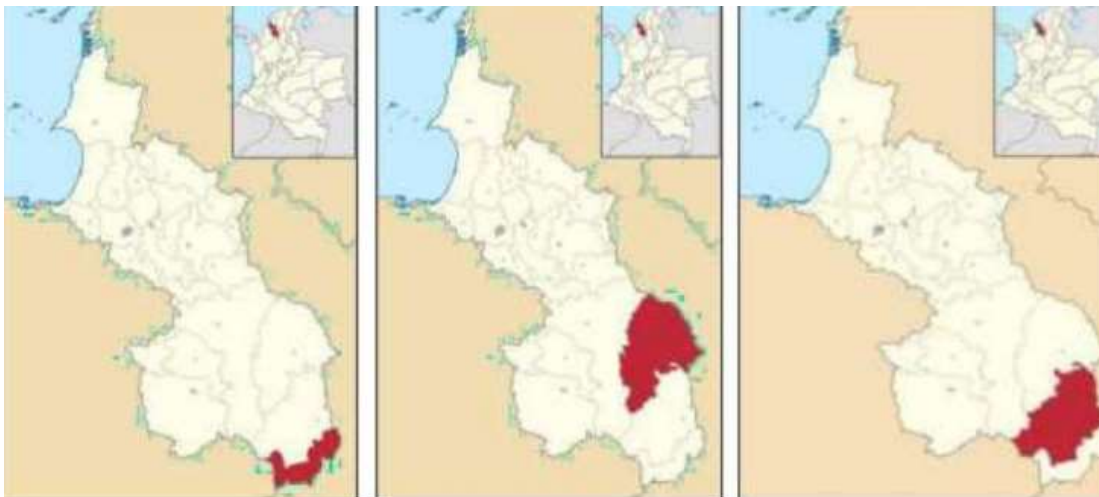

La Subregión Mojana se localiza en el extremo sur del departamento, como lo indican las Figuras; Conformada por los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 2.337 kilómetros cuadrados (el 22.6% del total departamental). En ella domina un clima típico del bosque húmedo tropical. La mayor parte de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por un complejo de caños, ríos, ciénagas y zapales, que hacen parte de la Depresión Momposina, zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.

2.1.2 Ubicación del Proyecto.

Tabla 2. Municipios dentro del proyecto.

DEPARTAMENTO	SUB-REGION	MUNICIPIOS
Sucre	Mojana	Majagual
		Guaranda
		Sucre



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

2.1.3 información del proyecto

INFORMACION DEL CONTRATO	
Contrato No.	CLAUSULADO CONTRATO No. LP- 012-2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual – Guaranda - Sucre
Departamento	Sucre
Contratante	Departamento de Sucre – Gobernación de Sucre
NIT	892 280 021-1
Contratista	Consorcio Campo Verde
NIT	901 762 098-9.
Valor Contrato	Catorce Mil Diecisiete Millones Cuatrocientos Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos M/Cte (\$ 14.017.400.687,00),
Duración	Doce (12) meses
Número de Beneficiarios	300
Supervisor	Álvaro López Herrera
Objeto Supervisión	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."
Fecha de Inicio	Octubre 23 de 2023

3 DOMICILIO DEL CONSORCIO CAMPO VERDE.

El consorcio campo verde, tiene como domicilio principal de correspondencia en la carrera 11ª #55 – 21 Barrio la castellana – Montería Córdoba. Sin embargo, hace presencia permanente en la sub – región de la Mojana, en los municipios de Majagual, Guaranda y sucre en el departamento de sucre, desarrollando las actividades propias del proyecto y definidas en el contrato No LP-012-2023, a través de los profesionales contratados en el marco del contrato de interventoría.

3.1 Personal Vinculado al Contrato No LP- 012-2023.

Para el desarrollo del compromiso contractual, la Fundación para volver a vivir - Revivir, dispone de un equipamiento inicial en un espacio dispuesto para las oficinas de la interventoría. Igualmente se garantiza para el desplazamiento del equipo, transporte a las zonas de ejecución del proyecto.

Dando cumplimiento a la programación prevista para la ejecución de las actividades del proyecto, de acuerdo con los ajustes aprobados en comité; para la ejecución del mismo se contrató el equipo humano para la implementación del proyecto.

A continuación, se presentan las contrataciones realizadas y la valoración hecha respecto al cumplimiento o no de los perfiles definidos en los estudios previos que hacen parte integral del contrato del proyecto.

Tabla 3. Equipo Humano Consorcio Campo Verde.

CONCEPTO	UND	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	FECHA DE INICIO Y TERMINACION
Contratacion de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesion con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socialización.	Horas	62480	80	4.998.400	23 NOV - 23 DIC
Contratacion de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesion a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socialización.	Horas	62480	80	4.998.400	23 NOV - 23 DIC
Contratación de 6 auxiliares de apoyo por día (Evento) para la toma de datos	Evento	359890	10	3.598.900	23 NOV - 23 DIC
Contratacion de Diez (10) tecnicos agopecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realizacion de las visitas. Tecnicos Agropecuarios para desarrollar 60 visitas cada uno para la caracterizacion de los potenciales beneficiarios.(60 visitas por X 10 tecnicos = 600 visitas)	Visitas	44990	600	26.994.000	23 NOV - 23 DIC



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Contratación de (Diez 10) técnicos agropecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas. Técnicos Agropecuarios desarrollando 300 visitas cada uno (10 visitas por cada unidad productiva) teniendo a cargo cada técnico 10 productores agropecuarios. (300 visitas X 10 técnicos = 3.000 visitas)	Visitas	44.990	3.000	134.970.000	23 DIC 2023 - 23 DE JULIO DE 2024
Contratación de Seis (6) técnicos agropecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas. Un (1) Técnico Agropecuario brindará 8 horas de asistencia técnica a cada productor por 50 productores un total de 400 horas a cargo, los 10 técnicos sería un total de 2.400 horas de asistencia técnica en el establecimiento del cultivo a las unidades productivas hortofrutícola beneficiarios. (400 horas X 6 Técnicos = 2.400 horas)	Horas	13.990	2.400	47.976.000	23 DIC 2023 - 23 DE MARZO DE 2024
Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller). - Personal para apoyar el desarrollo de las jornadas de talleres, se realizara en 4 días cada uno costo x jornada de (\$ 80.000 x día x 2 orientadores= 160.000) x 40 jornadas para completar 10 talleres	Jornadas	40	\$153.950	\$6.398.000	23 DE ENERO - 23 DE MAYO DE 2024

- **Realizar visitas técnicas por unidad productiva.**

De acuerdo a lo establecido dentro del cronograma del proyecto, el consorcio campo verde realizo la contratación del personal necesario (Técnicos agropecuarios), para el desarrollo de las visitas técnicas por unidad productiva, donde los técnicos realizan acompañamiento a los beneficiarios en los procesos iniciales del establecimiento de los cultivos de: melón, sandía, plátano y berenjena. Realizando capacitación de manera individual acerca del manejo de semilleros de las mismas especies, preparación de suelos y manejo de sistema de riego.

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$ 19.281.429** lo que equivale a un **14%** del presupuesto a ejecutar en la realización de 428, 57 visitas técnicas realizadas a los beneficiarios en los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre con el objetivo de evaluar las condiciones de las actividades estipuladas en

las visitas anteriores.

- **Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas).**

De acuerdo a lo establecido dentro del cronograma del proyecto, el consorcio campo verde realizó la contratación del personal necesario (Técnicos agropecuarios), para el desarrollo de las visitas de Buenas prácticas agrícolas, donde los técnicos realizan acompañamiento a los beneficiarios en los procesos de manejo de residuos y contaminantes, como residuos de las actividades agrícolas realizadas en el establecimiento del cultivo.

La actividad correspondiente a visitas técnicas de buenas prácticas agrícolas se encuentra ejecutada en un **100%**.

- **REALIZAR TALLERES PRODUCTIVOS AMBIENTALES.**

El consorcio durante la ejecución de estas actividades atiende los 300 beneficiarios del proyecto integrado por 30 personas por taller para el total de los beneficiarios, cada taller tiene una duración de 24 horas (10 talleres x 24 horas = 240 horas) distribuidos en 6 jornadas de 4 horas cada una.

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$8.577.600** lo que equivale a un **20%** del presupuesto a ejecutar.

Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.

Se realizó contratación de personal requerido para el desarrollo de talleres en gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo, promoviendo la importancia de la asociatividad como enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto entre personas, ya que en desarrollo de esta se fortalecen los lazos de solidaridad, de cooperación y de confianza para el logro de un objetivo común.

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$ 8.897.150** lo que equivale a un **25%** del presupuesto a ejecutar.

Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **\$ 15.709.571** lo que equivale a un **14%** del presupuesto a ejecutar.

3.2 RELACION DEL AVANCE TECNICO DEL CONTRATO No 012-2023

En este punto vamos a reseñar los avances en el proceso de entrega de material y construcción de semilleros y sistemas de riego y a si mismo se hará una descripción de cada uno de estos elementos y la presentación de una encuesta por interventoría donde se describe las actividades realizadas en los previos de majagual, Guaranda y sucre.

➤ **Visita evaluación de predio - F001 – LP-012.**

Formato usado para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos del predio y del productor para ser tenido en cuenta como beneficiario.

Los requisitos mínimos evaluados son:

- Tipo de tenencia de la tierra.
- Disponibilidad de un área de 2 hectáreas, para la implementación y desarrollo del cultivo.
- Disponibilidad de Agua cercana al lote de producción.
- Área seleccionada debe estar limpio para el montaje de la unidad.
- El productor debe estar dispuesto a asumir los compromisos propios del proyecto.

➤ **Hallazgos encontrados**

Se realizo visita a varios predios en el municipio de majagual, Guaranda y Sucre, en la cual nos encontramos con diferentes novedades las cuales se evidencia claramente en atrasos por diferentes motivos como las fuertes lluvias, que ha ocasionado la no realización del mecanizado de algunos previos, lo que trae como consecuencia el atraso en la ejecución del proyecto, visualizando crecimiento constante de los terrenos que ya han sido mecanizados en su totalidad para posterior montaje del sistema de riego. Cabe resaltar que estos hallazgos fueron manifestados al ente ejecutor para brindar solución a esta problemática en este municipio, en el cual el consorcio Campo Verde manifiesta

que Brindara insumos para detener y controlar esta maleza que impide con la buena ejecución del proyecto.

Dentro de estos hallazgos también fueron encontrados algunos semilleros los cuales se han venido abajo los plásticos por el agua que ha sido de varios milímetros los cuales ocasionan mucha presión en el plástico haciendo que estos se formen camas de agua y pierdan tensión por las guayas que soportan a estos, cayéndose. Como solución a esto el consorcio ha dado una solución a los productores colocando soporte en la mesa de la estructura de los semilleros para generar más resistencia, a su vez colocando los pares de centro a más altura para que la inclinación de este plástico de mayor a 15° y de esta manera pueda correr mejor el agua, junto con la reducción de espacios de 20cm en el ancho del semillero, es decir 10cm por lados para que el plástico sea mejor tensionado. De esta manera se ha brindado una solución por parte del ente ejecutor.

A continuación, se muestran las diferentes evidencias con registros fotográficos de estos predios.

➤ **Formato visita técnica a predio - F002 -LP-012**

Formato general de seguimiento de labores en los predios y con los productores. Se diligenciaron en cada visita que realizó el técnico o profesional al predio y a la unidad productiva, en ella se consignó el diagnóstico de la situación encontrada, las actividades que se realizaron durante la visita, las recomendaciones que el profesional deje al beneficiario y los compromisos que se ganaron con las recomendaciones y el intercambio de saberes, tanto para el productor como para el profesional o técnico que realizó la visita. Este formato consta de un registro fotográfico que debe tener al menos cuatro (4) fotografías de cada uno de los componentes agrícola y de intercambio de saberes.

- **Alquiler de oficina para funcionamiento administrativo del proyecto y alquiler de bodega para almacenamiento.** el ente ejecutor continúa realizando los pagos respectivos de arriendo de oficina (atendiendo la necesidad de contar con espacios adecuados para las labores administrativas, reuniones del equipo

coordinación del contrato, reuniones con el equipo de campo e interventoría y para atención de los productores seleccionados como beneficiarios del contrato, procesamiento y almacenamiento de la información recolectada en las diferentes actividades y visitas del proyecto, el consorcio suscribió un contrato de arriendo sobre un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio de Majagual).

y bodega de almacenamiento de insumos, materiales y herramientas adquiridos con recursos del proyecto, dándole cumplimiento a los requerimientos prescritos en el presupuesto y cronograma financiero del mismo, estos inmuebles se encuentran ubicados en el municipio de majagual – sucre.

Formatos de avances y actividades

Para la ejecución del contrato el área administrativa y técnica continua con la utilización de formatos de avances y actividades con el fin de recopilar y tabular información concerniente de los beneficiarios y avances del proyecto.

- **Estructuración de formatos de calidad usados en el clausulado contrato N° LP-012 de 2023.**

Se utilizan los siguientes formatos de calidad para funcionamiento y control de las actividades a desarrollar:

- **Capacitación grupal: escuela de campo – ECA - F- ECA - 001 – LP-012.**

Formato general Contiene el espacio suficiente para que el profesional encargado describa de manera clara y completa cada actividad realizada y sus observaciones. Tiene un formato anexo para el registro fotográfico de cada actividad.

- **Listado de asistencia ECA - F- ECA - 002 – LP-012.**

Este formato se usa para registrar a cada uno de los beneficiarios que asisten a las Escuelas de Campo ECA, se consigna sus nombres, documentos, corregimiento, correo electrónico, número de contacto y firma.

Tabla 4. Cronograma de Actividades de Interventoría del Proyecto Mes 4

INTERVENTORIA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DEL PROYECTO					
No.	DESCRIPCIÓN	MES 4			
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	Realizar Interventoría a activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.				
2	Interventoría a sistema de riego				
3	Seguimiento a ejecución financiera (actas, facturas, contrato a proveedores, egresos)				
4	Interventoría Herramientas Cosecha y Postcosecha				
5	Interventoría Insumos Cultivo				
6	Interventoría Realización de Visitas técnicas x unidad de productiva.				
7	Interventoría Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)				
8	Interventoría Realización talleres productivos ambientales				
9	Interventoría Realización Seminarios				
10	Interventoría Realización, Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.				
11	Interventoría realización Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo				
12	Interventoría Implementación Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.				
13	Compra de papeleria				
14	Elaboración y presentación de informes				
15	Comites técnicos del proyecto				

Cronograma de Actividades Por Semanas de Interventoría

Como se muestra en el cuadro a continuación se detalla el cronograma de actividades de interventoría en el proyecto de implementación hortofrutícola en cada uno de los municipios de Majagual, Guaranda y Sucre. Mostrando en detalle por semana y meses la ejecución de la misma en cada uno de las actividades de la ejecución del proyecto. A continuación, se muestra el cronograma en la siguiente tabla.



Tabla 5. Cronograma de Actividades Por Semanas de Interventoría

INTERVENTORIA IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE																	
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DEL PROYECTO																	
No.	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	Etapas pre-contractual																
2	Reconocimiento de la zona y visita a predios																
3	Realizar Interventoría a activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.																
4	Interventoría a sistema de riego																
5	Revisión contractual de la ejecución del proyecto																
6	Seguimiento a ejecución financiera (actas, facturas, contrato a proveedores, egresos)																
7	Interventoría Herramientas Cosecha y Postcosecha																
8	Interventoría Insumos Cultivo																
9	Interventoría Analisis de Suelos																
10	Interventoría Realización de Visitas técnicas x unidad de productiva																
11	Interventoría Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)																
12	Interventoría Realización talleres productivos ambientales																
13	Interventoría Realización Seminarios																
14	Interventoría Realización, Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.																
15	Interventoría realización Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo																
16	Interventoría Implementación Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.																
17	Interventoría Realización una feria Campesina para impulsar la comercialización																
18	Compra de papelería																
19	Elaboración y presentación de informes																
20	Comités técnicos del proyecto																



Tabla 6. Ejecución de la Interventoría al Consorcio Campo Verde

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	mayo	TOTAL
3.5.1 Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	\$	\$ 109.967.000,00							\$ 15.709.571,42	\$ 15.709.571,42	\$ 31.419.142,84
3.1.1 Interventoría del Proyecto	MES	12									\$ 168.157.354,68
3.4.1 Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	\$	\$ 28.491.000,00	\$ 4.748.500,00	\$ 4.748.500,00	\$ 9.497.000,00	\$ 9.497.000,00				\$ 0,00	\$ 28.491.000,00
3.3.1 Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	\$	\$ 35.588.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.575,00	\$ 4.448.575,00	\$ 8.897.150,00	\$ 8.897.150,00	\$ 8.897.150,00	\$ 0,00	\$ 35.588.600,00
3.2.1 Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	\$	\$ 26.992.000,00								\$ 0,00	\$ -
1.2.1 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	\$	\$ 1.123.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.860.000,00	\$ 280.860.000,00	\$ 280.860.000,00	\$ 0,00	\$ 199.359.498,80	\$ 81.500.501,20	\$ 1.123.440.000,00
1.2.2 Sistema de Riego	\$	\$ 5.039.766.000,00	\$ 0,00	\$ 577.621.000,00	\$ 577.621.000,00	\$ 1.942.262.000,00	\$ 647.420.666,67	\$ 0,00	\$ 647.420.666,67	\$ 258.968.266,66	\$ 4.651.313.600,00
1.2.3 Herramientas Cosecha y Postcosecha	\$	\$ 216.057.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.028.500,00	\$ 108.028.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.057.000,00
1.2.4 Insumos Cultivo	\$	\$ 4.723.203.810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 472.320.381,00	\$ 472.320.381,00	\$ 944.640.762,00	\$ 472.320.381,00	\$ 1.416.961.143,00	\$ 377.856.304,80	\$ 4.156.419.352,80
1.2.5 Análisis de Suelos	\$	\$ 53.985.000,00	\$ 0,00	\$ 26.992.500,00	\$ 26.992.500,00					\$ 0,00	\$ 53.985.000,00
1.2.6 Administración del Proyecto	\$	\$ 2.341.100.077,00	\$ 119.837.975,00	\$ 119.837.975,00	\$ 239.675.950,00	\$ 84.624.917,14	\$ 84.624.917,14	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 1.283.288.612,80
1.3.1 Realizar jornadas de identificación y socialización	\$	\$ 30.393.600,00	\$ 15.196.800,00	\$ 15.196.800,00						\$ 0,00	\$ 30.393.600,00
1.1.1 Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.	\$	\$ 26.994.000,00	\$ 6.748.500,00	\$ 6.748.500,00	\$ 13.497.000,00					\$ 0,00	\$ 26.994.000,00
2.3.1 Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	\$	\$ 47.976.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.996.000,00	\$ 7.996.000,00	\$ 15.992.000,00	\$ 0,00	\$ 15.992.000,00	\$ 0,00	\$ 47.976.000,00
2.2.1 Realizar Seminarios	\$	\$ 35.588.600,00								\$ 0,00	
2.1.1 Realizar talleres productivos ambientales	\$	\$ 42.888.000,00						\$ 0,00	\$ 8.577.600,00	\$ 8.577.600,00	\$ 17.155.200,00
2.4.1 Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	\$	\$ 134.970.000,00	\$ 0,00	\$ 9.640.714,29	\$ 9.640.714,29	\$ 19.281.428,57	\$ 19.281.428,57	\$ 21.209.571,00	\$ 19.281.428,57	\$ 19.281.428,57	\$ 117.616.713,86
		\$ 14.017.400.687,00	\$ 146.331.775,00	\$ 760.785.989,29	\$ 1.750.577.620,29	\$ 2.929.318.801,71	\$ 2.001.716.924,38	\$ 713.989.394,84	\$ 2.543.761.351,30	\$ 973.455.965,49	\$ 11.988.295.176,98

NOTA: El monto de ejecución financiera del proyecto con la interventoría es de 11.988.295.176,98.


3.3 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO LP – 012- 2023

A continuación, se relaciona el avance financiero del contrato:

Tabla 7. Avance Financiero Ente Ejecutor

Ítem	Valores
Valor Inicial del Contrato	\$14.017.400.687
Valor Facturado mes 1	\$907.317.764
Valor Facturado mes 2	\$1.750.577.620
Valor Facturado mes 3	\$2.929.318.802
Valor Facturado mes 4	\$2.001.716.924
Valor Facturado mes 5	\$713.989.395
Valor Facturado mes 6	\$2.543.761.351
Valor Facturado mes 7	\$973.455.965
TOTAL MESES FACTURADOS	\$11.820.137.822

Figura 1. Contrato de Interventoría, Avance Financieros.

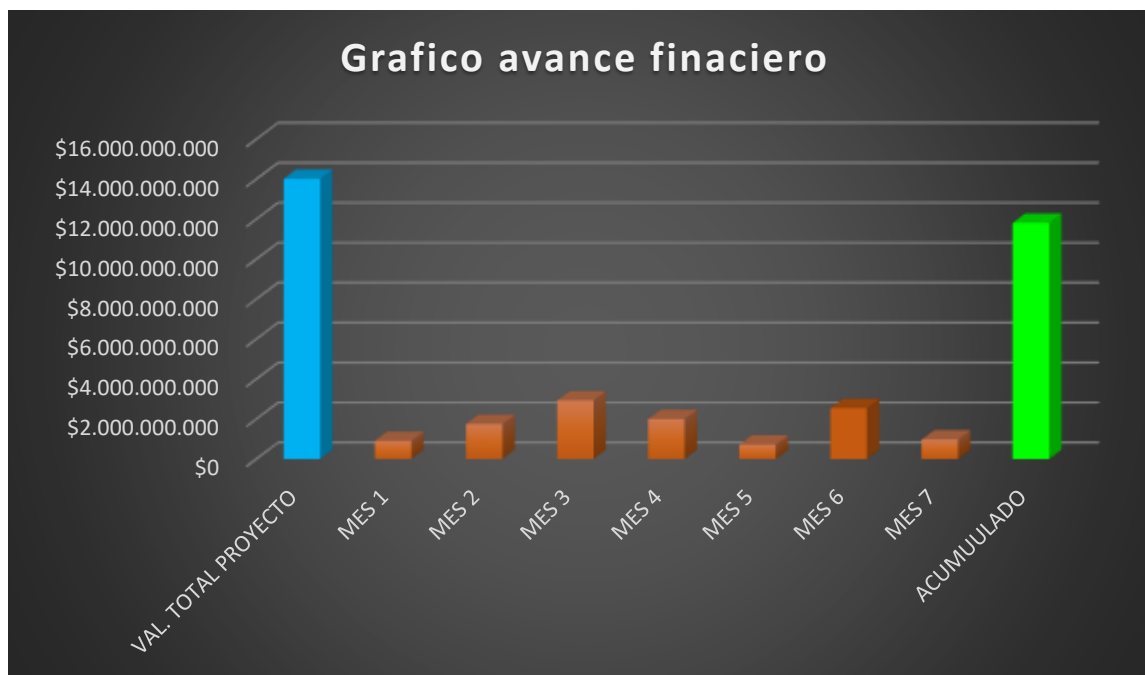



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Como se muestra en el gráfico de barras anterior, sobre el valor total del proyecto por un valor total de \$14.017.400.687, tenemos ilustrado como ha avanzado la ejecución de este proyecto a la fecha, con un acumulado correspondiente a un rubro de \$11.820.137.822 el cual se ve reflejado en un porcentaje del 84.3% en el acumulado de la ejecución financiera del proyecto, cabe resaltar que se le está dando seguimiento a todo el proyecto.

Tabla 8. Avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto

CONDICIONES INICIALES						MES N° 1			MES N° 2		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%
COMPONENTE PRODUCTIVO											
OBJETIVO 1: Implementar 300 unidades de producción hortofrutícola (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de											
1.1 Realizar jornadas de identificación y socialización.											
1.1.1	Contratación de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesion con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Horas	80	62.480	4.998.400	80	4.998.400	100%	-	0%	
1.1.2	Contratación de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesion a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Horas	80	62.480	4.998.400	80	4.998.400	100%	-	0%	
1.1.3	Contratación de 6 auxiliares de apoyo por día (Evento) para la toma de datos	Evento	10	359.890	3.598.900	10	3.598.900	100%	-	0%	
1.1.4	Entrega de papelería a población	Personas	600	10.800	6.480.000	600	6.480.000	100%	-	0%	
1.1.5	Alquiler de salones, video beam, sonido, computador por día	Jornadas	10	701.790	7.017.900	10	7.017.900	100%	-	0%	
1.1.6	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	600	5.500	3.300.000	600	3.300.000	100%	-	0%	
SUBTOTAL					30.393.600		30.393.600		-		
1.2 Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.											
1.2.1	Contratación de Diez (10) tecnicos agropecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realizacion de las visitas.	Visitas	600	44.990	26.994.000	300	13.497.000	50%	300	13.497.000	50%
SUBTOTAL					26.994.000		13.497.000			13.497.000	
1.3 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros											
1.3.1	Invernadero agrícola portátil 600 x 300 x 200 CM	unidad	300	955.070	286.521.000	-	0%		75	71.630.250	25%
1.3.2	Tanque para mezcla de 250 Litros	Unidad	300	223.930	67.179.000	-	0%		75	16.794.750	25%
1.3.3	Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	Unidad	300	1.225.000	367.500.000	-	0%		75	91.875.000	25%
1.3.4	Plastico Mulch plata negra	Rollo	300	1.105.000	331.500.000	-	0%		75	82.875.000	25%
1.3.5	Bandejas de Semilleros (Semillero Melon y Berenjena)	unidad	10.800	6.550	70.740.000	-	0%		2700	17.685.000	25%
SUBTOTAL					1.123.440.000		-			280.880.000	
1.4 Sistema de Riego											
SUBTOTAL					1.123.440.000		-			280.880.000	
1.4 Sistema de Riego											
1.4.1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	Unidad	300	4.759.000	1.427.700.000	34	163.632.498	11%	34	163.632.498	11%
1.4.2	Granada de succión aluminio 2"	Unidad	300	55.980	16.794.000	34	1.924.805	11%	34	1.924.805	11%
1.4.3	Manguera de succión corrugada 2" X 8 metros	Unidad	300	237.930	71.379.000	34	8.180.937	11%	34	8.180.937	11%
1.4.4	Pieza en F importada de 2 pulgadas	Unidad	600	25.190	15.114.000	69	1.732.256	11%	69	1.732.256	11%
1.4.5	Pieza tipo O	Unidad	600	36.390	21.834.000	69	2.706.756	11%	69	2.706.756	11%
1.4.6	Tanque de mezcla Azul de 200 litros	Unidad	300	299.480	89.838.000	34	9.952.734	11%	34	9.952.734	11%
1.4.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	Unidad	300	153.950	46.185.000	34	5.293.386	11%	34	5.293.386	11%
1.4.8	Adaptador hembra PVC 2"	Unidad	300	14.000	4.200.000	34	481.373	11%	34	481.373	11%
1.4.9	Tubería PVC RDE 41 de 2 Pulgadas	Unidad	15.000	75.580	1.133.700.000	1719	129.936.376	11%	1719	129.936.376	11%
1.4.10	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	Unidad	2.700	17.990	48.573.000	309	5.567.081	11%	309	5.567.081	11%
1.4.11	Valvula de paso de 2 Pulgadas	Unidad	600	30.990	18.594.000	69	2.131.108	11%	69	2.131.108	11%
1.4.12	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°	Unidad	1.200	17.990	21.588.000	138	2.474.258	11%	138	2.474.258	11%
1.4.13	TEE PVC de 2 Pulgadas	Unidad	1.200	20.990	25.188.000	138	2.886.864	11%	138	2.886.864	11%
1.4.14	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas	Unidad	300	8.400	2.520.000	34	288.824	11%	34	288.824	11%
1.4.15	Tapon rosado PVC de 2 pulgadas	Unidad	300	11.000	3.300.000	34	376.222	11%	34	376.222	11%
1.4.16	Colador Derivación 2X1	Unidad	900	13.600	12.240.000	103	1.402.859	11%	103	1.402.859	11%
1.4.17	Valvula de aire de 1 Pulgada	Unidad	900	56.580	50.922.000	103	6.042.609	11%	103	6.042.609	11%
1.4.18	Adaptador Macho PVC de 1 Pulgada	Unidad	900	2.300	2.070.000	103	237.248	11%	103	237.248	11%
1.4.19	Tubería PVC RDE 32.5 DE 1 1/2 Pulgada	Unidad	10.800	57.980	626.184.000	1238	71.768.616	11%	1238	71.768.616	11%
1.4.20	Buje PVC 2X1 1/2	Unidad	1.200	7.600	9.120.000	138	1.045.267	11%	138	1.045.267	11%
1.4.21	Codos PVC de 1 1/2	Unidad	3.600	9.600	34.560.000	413	3.961.014	11%	413	3.961.014	11%
1.4.22	Valvula de Paso de 1 1/2 Pulgadas	Unidad	1.200	19.990	23.988.000	138	2.749.329	11%	138	2.749.329	11%
1.4.23	Codo PVC de 1 1/2 45°	Unidad	1.200	11.000	13.200.000	138	1.512.887	11%	138	1.512.887	11%
1.4.24	Adaptador Macho PVC de 1 1/2	Unidad	1.200	5.600	6.720.000	138	770.187	11%	138	770.187	11%
1.4.25	Tapon rosado PVC de 1 1/2 Pulgadas	Unidad	1.200	8.600	7.920.000	138	907.732	11%	138	907.732	11%
1.4.26	Sileta goma 16 Milímetros	Unidad	36.000	480	16.960.000	4126	1.897.986	11%	4126	1.897.986	11%
1.4.27	Conector 16 Milímetros	Unidad	36.000	540	19.440.000	4126	2.226.070	11%	4126	2.226.070	11%
1.4.28	Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	Unidad	300	119.960	35.988.000	34	4.124.681	11%	34	4.124.681	11%
1.4.29	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	Unidad	36.000	760	27.360.000	4126	3.135.802	11%	4126	3.135.802	11%
1.4.30	Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Gateros A 20 por 2000 MTS	Unidad	800	845.710	676.568.000	103	97.551.307	11%	103	97.551.307	11%
1.4.31	Buje de reducción PVC 2X1	Unidad	600	2.800	1.680.000	69	192.549	11%	69	192.549	11%
1.4.32	Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	Unidad	300	38.090	11.427.000	34	1.309.679	11%	34	1.309.679	11%
1.4.33	Codo PVC de 1 Pulgada de 90	Unidad	1.200	2.800	3.360.000	138	385.099	11%	138	385.099	11%
1.4.34	Valvula de paso PVC de 1 Pulgada	Unidad	600	7.600	4.560.000	69	922.634	11%	69	922.634	11%
1.4.35	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	Unidad	1.500	2.800	4.200.000	172	481.373	11%	172	481.373	11%
1.4.36	Injector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	Unidad	300	99.370	29.811.000	34	3.416.718	11%	34	3.416.718	11%
1.4.37	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	Unidad	1.200	11.200	13.440.000	138	1.540.394	11%	138	1.540.394	11%
1.4.38	Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	Unidad	600	117.560	70.536.000	69	8.064.319	11%	69	8.064.319	11%
1.4.39	Instalación por HA o Beneficiario	Unidad	300	720.780	216.234.000	34	24.783.154	11%	34	24.783.154	11%
SUBTOTAL					5.039.766.000		577.621.000			577.621.000	23%
1.5 Herramientas Cosecha y Postcosecha											

Tabla 9. Avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto

Herramientas Cosecha y Postcosecha			Unidad	1,200	9,100	10,920,000	-	0%	600	5,460,000	50%
1.5.1	Guantes para cosecha	Unidad	600	63,980	38,388,000	-	0%	300	18,194,000	50%	
1.5.2	Tijeras	Unidad	600	34,990	20,994,000	-	0%	300	10,497,000	50%	
1.5.3	Hula	Unidad	600	7,000	4,200,000	-	0%	300	2,100,000	50%	
1.5.4	Pala con rabe	Unidad	600	81,980	37,188,000	-	0%	300	18,594,000	50%	
1.5.5	Fumigadora Agrícola Plástica 20 lt	Unidad	300	223,930	67,179,000	-	0%	150	33,589,500	50%	
1.5.6	Regadera Plástica de 8 Lt	Unidad	600	61,980	37,188,000	-	0%	300	18,594,000	50%	
1.5.7						-	0%				
1.6	Insumos Cultivo					-	0%				
1.6.1	Fertilización Cultivo de Plátano - Materia Orgánica	Bultos	2,400	39,890	95,736,000	0	-	0%	240	8,973,600	10%
1.6.2	Fertilización Cultivo Plátano Fosfato Diamónico 18-46-0	Bultos	300	447,600	134,388,000	0	-	0%	30	13,438,800	10%
1.6.3	Fertilización Cultivo Plátano Elementos mayores 21-11-7 (N-P-K-Mg)	Bultos	300	363,890	109,167,000	0	-	0%	30	10,916,700	10%
1.6.4	Fertilización Cultivo Plátano Componentes Elementos mayores 15-4-23-4 (N-P-K-Mg)	Bultos	300	370,890	111,267,000	0	-	0%	30	11,126,700	10%
1.6.5	Fertilización Cultivo Plátano Elementos menores 15-1.0-2.2 (CALCIO, BORO, ZINC)	Bultos	300	363,890	109,167,000	0	-	0%	30	10,916,700	10%
1.6.6	Fungicida plátano Azoxystrobin Vectol 325 SC	Litros	30	118,300	3,549,000	0	-	0%	3	354,900	10%
1.6.7	Fungicida plátano TILTI 250 CE propiconazol	Litros	30	96,400	2,893,000	0	-	0%	3	289,380	10%
1.6.8	Fungicida plátano TIOHANEI NT mancozeb	Litros	30	34,990	1,049,700	0	-	0%	3	104,870	10%
1.6.9	Fertilización Patilla (MELAZA)	Kilogramos	600	3,640	2,184,000	0	-	0%	60	218,400	10%
1.6.10	Fertilización Patilla (DAP)	Bultos	300	447,600	134,388,000	0	-	0%	30	13,438,800	10%
1.6.11	Fertilización Patilla (SOLU NPK)	Bultos	300	609,940	182,982,000	0	-	0%	30	18,298,200	10%
1.6.12	Fertilización Patilla (NITROCAL)	Bultos	300	398,180	119,454,000	0	-	0%	30	11,945,400	10%
1.6.13	Fertilización Patilla (BOROLIQ)	Litros	300	36,800	11,967,000	0	-	0%	30	1,196,700	10%
1.6.14	Sustrato Sustrato Pindstrup Plusa Orange Semillero cultivo de melon	Unidades	369	417,770	154,157,130	0	-	0%	37	15,415,713	10%
1.6.15	Fertilización Melón (MELAZA)	Kilogramos	600	3,640	2,184,000	0	-	0%	60	218,400	10%
1.6.16	Fertilización Melón (DAP)	Bultos	300	447,600	134,388,000	0	-	0%	30	13,438,800	10%
1.6.17	Fertilización Melón (Solutos 44)	Bultos	264	208,400	55,017,600	0	-	0%	26	5,501,760	10%
1.6.18	Fertilización Melón (Sulfato de magnesio)	Bultos	300	174,950	52,485,000	0	-	0%	30	5,248,500	10%
1.6.19	Fertilización Melón (Nitrato de potasio)	Bultos	300	609,940	182,982,000	0	-	0%	30	18,298,200	10%
1.6.20	Fertilización Melón (xi) Estandar	Bultos	150	368,880	55,332,000	0	-	0%	15	5,583,200	10%
1.6.21	Fertilización Melón (Micromenores)	Bultos	75	233,450	17,508,750	0	-	0%	8	1,750,875	10%
1.6.22	Fertilización Melón (Nitrocal)	Bultos	528	398,180	210,239,040	0	-	0%	53	21,023,904	10%
1.6.23	Fertilización Melón (BORAX TECNICO)	Bultos	6	342,900	2,057,400	0	-	0%	1	205,740	10%
1.6.24	Fertilización Melón (Sulfato de potasio)	Bultos	288	511,975	147,447,360	0	-	0%	29	14,744,736	10%
1.6.25	Sustrato Sustrato Pindstrup Plusa Orange Semillero cultivo de berenjena	Bultos	278	417,770	115,304,520	0	-	0%	28	11,530,452	10%
1.6.26	Fertilización Berenjena (MELAZA)	Kilogramos	600	3,640	2,184,000	0	-	0%	60	218,400	10%
1.6.27	Fertilización Berenjena (DAP)	Bultos	300	447,600	134,388,000	0	-	0%	30	13,438,800	10%
1.6.28	Fertilización Berenjena (Solutos)	Bultos	180	208,400	37,512,000	0	-	0%	3	1,343,580	10%
1.6.29	Fertilización Berenjena (Solu NPK)	Bultos	900	609,940	548,948,000	0	-	0%	90	54,894,800	10%
1.6.30	Acetamiprid Control de Plagas Berenjena	Sobres	120	258,920	31,070,400	0	-	0%	12	3,107,040	10%
1.6.31	Deltametrina + thiacloprid Control de Plagas Berenjena	Litros	105	244,930	25,717,650	0	-	0%	11	2,571,765	10%
1.6.32	Timetoaxam 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ildeno-Nitroamina Control de Plagas Berenjena	Frasco	24	335,900	8,061,600	0	-	0%	2	806,160	10%
1.6.33	Fipronil 4 SC Control de Plagas Berenjena	Litros	105	202,940	21,308,700	0	-	0%	11	2,130,870	10%
1.6.34	4 EC Clorpirifos Control de Plagas Berenjena	Litros	105	58,780	6,171,900	0	-	0%	11	617,190	10%
1.6.35	Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisoplae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecani 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de Plagas Berenjena	Unidad	300	90,970	27,291,000	0	-	0%	30	2,729,100	10%
1.6.36	Emamectina benzoato control de Plagas Berenjena	Kilos	18	538,840	9,699,120	0	-	0%	2	969,912	10%
1.6.37	Azoxystrobin+12S Difenoconazol control de enfermedades Berenjena	Litros	105	293,910	30,860,550	0	-	0%	11	3,086,055	10%
1.6.38	Carbendazim control de enfermedades Berenjena Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhidrico control de enfermedades Berenjena	Litros	90	118,960	10,706,400	0	-	0%	9	1,070,640	10%
1.6.40	Acetamiprid Control de Plagas Melón	Sobres	120	258,920	31,070,400	0	-	0%	12	3,107,040	10%
1.6.41	Deltametrina + thiacloprid Control de Plagas Melón	Litros	105	244,930	25,717,650	0	-	0%	11	2,571,765	10%
1.6.42	Timetoaxam 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ildeno-Nitroamina Control de Plagas Melón	Frasco	24	335,900	8,061,600	0	-	0%	2	806,160	10%
1.6.43	Fipronil 4 SC Control de Plagas Melón	Litros	105	202,940	21,308,700	0	-	0%	11	2,130,870	10%
1.6.44	4 EC Clorpirifos Control de Plagas Melón	Litros	105	58,780	6,171,900	0	-	0%	11	617,190	10%
1.6.45	Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisoplae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecani 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de Plagas Melón	Unidad	300	90,970	27,291,000	0	-	0%	30	2,729,100	10%
1.6.46	Emamectina benzoato Control de Plagas Melón	Kilos	18	538,840	9,699,120	0	-	0%	2	969,912	10%
1.6.47	Azoxystrobin+12S Difenoconazol control de enfermedades Melón	Litros	105	293,910	30,860,550	0	-	0%	11	3,086,055	10%
1.6.48	Carbendazim control de enfermedades Melón Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhidrico control de enfermedades Melón	Litros	90	90,970	9,551,850	0	-	0%	11	955,185	10%
1.6.49	Acetamiprid Control de plagas Patilla	Sobres	120	258,920	31,070,400	0	-	0%	12	3,107,040	10%
1.6.51	Deltametrina + thiacloprid Control de plagas Patilla	Litros	105	244,930	25,717,650	0	-	0%	11	2,571,765	10%
1.6.52	Timetoaxam 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ildeno-Nitroamina Control de plagas Patilla	Frasco	24	335,900	8,061,600	0	-	0%	2	806,160	10%
1.6.53	Fipronil 4 SC Control de plagas Patilla	Litros	105	202,940	21,308,700	0	-	0%	11	2,130,870	10%
1.6.54	4 EC Clorpirifos Control de plagas Patilla	Litros	105	58,500	6,247,500	0	-	0%	11	624,750	10%
1.6.55	Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisoplae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecani 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de plagas Patilla	Unidad	300	90,970	27,291,000	0	-	0%	30	2,729,100	10%
1.6.56	Emamectina benzoato Control de plagas Patilla	Kilos	18	538,840	9,699,120	0	-	0%	2	969,912	10%
1.6.57	Azoxystrobin+12S Difenoconazol control de enfermedades Patilla	Litros	105	293,910	30,860,550	0	-	0%	11	3,086,055	10%
1.6.58	Carbendazim control de enfermedades Patilla Complejo Yodo Polietoxi-Polipropoxi Polietoxi Etanol 32 g/l Acido Yodhidrico control de enfermedades Patilla	Litros	90	118,960	10,706,400	0	-	0%	9	1,070,640	10%
1.6.60	Colinos de Plátano	Colinos	132,000	3,890	526,680,000	0	-	0%	13200	52,668,000	10%
1.6.61	Semilla de Melón	Sobre	300	1,099,000	329,700,000	0	-	0%	30	32,970,000	10%
1.6.62	Semilla de Berenjena	Sobre	4,500	157,450	708,525,000	0	-	0%	450	70,852,500	10%
1.6.63	Semilla de Patilla	Sobre	300	349,890	104,967,000	0	-	0%	30	10,496,700	10%
1.7	Análisis de suelos				4,723,203,819		-			472,320,381	
1.7.1	Análisis de suelos completo intercambiable	Unidad	300	179,650	53,895,000	150	26,992,500	50%	150	26,992,500	100%
		SUBTOTAL			53,965,000		26,992,500			26,992,500	
SUBTOTAL OBJETIVO 1					11,213,839,410		648,904,100	5.78%		1,479,319,381	13.19%



OBJETIVO 2: Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.

2.1	Realizar Visitas técnicas a unidad productiva.												
2.1.1	Contratación de (Dici 10) técnicos agropecuarios a profesión a fin a todo costo a visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Visitas	3,000	44.990	134.970.000	214	9.640.714	7%	214	9.640.714.2900	7%		
SUBTOTAL					134.970.000		9.640.714			9.640.714			
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)												
2.2.1	Contratación de Asistente técnico y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	Horas	2.400	19.990	47.976.000	0	-	0%	400	7.996.000	17%		
SUBTOTAL					47.976.000		-			7.996.000			
2.3	Realizar talleres productivos ambientales												
2.3.1	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los talleres productivos ambientales.	Horas	240	49.980	11.995.200	0	-	0%	0	-	0%		
2.3.2	Contratación de 4 auxiliares de apoyo por día (Jornada) para la toma de datos	Jornadas	80	209.900	14.395.800	0	-	0%	0	-	0%		
2.3.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	6.597.000	0	-	0%	0	-	0%		
2.3.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1800	5.500	9.900.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					42.888.000		-	0%		-	0,00%		
2.4	Realizar Seminarios												
2.4.1	Contratación de Dos (2) Administradores agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los seminarios.	Horas	320	49.980	15.993.600	0	-	0%	0	-	0%		
2.4.2	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x seminario)	Jornadas	40	159.950	6.398.000	0	-	0%	0	-	0%		
2.4.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	6.597.000	0	-	0%	0	-	0%		
2.4.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1200	5.500	6.600.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					35.588.600		-	0%		-	0,00%		
SUBTOTAL OBJETIVO 2						SUBTOTAL CAP. 2	201.422.600	9.640.714	3,68%		17.636.714	6,75%	

OBJETIVO 3: Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.

3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.												
3.1.1	Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización	Unidad	300	94.970	\$ 28.491.000	100	9.497.000	33%	100	9.497.000	33%		
SUBTOTAL					\$ 28.491.000		9.497.000	33%		9.497.000	33,33%		
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.												
3.2.1	Contratación de Dos (2) Administradores de empresas o área a fin para el desarrollo de los talleres	Horas	320	49.980	\$ 15.993.600	0	-	0%	40	1.999.200	13%		
3.2.2	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller)	Jornadas	40	159.950	\$ 6.398.000	0	-	0%	5	799.750	13%		
3.2.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	\$ 6.597.000	0	-	0%	38	824.625	13%		
3.2.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1.200	5.500	\$ 6.600.000	0	-	0%	150	825.000	13%		
SUBTOTAL					\$ 35.588.600		-	0%		4.448.575	12,50%		
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.												
3.3.1	Consultoría para el desarrollo de la actividad	Unidad	1	109.967.000	\$ 109.967.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					\$ 109.967.000		-	0%		-	0,00%		
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.												
3.4.2	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización	Unidad	1	26.992.000	\$ 26.992.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					\$ 26.992.000.00		-	0%		-	0,00%		
SUBTOTAL OBJETIVO 3						SUBTOTAL CAP. 3	201.038.600	9.497.000	4,72%		13.945.575	6,94%	

4	ADMINISTRACIÓN												
4.1	ADMINISTRACIÓN (DILIGENCIA, FORMULARIO 1.1.)	Global	1	2.341.100.077	2.341.100.077	0.1024	239.675.950	0.1024	0.1024	239.675.950	10.238%		

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:				14.017.400.687	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	907.317.764	6,47%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	1.750.577.620	12,49%		
--------------------------	--	--	--	----------------	----------------------------------	-------------	-------	----------------------------------	---------------	--------	--	--

VALOR DEL CONTRATO OBRA				14.017.400.687	TOTAL EJECUTADO	907.317.764	6,47%	TOTAL EJECUTADO	1.750.577.620	12,49%		
-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------	---------------	--------	--	--

BALANCE PRESUPUESTAL OBRA			
V/R INICIAL CONTRATO:	14.017.400.687	V/R ANTICIPO:	0,00
V/R ADICIONES:	0,00	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	14.017.400.687		
VALOR ACUMULADO EJECUTADO O AVANCE FISICO	10.846.681.856.81	77,38%	

VALOR ACUMULADO EJECUTADO O AVANCE FISICO	10.846.681.856,81	77,38%		
---	-------------------	--------	--	--

3.170.718.830

Tabla 10. Avance consolidado mes 3,4,5 y 6 del proyecto

[illegible]

Tabla 11. Avance consolidado mes 3,4 y 5 del proyecto

[illegible]



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

428.57	19.281.429	14%	428.57	19.281.429	14%	471.43	21.209.571	18%	428.57	19.281.429	14%
	19.281.429			19.281.429			21.209.571			19.281.429	
400	7.996.000	17%	800	15.992.000	33%		-		800	15.992.000	33%
	7.996.000			15.992.000			-			15.992.000	
							-		48	2.399.040	
							-		12	2.879.180	
							-		60	1.319.400	
							-		360	1.980.000	
							-			8.577.600	
										-	
										-	0%
										-	0%
										-	0%
										-	0%
										-	
	27.377.429			35.273.429			21.209.571			43.851.029	
100	8.497.000	33%									
	8.497.000										
40	1.999.200	12%	80	3.998.400	25%	80	3.998.400	25%	80	3.998.400	25.00%
5	799.750	13%	10	1.599.500	25%	10	1.599.500	25%	10	1.599.500	25.00%
17.5	824.825	13%	75	1.649.250	25%	75	1.649.250	25%	75	1.649.250	25.00%
150	825.000	13%	300	1.650.000	25%	300	1.650.000	25%	300	1.650.000	25.00%
	4.448.575			8.897.150			8.897.150			8.897.150	
							-	0.00%	0.142857143	15.709.571.42	14.28%
							-			15.709.571.42	
	13.945.575			8.897.150			8.897.150			24.606.721	
0.036147501	84.824.917	3.61%	0.0361475	84.824.917	3.61%	0.000369	211.562.293	9.04%	0.000368752	211.562.293	9.04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	125.847.921	0.896%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.001.716.924	14.280%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	713.989.395	5.004%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.543.781.351	18.147%
TOTAL EJECUTADO	125.847.921	0.90%	TOTAL EJECUTADO	2.001.716.924	14.28%	TOTAL EJECUTADO	713.989.395	5.00%	TOTAL EJECUTADO	2.543.781.351	18.10%



Tabla 12. Avance consolidado mes 7

MES N° 1			ACUMULADO		
CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANT.	VALOR TOTAL	%
			80	4.398.400	100%
			80	4.398.400	100%
			10	3.588.000	100%
			800	6.480.000	100%
			10	7.017.800	100%
			800	3.306.000	100%
				36.341.888	100%
			800	36.964.000	100%
				36.964.000	100%
22	20.785.801	7%	300	288.521.000	100%
22	4.473.333	7%	300	87.176.000	100%
22	26.680.488	7%	300	367.500.000	100%
22	24.649.829	7%	300	331.500.000	100%
22	5.131.888	7%	10800	70.740.000	100%
22	91.589.501,20			1.433.446.000	100%
22	73.340.314	8%	277	1.317.698.000	100%
22	862.058	8%	277	16.499.181	100%
22	3.687.606	8%	277	60.877.287	100%
22	779.833	8%	284	13.949.031	100%
22	2.114.430	8%	277	37.412.361	100%
22	4.482.190	8%	277	80.144.747	100%
22	2.377.215	8%	277	42.825.177	100%
22	218.817	8%	277	2.878.275	100%
22	58.250.150	8%	13844	1.246.117.275	100%
22	2.485.923	8%	1409	48.826.178	100%
22	488.492	8%	384	17.480.402	100%
22	5.129.288	8%	1108	19.824.052	100%
22	7.284.281	8%	1108	22.346.573	100%
22	128.490	8%	277	2.325.785	100%
22	1.088.870	8%	331	4.444.444	100%
22	2.709.118	8%	831	11.298.572	100%
22	528.952	8%	831	48.418.322	100%
22	126.267	8%	831	7.910.490	100%
22	32.170.411	8%	8948	577.919.323	100%
22	488.821	8%	1108	8.417.083	100%
22	1.775.885	8%	1108	31.888.032	100%
22	1.230.623	8%	1108	22.139.289	100%
22	878.282	8%	1108	12.482.277	100%
22	343.207	8%	1108	6.202.038	100%
22	400.848	8%	1108	7.006.148	100%
22	890.335	8%	10225	10.243.047	100%
22	988.824	8%	10225	1.741.14.14	100%
22	1.449.243	8%	34225	33.214.188	100%
22	5.400.893	8%	34225	33.267.180	100%
22	43.735.708	8%	831	185.539.381	100%
22	48.227	8%	384	1.590.210	100%
22	587.118	8%	1108	10.548.038	100%
22	1.108.885	8%	1108	2.101.200	100%
22	324.118	8%	104	4.008.527	100%
22	1.084.817	8%	277	3.878.278	100%
22	5.501.638	8%	277	27.573.244	100%
22	1.084.817	8%	1108	2.204.078	100%
22	3.824.407	8%	1108	60.098.278	100%
22	117.118	8%	277	18.907.231	100%
22	278.848.284,88			4.851.213.800	100%
			1100	10.800.000	100%
			800	30.948.000	100%
			800	20.884.000	100%
			800	4.200.000	100%
			800	37.188.000	100%
			800	87.176.000	100%
			800	37.188.000	100%
				216.947.888	100%
102	7.856.880	8%	2112	84.247.680	100%
24	10.748.840	8%	284	118.235.040	100%
24	8.735.360	8%	284	96.068.000	100%
24	8.901.360	8%	284	87.914.000	100%
24	8.735.360	8%	284	98.088.000	100%
24	281.920	8%	28	2.123.120	100%
24	231.504	8%	28	1.348.144	100%
24	85.978	8%	28	925.128	100%
24	174.220	8%	109	1.027.800	100%
24	1.074.864	8%	29	1.823.904	100%
24	14.838.960	8%	284	107.024.180	100%
24	8.568.320	8%	284	105.118.320	100%
24	907.980	8%	325	10.530.980	100%
24	12.532.870	8%	325	158.858.274	100%
24	174.720	8%	328	1.367.800	100%
24	1.074.864	8%	28	1.823.904	100%
24	4.401.408	8%	230	48.415.488	100%
24	2.188.800	8%	284	46.188.800	100%
24	14.038.960	8%	284	101.024.180	100%
24	7.780.560	8%	124	32.462.160	100%
24	1.400.700	8%	48	18.407.700	100%
24	18.819.121	8%	488	185.010.500	100%
24	184.982	8%	253	1.810.512	100%
24	11.765.780	8%	253	128.753.677	100%
24	8.224.362	8%	243	101.487.878	100%
24	174.720	8%	328	1.367.800	100%
24	1.074.864	8%	28	1.823.904	100%
24	3.200.480	8%	138	32.072.280	100%
24	43.413.580	8%	106	432.000.000	100%
24	4.485.930	8%	106	27.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24	2.087.412	8%	82	22.831.832	100%
24	844.928	8%	21	7.094.208	100%
24	1.704.696	8%	92	18.791.808	100%
24	485.752	8%	92	5.431.272	100%
24	2.183.280	8%	284	24.018.080	100%
24	775.930	8%	18	8.538.228	100%
24	3.488.844	8%	92	37.187.284	100%
24	784.148	8%	92	8.400.628	100%
24	886.512	8%	79	9.421.832	100%
24	3.488.832	8%	106	37.343.952	100%
24					



428,57	19.281.429	14%
	19.281.429	
	-	
	-	
48	2.399.040	20%
12	2.879.160	20%
60	1.319.400	20%
360	1.980.000	20%
	8.577.600	
	-	
	27.859.029	
	-	
0,142857143	\$ 15.709.571,42	14%
	\$ 15.709.571,42	
	15.709.571	
0,090368752	211.562.293	9,04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	973.455.965	6,945%
TOTAL EJECUTADO	973.455.965	6,94%

2186	98.335.285	73%
	117.616.714	87%
2400	47.976.000	100%
	47.976.000	100%
96	4.798.080	40%
24	5.758.320	40%
120	2.638.800	40%
720	3.960.000	40%
	17.155.200	40%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
	0	0%
	182.747.914	69,91%
200	18.994.000	100%
	28.491.000	100%
320	15.993.600	100%
40	6.398.000	100%
300	6.597.000	100%
1200	6.600.000	100%
	35.588.600	100%
0,2857	31.419.143	29%
	31.419.143	29%
0	0	0%
	0	0%
	95.498.743	48%
0,5482	1.283.288.613	54,82%
	11.820.137.822	84,32%
	\$ 11.820.137.822	84,32%



A continuación, vamos a describir en cada uno de los objetivos del desarrollo de las actividades que estén por debajo del 100% de ejecución de este proyecto, explicando el porcentaje de avance en cuanto a la ejecución a la fecha y las condiciones de ejecución de la misma.

Esta tabla describe la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, mostrando el avance en cada una de ellas. Seguidamente haremos descripción de los procesos de ejecución de las subactividades como se describen a continuación:

Tabla 15. Ejecución de cada una de las actividades del proyecto

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO HORTIFRUTICOLA BOLIANA							
No.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	VALOR T POR ACTIVIDAD	MAYO	% AVANCE MAYO	ACUMULADO	% ACUMULADO
1	Fomentar el establecimiento de cultivos hortifrutícolas (Plátano, Maíz, Banajana y Pailón) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.	60 días	\$ 57.387.690	\$ -	100%	\$ 57.387.690	100%
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización.	30 días	\$ 30.353.600	\$ -	100%	\$ 30.353.600	100%
1.2	Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.	60 días	\$ 26.994.000	\$ -	100%	\$ 26.994.000	100%
1.3	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos	150 días	\$ 11.156.401.896	\$ 116.325.872,86	9%	\$ 11.261.214.953	81%
1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	60 días	\$ 1.123.440.000	\$ 81.530.501,26	7%	\$ 1.123.440.000	100%
1.3.2	Sistema de Riego	90 días	\$ 5.036.766.000	\$ 256.668.266,66	5%	\$ 4.981.312.000	92%
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha	30 días	\$ 216.057.000	\$ -	0%	\$ 216.057.000	100%
1.3.4	Insumos Cultivos	150 días	\$ 4.723.203.810	\$ 377.858.304,80	8%	\$ 4.156.416.353	88%
1.3.5	Análisis de Suelos	30 días	\$ 53.955.000	\$ -	0%	\$ 53.955.000	100%
2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 386 unidades productivas a atender.	240 días	\$ 281.422.600	\$ 27.859.026,57	11%	\$ 163.486.485	43%
2.1	Realizar visitas técnicas a unidad de productiva	210 días	\$ 134.970.000	\$ 19.281.426,57	14%	\$ 96.336.395	82%
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)	240 días	\$ 47.976.000	\$ -	0%	\$ 47.976.000	100%
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	150 días	\$ 42.868.000	\$ 8.577.600,00	20%	\$ 17.155.200	40%
2.4	Realizar Seminarios	60 días	\$ 35.588.600	\$ -	0%	\$ -	0%
3	Establecer una alianza comercial estratégica para comercialización de los productos hortifrutícolas	210 días	\$ 201.838.800	\$ 15.709.571,42	8%	\$ 95.488.743	48%
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	90 días	\$ 26.401.000	\$ -	0%	\$ 26.401.000	100%
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.	120 días	\$ 35.588.600	\$ -	0%	\$ 35.588.600	100%
3.3	Implementar Marketing territorial Hortifrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	210 días	\$ 109.967.000	\$ 15.709.571,42	14%	\$ 31.410.142,84	29%
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	30 días	\$ 26.992.000	\$ -	0%	\$ -	0%
4	ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	360 días	\$ 2.341.106.877	\$ 211.962.292,84	9%	\$ 1.283.286.612,80	55%
	COSTO TOTAL		\$ 14.917.409.887	\$ 761.893.672,85	5%	\$ 11.808.836.393	54%



15	2.3	Realizar talleres productivos ambientales	150 días	\$ 42.888.000	\$ 8.377.000,00	20%	\$ 17.155.200	40%
16	2.4	Realizar Seminarios	50 días	\$ 35.588.500	\$ -	0%	\$ -	0%
17	3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas	210 días	\$ 201.838.800	\$ 15.708.571,42	8%	\$ 96.488.743	48%
18	3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo	90 días	\$ 28.491.000	\$ -	0%	\$ 28.491.000	100%
19	3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	120 días	\$ 35.588.500	\$ -	0%	\$ 35.588.000	100%
20	3.3	Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización	210 días	\$ 109.967.000	\$ 15.708.571,42	14%	\$ 31.419.142,34	29%
21	3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización	30 días	\$ 26.992.000	\$ -	0%	\$ -	0%
22	4	ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	368 días	\$ 2.341.108.872	\$ 211.962.292,84	9%	\$ 1.283.288.612,80	55%
23		COSTO TOTAL		\$ 14.917.408.887	\$ 765.893.672,65	5%	\$ 11.808.858.383	84%

REALIZAR INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CULTIVOS (ADQUISICIÓN ACTIVOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO AL MODELO DE INVERSIÓN)

Detalle Actividad	% Avance Físico		Valor Total	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
				10	11	12	1	2	3	4	5
Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	99,65	Inicial									
		Prog	1.127.379.284,00			280.860.000,00	280.860.000,00	280.860.000,00	284.799.284,00		
		Eje	1.123.440.000,00			280.860.000,00	280.860.000,00	280.860.000,00		199.359.498,80	81.500.501,20
Sistema de Riego	92,29	Inicial									
		Prog	5.039.766.000,00		577.621.000,00	577.621.000,00	1.942.262.000,00	647.420.666,67	647.420.666,67	647.420.666,66	
		Eje	4.651.313.600,00		577.621.000,00	577.621.000,00	1.942.262.000,00	647.420.666,67		647.420.666,67	258.968.266,66
Herramientas Cosecha y Postcosecha	100	Inicial									
		Prog	216.057.000,00			108.028.500,00	108.028.500,00				
		Eje	216.057.000,00			108.028.500,00	108.028.500,00				
Insumos Cultivo	88	Inicial									
		Prog	4.723.203.810,00			472.320.381,00	472.320.381,00	944.640.762,00	944.640.762,00	944.640.762,00	944.640.762,00
		Eje	4.156.419.352,80			472.320.381,00	472.320.381,00	944.640.762,00	472.320.381,00	1.416.961.143,00	377.856.304,80
Análisis de Suelos	100	Inicial									
		Prog	53.985.000,00		26.992.500,00	26.992.500,00					
		Eje	53.985.000,00		26.992.500,00	26.992.500,00					
Administración del Proyecto	54,82	Inicial									
		Prog	2.341.100.077,00	119.837.975,00	119.837.975,00	239.675.950,00	84.624.917,14	84.624.917,14	211.562.292,84	211.562.292,84	211.562.292,84
		Eje	1.283.288.612,80	119.837.975,00	119.837.975,00	239.675.950,00	84.624.917,14	84.624.917,14	211.562.292,84	211.562.292,84	211.562.292,84

Para esta actividad se anotan los siguientes avances:

Avance financiero actividad: 96%

Avance físico actividad: 96%

Objetivos 2.

Realizar visitas técnicas por unidad productivas: frente al 100% de total de la ejecución para esta actividad, se ha realizado un 87.14% de ejecución hasta el mes de mayo, lo cual indica que el 12.86% faltante de la ejecución se debe a que por cada mes se están realizando estas visitas técnicas hasta la finalización del proyecto, lo cual incurre en unos gastos parciales por cada mes como rubro financiero, tal cual como se describe en el cuadro financiero.

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Total	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
					10	11	12	1	2	3	4	5
Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	58,57	Inicial										
		Prog	134.970.000	134.970.000		9.640.714,28	9.640.714,29	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57
		Eje	79.053.856,72	79.053.856,72		9.640.714,29	9.640.714,29	19.281.428,57	19.281.428,57	21.209.571	19.281.428,57	19.281.428,57

Avance financiero actividad 5: 87.14%

Avance físico actividad 5: 87.14%

Realizar Talleres Productivos Ambientales: Con respecto a esta actividad se realiza un avance más del 20% para el mes de mayo, para un total de un 40% de la ejecución, frente a un 60% por ejecutar a lo largo de los meses faltantes del proyecto con sus rubros asignados para cada mes por el consorcio campo verde como se muestra en el cuadro anterior.

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Total	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
					10	11	12	1	2	3	4	5
Realizar talleres productivos ambientales	40	Inicial										
		Prog	42.888.000	42.888.000						4.288.800	4.288.800	8.577.600
		Eje	17.155.200	17.155.200							8.577.600	8.577.600

Avance financiero actividad 5: 40%

Avance físico actividad 5: 40%

Realizar Seminarios: Se evidencia 0% de avance en la ejecución de esta actividad, la cual se empezará ejecutar a partir del mes de julio hasta el mes de septiembre según el cronograma de ejecución del consorcio campo verde para cumplir con el 100%.

Objetivo 3.

Implementar Marketing Territorial hortofrutícola, Una Alternativa para la Promoción del departamento y Competitividad y Asociación: en esta actividad nos encontramos con una ejecución para este mes de mayo de un 14% más, para un total de un 28.57% de avance total. con todo lo que concierne a la consultoría del desarrollo de las actividades del proyecto, todo esto se ira desarrollando a lo largo de los meses que faltan para cumplir con un 71,43% del proyecto por parte de los ejecutores tal cual como se muestra en detalle en el cuadro financiero.

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Total	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
					10	11	12	1	2	3	4	5
Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	28.57	Inicial										
		Prog	109.967.000	109.967.000						7.854.785,71	7.854.785,71	15.709.571,43
		Eje	31.419.142,84	31.419.142,84							15.709.571,42	15.709.571,42

Avance financiero actividad 5: 28,57%

Avance físico actividad 5: 28,57%

Realizar una Feria Campesina Para Impulsar la Comercialización: Resaltamos que esta actividad se encuentra en un 0%, puesto que esta actividad está programada al final del proyecto, teniendo en cuenta que se generaran iniciativas de comercialización, captación de nuevos clientes.

Seguimiento de los hallazgos financieros encontrados anterior mente.

Resaltando los hallazgos encontrados por interventoría anteriormente, se identificaron hallazgos en la supervisión financiera realizada por el equipo de interventoría, las cuales fueron presentadas al consorcio campo verde con la finalidad de corregir dichas inconsistencias, en el cual se muestra en detalle a continuación con los soportes relacionados.

Tabla 16. Seguimiento de los hallazgos financieros encontrados anteriormente

ITEM	DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMO	CANT U PROY	VALOR UNIT PROD	UND T RECIBIDAS	VALOR TOT FACT	CANT APR GOB	DIF CANT GOB	SIN FACTURAR GOB	CANT TOT FALT	VALOR TOT FALT PROY
1.03	Plastico Mulch plata negra	300	\$ 1.105.000	301	\$ 331.500.000	300	-	\$ -	1,00	
1.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	300	\$ 159.950	183	\$ 46.185.000	175	8	\$ -	117,00	\$ 18.012.150,00
1.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	10.800	\$ 57.980	15300	\$ 626.184.000	6.300	-	\$ -	4.500,00	\$ 260.910.000,00
1.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	10.800	\$ 57.980	15300	\$ 626.184.000	6.300	-	\$ -	4.500,00	\$ 260.910.000,00

Descripción Productos Nota Crédito

- Plástico mulch plata negra: se compra (1) una unidad de mas, frente a las (300) unidades asignadas por el proyecto.
- Maguera de succión corrugada 2"x 3 metros: se compraron 8 unidades de más, frente a las 175 unidades aprobadas por gobernación.
- Tubería PVC RDE 32,5 de 1. ½ pulgadas: según acta aprobada por gobernación se debieron comprar 6300 unidades, de las cuales evidencian la compra por 9000 unidades de más.



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Tabla 17. Soportes de subsanaciones relacionados de las inconsistencias encontradas.



FUNDACION MANANTIAL DE VIDA
NIT 909.206.509-1
CARRERA 4 NRO 26-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DIOS 373
Expedida: 2024/05/10 Vence: 2024/05/10
Cancelada de Contado

Cliente: CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA
Ciudad: MONTERIA - CORDOBA **Correo:** consorciochampoverde01@gmail.com
NIT: 901.762.098 -9
Tel:

#	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SILETA GOMA 16 MILIMETROS	Unid	19%	1.992	386.48	\$769,868.16
2	TAPON ROSCADO PVC DE 1.1/2 PULGADAS	Unid	19%	40	5,546.98	\$221,879.20
3	CONECTOR 16 MILIMETROS	Unid	19%	95	453.79	\$43,110.05
4	MANUERA DE SUCCION CORRUGADA 2X3 METROS	Unid	19%	125	129,370.69	\$16,171,336.25

Total Items: 4
Sub Total \$17,206,193.66
I.V.A \$3,269,176.80
Pago/Abono de Contado \$20,475,370.46

Sum: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS Con 46 CTS M/L
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

Resolución facturación No. 18764068143159 del 2024/04/01 al 2025/04/01, consecutivos autorizados del DIOS353 al DIOS1000
Favor consignar a nuestra cuenta de ahorros del banco Davivienda Nro. 1560 0073 4954

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** _____


Cufe: 919e05cb3dd723b96495f3a3f581f:55196ea2401d8dba3924d55c34c6c96063bad1f47a8e95abb1e0c2db9e3da7179a
Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A NIT: 890830534 **Fecha hora validación:** 2024-05-10 09:54
Impreso por: Software contable Clave - Software de Colombia S.A.S NIT: 800 741 386 S. **Fecha hora generación:** 2024/05/10 09:57 **Elaborado por:** RSR



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MANA

Nit: 901312550-7

CORR DE SAN FRANCISCO DEL RAYO Montelliano - Córdoba

3016744991 - asociacionagropecuariamana@gmail.com



Fecha

29/12/2023

REMISION

224

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901.762.098 -9

Direccion: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA Monteria - Córdoba

Telefono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	34	\$ 3.999.159,66	\$ 135.971.428,44
Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	52	\$ 199.941,18	\$ 10.396.941,36
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	25	\$ 243.243,70	\$ 6.081.092,50
Codos PVC de 1.1/2	498	\$ 8.067,22	\$ 4.017.475,56
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteros A 20 por 2000 MTS	79	\$ 794.714,29	\$ 62.782.428,91
Silleta goma 16 Milímetros	8	\$ 384,30	\$ 3.074,40
Conector 16 Milímetros	905	\$ 453,78	\$ 410.670,90
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	623	\$ 638,70	\$ 397.910,10
Codo PVC de 1.1/2 45°	13	\$ 9.244,00	\$ 120.172,00
Tanque para mezcla de 250 Litros	150	\$ 158.131,09	\$ 23.719.663,50
Tanque de Almacenamiento de 2000 litros	150	\$ 1.029.411,76	\$ 154.411.764,00
Plásticos Mulch Plata Negra	150	\$ 928.571,43	\$ 139.285.714,50
Bandejas de Semilleros (semillero melon y berenjena)	5400	\$ 5.504,20	\$ 29.722.680,00
Collarín Derivación 2X1	325	\$ 11.428,57	\$ 3.714.285,25
Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	620	\$ 15.117,65	\$ 9.372.943,00
Silleta goma 16 Milímetros	57	\$ 386,55	\$ 22.033,35
Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignacion-Transferencias		Base	\$ 580.430.277,77
			\$ 110.281.752,80
		TOTAL	\$ 690.712.030,57



FUNDACION MANANTIAL DE VIDA

NIT: 900206500-1

Carrera 4 # 26-28 Barrio Centro Montería

7810091 - gerencia@funmavi.org



Fecha

29/12/2023

REMISION

223

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA M

Teléfono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
SILLETA GOMA 16 MILIMETROS	1992	\$ 386	\$ 769.868,16
TAPON ROSCADO PVC DE 1.1/2 PULGADAS	40	\$ 5.546,98	\$ 221.879,20
CONECTOR 16 MILIMETROS	95	\$ 453,79	\$ 43.110,05
MANGUERA DE SUCCION CORRUGADA 2X3 METROS	125	\$ 129.370,69	\$ 16.171.336,25
Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignación - Transferencias		Base	\$ 17.206.193,66
		IVA	\$ 3.269.176,80
		TOTAL	\$ 20.475.370,46



MULTISERVICIOS CANAAN

Nit:50980427-7

Calle 36A # 40A-12 Montería - Córdoba

3024624990 - sixtatirado@gmail.com



Fecha

29/12/2023

REMISION

225

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA Montería - Córdoba

Telefono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	50	\$ 243.243,70	\$ 12.162.185,00
Injector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	50	\$ 83.504,20	\$ 4.175.210,00
Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	200	\$ 9.411,76	\$ 1.882.352,00
Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	325	\$ 2.352,92	\$ 764.699,00
Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	90	\$ 32.008,40	\$ 2.880.756,00
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	10	\$ 3.999.159,66	\$ 39.991.596,60
Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	23	\$ 199.941,28	\$ 4.598.649,44
Valvula de aire de 1 Pulgada	275	\$ 49.226,89	\$ 13.537.394,75
Valvula de paso de 2 Pulgadas	200	\$ 26.042,02	\$ 5.208.404,00
TEE PVC de 2 Pulgadas	400	\$ 17.638,66	\$ 7.055.464,00
Granada de succión aluminio 2"	100	\$ 47.042,02	\$ 4.704.202,00
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS	140	\$ 794.714,29	\$ 111.260.000,60
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	808	\$ 638,66	\$ 388.305,28
Codo PVC de 1 Pulgada de 90	500	\$ 2.352,94	\$ 1.176.470,00
Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas	500	\$ 16.798,33	\$ 8.399.165,00
Adaptador hembra PVC 2"	91	\$ 11.764,70	\$ 1.070.587,70
Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	250	\$ 98.789,90	\$ 24.697.475,00
Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	125	\$ 100.831,93	\$ 12.603.991,25

Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignación-Transferencias

Base \$ 256.556.907,62

\$ 48.745.812,49

TOTAL \$ 305.302.720,11



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar

ALMACEN PUNTO FERRETERO AYAPEL / SANDRA PAOLA ARCOB MARTINEZ

NIT 50.995.155-1

CRA 7 25 17 BRR OSPINA PEREZ AVENIDA BOLIVAR

Tel: (604) 3205428

Ayapel - Colombia

Puntoferreteriaayapel@gmail.com

AYAPITO

Remisión
No. 1-1

Señores: CONSORCIO CAMPO VERDE
NIT 901.762.098-9 Teléfono (604) 0000000 - Ext. 000
Dirección cr 11A.55 21 B la castellana Ciudad Montería - Colombia

Fecha
Elaboración

29/12/2023

Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	F1	20.00	95,180,008.00
2	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	1901	50.00	11,896,490.00
3	Tanque de mezcla Azul de 200 litros	1904	50.00	14,473,018.00
4	Codos PVC de 1.1/2	1917	1,002.00	9,618,929.00
5	Rollo de cinta de riego GAL BML con Goteros A.20 por 2000 MTS	1926	156.00	147,530,707.00
6	Silieta goma 16 Milímetros	1922	12,943.00	5,954,479.00
7	inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	1932	75.00	7,452,732.00
8	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	1933	300.00	3,360,084.00
9	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	1931	300.00	840,021.00
10	Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	1928	35.00	1,333,133.00
11	Valvula de aire de 1 Pulgada	1914	100.00	5,858,013.00
12	Valvula de paso de 2 Pulgadas	1908	50.00	1,548,499.00
13	TEE PVC de 2 Pulgadas	1910	100.00	2,099,041.00
14	Granada de succión aluminio 2	1900	25.00	1,399,500.00
15	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	1925	13,769.00	10,464,351.00
16	Adaptador hembra PVC 2	1906	34.00	476,012.00
17	Tapon roscado PVC de 1.1/2 Pulgadas	1921	460.00	3,035,880.00
18	Conector 16 Milímetros	1923	14,000.00	7,560,141.00
19	Codo PVC de 1.1/2 45	1919	487.00	5,357,175.00
20	Pieza en F Importado de 2 pulgadas	1902	250.00	6,297,480.00
21	Pieza tipo D	1903	250.00	9,847,548.00
22	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	1907	505.00	9,085,162.00
23	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°	1909	500.00	8,995,210.00
24	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas	1911	125.00	1,050,026.00
25	Tapon roscado PVC de 2 pulgadas	1912	125.00	1,375,045.00
26	Collarin Derivación 2X1	1913	50.00	680,026.00
27	Adaptador Macho PVC de 1 Pulgada	1915	375.00	862,601.00
28	Buje PVC 2X1.1/2	1916	500.00	3,800,265.00
29	Adaptador Macho PVC de 1.1/2	1920	500.00	2,800,070.00
30	Buje de reducción PVC 2X1	1927	250.00	700,018.00
31	Valvula de paso PVC de 1 Pulgada	1930	250.00	1,900,133.00
32	Tanque para mezcla de 250 Litros	F3	1.00	223,929.00
33	Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	F4	7.00	8,575,002.00



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Observaciones:

Total Bruto	329,102,292.00
IVA 19%	62,529,436.00
Total a Pagar	391,631,728.00

Entregado por: _____ Recibido por: _____



Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras
asociaciones n.o.p.

Razón Social: ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA MANA
Identificación: 901312550-7
Teléfono: 3016744991
Dirección: CORR DE SAN FRANCISCO
DEL RAYO, Montelibano,
Cordoba, Colombia.
Condición IVA:
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: DIOS-7
Fecha: 10/05/2024 10:58
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA,
Municipio: Montería, Cordoba, Colombia.

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824680

Muni. Dest.: Montería

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS		34.00	Und	19%	3,990,159.66	0.00	135,971,428.44
2	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros		52.00	Und	19%	199,941.18	0.00	10,396,941.36
3	Tanque de mezcla Azul de 200 litros		25.00	Und	19%	243,243.70	0.00	6,081,092.50
4	Codos PVC de 1.1/2		498.00	Und	19%	8,067.22	0.00	4,017,475.56
5	Rollo de cinta de riego CAL BML con Coteross A 20 por 2000 MTS		79.00	Und	19%	794,714.29	0.00	62,782,428.91
6	Sileta goma 16 Milímetros		8.00	Und	19%	384.30	0.00	3,074.40
7	Conector 16 Milímetros		905.00	Und	19%	453.78	0.00	410,670.90
8	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros		623.00	Und	19%	638.70	0.00	397,910.10
9	Codo PVC de 1.1/2 45°		13.00	Und	19%	9,244.00	0.00	120,172.00
10	Tanque para mezcla de 250 Litros		150.00	Und	19%	158,131.09	0.00	23,719,663.50
11	Tanque de Almacenamiento de 2000 litros		150.00	Und	19%	1,029,411.76	0.00	154,411,764.00
12	Plásticos Mulch Plata Negra		150.00	Und	19%	928,571.43	0.00	139,285,714.50
13	Bandejas de Semilleros (semillero melon y berenjena)		5,400.00	Und	19%	5,504.20	0.00	29,722,680.00
14	Collarin Derivación 2X1		325.00	Und	19%	11,428.57	0.00	3,714,285.25
15	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°		620.00	Und	19%	15,117.65	0.00	9,372,943.00
16	Sileta goma 16 Milímetros		57.00	Und	19%	380.55	0.00	22,033.35

Total de líneas: 10



HECHO EN
XUBIO.com
Página 1 / 2



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

MULTISERVICIOS CANAAN

Nit:50980427-7

Calle 36A # 40A-12 Montería - Córdoba

3024624990 - sixtatirado@gmail.com



Fecha

29/12/2023

REMISION

225

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA Montería - Córdoba

Telefono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	50	\$ 243.243,70	\$ 12.162.185,00
Injector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	50	\$ 83.504,20	\$ 4.175.210,00
Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	200	\$ 9.411,76	\$ 1.882.352,00
Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	325	\$ 2.352,92	\$ 764.699,00
Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	90	\$ 32.008,40	\$ 2.880.756,00
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	10	\$ 3.999.159,66	\$ 39.991.596,60
Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	23	\$ 199.941,28	\$ 4.598.649,44
Valvula de aire de 1 Pulgada	275	\$ 49.226,89	\$ 13.537.394,75
Valvula de paso de 2 Pulgadas	200	\$ 26.042,02	\$ 5.208.404,00
TEE PVC de 2 Pulgadas	400	\$ 17.638,66	\$ 7.055.464,00
Granada de succión aluminio 2"	100	\$ 47.042,02	\$ 4.704.202,00
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS	140	\$ 794.714,29	\$ 111.260.000,60
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	608	\$ 638,66	\$ 388.305,28
Codo PVC de 1 Pulgada de 90	500	\$ 2.352,94	\$ 1.176.470,00
Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas	500	\$ 16.798,33	\$ 8.399.165,00
Adaptador hembra PVC 2"	91	\$ 11.764,70	\$ 1.070.587,70
Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	250	\$ 98.789,90	\$ 24.697.475,00
Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	125	\$ 100.831,93	\$ 12.603.991,25

Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignación-Transferencias

Base \$ 256.556.907,62

\$ 48.745.812,49

TOTAL \$ 305.302.720,11



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras
asociaciones n.o.p.

Razón Social: ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA MANA
Identificación: 901312550-7
Teléfono: 3016744991
Dirección: CORR DE SAN FRANCISCO
DEL RAYO, Montelibano,
Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
**Responsabilidad
fiscal:** No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: DIOS-7
Fecha: 10/05/2024 10:58
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA, .
Municipio: Montería, Cordoba, Colombia.
Muni. Dest.: Montería

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal: 580,430,277.77
Descuento: 0.00
Total Bruto: 580,430,277.77
IVA 19%: 110,281,752.80

Fecha y hora de validación: 10/05/2024 11:21

CUFE: eb0f4e92661b5cb636d096a71bce35e9a5e8ff4345872c1a283a3bd88b8d2df855a1e3be79c8ab2d3eb9e63b554cff72

Firma Digital:
T0e11HYQUJR3dfsF5LtAqZ9AauRR@TB/wP+iFdqq8UzzbPmZVMsY2X5oFWlyKA
APuYkHFQZxMM3V8FWbXrlofrdrLttQZKwUMXpP4Crk1EWwPSwox72stFrqV08+cw
Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764054292385 del 2023-08-23 al 2024-08-23. Rango: DIOS-1 al DIOS-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 690,712,030.57



HECHO EN
XUBIO.com

Página 2 / 2



MULTISERVICIOS CANAAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Razón Social: SIXTA TULIA TIRADO HOYOS
Identificación: 50980427-7
Teléfono: 3024624990
Dirección: Calle 36A # 40A-12, Montería, Córdoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: MSC-183
Fecha: 10/05/2024 10:30
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CONSORCIO CAMPO VERDE, ...
Municipio: Montería, Córdoba, Colombia.

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Muni. Dest.: Montería

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	Tanque de mezcla Azul de 200 litros		50.00	Und	19%	243,243.70	0.00	12,162,185.00
2	Injector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios		50.00	Und	19%	83,504.20	0.00	4,175,210.00
3	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas		200.00	Und	19%	9,411.76	0.00	1,882,352.00
4	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada		325.00	Und	19%	2,352.92	0.00	764,700.63
5	Tubería RDE21 DE 1 Pulgada		90.00	Und	19%	32,008.40	0.00	2,880,756.00
6	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS		10.00	Und	19%	3,999,159.66	0.00	39,991,596.60
7	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros		23.00	Und	19%	199,941.18	0.00	4,598,647.14
8	Valvula de aire de 1 Pulgada		275.00	Und	19%	49,226.89	0.00	13,537,394.75
9	Valvula de paso de 2 Pulgadas		200.00	Und	19%	26,042.02	0.00	5,208,404.00
10	TEE PVC de 2 Pulgadas		400.00	Und	19%	17,638.66	0.00	7,055,464.00
11	Granada de succión aluminio 2"		100.00	Und	19%	47,042.02	0.00	4,704,202.00
12	Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS		140.00	Und	19%	794,714.29	0.00	111,280,000.60
13	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros		608.00	Und	19%	638.66	0.00	388,305.28
14	Codo PVC de 1 Pulgada de 90		500.00	Und	19%	2,352.94	0.00	1,176,470.00
15	Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas		500.00	Und	19%	16,798.32	0.00	8,399,160.00
16	Adaptador hembra PVC 2"		91.00	Und	19%	11,764.71	0.00	1,070,588.61
17	Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto		250.00	Und	19%	98,789.92	0.00	24,697,480.00



HECHO EN
XUBIO.com

Página 1 / 2



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



MULTISERVICIOS CANAAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Razón Social: SIXTA TULIA TIRADO HOYOS
Identificación: 50980427-7
Teléfono: 3024624990
Dirección: Calle 36A # 40A-12, Montería, Córdoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: MSC-183
Fecha: 10/05/2024 10:30
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CONSORCIO CAMPO VERDE, .
Municipio: Montería, Córdoba, Colombia.

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Muni. Dest.: Montería

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
18	Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS		125.00	Und	19%	100,831.93	0.00	12,603,991.25

Total de líneas: 18

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal: 256,556,907.86
Descuento: 0.00
Total Bruto: 256,556,907.86
IVA 19%: 48,745,812.49

Fecha y hora de validación: 10/05/2024 10:55

CUFE: 3dddf79c57edd431ddaea9887c6408af00123b028a992498e44e8ae79a6b2a02080c6a5328df473dad0d6eb621ab921

Firma Digital:
sFpuMA+kIqp0M34HkuxquYc3gz2GaMs2i5VEvHLwdUC2UsJC3c7t068N43uDEbsX
CWHhJC7fxZD4O1agRoWPgsTcymzp3iBmbgbrMWYOJd5fxvdQsyhQubXxtGal/Q
Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764088207893 del 2024-04-01 al 2024-10-01. Rango: MSC-172 al MSC-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 305,302,720.35



HECHO EN
XUBIO.com

Página 2 / 2



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ACTAS DE ENTREGA INSUMOS Y HERRAMIENTAS



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	
		Página: 1 de 7

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	
Componente	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TUBERÍA DE 2 PULGADAS	Tubo X 6m	84,0
2	TUBERÍA DE 1 1/2 PULGADAS	Tubo X 6m	209
3	CINTA DE RIEGO CAL 8000 (60 Rollos X 900M 5 X 1000)	Metro	59000
4	MANGUERA DE 16 mm	Rollo	6
5	MANGUERA CORRUGADA 6m X 2 PULG	unidad	4

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página 6 de 7

QUIEN RECIBE

Luisa Fernanda Juncos M

QUIEN RECIBE

Hernan Sosa Martinez F.

QUIEN RECIBE

Jorge Prusca

QUIEN RECIBE

Ysminis Bimeto

QUIEN RECIBE

Luis Arroyo Cuelo

QUIEN RECIBE

Yerson Flores Orazoñez

QUIEN RECIBE

Edilberto Navarro

QUIEN RECIBE

[Signature]

QUIEN RECIBE

Tomario Rodriguez





Fundación

Para Volver a Vivir


Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	<p>Página: 1 de 1</p>
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	majagual
Componente	INSUMOS Y MATERIALES

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Giliana Muñoz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1234792701 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TANQUE 2000 LT	UNIDAD	1
2	TANQUE 250 LT	UNIDAD	1
3	ABONO ORGÁNICO	BULTO	8

OBSERVACIONES:		
QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
<u>Hector Marquet</u>		
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. <u>1234792701</u>	



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	
		Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	INSUMOS Y MATERIALES

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Romario Rodríguez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.704.374.945 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet identificado con cédula de ciudadanía No. 102530530 en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TANQUE 2000 LT	UNIDAD	1
2	TANQUE 250 LT	UNIDAD	1
3	ABONO ORGÁNICO	BULTO	8

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

Hector Marquet

[Firma]

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:

Romario Rodríguez C.

Romario Rodríguez

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 1.704.374.945.

HUELLA





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Página: 1 de 1
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	INSUMOS Y MATERIALES

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Jorge Alberto Prasca identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1101380877 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530530, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TANQUE 2000 LT	UNIDAD	1
2	TANQUE 250 LT	UNIDAD	1
3	ABONO ORGÁNICO	BULTO	8

OBSERVACIONES:	
QUIEN ENTREGA: <u>Hector Marquet</u> <u>[Firma]</u> FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	QUIEN RECIBE: <u>Jorge Alberto Prasca Arrieta</u> <u>Jorge Prasca</u> FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. <u>1101380877</u>
	HUELLA 



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	
		Página: 1 de 2

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Luis Alfonso Arroyo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 11013806480 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación - Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:		
QUIEN ENTREGA: <u>Hector Marquet</u> <u>[Firma]</u>	QUIEN RECIBE: <u>Luis Alfonso Arroyo Arce</u> <u>Luis Arroyo</u> FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. <u>1101380648</u>	HUELLA 
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO		



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	
		Página: 1 de 2

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Jorge Prasca identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7707380877 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación - Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

Hector Marquet

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:

Jorge Alberto Prasca Arieta

Jorge Prasca

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 7707380877

HUELLA





Fundación

Para Volver a Vivir



Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	INSUMOS Y MATERIALES

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Yasmiris Barreto García identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1101386801 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Márquez identificado con cédula de ciudadanía No. 1066330330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TANQUE 2000 LT	UNIDAD	1
2	TANQUE 250 LT	UNIDAD	1
3	ABONO ORGÁNICO	BULTO	8

OBSERVACIONES:		
QUIEN ENTREGA: <u>Hector Márquez</u> 	QUIEN RECIBE: <u>Yasmiris Barreto García</u>  FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101386801	HUELLA 
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO		



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunión en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Wilmar Enrique Rodelo Aguas, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 92455084 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Eugenio Jara, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 02 de 06 de 2024

Quien entrega:



Quien recibe:






Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunión en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Elmer Baldovino Amaris, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 6797329 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Eugenio Alvarado, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 02 de 06 de 2024

Quien entrega:



Quien recibe:

Elmer Baldovino



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunió en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Anuar Enrique Rodelo Aguas, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 6797302 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Oscar Ruano Esquivel, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 02 de 06 de 2024

Quien entrega:

Oscar Ruano E

Quien recibe:

ANUARRODELO



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunión en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Sandra Martinez Acevedo, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 42366834 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Oscar Luis Riquero, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 02 de 06 de 2024

Quien entrega:

Oscar Riquero E

Quien recibe:

RES. MCL. MUÑOZ



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ACTA DE VISITA A PREVIOS

Dando seguimiento al trabajo realizado por el equipo de interventoría se continua con las visitas de la mano de formatos de visitas récords, todo esto con el objetivo de poder medir los avances de las ejecuciones de las diferentes actividades tales como las etapas de la mecanización de los terrenos en los tres municipios. De esta manera hemos podido encontrar eventualidades de diferentes indoles debido a los diferentes factores tanto externos como la naturales (terreno, lluvias, etc.), e internos como falta de recursos de algunos beneficiarios, o falta de maquinarias en la zona lo cual por parte del Consorcio Campo Verde ya empezó a dar solución a este inconveniente, contratando maquinas para agilizar estas actividades, por otra parte estos formatos récords muestran cuantos beneficiarios ya han recibido todos los kit para semilleros o si falta algunos materiales por entrega. Continuaremos con los formatos de sistema de riego junto con estos formatos como una forma de medición, se anexan algunos formatos como soporte.

Fundación Para Volver a Vivir									
FORMATO DE VISITA A PREDIO MECANIZACION CONTRATO INTERVENTORIA CA- 012-2023									
Nombre del Proyecto: Implementación de Agronegocios Hortofrutícolas Intensivos con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guantánamo y Matanzas en el Departamento de Sucre.									
Profesional a cargo: <u>INVENTORIA</u>									
Municipio: <u>Matanzas</u> Fecha: <u>02 de Mayo 2024</u> Departamento: <u>Sucre</u>									
Objeto de Visita: Verificación de Mecanización de Terreno									
A continuación se realiza una descripción del proceso de la actividad. Mediante una inspección a cada beneficiario, por favor marcar con (X) o (N) de acuerdo a lo indicado por parte del ente ejecutor.									
NOMBRE	CEDULA	CAPAC	INSPECCION	MECANIZACION TERRENO	PAQUETE MATERIAL	APROBADO	FECHA		
<u>José F. Viqueco</u>	<u>1038136686</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>01 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
<u>Andrés GARCÍA MARIEN</u>	<u>9191253</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>02 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
<u>Rosyris Polanco</u>	<u>22928475</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>02 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
<u>Luisa MORALES</u>	<u>1104313390</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>02 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
<u>Marcelo MARTÍNEZ</u>	<u>1105011158</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>02 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
<u>Luisa LÓPEZ</u>	<u>1102011158</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>02 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
<u>José MORALES</u>	<u>1101310811</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>02 de Mayo 2024</u>		
Observaciones:									
Observaciones:									
Observaciones:									
Firma Interventoría: <u>[Firma]</u> Firma Coordinador Proyecto: <u>[Firma]</u>									



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Fundación
Para Volver a Vivir

FORMATO DE VISTA A PREDIO MECANIZACION CONTRATO INTERVENTORIA CM- 012-2023

Nombre del Proyecto: Implementación de Agropecuarios Hortofrutícolas Intensivos con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guarandá y Majagual en el Departamento de Sucre.

Profesional a cargo: Filadelfo Cerna

Municipio: Macarandú Fecha: 02 de Mayo 2024

Departamento: Sucre
Vereda: Paraiso

Objeto de Visita: Verificación de Mecanización de Terreno

A continuación se realiza una descripción del proceso de la actividad. Mediante una inspección a cada beneficiario, por favor Marque con (S) o (N) de acuerdo a lo recibido por parte del ente receptor

NOMBRE	CEDULA	CAPACI	INSPECCION	PREPARACION TERRENO	FASE DE SIEMBRA	ABONADO	FINICA
Alba Bravo	3329543	SI	SI	SI	SI	NO	ALBA BRAVO.

Observaciones:

Enrique Acuña	9140533	SI	SI	SI	SI	NO	Enrique Acuña
---------------	---------	----	----	----	----	----	---------------

Observaciones:

Israel Castro	9126707	SI	SI	SI	SI	NO	Israel Castro
---------------	---------	----	----	----	----	----	---------------

Observaciones:

Carmelo Hernandez	9125713	SI	SI	SI	SI	NO	Carmelo Hernandez
-------------------	---------	----	----	----	----	----	-------------------

Observaciones:

Manuel Sierra	119110498	SI	SI	SI	SI	NO	Manuel Sierra
---------------	-----------	----	----	----	----	----	---------------

Observaciones:

Elisabeth. Bello	100013902	SI	SI	SI	SI	NO	Elisabet Bello
------------------	-----------	----	----	----	----	----	----------------

Observaciones:

Saiva Castro	1104318564	SI	SI	SI	SI	NO	Saiva Castro
--------------	------------	----	----	----	----	----	--------------

Observaciones:

Edilton Sierra	1104318564	SI	SI	SI	SI	NO	Edilton S.
----------------	------------	----	----	----	----	----	------------

Observaciones:

							Carla Bello.
--	--	--	--	--	--	--	--------------

Observaciones:

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA COORDINADOR PROYECTO



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Fundación

Para Volver a Vivir

FORMATO DE VISTA A PREDIO MECANIZACION CONTRATO INTERVENTORIA CM- 012-2023

Nombre del Proyecto: Implementación de Agronegocios Hortícolas Intensivos con Pequeñas Producciones de los Municipios de Sucre, Guarandas y Majagual en el Departamento de Sucre.

Profesional a cargo: Interventora

Municipio: Páez

Fecha: 1 de Mayo 2024

Departamento: Sucre
Vereda: El Rastro

Objeto de Visita: Verificación de Mecanización de Terreno

A continuación se realiza una descripción del proceso de la actividad. Mediante una inspección a cada beneficiario, por Favor Marcar con (S) o (No) de acuerdo a lo recibido por parte del ente receptor

NOMBRE	CIUDAD	CAPAC	INSPECCION	PREPARACION TERRENO	PAIS DE PASTURA	ACORDADO	FINAN
JEISON FLORES	220002702	SI	SI	SI	SI	NO	JEISON FLORES

Observaciones: Luis Arroyo cuido 407352648 SI SI SI SI SI NO Luis Arroyo

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

FIRMA INTERVENTORA: [Firma] FIRMA COORDINADOR PROYECTO: [Firma]



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

FORMATO DE VISTA A PREDIO MECANIZACION CONTRATO INTERVENTORIA CA- 012-2023

Nombre del Proyecto: Implementación de Agrotecnologías Hortofrutícolas Interventori con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guarandá y Molagán en el Departamento de Sucre.

Profesional a cargo: Hechor Hargier

Municipio: Molagán fecha: 6 de Mayo

Objeto de Visita: Verificación de Mecanización de Terreno

Departamento: Sucre

Vineta: Palomera (Sucre)

A continuación se realiza una descripción del proceso de la actividad. Mediante una inspección a cada beneficiario por parte del técnico con [SI] o [NO] de acuerdo a lo establecido por parte del ente coordinador

NOMBRE	CEDULA	CAPACIT	INSPECCION	PREPARACION TERRENO	PLANTAS DE BASTURA	ABONADO	TRABAJO
<u>Lucía Juvenio</u>	<u>110800158</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>

Observaciones:

<u>Eduar Ariza</u>	<u>110435355</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
--------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Fernanda Hargier</u>	<u>11007611216</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
-------------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Edilberto Navarro</u>	<u>92131430</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Luis A. Amaya Cede</u>	<u>1101380648</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
---------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Yerson Hargier Urbey</u>	<u>110011012</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
-----------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Yasmin E. Barranto</u>	<u>1101386802</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
---------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Faye A. Vasca R.</u>	<u>110138011</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>10/11/2023</u>
-------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Observaciones:

<u>Firma Interventoria</u>	<u>Firma Coordinador Proyecto</u>
----------------------------	-----------------------------------



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar



Fundación
Para Volver a Vivir

FORMATO DE VISITA A PRECIO MECANIZACION CONTRATO INTERVENTORIAL CM-012-2023

Nombre del Proyecto: Implementación de Agronegocios Hortícolas Intensivos con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guarrunzas y Majagual en el Departamento de Sucre

Profesional a cargo: Blalberto Carr

Departamento: Sucre

Municipio: Majagual

Vereda: San Miguel-Paloven

Objeto de Visita: Verificación de Mecanización de Terreno

A continuación se realiza una descripción del proceso de la actividad. Mediante una inspección a cada beneficiario, por favor Marque con (SI) o (NO) de acuerdo a lo recibido por parte del ente ejecutor

NOMBRE	CEPIA	CHACT	INSPECCION	PREPARACION TERRENO	PLANT DE SIEMBRA	APORTEADO	RECEBIDA
<u>Yimena Otalora</u>	<u>1102336538</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>Yimena Otalora</u>

Observaciones:

<u>Emilio A. Morán S.</u>	<u>92127290</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>Emilio Morán</u>
---------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

Observaciones:

<u>Andrés C. Vargas C.</u>	<u>1104379119</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>Andrés Vargas</u>
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------

Observaciones:

<u>Clara Fernández C.</u>	<u>1104380292</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>Clara Fernández</u>
---------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------

Observaciones:

<u>Nely C. Castro C.</u>	<u>50966169</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>Nely Castro</u>
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------

Observaciones:

<u>Liliana Huang Lopez</u>	<u>1134991101</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>Liliana Huang</u>
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------

Observaciones:

<u>Román Rodríguez</u>	<u>1104374943</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>Román Rodríguez</u>
------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------

Observaciones:

--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones:

FIRMA INTERVENTORIA							FIRMA COORDINADOR PROYECTO

[illegible]



Nombre del Proyecto: Implementación de Aprovechamientos Hortícolas Intensivos con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guarandas y Malajual en el Departamento de Sucre.													
Profesional a cargo: Hector		Departamento: Sucre											
Municipio: Malajual		Vereda: El Paraiso											
Fecha: 2 de Mayo													
Nota: Verificación de instalación de semilleros													
A continuación se realiza una descripción del proceso de la actividad. Mediante una inspección a cada beneficiario, por favor Marque con (SI) o (No) de acuerdo a lo recibido por parte del ente ejecutor													
Nombre	Cedula	Capacitación	Madera	Malla	Plástico	Trocha	Gravilla	Almuerzo	Guayeta	Pollonadura	Bandejas	Firma	
Rosalba Acuña S.	5729033	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rosalba Acuña	
Observaciones: en la lluvia se han enjaulados,													
Rosalba Ais Ruiz	6796944	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rosalba Ais Ruiz	
Observaciones: inclinación de los Sacallos, Plástico viejo Acuña.													
Gliserio Saubato	745642	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Gliserio Saubato	
Observaciones:													
José de los Santos	913201	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	José de los Santos	
Observaciones:													
Miguel Andrade Hoya	9295029	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Miguel Andrade	
Observaciones:													
Eliañe Acuña	45188789	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Eliañe Acuña	
Observaciones:													
Edilberto Ayala Diaz	5535927	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Edilberto Ayala	
Observaciones:													
Lorena Casallas	6471694	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Lorena Casallas	
Observaciones:													

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA COORDINADOR PROYECTO

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

TRASLADO DE INSUMOS PARA ENTREGA





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ENTREGA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!






Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

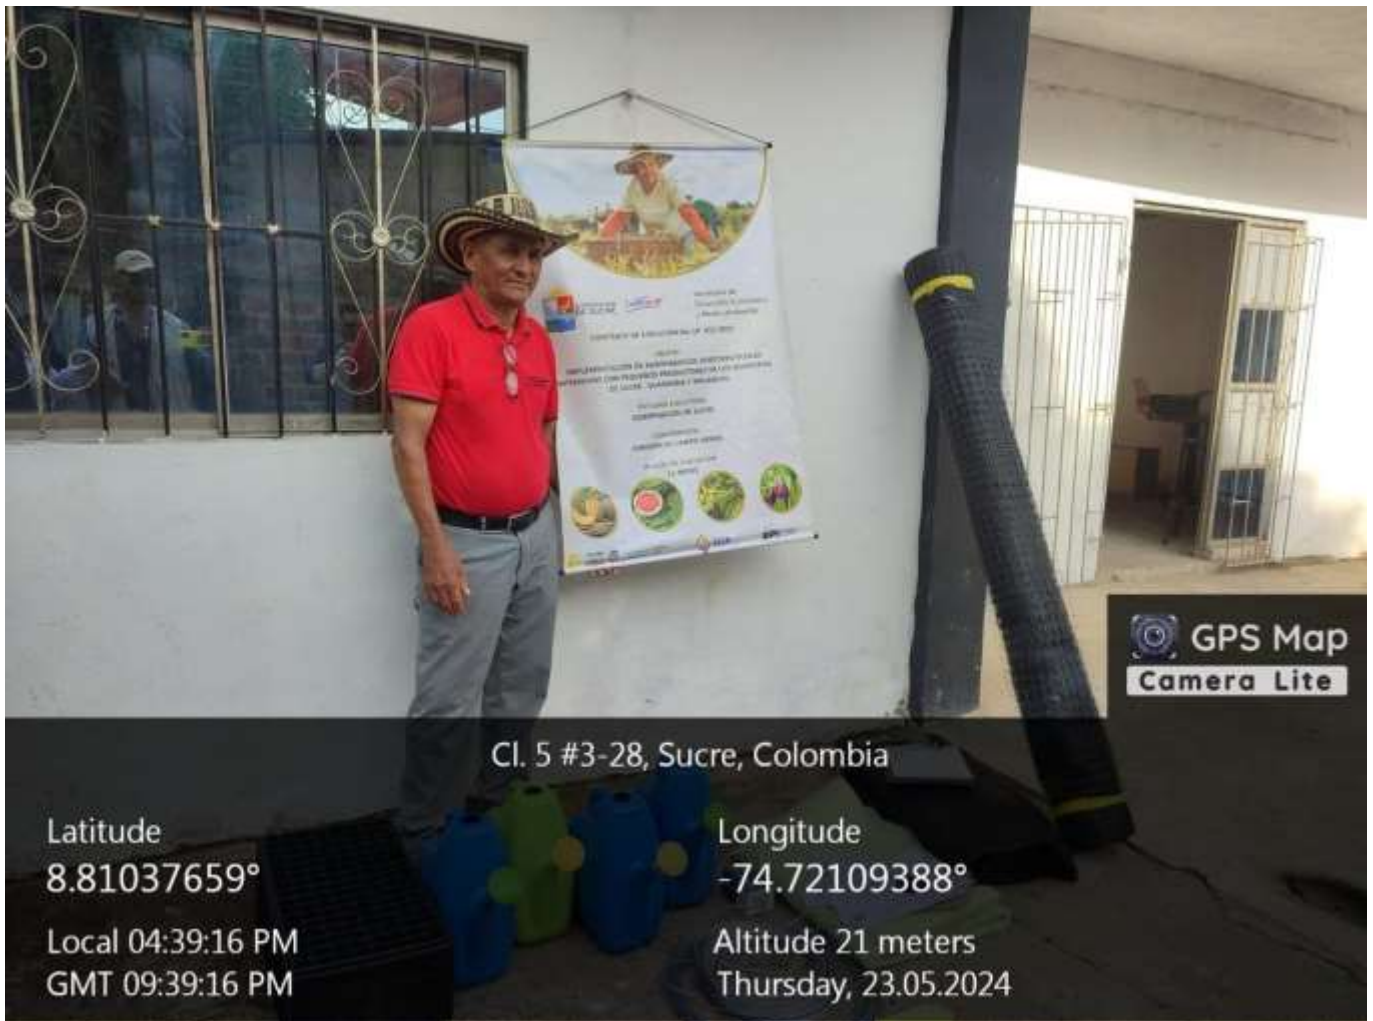



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!






Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

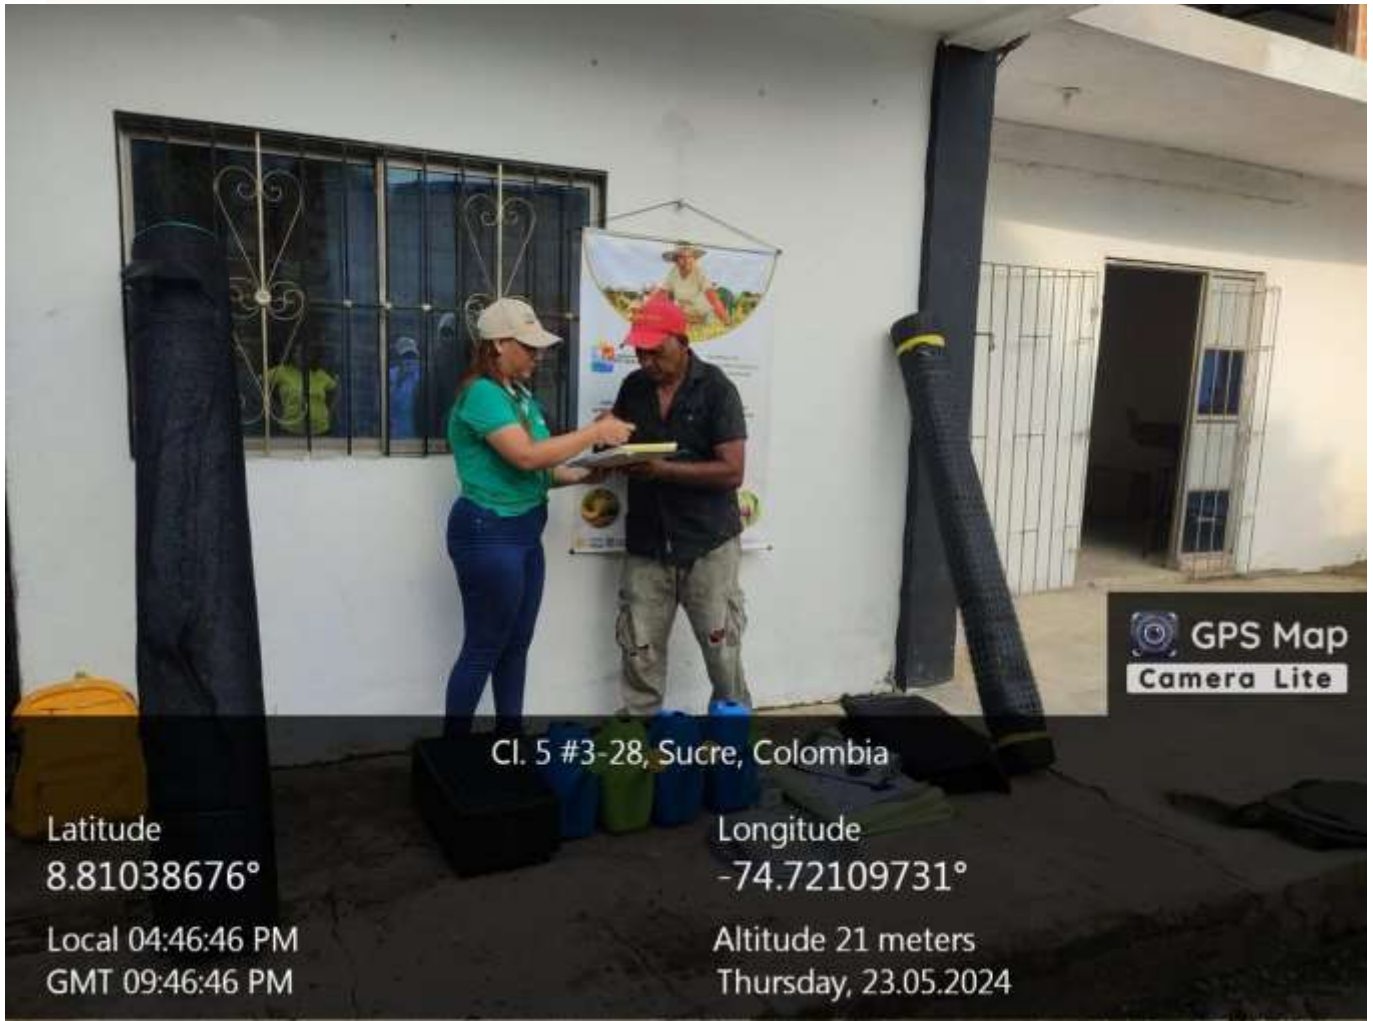



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

EVIDENCIAS DE INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Latitud: 8°25'56"

Longitud: -74°45'46"

Elevación: 25.97±12.35 m

Precisión: 12.13 m

Nota: Majagual-sucre- Leiber Ricardo

AlmCam@IOS



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Latitud: 8°25'55"

Longitud: -74°45'46"

Elevación: 25.18±3.34 m

Precisión: 4.76 m

Nota: Majagual-sucre- Leiber Ricardo

NeoCam @ iOS



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Latitud: 8°25'55"

Longitud: -74°45'46"

Elevación: 24.96±3.35 m

Precisión: 4.76 m

Nota: Majagual-sucre- Leiber Ricardo

MapaCadastral



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

REALIZACION DE MECANIZADO



Municipio de Guaranda



Municipio de Guaranda



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Municipio de Guaranda



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Municipio de Guaranda

NIDER CARLOS CASTRO CASTRO

Representante Legal: Fundación Para Volver a Vivir

NIT: 823.002.076-4
