



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONTRATO N° CM-012-2023

**CONTRATISTA:
CONSORCIO CAMPO VERDE.**

INFORME N° 7 ESTADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS
HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE,
GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE”**

**GOBERNACIÓN DE SUCRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
JULIO DE 2024**



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

OBJETO DEL CONTRATO:

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS
HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE,
GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE”**

INTERVENTOR DE PRODUCCIÓN:

INTERVENTOR DEL COMPONENTE PRODUCTIVO:

**GOBERNACIÓN DE SUCRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
JULIO 2024**



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
2.1 Descripción del Proyecto.....	5
2.1.1 Localización del proyecto.....	5
2.1.2 información del proyecto.....	7
2.1.3 DOMICILIO DEL CONSORCIO CAMPO VERDE.	7
3. PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO NO LP- 012-2023.	8
4. RELACION DEL AVANCE TECNICO DEL CONTRATO No 012-2023	10
5. OBJETIVOS.....	12
5.1 Objetivo General	12
5.2 Objetivos Específicos.....	12
6. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO PRODUCTIVO.	12
8. ACTIVIDADES DE AFECTACIÓN Y NO AFECTACIÓN.....	15
8.1 Actividades que no han sido afectadas por la rotura en Caregato y el fenómeno de la niña.	15
8.1.1 Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	
15	
8.2 Actividades afectadas por la rotura del jarillón en el sector caregato y por el fenómeno de la niña.	19
Imagen 4. Terreno preparado y encharcado en el cual se está instalando el sistema de riego.....	27
Imagen 5. Entrega de Aporcadora en el municipio de Guaranda.....	28
9 CRONOGRAMA PROPUESTO.....	29



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

INDICE DE TABLA

Tabla 1. Municipios dentro del proyecto.....	6
Tabla 2. Equipo Humano Consorcio Campo Verde.....	8
Tabla 3. Datos generales del Contrato de ejecución de proyecto productivo.....	12
Tabla 4. Avance Financiero del Contrato de Interventoría	31
Tabla 5. Avance financiero por actividad mensual	32
Tabla 6. Avance de actividades Objetivo 1.	33
Tabla 7. Avance de actividades Objetivo 2.	33
Tabla 8. Avance de actividades Talleres.....	34
Tabla 9. Avance de actividades Talleres.....	34
Tabla 10. Ejecución de cada una de las actividades del proyecto.....	35
Tabla 11. Avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto	36
Tabla 12. Continuación avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto.....	37
Tabla 13. Avance consolidado mes 3,4,5 y 6 del proyecto.....	39
Tabla 14. Continuación avance consolidado mes 3,4 y 5 del proyecto.....	40
Tabla 15. Continuación avance consolidado mes 7 y 8 del proyecto.....	42
Tabla 16. Continuación avance consolidado mes 9 del proyecto.....	45
Tabla 17. cronograma de Actividades de Interventoría del Proyecto Mes 4	48
Tabla 18. Cronograma de Actividades Por Semanas de Interventoría.....	49
Tabla 19. Soportes relacionados de las inconsistencias encontradas.	50



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento contiene el informe sobre la situación que se presenta en los municipios dentro del proyecto a los 31 días del mes de julio de 2024, en relación con la ejecución de las actividades que se tienen contratadas dentro del CONTRATO No. LP-012-2023, cuyo objeto es: **“Implementación de Agronegocios Hortofrutícolas Intensivos con Pequeños Productores de los Municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el Departamento de Sucre.”**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Descripción del Proyecto.

2.1.1 Localización del proyecto.

Figura No. 1. Ubicación Subregión Mojana en Sucre y Colombia






Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

El proyecto se desarrollará en 3 Municipios:

Figura No. 2. Municipios de Guaranda, Majagual y Sucre.

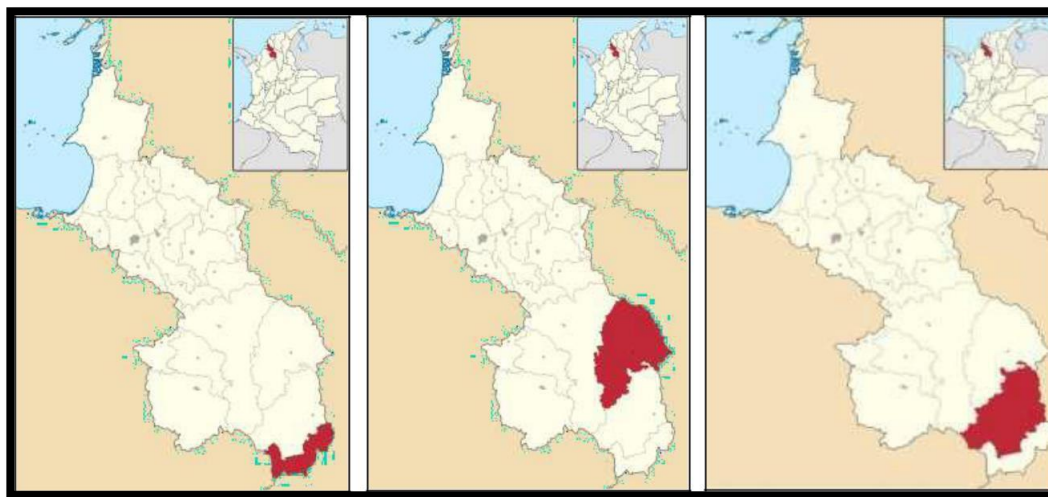

La Subregión Mojana se localiza en el extremo sur del departamento, como lo indican las Figuras; Conformada por los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 2.337 kilómetros cuadrados (el 22.6% del total departamental). En ella domina un clima típico del bosque húmedo tropical. La mayor parte de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por un complejo de caños, ríos, ciénagas y zápales, que hacen parte de la Depresión Momposina, zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.

Tabla 1. Municipios dentro del proyecto.

DEPARTAMENTO	SUBREGIÓN	Municipios
Sucre	Mojana	Majagual
		Sucre
		Guaranda

2.1.2 información del proyecto

INFORMACION DEL CONTRATO	
Contrato No.	CLAUSULADO CONTRATO No. LP- 012-2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual – Guaranda - Sucre
Departamento	Sucre
Contratante	Departamento de Sucre – Gobernación de Sucre
NIT	892 280 021-1
Contratista	Consorcio Campo Verde
NIT	901 762 098-9.
Valor Contrato	Catorce Mil Diecisiete Millones Cuatrocientos Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos M/Cte (\$ 14.017.400.687,00),
Duración	Doce (12) meses
Número de Beneficiarios	300
Supervisor	Álvaro López Herrera
Objeto Supervisión	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES “IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.”
Fecha de Inicio	Octubre 23 de 2023

2.1.3 DOMICILIO DEL CONSORCIO CAMPO VERDE.

El consorcio campo verde, tiene como domicilio principal de correspondencia en la carrera 11ª #55 – 21 Barrio la castellana – Montería Córdoba. Sin embargo, hace presencia permanente en la sub – región de la Mojana, en los municipios de Majagual, Guaranda y sucre en el departamento de sucre, desarrollando las actividades propias del proyecto y definidas en el contrato No LP-012-2023, a través de los profesionales contratados en el marco del contrato de interventoría.

3. PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO NO LP- 012-2023.

Para el desarrollo del compromiso contractual, la Fundación para volver a vivir - Revivir, dispone de un equipamiento inicial en un espacio dispuesto para las oficinas de la interventoría. Igualmente se garantiza para el desplazamiento del equipo, transporte a las zonas de ejecución del proyecto.

Dando cumplimiento a la programación prevista para la ejecución de las actividades del proyecto, de acuerdo con los ajustes aprobados en comité; para la ejecución del mismo se contrató el equipo humano para la implementación del proyecto.

A continuación, se presentan las contrataciones realizadas y la valoración hecha respecto al cumplimiento o no de los perfiles definidos en los estudios previos que hacen parte integral del contrato del proyecto.

Tabla 2. Equipo Humano Consorcio Campo Verde.

CONCEPTO	UND	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	FECHA DE INICIO Y TERMINACION
Contratacion de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesion con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socialización.	Horas	62480	80	4.998.400	23 NOV - 23 DIC
Contratacion de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesion a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socialización.	Horas	62480	80	4.998.400	23 NOV - 23 DIC
Contratación de 6 auxiliares de apoyo por dia (Evento) para la toma de datos	Evento	353890	10	3.538.900	23 NOV - 23 DIC
Contratacion de Diez (10) tecnicos agopecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realizacion de las visitas. Tecnicos Agropecuarios para desarrollar 60 visitas cada uno para la caracterizacion de los potenciales beneficiarios. (60 visitas por X 10 tecnicos = 600 visitas)	Visitas	44990	600	26.994.000	23 NOV - 23 DIC



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Contratación de (Diez 10) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas. Técnicos Agropecuarios desarrollando 300 visitas cada uno (10 visitas por cada unidad productiva) teniendo a cargo cada técnico 10 productores agropecuarios. (300 visitas X 10 técnicos = 3.000 visitas)	Visitas	44.990	3.000	134.970.000	23 DIC 2023 - 23 DE JULIO DE 2024
Contratación de Seis (6) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas. Un (1) Técnico Agropecuario brindará 8 horas de asistencia técnica a cada productor por 50 productores un total de 400 horas a cargo, los 10 técnicos sería un total de 2.400 horas de asistencia técnica en el establecimiento del cultivo a las unidades productivas hortofrutícola beneficiarios. (400 horas X 6 Técnicos = 2.400 horas)	Horas	19.990	2.400	47.976.000	23 DIC 2023 - 23 DE MARZO DE 2024
Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller). - Personal para apoyar el desarrollo de las jornadas de talleres, se realizará en 4 días cada uno costo x jornada de (\$ 80.000 x día x 2 orientadores = 160.000) x 40 jornadas para completar 10 talleres	Jornadas	40	\$159.950	\$6.398.000	23 DE ENERO - 23 DE MAYO DE 2024

4. RELACION DEL AVANCE TECNICO DEL CONTRATO No 012-2023

En este punto vamos a reseñar los avances en el proceso de entrega de material y construcción de semilleros y sistemas de riego y a si mismo se hará una descripción de cada uno de estos elementos y la presentación de una encuesta por interventoría donde se describe las actividades realizadas en los previos de majagual, Guaranda y sucre.

➤ **Visita evaluación de predio - F001 – LP-012.**

Formato usado para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos del predio y del productor para ser tenido en cuenta como beneficiario.

Los requisitos mínimos evaluados son:

- Tipo de tenencia de la tierra.
 - Disponibilidad de un área de 2 hectáreas, para la implementación y desarrollo del cultivo.
 - Disponibilidad de Agua cercana al lote de producción.
 - Área seleccionada debe estar limpio para el montaje de la unidad.
 - El productor debe estar dispuesto a asumir los compromisos propios del proyecto.
- **Hallazgos encontrados.** Se realizo visita a varios predios en el municipio de majagual, Guaranda y Sucre, en la cual nos encontramos con diferentes novedades las cuales se evidencia claramente en atrasos por diferentes motivos como las fuertes lluvias, que ha ocasionado la no realización del mecanizado de algunos previos, lo que trae como consecuencia el atraso en la ejecución del proyecto, visualizando crecimiento constante de los terrenos que ya han sido mecanizados en su totalidad para posterior montaje del sistema de riego. Cabe resaltar que estos hallazgos fueron manifestados al ente ejecutor para brindar solución a esta problemática en este municipio, en el cual el consorcio Campo Verde manifiesta que Brindara insumos para detener y controlar esta maleza que impide con la buena ejecución del proyecto.

Dentro de estos hallazgos también fueron encontrados algunos semilleros los cuales se han venido abajo los plásticos por el agua que ha sido de varios milímetros los cuales ocasionan mucha presión en el plástico haciendo que estos se formen camas de agua y pierdan tensión por las guayas que soportan a estos, cayéndose.

Como solución a esto el consorcio ha dado una solución a los productores colocando soporte en la mesa de la estructura de los semilleros para generar más resistencia, a su vez colocando los pareles de centro a más altura para que la inclinación de este plástico de mayor a 15° y de esta manera pueda correr mejor el agua, junto con la

reducción de espacios de 20cm en el ancho del semillero, es decir 10cm por lados para que el plástico sea mejor tensionado. De esta manera se ha brindado una solución por parte del ente ejecutor.

A continuación, se muestran las diferentes evidencias con registros fotográficos de estos predios.

- **Formato visita técnica a predio - F002 -LP-012.** Formato general de seguimiento de labores en los predios y con los productores. Se diligenciaron en cada visita que realizó el técnico o profesional al predio y a la unidad productiva, en ella se consignó el diagnóstico de la situación encontrada, las actividades que se realizaron durante la visita, las recomendaciones que el profesional deje al beneficiario y los compromisos que se ganaron con las recomendaciones y el intercambio de saberes, tanto para el productor como para el profesional o técnico que realizó la visita. Este formato consta de un registro fotográfico que debe tener al menos cuatro (4) fotografías de cada uno de los componentes agrícola y de intercambio de saberes.
- **Alquiler de oficina para funcionamiento administrativo del proyecto y alquiler de bodega para almacenamiento.** el ente ejecutor continúa realizando los pagos respectivos de arriendo de oficina (atendiendo la necesidad de contar con espacios adecuados para las labores administrativas, reuniones del equipo coordinación del contrato, reuniones con el equipo de campo e interventoría y para atención de los productores seleccionados como beneficiarios del contrato, procesamiento y almacenamiento de la información recolectada en las diferentes actividades y visitas del proyecto, el consorcio suscribió un contrato de arriendo sobre un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio de Majagual) y bodega de almacenamiento de insumos, materiales y herramientas adquiridos con recursos del proyecto, dándole cumplimiento a los requerimientos prescritos en el presupuesto y cronograma financiero del mismo, estos inmuebles se encuentran ubicados en el municipio de majagual – sucre.

Formatos de avances y actividades. Para la ejecución del contrato el área administrativa y técnica continúa con la utilización de formatos de avances y actividades con el fin de recopilar y tabular información concerniente de los beneficiarios y avances del proyecto.

- **Estructuración de formatos de calidad usados en el clausulado contrato N° LP-012 de 2023.**

Se utilizan los siguientes formatos de calidad para funcionamiento y control de las actividades a desarrollar:

➤ **Capacitación grupal: escuela de campo – ECA - F- ECA - 001 – LP-012.**

Formato general Contiene el espacio suficiente para que el profesional encargado describa de manera clara y completa cada actividad realizada y sus observaciones. Tiene un formato anexo para el registro fotográfico de cada actividad.

➤ **Listado de asistencia ECA - F- ECA - 002 – LP-012.**

Este formato se usa para registrar a cada uno de los beneficiarios que asisten a las Escuelas de Campo ECA, se consigna sus nombres, documentos, corregimiento, correo electrónico, número de contacto y firma.

5. OBJETIVOS.

5.1 Objetivo General

Aumentar los niveles de productividad hortofrutícola en los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre.

5.2 Objetivos Específicos.

- Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.
- Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.
- Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.

6. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO PRODUCTIVO.

La siguiente es la información correspondiente de los contratos suscritos:

- **Contrato de ejecución de proyecto productivo clausulado contrato No. LP-012-2023.**

El objeto de este contrato es el “Implementación de agronegocios hortofrutícolas intensivos con pequeños productores de los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de sucre”.

Tabla 3. Datos generales del Contrato de ejecución de proyecto productivo.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Contrato No.	CLAUSULADO CONTRATO No. LP- 012-2023	
	IMPLEMENTACIÓN	DE AGRONEGOCIOS



Objeto	HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE
Municipio	Majagual – Guaranda – Sucre
Departamento	Sucre
Contratante	Departamento de Sucre – Gobernación de Sucre
NIT	892 280 021-1
Contratista	Consorcio Campo Verde
NIT	901 762 098-9.
Valor Contrato	Catorce Mil Diecisiete Millones Cuatrocientos Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos M/Cte (\$ 14.017.400.687,00),
Duración	Doce (12) meses
Número de Beneficiarios	300
Supervisor	Álvaro López Herrera
Objeto Supervisión	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES “IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.”
Fecha de Inicio	Octubre 23 de 2023

7. COMPONENTES DEL PROYECTO

EL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”, TIENE TRES COMPONENTES:

1. Implementar 300 unidades de producción hortofrutícola (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.
2. Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.

3. Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.

CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO					
No.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	VALOR PARCIAL	ACUMULADO	% ACUMULADO
1	Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.	60 días	\$ 57.387.600	\$ 57.387.600	100%
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización	30 días	\$ 30.393.600	\$ 30.393.600	100%
1.2	Realizar vistas de caracterización y sistematización de la información.	60 días	\$ 26.994.000	\$ 26.994.000	100%
1.3	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos	150 días	\$ 11.156.451.810	\$ 10.825.827.543	97%
1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	60 días	\$ 1.123.440.000	\$ 1.123.440.000	100%
1.3.2	Sistema de Riego	90 días	\$ 5.039.766.000	\$ 5.039.766.000	100%
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha	30 días	\$ 216.057.000	\$ 216.057.000	100%
1.3.4	Insumos Cultivo	150 días	\$ 4.723.203.810	\$ 4.392.579.543	93%
1.3.5	Análisis de Suelos	30 días	\$ 53.985.000	\$ 53.985.000	100%
2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	240 días	\$ 261.422.600	\$ 191.325.513	73%
2.1	Realizar Vistas técnicas x unidad de productiva.	210 días	\$ 134.970.000	\$ 117.616.713	87%
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)	240 días	\$ 47.976.000	\$ 47.976.000	100%
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	150 días	\$ 42.888.000	\$ 25.732.800	60%
2.4	Realizar Seminarios	60 días	\$ 35.588.600	\$ -	0%

3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortofrutícolas.	210 días	\$ 201.038.600	\$ 111.208.314	55%
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	90 días	\$ 28.491.000	\$ 28.491.000	100%
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	120 días	\$ 35.588.600	\$ 35.588.600	100%
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	210 días	\$ 109.967.000	\$ 47.128.714,26	43%
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	30 días	\$ 26.992.000	\$ -	0%
4	ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	360 días	\$ 2.341.100.077	\$ 1.494.850.905,64	64%
	COSTO TOTAL		\$ 14.017.400.687	\$ 12.680.599.876	90%

8. ACTIVIDADES DE AFECTACIÓN Y NO AFECTACIÓN.

8.1 Actividades que no han sido afectadas por la rotura en Caregato y el fenómeno de la niña.

8.1.1 Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.

Las actividades correspondientes a los componentes 2 y 3 se vienen desarrollando acorde al cronograma, donde la única afectación en el desarrollo de los mismos la provocan la frecuencia e intensidad de las lluvias, toda vez que afectan el estado de las vías rurales haciéndolas intransitables por variados periodos de tiempo, lo que depende de la duración e intensidad de la lluvia y el estado de la vía. El municipio de Sucre es un ejemplo claro de esta situación, ya que cuando llueve muchas de sus vías se vuelven intransitables y hay que esperar a que las aguas se drenen por escorrentías o por infiltración.

Para el ingreso de materiales, insumos, herramientas y equipos a los municipios de Guaranda y Sucre, nos hemos visto en la necesidad de hacerlo por vía FLUVIAL, aprovechando que los caños están en unos niveles muy altos.

Las vías terrestres se han visto muy afectadas por las lluvias y en muchos casos la misma comunidad no deja transitar vehículos de carga o tractores para que no empeoren el estado de las mismas, e igualmente, para evitar accidentes.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Imagen 1. Camión de carga varado por mal estado de la vía.





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Imagen 2. Transporte de insumos, herramientas, equipos y semillas a Sucre.





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Imagen 3. Envío de elementos a zonas de siembra en Sucre.



El siguiente cuadro resume las actividades realizadas en los componentes 2 y 3 del proyecto, el cual muestra que las actividades de acompañamiento integral se vienen realizando acorde al cronograma.



2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	
2.1	Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	En ejecución acorde a cronograma
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	
2.4	Realizar Seminarios	
3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortofrutícolas.	
3.1	Realizar Acompañamiento formalizacion de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	En ejecución acorde a cronograma
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	

Todas estas son actividades que se pueden seguir realizando, guardando las debidas precauciones de movilidad. El acompañamiento al pequeño productor beneficiario del proyecto se está realizando de manera integral, brindando apoyo y orientación en todas sus labores productivas, lo cual es algo que ellos mismos solicitan se continúe haciendo y que nosotros estamos dispuestos a hacer con el mayor profesionalismo.

Los costos del transporte de los materiales, herramientas, insumos y semilla se vienen asumiendo por parte del consorcio, toda vez que el presupuesto del proyecto no lo contemplaba y debía ser asumido por el productor, pero en vista de las limitaciones económicas de los mismos y en aras de llevar todas las actividades contratadas a feliz término, el Consorcio Campo Verde ha asumido estos costos, los cuales son cada vez más elevados.

8.2 Actividades afectadas por la rotura del jarillón en el sector caregato y por el fenómeno de la niña.

Las actividades del proyecto que se han visto afectadas por el Fenómeno de la Niña, el cual ha causado una alta frecuencia en las lluvias, así como alta intensidad en las mismas, se describen en el siguiente cuadro.

1.3	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos	
1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	100%
1.3.2	Sistema de Riego	
1.3.2.1	Inversión en compra de materiales y equipos para riego	100%

1.3.2.2	Contratación de Personal para implementación de sistemas de riego	100%
1.3.2.3	Levantamientos Topográficos de predios a intervenir	100%
1.3.2.4	Diseño de Sistemas de Riego	100%
1.3.2.5	Coordinación, delimitación y replanteo de diseños para labores de mecanización	100%
1.3.2.6	Mecanización de zonas de siembra (arado)	62%
1.3.2.7	Mecanización de zonas de siembra (aporcado)	33,3%
1.3.2.8	Excavación para tuberías de riego	39%
1.3.2.9	Montaje hidráulico del sistema	30%
1.3.2.10	Montaje cabezal de riego	30%
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha	100%
1.3.4	Insumos Cultivo	93%
1.3.5	Análisis de Suelos	100%

Existe una Ruta Crítica que se ha visto afectada, principalmente, por el Fenómeno de la Niña, tiene que ver con Mecanización, establecimiento de riego y siembra.

Es evidente que son actividades que en gran medida contienen el objeto último de este proyecto.

Pero es necesario realizar algunas aclaraciones para poder contextualizar la situación.

1. La rotura de CAREGATO y de los otros jarillones no han presentado amenaza directa a nuestras zonas de siembra, teniendo en cuenta que uno de las condiciones para elegir zonas de intervención, fue la escogencia de áreas que se vieran poco afectadas en épocas de lluvias, lo que nuestros beneficiarios llaman comúnmente Zonas Altas.
2. La mayor afectación se nos viene dando por el Fenómeno de La Niña y las precipitaciones asociadas. La alta frecuencia e intensidad de las mismas ocasionado que, en un número significativo de predios, las aguas no drenen y se presente encharcamiento sostenido en los mismos. En la última semana se ha dado un periodo de disminución de las lluvias, lo que se conoce como El Veranillo de San Juan, y se ha notado un descenso en las áreas encharcadas.
3. Muchos predios, en los que se habían realizado labores de mecanización en lo referente a arado y otros con arado y aporcado, se vieron afectados por las lluvias, las cuales generaron dificultaron las labores de montaje de sistemas de riego y deterioro en el estado de los suelos y los camellones que habían sido aporcados.
4. El municipio que presenta mayor número de predios afectados es Majagual, sobre todo en los sectores de Palomar (10 ha), Paraíso (18 ha), Sectores aledaños a Tres Bocas (32 ha), El Tamaco (11 ha). Los municipios de Guaranda y Majagual presentan unas afectaciones cercanas a las 20 hectáreas cada uno, al día de hoy.
5. La poca disponibilidad de maquinaria agrícola en los municipios ha sido un factor que ha generado retraso en las actividades. Por lo general, no existen aperos para labores de aporque, tanto así que el Consorcio Campo Verde asumió la compra de dos (2) taipas o aporcadoras para realizar estas labores en los municipios de Guaranda y Sucre, y se colocaron a disposición de los beneficiarios.
6. El siguiente cuadro resume la situación en cada municipio.

MUNICIPIO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
MAJAGUAL	Orden Público	No se han presentado situaciones de alteración del orden público que hayan interrumpido las labores del Contrato LP-012-2023
	Disponibilidad de Maquinaria Agrícola	En el municipio se cuenta con maquinaria agrícola para labores de arado, pero no cuenta con suficientes aperos para las labores de aporcado de los terrenos en las áreas de siembra, según lo estipula el contrato en mención.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	Factor Climático	Desde finales del mes de marzo se vienen presentando lluvias casi que de manera ininterrumpida. En la actualidad casi el 70% de los predios presentan problemas de encharcamiento.
		La labores de mecanización de suelos se ha visto afectada, incluso las labores de arado realizadas sobre 52 hectáreas se han deteriorado y hemos visto el crecimiento de arvenses e igualmente se han imposibilitado las labores de aporcado de los predios.
		La ruta crítica que implican las labores de mecanización de los predios, montaje de sistemas de riego y siembra se encuentra interrumpida en casi un 80% de los predios.
	Factor Económico	Los Beneficiarios manifiestan limitaciones económicas para aportar los recursos necesarios para las acciones que corren por cuenta de ellos, tales como, mecanización, arriendo de tierras, cercado, labores de excavación e instalación de riego.
GUARANDA	Orden Público	No se han presentado situaciones de alteración del orden público que hayan interrumpido las labores del Contrato LP-012-2023
	Disponibilidad de Maquinaria Agrícola	En el municipio se cuenta con maquinaria agrícola para labores de arado, pero no cuenta con aperos para las labores de aporcado de los terrenos en las áreas de siembra, según lo estipula el contrato en mención. El Consorcio Campo Verde asumió la responsabilidad de comprar una Taipa para labores de aporcado y ponerla a disposición de los beneficiarios.
	Factor Climático	Desde finales del mes de marzo se vienen presentando lluvias casi que de manera ininterrumpida. En la actualidad 22 hectáreas presentan problemas de encharcamiento.
		La labores de mecanización de suelos se ha visto afectada, incluso las labores de arado realizadas sobre 32 hectáreas se han deteriorado y hemos visto el crecimiento de arvenses e igualmente se han visto retrasadas las labores de aporcado de los predios.
		La ruta crítica que implican las labores de mecanización de los predios, montaje de sistemas de riego y siembra se encuentra demorada por la alta frecuencia en las precipitaciones.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	Factor Económico	Los Beneficiarios manifiestan limitaciones económicas para aportar los recursos necesarios para las acciones que corren por cuenta de ellos, tales como, mecanización, arriendo de tierras, cercado, labores de excavación e instalación de riego.
SUCRE	Orden Público	No se han presentado situaciones de alteración del orden público que hayan interrumpido las labores del Contrato LP-012-2023
	Disponibilidad de Maquinaria Agrícola	En el municipio se cuenta con maquinaria agrícola para labores de arado, pero no cuenta con aperos para las labores de aporcado de los terrenos en las áreas de siembra, según lo estipula el contrato en mención. El Consorcio Campo Verde asumió la responsabilidad de comprar una Taipa para labores de aporcado y ponerla a disposición de los beneficiarios.
	Factor Climático	Desde finales del mes de marzo se vienen presentando lluvias casi que de manera ininterrumpida. En la actualidad 20 hectáreas presentan problemas de encharcamiento.
		La labores de mecanización de suelos se ha visto afectada, incluso las labores de arado realizadas sobre 32 hectáreas se han deteriorado y hemos visto el crecimiento de arvenses e igualmente se han visto retrasadas las labores de aporcado de los predios.
		La ruta crítica que implican las labores de mecanización de los predios, montaje de sistemas de riego y siembra se encuentra demorada por la alta frecuencia en las precipitaciones.
	Factor Económico	Los Beneficiarios manifiestan limitaciones económicas para aportar los recursos necesarios para las acciones que corren por cuenta de ellos, tales como, mecanización, arriendo de tierras, cercado, labores de excavación e instalación de riego.

7. Es posible seguir haciendo labores de mecanización, excavación y montaje de sistemas de riego y siembra en aproximadamente el 63% de los predios.
8. No vemos recomendable realizar la siembra de Melón y Patillas en estos momentos por la susceptibilidad de estos cultivos a excesos de humedad por ataque de hongos. Igualmente, ésta viene siendo una solicitud de parte de los beneficiarios, quienes manifiestan que el riesgo de perder las cosechas es muy alto.
9. En la actualidad se está realizando siembra en terreno de colinos plátano y estamos haciendo revisión de los predios para realizar siembra de berenjena.
10. Se concertó con los beneficiarios una serie de peticiones a través de un formato diligenciado por predio. Se anexan los formatos que han sido diligenciados a la fecha, toda vez que se hace necesario socializar los temas incluidos en los mismos y esta actividad requiere tiempo, pero en el transcurso de la semana se entregaran las faltantes, para cubrir los 300 beneficiarios.
11. Queremos recalcar nuestro compromiso y agradecimiento con este proyecto y el equipo técnico que nos acompaña, así como nuestro deseo de realizar todas las acciones que nos fueron socializadas.

A continuación, se detallan las Solicitudes concertadas con los beneficiarios:

Exposición de Motivos

- El 2023 fue un año difícil para todos los pequeños productores de La Mojana Sucreña.
- Nuestros ingresos dependen, casi exclusivamente, de los cultivos transitorios como el arroz y la patilla, así como de arrendar nuestra tierra para pasturas de ganado.
- Este año acogimos con alegría la invitación a participar como beneficiarios del Contrato No. 012-2023, para producción hortofrutícola con riego y fertilización.
- Durante todo este año hemos dispuesto nuestra tierra (propia o arrendada) para las labores de este proyecto. Lo que significa una inversión en arriendo o imposibilidad para establecer otros cultivos durante este tiempo, lo que limitó nuestra posibilidad de generar ingresos lícitos.

- Acorde al cronograma de actividades realizamos labores de arado de nuestros predios, pero con el inicio del Fenómeno de la Niña, las lluvias frecuentes e intensas provocaron que el trabajo de mecanización se deteriorara y adicionalmente se produjo un brote incontrolado de arvenses. Lo que se traduce en pérdida de la inversión de mecanización y la necesidad de controlar el crecimiento de los arvenses. Hemos notado que las excavaciones que hacemos para la tubería de los sistemas de riego, ayudan a evacuar las aguas que quedan en nuestros predios, por lo creemos importante implementar un sistema de drenaje en las áreas de cultivo.
- Otro gasto que se ha generado es el de transporte, aun cuando el Consorcio Campo Verde trae los materiales, herramientas, insumos y semillas al casco veredal o a un predio acordado, para llevarlo a nuestros predios debemos contratar motocargueros o tractores teniendo en cuenta los volúmenes de lo entregado.
- Al tener nuestros predios sometidos al régimen de lluvias del Fenómeno de la Niña algunos de ellos están parcial o totalmente encharcados, lo que imposibilita las labores de mecanización, montaje de sistemas de riego y por lo tanto la siembra, pero esto es pasajero y en un par de meses se pueden retomar esas labores, aunque solicitamos se continúe con las otras acciones de acompañamiento y capacitación propias del proyecto.

Queremos recalcar que este tipo de proyectos es de gran ayuda para los que deseamos mejorar la calidad de vida de nuestras familias y por eso estamos muy agradecidos, pero igualmente nuestra situación económica es muy frágil y más con todo lo antes mencionado. Tanto el factor climático como el económico son una gran limitante para nosotros, los beneficiarios, quienes necesitamos apoyo para costear arriendos de tierra, labores de mecanización, transporte, excavación y montaje de sistemas de riego. Agradecemos al Consorcio quienes han comprado y puesto a disposición de los beneficiarios, los aperos necesarios para el aporque de los terrenos; viene costeando las labores de excavación y montaje del sistema hidráulico para riego.

Solicitudes:

1. Destinar recursos al proyecto para apoyarnos en la parte de costos que nos corresponden y una extensión en tiempo, por lo menos de tres (3) meses, en el

proyecto para concluir satisfactoriamente las actividades pendientes y permitir que el factor climático pase.

2. Suspender actividades de mecanización, montaje de sistemas de riego y siembra en los predios que están encharcados. Pero continuar con las demás acciones contempladas en el proyecto. Todo esto encaminado a contar con mejores condiciones agroclimáticas para la producción.
3. Priorizar recursos para que el Consorcio pueda diseñar y construir sistemas de drenajes en los predios, que permitan la evacuación de los excesos de agua producto de las lluvias.
4. Destinar recursos para compra de materiales, insumos, semillas (Melón y Patilla por su corto periodo productivo y su alta sensibilidad a factores externos) y equipos necesarios para labores de cosecha y poscosecha que no están contemplados en el presupuesto original y sus costos de transporte.
5. Permitir que actividades programadas dentro del cronograma puedan se reprogramadas para cumplir con los objetivos de las mismas.
6. Aprobar el aumento en el número de actividades y acciones de apoyo y acompañamiento dentro del proyecto que sean necesarias.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Imagen 4. Terreno preparado y encharcado en el cual se está instalando el sistema de riego.



Imagen 5. Entrega de Aporcadora en el municipio de Guaranda.



9 CRONOGRAMA PROPUESTO.

[illegible]



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

El cronograma propuesto contiene una extensión en el tiempo de tres (3) meses, culminando actividades en el mes de enero (día 23). Incluye las nuevas actividades propuestas y el aumento en número de actividades que se vienen realizando, así como la reprogramación de algunas en el tiempo.

Control de Actividades.

El control de las actividades desarrolladas por el contratista se realiza mediante la inspección diaria de las obras ejecutadas y materiales adquiridos, ejerciendo presencia directa por parte de la supervisión con el apoyo diario de un director.

Atentamente

NIDER CARLOS CASTRO CASTRO
Representante legal
FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR


10. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona el avance financiero del contrato:

Tabla 4. Avance Financiero del Contrato de Interventoría

Ítem	Valores
Valor Inicial del Contrato	\$14.017.400.687
Valor Facturado mes 1	\$907.317.764
Valor Facturado mes 2	\$1.750.577.620
Valor Facturado mes 3	\$2.929.318.802
Valor Facturado mes 4	\$2.001.716.924
Valor Facturado mes 5	\$713.989.395
Valor Facturado mes 6	\$2.543.761.351
Valor Facturado mes 7	\$973.455.965
Valor Facturado mes 8	\$879.743.483
Valor Facturado mes 9	\$253.643.764
VALOR ACOMULADO	\$12.934.243.641

Figura 1. Contrato de Interventoría, Avance Financieros.

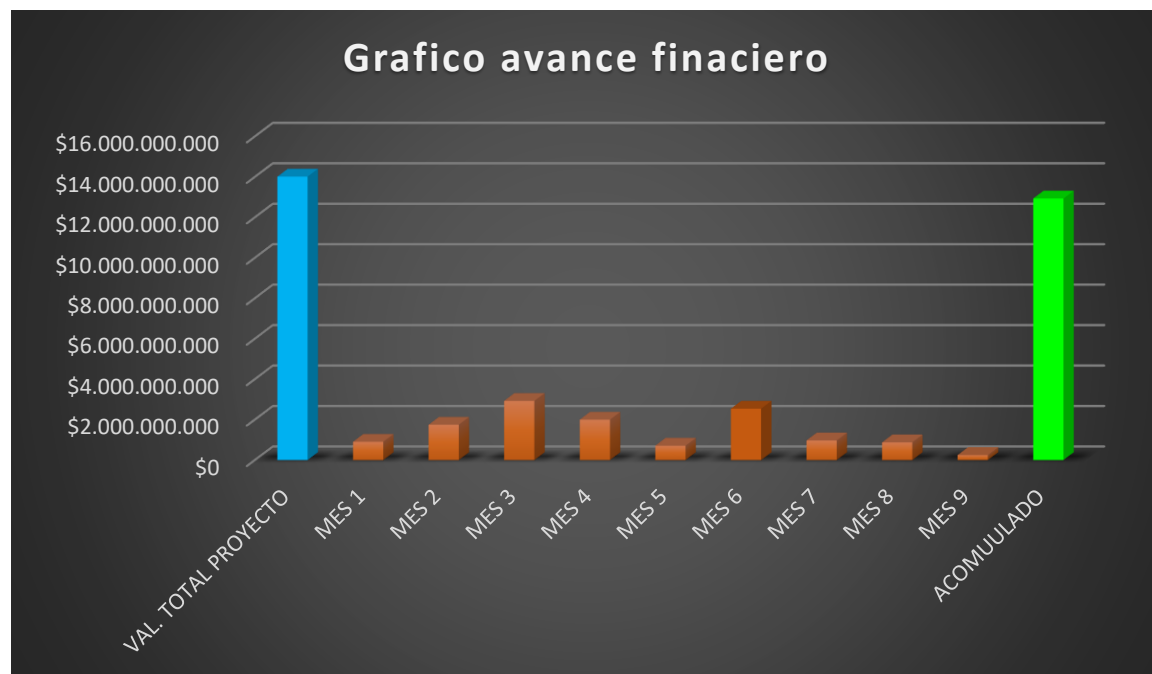



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Como se muestra en el gráfico de barras anterior, sobre el valor total del proyecto por un valor total de \$14.017.400.687, tenemos ilustrado como ha avanzado la ejecución de este proyecto a la fecha, con un acumulado correspondiente a un rubro de \$12.934.243.641 el cual se ve reflejado en un porcentaje del 92.27% en el acumulado de la ejecución financiera del proyecto, cabe resaltar que se le está dando seguimiento a todo el proyecto.

Tabla 5. Avance financiero por actividad mensual

A continuación, se detallará en la siguiente tabla el avance financiero de la ejecución del proyecto, donde se evidencian las diferentes sumas de dineros destinados en dichas actividades con respecto a lo descrito por la suma inicial asignada en las diferentes actividades que componen este proyecto.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	mayo	junio	julio	TOTAL
3.5.1 Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la	\$	\$ 109.967.000,00							\$ 15.709.571,42	\$ 15.709.571,42	\$ 15.709.571,42	\$ 15.709.571,42	\$ 62.838.285,68
3.1.1 Interventoría del Proyecto	MES	12											\$ 252.236.032,02
3.4.1 Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	\$	\$ 28.491.000,00	\$ 4.748.500,00	\$ 4.748.500,00	\$ 9.497.000,00	\$ 9.497.000,00				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.491.000,00
3.3.1 Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	\$	\$ 35.588.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.575,00	\$ 4.448.575,00	\$ 8.897.150,00	\$ 8.897.150,00	\$ 8.897.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.588.600,00
3.2.1 Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	\$	\$ 26.992.000,00								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
1.2.1 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	\$	\$ 1.123.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.860.000,00	\$ 280.860.000,00	\$ 280.860.000,00	\$ 0,00	\$ 199.359.498,80	\$ 81.500.501,20	\$ -	\$ -	\$ 1.123.440.000,00
1.2.2 Sistema de Riego	\$	\$ 5.039.766.000,00	\$ 0,00	\$ 577.621.000,00	\$ 577.621.000,00	\$ 1.942.262.000,00	\$ 647.420.666,67	\$ 0,00	\$ 647.420.666,67	\$ 258.968.266,66	\$ 388.452.400,00	\$ -	\$ 5.039.766.000,00
1.2.3 Herramientas Cosecha y Postcosecha	\$	\$ 216.057.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.028.500,00	\$ 108.028.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.057.000,00
1.2.4 Insumos Cultivo	\$	\$ 4.723.203.810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 472.320.381,00	\$ 472.320.381,00	\$ 944.640.762,00	\$ 472.320.381,00	\$ 1.416.961.143,00	\$ 377.856.304,80	\$ 236.160.191,00	\$ -	\$ 4.392.579.543,80
1.2.5 Analisis de Suelos	\$	\$ 53.985.000,00	\$ 0,00	\$ 26.992.500,00	\$ 26.992.500,00					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.985.000,00
1.2.6 Administración del Proyecto	\$	\$ 2.341.100.077,00	\$ 119.837.975,00	\$ 119.837.975,00	\$ 239.675.950,00	\$ 84.624.917,14	\$ 84.624.917,14	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 1.706.413.198,48
1.3.1 Realizar Jornadas de identificación y socialización	\$	\$ 30.393.600,00	\$ 15.196.800,00	\$ 15.196.800,00						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.393.600,00
1.1.1 Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.	\$	\$ 26.994.000,00	\$ 6.748.500,00	\$ 6.748.500,00	\$ 13.497.000,00					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.994.000,00
2.3.1 Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	\$	\$ 47.976.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.996.000,00	\$ 7.996.000,00	\$ 15.992.000,00	\$ 0,00	\$ 15.992.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.976.000,00
2.2.1 Realizar Seminarios	\$	\$ 35.588.600,00								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.794.300,00	\$ 17.794.300,00
2.1.1 Realizar talleres productivos ambientales	\$	\$ 42.888.000,00						\$ 0,00	\$ 8.577.600,00	\$ 8.577.600,00	\$ 8.577.600,00	\$ 8.577.600,00	\$ 34.310.400,00
2.4.1 Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	\$	\$ 134.970.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.640.714,29	\$ 9.640.714,29	\$ 19.281.428,57	\$ 19.281.428,57	\$ 21.209.571,00	\$ 19.281.428,57	\$ 19.281.428,57	\$ -	\$ 117.616.735,86
		\$ 14.017.400.687,00	\$ 146.531.775,00	\$ 751.145.275,00	\$ 1.750.577.620,29	\$ 2.919.678.087,43	\$ 2.001.716.924,38	\$ 712.061.252,41	\$ 2.545.689.493,73	\$ 973.455.965,49	\$ 879.743.483,83	\$ 253.643.764,26	\$ 13.186.479.673,84

A continuación, vamos a describir en cada uno de los objetivos del desarrollo de las actividades que estén por debajo del 100% de ejecución de este proyecto, explicando el porcentaje de avance en cuanto a la ejecución a la fecha y las condiciones de ejecución de la misma.

Esta tabla describe la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, mostrando el avance en cada una de ellas. Seguidamente haremos descripción de los procesos de ejecución de las subactividades como se describen a continuación:



Objetivo 1.

Insumos de cultivos: para el mes de julio no se realiza alguna ejecución ya que se logró un avance significativo el mes anterior teniendo un avance a la fecha de un 93%, obteniendo un faltante de un 7% para cumplir con el 100% de esta actividad, la cual está representada en los insumos que el consorcio campo verde ya realizó con sus respectivas ordenes, pero aún no han sido despachadas por el proveedor.

Tabla 6. Avance de actividades Objetivo 1.

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023 10	2023 11	2023 12	2024 1	2024 2	2024 3	2024 4	2024 5	2024 6	2024 7	2024 8	2024 9	2024 10
12.1 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	99.65	Inicial																
		Prog	1.127.379,284	1	1.127.379,284			280.860.000	280.860.000	280.860.000	284.799,284							
		Eje	1.123.440.000	1	1.123.440.000			280.860.000	280.860.000	280.860.000		199.359.498,80	81.500.501,20					
12.2 Sistema de Fiego	100	Inicial																
		Prog	5.039.766,000	1	5.039.766,000		577.621,000	577.621,000	1.942.262,000	647.420.666,67	647.420.666,67	647.420.666,66						
		Eje	5.039.766,000	1	5.039.766,000		577.621,000	577.621,000	1.942.262,000	647.420.666,67	647.420.666,67	647.420.666,67	258.968.266,66	388.452,400				
12.3 Herramientas Cosecha y Postcosecha	100	Inicial																
		Prog	216.057,000	1	216.057,000			108.028,500	108.028,500									
		Eje	216.057,000	1	216.057,000			108.028,500	108.028,500									
12.4 Insumos Cultivo	93	Inicial																
		Prog	4.723.203,810	1	4.723.203,810			472.320,381	472.320,381	944.640,762	944.640,762	944.640,762	944.640,762					
		Eje	4.392.579,543,80	1	4.392.579,543,80			472.320,381	472.320,381	944.640,762	472.320,381	1.416.961,143	377.856,304,80	236.160,191				
12.5 Analisis de Suelos	100	Inicial																
		Prog	53.985,000	1	53.985,000		26.992,500	26.992,500										
		Eje	53.985,000	1	53.985,000		26.992,500	26.992,500										
12.6 Administración del Proyecto	63.85	Inicial																
		Prog	2.341.100,077	1	2.341.100,077	119.837,975	119.837,975	239.675,950	84.624,917,14	84.624,917,14	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84
		Eje	1.434.950,905,64	1	1.434.950,905,64	119.837,975	119.837,975	239.675,950	84.624,917,14	84.624,917,14	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84	211.562,292,84

Para esta actividad se anotan los siguientes avances:

Avance financiero actividad: 93%

Avance físico actividad: 93%

Objetivo 2.

Realizar visitas técnicas por unidad productivas: frente al 100% de total de la ejecución para esta actividad, se ha realizado un 87% de ejecución hasta el mes de julio, lo cual indica que el 13% faltante de la ejecución se debe a que por cada mes se están realizando estas visitas técnicas hasta la finalización del proyecto, lo cual incurre en unos gastos parciales por cada mes como rubro financiero, tal cual como se describe en el cuadro financiero.

Tabla 7. Avance de actividades Objetivo 2.

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023 10	2023 11	2023 12	2024 1	2024 2	2024 3	2024 4	2024 5	2024 6
2.4.1 Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	101.43	Inicial												
		Prog	134.970,000	1	134.970,000		9.640.714,28	9.640.714,29	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,58
		Eje	136.898.142,43	1	136.898.142,43		9.640.714,29	9.640.714,29	19.281.428,57	19.281.428,57	21.209,571	19.281.428,57	19.281.428,57	

Avance financiero actividad 5: 87.14%

Avance físico actividad 5: 87.14%

Realizar Talleres Productivos Ambientales: Con respecto a esta actividad se realiza un avance más del 20% para el mes de mayo, para un total de un 80% de la ejecución, frente a un 20% por ejecutar a lo largo de los meses faltantes del proyecto con sus rubros asignados para cada mes por el consorcio campo verde como se muestra en el cuadro anterior.

Tabla 8. Avance de actividades Talleres

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023 10	2023 11	2023 12	2024 1	2024 2	2024 3	2024 4	2024 5	2024 6	2024 7	2024 8	2024 9
2.11 Realizar talleres productivos ambientales	60	Inicial															
		Prog	42.888.000	1	42.888.000						4.288.800	4.288.800	8.577.600	8.577.600	8.577.600	8.577.600	
		Eje	25.732.800	1	25.732.800							8.577.600	8.577.600	8.577.600	8.577.600	8.577.600	

Avance financiero actividad 5: 80%

Avance físico actividad 5: 80%

Realizar Seminarios: para esta actividad encontramos una ejecución del 50% en cuanto a los avances obtenidos, cabe resaltar que esta actividad dio inicio el mes pasado, se encuentra aun un 50% por ejecutar para lograr el 100% de esta actividad.

Objetivo 3.

Implementar Marketing Territorial hortofrutícola, Una Alternativa para la Promoción del departamento y Competitividad y Asociación: en esta actividad nos encontramos con una ejecución para este mes de julio de un 14% más, para un total de un 57% de avance total. con todo lo que concierne a la consultoría del desarrollo de las actividades del proyecto, todo esto se ira desarrollando a lo largo de los meses que faltan para cumplir con un 43% del proyecto por parte de los ejecutores tal cual como se muestra en detalle en el cuadro financiero.

Tabla 9. Avance de actividades Talleres

Detalle Actividad	% Avance Físico		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023 10	2023 11	2023 12	2024 1	2024 2	2024 3	2024 4	2024 5	2024 6	2024 7	2024 8	2024 9	2024 10
3.5.1 Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización	42.88	Inicial																
		Prog	109.967.000	1	109.967.000						7.854.785,71	7.854.785,71	15.709.571,43	15.709.571,43	15.709.571,43	15.709.571,43	15.709.571,43	15.709.571,43
		Eje	47.128.714,26	1	47.128.714,26							15.709.571,42	15.709.571,42	15.709.571,42	15.709.571,42	15.709.571,42	15.709.571,42	15.709.571,42

Avance financiero actividad 5: 57%

Avance físico actividad 5: 57%



Realizar una Feria Campesina Para Impulsar la Comercialización: Resaltamos que esta actividad se encuentra en un 0%, puesto que esta actividad está programada al final del proyecto, teniendo en cuenta que se generaran iniciativas de comercialización, captación de nuevos clientes.

Tabla 10. Ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO HORTIFRUTICOLA MOJANA							
No.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	VALOR T POR ACTIVIDAD	JULIO	% AVANCE JULIO	ACUMULADO	% ACUMULADO
1	Fomentar el establecimiento de cultivos hortofrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.	60 días	\$ 57.387.600	\$ -	100%	\$ 57.387.600	100%
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización	30 días	\$ 30.393.600	\$ -	100%	\$ 30.393.600	100%
1.2	Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.	60 días	\$ 26.994.000	\$ -	100%	\$ 26.994.000	100%
1.3	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos	150 días	\$ 11.156.451.810	\$ -	0%	\$ 10.825.827.544	97%
1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	60 días	\$ 1.123.440.000	\$ -	0%	\$ 1.123.440.000	100%
1.3.2	Sistema de Riego	90 días	\$ 5.039.766.000	\$ -	0%	\$ 5.039.766.000	100%
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha	30 días	\$ 216.057.000	\$ -	0%	\$ 216.057.000	100%
1.3.4	Insumos Cultivo	150 días	\$ 4.723.203.810	\$ -	0%	\$ 4.392.579.544	93%
1.3.5	Análisis de Suelos	30 días	\$ 53.985.000	\$ -	0%	\$ 53.985.000	100%
2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	240 días	\$ 261.422.600	\$ 26.371.900,00	10%	\$ 217.697.413	83%
2.1	Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	210 días	\$ 134.970.000	\$ -	0%	\$ 117.616.713	87%
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)	240 días	\$ 47.976.000	\$ -	0%	\$ 47.976.000	100%
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	150 días	\$ 42.888.000	\$ 8.577.600,00	20%	\$ 34.310.400	80%
2.4	Realizar Seminarios	60 días	\$ 35.588.600	\$ 17.794.300,00	50%	\$ 17.794.300	50%
3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortofrutícolas.	210 días	\$ 201.038.600	\$ 227.271.864,26	113%	\$ 1.833.331.084	912%
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	90 días	\$ 28.491.000		0%	\$ 28.491.000	100%
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	120 días	\$ 35.588.600		0%	\$ 35.588.600	100%
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	210 días	\$ 109.967.000	\$ 15.709.571,42	14%	\$ 62.838.285,68	57%
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	30 días	\$ 26.992.000	\$ -	0%	\$ -	0%
4	ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	360 días	\$ 2.341.100.077	\$ 211.562.292,84	9%	\$ 1.706.413.198,48	73%
	COSTO TOTAL		\$ 14.017.400.687	\$ 253.643.764,26	2%	\$ 12.934.243.641	92%



CONDICIONES INICIALES						MES N° 1			MES N° 2		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%
COMPONENTE PRODUCTIVO											
OBJETIVO 1: Implementar 300 unidades de producción hortofrutícola (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de											
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización.										
1.1.1	Contratación de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesión con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Horas	80	62.480	4.998.400	80	4.998.400	100%			0%
1.1.2	Contratación de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesión a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Horas	80	62.480	4.998.400	80	4.998.400	100%		-	0%
1.1.3	Contratación de 6 auxiliares de apoyo por día (Evento) para la toma de datos	Evento	10	359.890	3.598.900	10	3.598.900	100%		-	0%
1.1.4	Entrega de papelería a población	Personas	600	10.800	6.480.000	600	6.480.000	100%		-	0%
1.1.5	Alquiler de salones, video beam, sonido, computador por día	Jornadas	10	701.790	7.017.900	10	7.017.900	100%		-	0%
1.1.6	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	600	5.500	3.300.000	600	3.300.000	100%		-	0%
SUBTOTAL					30.393.600		30.393.600			-	
1.2	Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.										
1.2.1	Contratación de Diez (10) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Visitas	600	44.990	26.994.000	300	13.497.000	50%	300	13.497.000	50%
SUBTOTAL					26.994.000		13.497.000			13.497.000	
1.3	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros										
1.3.1	Invernadero agrícola portátil 600 x 300 x 200 CM	unidad	300	955.070	286.521.000		-	0%	75	71.630.250	25%
1.3.2	Tanque para mezcla de 250 Litros	Unidad	300	223.930	67.179.000		-	0%	75	16.794.750	25%
1.3.3	Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	Unidad	300	1.225.000	367.500.000		-	0%	75	91.875.000	25%
1.3.4	Plástico Mulch plata negra	Rollo	300	1.105.000	331.500.000		-	0%	75	82.875.000	25%
1.3.5	Bandejas de Semilleros (Semillero Melón y Berenjena)	unidad	10.800	6.550	70.740.000		-	0%	2700	17.685.000	25%
SUBTOTAL					1.123.440.000		-			286.860.000	
1.4	Sistema de Riego										
SUBTOTAL					1.123.440.000		-			286.860.000	
1.4	Sistema de Riego										
1.4.1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2" 4LPS	Unidad	300	4.759.000	1.427.700.000	34	163.632.498	11%	34	163.632.498	11%
1.4.2	Granada de succión aluminio 2"	Unidad	300	55.980	16.794.000	34	1.924.805	11%	34	1.924.805	11%
1.4.3	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	Unidad	300	237.930	71.379.000	34	8.180.937	11%	34	8.180.937	11%
1.4.4	Pieza en F importado de 2 pulgadas	Unidad	600	25.190	15.114.000	69	1.732.256	11%	69	1.732.256	11%
1.4.5	Pieza tipo D	Unidad	600	39.390	23.634.000	69	2.708.756	11%	69	2.708.756	11%
1.4.6	Tanque de mezcla Azul de 200 litros	Unidad	300	289.460	86.838.000	34	9.952.734	11%	34	9.952.734	11%
1.4.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	Unidad	300	153.950	46.185.000	34	5.293.386	11%	34	5.293.386	11%
1.4.8	Adaptador hembra PVC 2"	Unidad	300	14.000	4.200.000	34	481.373	11%	34	481.373	11%
1.4.9	Tubería PVC RDE 41 de 2 Pulgadas	Unidad	15.000	75.580	1.133.700.000	1719	129.636.376	11%	1719	129.636.376	11%
1.4.10	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	Unidad	2.700	17.990	48.673.000	309	5.567.081	11%	309	5.567.081	11%
1.4.11	Valvula de paso de 2 Pulgadas	Unidad	600	30.990	18.594.000	69	2.131.108				



Tabla 12. Continuación avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto.

Herramientas Cosecha y Postcosecha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

OBJETIVO 2: Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.

2.1	Realizar Visitas técnicas x unidad productiva.												
2.1.1	Contratación de (Cinco 10) técnicos agropecuarios o profesionistas a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Visitas	3 000	44.990	134.970.000	214	9.640.714	7%	214	9.640.714.2900	7%		
SUBTOTAL					134.970.000		9.640.714			9.640.714			
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)												
2.2.1	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)	Horas	2 400	18.990	47.976.000	0	-	0%	400	7.996.000	17%		
SUBTOTAL					47.976.000		-			7.996.000			
2.3	Realizar talleres productivos ambientales												
2.3.1	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesionista a fin por horas para el desarrollo de los talleres productivos ambientales.	Horas	240	48.980	11.995.200	0	-	0%	0	-	0%		
2.3.2	Contratación de 4 auxiliares de apoyo por día (Jornada) para la toma de datos	Jornadas	60	239.930	14.395.800	0	-	0%	0	-	0%		
2.3.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	6.597.000	0	-	0%	0	-	0%		
2.3.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1800	5.500	9.900.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					42.888.000		-	0%		-	0,00%		
2.4	Realizar Seminarios												
2.4.1	Contratación de Dos (2) Administradores agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesionista a fin por horas para el desarrollo de los seminarios	Horas	320	48.980	15.993.600	0	-	0%	0	-	0%		
2.4.2	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller)	Jornadas	40	159.950	6.398.000	0	-	0%	0	-	0%		
2.4.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	6.597.000	0	-	0%	0	-	0%		
2.4.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1200	5.500	6.600.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					35.588.600		-	0%		-	0,00%		
SUBTOTAL OBJETIVO 2							261.422.600	9.640.714	3,69%		17.636.714	6,75%	

OBJETIVO 3: Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortofrutícolas.

3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.												
3.1.1	Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización	Unidad	300	94.970	\$ 28.491.000	100	9.497.000	33%	100	9.497.000	33%		
SUBTOTAL					\$ 28.491.000		9.497.000	33%		9.497.000	33,33%		
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.												
3.2.1	Contratación de Dos (2) Administradores de empresas o área a fin para el desarrollo de los talleres	Horas	320	48.980	\$ 15.993.600	0	-	0%	40	1.999.200	13%		
3.2.2	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller)	Jornadas	40	159.950	\$ 6.398.000	0	-	0%	5	799.750	13%		
3.2.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	\$ 6.597.000	0	-	0%	38	834.620	13%		
3.2.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1 200	5.500	\$ 6.600.000	0	-	0%	150	825.000	13%		
SUBTOTAL					\$ 35.588.600		-	0%		4.448.575	12,50%		
3.3	Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.												
3.3.1	Consultoría para el desarrollo de la actividad	Unidad	1	109.967.000	\$ 109.967.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					\$ 109.967.000		-	0%		-	0,00%		
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.												
3.4.2	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización	Unidad	1	26.992.000	\$ 26.992.000	0	-	0%	0	-	0%		
SUBTOTAL					\$ 26.992.000,00		-	0%		-	0,00%		
SUBTOTAL OBJETIVO 3							201.938.600	9.497.000	4,72%		13.945.575	6,94%	

4 ADMINISTRACIÓN															
4.1	ADMINISTRACIÓN (DILIGENCIAR FORMULARIO 1.1.)	Global	1		2.341.100.077	2.341.100.077	0,1024	239.875.950	0,1024		0,1024	239.875.950	10,238%		
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:					14.017.400.687	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	907.317.764	6,47%		TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	1.750.577.620	12,48%			
VALOR DEL CONTRATO OBRA					14.017.400.687	TOTAL EJECUTADO	907.317.764	6,47%		TOTAL EJECUTADO	1.750.577.620	12,48%			
BALANCE PRESUPUESTAL OBRA															
VIR INICIAL CONTRATO:		14.017.400.687			VIR ANTICIPO:		0,00								
VIR ADICIONES:		0,00			% ANTICIPO:		0%								
VIR ACTUAL CONTRATO:		14.017.400.687													
VALOR ACUMULADO EJECUTADO O AVANCE FISICO		10.846.681.856,81			77,38%										

3.170.718.830

3.170.718.830

[illegible]



Tabla 14. Continuación avance consolidado mes 3,4 y 5 del proyecto.

600	5 490 000	50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

428.57	19.281.429	14%	428.57	19.281.429	14%	471.43	21.209.571	10%	428.57	19.281.429	14%
	19.281.429			19.281.429			21.209.571			19.281.429	
400	7.996.000	17%	800	15.992.000	33%		-		800	15.992.000	33%
	7.996.000			15.992.000			-			15.992.000	
							-		48	2.399.040	
							-		12	2.879.160	
							-		60	1.319.400	
							-		300	1.580.000	
							-			8.577.600	
										-	
										-	0%
										-	0%
										-	0%
										-	0%
										-	
	27.277.429			35.273.429			21.209.571			43.851.029	
100	9.497.000	33%									
	9.497.000										
40	1.999.200	13%	80	3.998.400	25%	80	3.998.400	25%	80	3.998.400	25.00%
5	799.750	13%	10	1.599.500	25%	10	1.599.500	25%	10	1.599.500	25.00%
37.5	624.625	13%	75	1.649.250	25%	75	1.649.250	25%	75	1.649.250	25.00%
150	825.000	13%	300	1.650.000	25%	300	1.650.000	25%	300	1.650.000	25.00%
	4.448.575			8.897.150			8.897.150			8.897.150	
								0,00%	0.142857143	\$ 15.709.571,42	14,29%
							\$ -			\$ 15.709.571,42	
	13.945.575			8.897.150			8.897.150			24.606.721	
0.036147501	84.624.917	3,61%	0.0361475	84.624.917	3,61%	0.090369	211.562.293	9,04%	0.090368752	211.562.293	9,04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	125.847.921	0,898%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.001.716.924	14,280%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	713.989.395	5,094%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.543.761.351	18,147%
TOTAL EJECUTADO	125.847.921	0,90%	TOTAL EJECUTADO	2.001.716.924	14,28%	TOTAL EJECUTADO	713.989.395	5,09%	TOTAL EJECUTADO	2.543.761.351	18,15%



Tabla 15. Continuación avance consolidado mes 7 y 8 del proyecto.

[illegible]



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

192	7.658.880	8%
24	10.748.640	8%
24	8.733.360	8%
24	8.901.360	8%
24	8.733.360	8%
2,4	283.920	8%
2,4	231.504	8%
2,4	83.976	8%
48	174.720	8%
2,4	1.074.864	8%
24	14.638.560	8%
24	9.556.320	8%
24	957.360	8%
29,52	12.332.570	8%
48	174.720	8%
2,4	1.074.864	8%
21,12	4.401.408	8%
24	4.198.800	8%
24	14.638.560	8%
12	4.786.560	8%
6	1.400.700	8%
42,24	16.819.123	8%
0,48	164.592	8%
23,04	11.795.789	8%
22,08	9.224.362	8%
48	174.720	8%
2,4	1.074.864	8%
14,4	3.000.960	8%
72	43.915.680	8%
9,6	2.485.632	8%
8,4	2.057.412	8%
1,92	644.928	8%
8,4	1.704.696	8%
8,4	493.752	8%
24	2.183.280	8%
1,44	775.930	8%
8,4	2.468.844	8%
8,4	764.148	8%
7,2	856.512	8%
9,6	2.485.632	8%
8,4	2.057.412	8%
1,92	644.928	8%
8,4	1.704.696	8%
8,4	493.752	8%
24	2.183.280	8%
1,44	775.930	8%
8,4	2.468.844	8%
8,4	764.148	8%
7,2	856.512	8%
9,6	2.485.632	8%
8,4	2.057.412	8%
1,92	644.928	8%
8,4	1.704.696	8%
8,4	499.800	8%
24	2.183.280	8%
1,44	775.930	8%
8,4	2.468.844	8%
8,4	764.148	8%
7,2	856.512	8%
10560	42.134.400	8%
24	26.376.000	8%
360	56.682.000	8%
24	8.397.360	8%
	377.856.305	

120	4.786.800	5%
15	6.717.900	5%
15	5.458.350	5%
15	5.563.350	5%
15	5.458.350	5%
1,5	177.450	5%
1,5	144.690	5%
1,5	52.485	5%
30	109.200	5%
1,5	671.790	5%
15	9.149.100	5%
15	5.972.700	5%
15	598.350	5%
18,45	7.707.857	5%
30	109.200	5%
1,5	671.790	5%
13,2	2.750.880	5%
15	2.624.250	5%
15	9.149.100	5%
7,5	2.991.600	5%
3,75	875.438	5%
26,4	10.511.952	5%
0,3	102.870	5%
14,4	7.372.368	5%
13,8	5.765.226	5%
30	109.200	5%
1,5	671.790	5%
9	1.875.600	5%
45	27.447.300	5%
6	1.553.520	5%
5,25	1.285.883	5%
1,2	403.080	5%
5,25	1.065.435	5%
5,25	308.595	5%
15	1.364.550	5%
0,9	484.956	5%
5,25	1.543.028	5%
5,25	477.593	5%
4,5	535.320	5%
6	1.553.520	5%
5,25	1.285.883	5%
1,2	403.080	5%
5,25	1.065.435	5%
5,25	308.595	5%
15	1.364.550	5%
0,9	484.956	5%
5,25	1.543.028	5%
5,25	477.593	5%
4,5	535.320	5%
6	1.553.520	5%
5,25	1.285.883	5%
1,2	403.080	5%
5,25	1.065.435	5%
5,25	312.375	5%
15	1.364.550	5%
0,9	484.956	5%
5,25	1.543.028	5%
5,25	477.593	5%
4,5	535.320	5%
6600	26.334.000	5%
15	16.485.000	5%
225	35.426.250	5%
15	5.248.350	5%
	236.160.191	



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	718.325.073	
428,57	19.281.429	14%
	19.281.429	
	-	
	-	
48	2.399.040	20%
12	2.879.160	20%
60	1.319.400	20%
360	1.980.000	20%
	8.577.600	
	-	
	27.859.029	
	-	
0,142857143	\$ 15.709.571,42	14%
	\$ 15.709.571,42	
	15.709.571	
0,090368752	211.562.293	9,04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	973.455.965	6,945%
TOTAL EJECUTADO	973.455.965	6,94%

	624.612.590	
428,57	19.281.429	14%
	19.281.429	
	-	
	-	
48	2.399.040	20%
12	2.879.160	20%
60	1.319.400	20%
360	1.980.000	20%
	8.577.600	
	-	
	27.859.029	
	-	
0,142857143	\$ 15.709.571,42	14%
	\$ 15.709.571,42	
	15.709.571	
0,090368752	211.562.293	9,04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	879.743.483	6,276%
TOTAL EJECUTADO	879.743.483	6,28%



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Tabla 16. Continuación avance consolidado mes 9 del proyecto.

MES N° 9			JULIO 2024		
CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANT	VALOR TOTAL	%
			80	4.998.400	100%
			80	4.998.400	100%
			10	3.598.900	100%
			600	6.480.000	100%
			10	7.017.900	100%
			600	3.300.000	100%
				30.393.600	100%
			600	26.994.000	100%
				26.994.000	100%
	-	0%	300	286.521.000	100%
	-	0%	300	67.179.000	100%
	-	0%	300	367.500.000	100%
	-	0%	300	331.500.000	100%
	-	0%	10800	70.740.000	100%
	-			1.123.440.000	100%
	-	0%	300	1.427.700.000	100%
	-	0%	300	16.794.000	100%
	-	0%	300	71.379.000	100%
	-	0%	600	15.114.000	100%
	-	0%	600	23.634.000	100%
	-	0%	300	86.838.000	100%
	-	0%	300	46.185.000	100%
	-	0%	300	4.200.000	100%
	-	0%	15000	1.133.700.000	100%
	-	0%	2700	48.573.000	100%
	-	0%	600	18.594.000	100%
	-	0%	1200	21.588.000	100%
	-	0%	1200	25.188.000	100%
	-	0%	300	2.520.000	100%
	-	0%	300	3.300.000	100%
	-	0%	900	12.240.000	100%
	-	0%	900	52.722.000	100%
	-	0%	900	2.070.000	100%
	-	0%	10800	626.184.000	100%
	-	0%	1200	9.120.000	100%
	-	0%	3600	34.560.000	100%
	-	0%	1200	23.988.000	100%
	-	0%	1200	13.200.000	100%
	-	0%	1200	6.720.000	100%
	-	0%	1200	7.920.000	100%
	-	0%	36000	16.560.000	100%
	-	0%	36000	19.440.000	100%
	-	0%	300	35.988.000	100%
	-	0%	36000	27.360.000	100%
	-	0%	900	851.139.000	100%
	-	0%	600	1.680.000	100%
	-	0%	300	11.427.000	100%
	-	0%	1200	3.360.000	100%
	-	0%	600	4.560.000	100%
	-	0%	1500	4.200.000	100%
	-	0%	300	29.811.000	100%
	-	0%	1200	13.440.000	100%
	-	0%	600	70.536.000	100%
	-	0%	300	216.234.000	100%
	-			5.039.766.000	100%
			1200	10.920.000	100%
			600	38.388.000	100%
			600	20.994.000	100%
			600	4.200.000	100%
			600	37.188.000	100%
			300	67.179.000	100%
			600	37.188.000	100%
				216.057.000	100%



2232	89.034.480	93%
279	124.952.940	93%
279	101.525.310	93%
279	103.478.310	93%
279	101.525.310	93%
28	3.300.570	93%
28	2.691.234	93%
28	976.221	93%
558	2.031.120	93%
28	12.495.294	93%
279	170.173.260	93%
279	111.092.220	93%
279	11.129.310	93%
343	143.366.131	93%
558	2.031.120	93%
28	12.495.294	93%
246	51.166.368	93%
279	48.811.050	93%
279	170.173.260	93%
140	55.643.760	93%
70	16.283.138	93%
491	195.522.307	93%
6	1.913.382	93%
268	137.126.045	93%
257	107.233.204	93%
558	2.031.120	93%
28	12.495.294	93%
167	34.886.160	93%
837	510.519.780	93%
112	28.895.472	93%
98	23.917.415	93%
22	7.497.288	93%
98	19.817.091	93%
98	5.739.867	93%
279	25.380.630	93%
17	9.020.182	93%
98	28.700.312	93%
98	8.883.221	93%
84	9.956.952	93%
112	28.895.472	93%
98	23.917.415	93%
22	7.497.288	93%
98	19.817.091	93%
98	5.739.867	93%
279	25.380.630	93%
17	9.020.182	93%
98	28.700.312	93%
98	8.883.221	93%
84	9.956.952	93%
112	28.895.472	93%
98	23.917.415	93%
22	7.497.288	93%
98	19.817.091	93%
98	5.810.175	93%
279	25.380.630	93%
17	9.020.182	93%
98	28.700.312	93%
98	8.883.221	93%
84	9.956.952	93%
122760	489.812.400	93%
279	306.621.000	93%
4185	658.928.250	93%
279	97.619.310	93%
	4.392.579.543	93%
300	53.985.000	100%
	53.985.000	100%
	10.883.215.143	97,05%



2614	117.616.714	87%
	117.616.714	87%
2400	47.976.000	100%
	47.976.000	100%
192	9.596.160	80%
48	11.516.640	80%
240	5.277.600	80%
1440	7.920.000	80%
	34.310.400	80%
160	7.996.800	50%
20	3.199.000	50%
150	3.298.500	50%
600	3.300.000	50%
	17.794.300	50%
	217.697.414	83,27%
200	18.994.000	100%
	28.491.000	100%
320	15.993.600	100%
40	6.398.000	100%
300	6.597.000	100%
1200	6.600.000	100%
	35.588.600	100%
0,5714	62.838.286	57%
	62.838.286	57%
0	0	0%
	0	0%
	126.917.886	63%
0,7289	1.706.413.198	72,89%
	12.934.243.641	92,27%
	\$ 12.934.243.641	92,27%



Tabla 17. cronograma de Actividades de Interventoría del Proyecto Mes 4

INTERVENTORIA IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DEL PROYECTO					
No.	DESCRIPCIÓN	MES 6			
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	Realizar Interventoría a activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.				
2	Interventoría a sistema de riego				
3	Seguimiento a ejecución financiera (actas, facturas, contrato a proveedores, egresos)				
4	Interventoría Herramientas Cosecha y Postcosecha				
5	Interventoría Insumos Cultivo				
6	Interventoría Realización de Visitas técnicas x unidad de productiva.				
7	Interventoría Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)				
8	Interventoría Realización talleres productivos ambientales				
9	Interventoría Realización Seminarios				
10	Interventoría Realización, Acompañamiento formalizacion de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.				
11	Interventoría realización Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo				
12	Interventoría Implementación Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.				
13	Compra de papeleria				
14	Elaboración y presentación de informes				
15	Comites técnicos del proyecto				

Cronograma de actividades por semanas de interventoría.

Como se muestra en el cuadro a continuación se detalla el cronograma de actividades de interventoría en el proyecto de implementación hortofrutícola en cada uno de los municipios de Majagual, Guaranda y Sucre. Mostrando en detalle por semana y meses la ejecución de la misma en cada uno de las actividades de la ejecución del proyecto. A continuación, se muestra el cronograma en la siguiente tabla.



Tabla 18. Cronograma de Actividades Por Semanas de Interventoría

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DEL PROYECTO																											
No.	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6					
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4		
1	Etapas pre-contractual																										
2	Reconocimiento de la zona y visita a predios																										
3	Realizar Interventoría a activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.																										
4	Interventoría a sistema de riego																										
5	Revisión contractual de la ejecución del proyecto																										
6	Seguimiento a ejecución financiera (actas, facturas, contrato a proveedores, egresos)																										
7	Interventoría Herramientas Cosecha y Postcosecha																										
8	Interventoría Insumos Cultivo																										
9	Interventoría Analisis de Suelos																										
10	Interventoría Realización de Visitas técnicas x unidad de productiva.																										
11	Interventoría Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)																										
12	Interventoría Realización talleres productivos ambientales																										
13	Interventoría Realización Seminarios																										
14	Interventoría Realización, Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.																										
15	Interventoría realización Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo																										
16	Interventoría Implementación Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.																										
17	Interventoría Realización una feria Campesina para impulsar la comercialización.																										
18	Compra de papelería																										
19	Elaboración y presentación de informes																										
20	Comites técnicos del proyecto																										

Seguimiento de los hallazgos financieros encontrados anteriormente.

Resaltando los hallazgos encontrados por interventoría anteriormente, se identificaron hallazgos en la supervisión financiera realizada por el equipo de interventoría, las cuales fueron presentadas al consorcio campo verde con la finalidad de corregir dichas inconsistencias, en el cual se muestra en detalle a continuación con los soportes relacionados.

ITEM	DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMO	CANT U PROJ	VALOR UNIT	PROD	UND T RECIBIDAS	VALOR TOT FACT	CANT APR GOB	DIF CANT GOB	SIN FACTURAR GOB	CANT TOT FALT	VALOR TOT FALT PROJ
1.03	Plastico Mulch plata negra	300	\$	1.105.000	301	\$ 331.500.000	300	-	\$ -	1,00	
1.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	300	\$	153.950	183	\$ 46.185.000	175	8		117,00	\$ 18.012.150,00
1.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	10.800	\$	57.980	15300	\$ 626.184.000	6.300	-	\$ -	4.500,00	\$ 260.910.000,00
1.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	10.800	\$	57.980	15300	\$ 626.184.000	6.300	-	\$ -	4.500,00	\$ 260.910.000,00

Descripción Productos Nota Crédito.

- Plástico mulch plata negra: se compra (1) una unidad de más, frente a las (300) unidades asignadas por el proyecto.
- Manguera de succión corrugada 2"x 3 metros: se compraron 8 unidades de más, frente a las 175 unidades aprobadas por gobernación.
- Tubería PVC RDE 32,5 de 1. ½ pulgadas: según acta aprobada por gobernación se debieron comprar 6300 unidades, de las cuales evidencian la compra por 9000 unidades de más.



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Tabla 19. Soportes relacionados de las inconsistencias encontradas.



FUNDACION MANANTIAL DE VIDA
NIT 900,206,500-1
CARRERA 4 NRO 26-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.DIOS 373

Expedida: 2024/05/10
Vence: 2024/05/10
Cancelada de Contado

Cliente: CONSORCIO CAMPO VERDE						Nit: 901,762,098 -9
Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA						Tel:
Ciudad: MONTERIA - CORDOBA Correo: consorciocampoverde01@gmail.com						

#	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SILLETA GOMA 16 MILIMETROS	Unid	19%	1,992	386.48	\$769,868.16
2	TAPON ROSCADO PVC DE 1.1/2 PULGADAS	Unid	19%	40	5,546.98	\$221,879.20
3	CONECTOR 16 MILIMETROS	Unid	19%	95	453.79	\$43,110.05
4	MANGUERA DE SUCCION CORRUGADA 2X3 METROS	Unid	19%	125	129,370.69	\$16,171,336.25

Sub Total						\$17,206,193.66
I.V.A						\$3,269,176.80
Pago/Abono de Contado						\$20,475,370.46

Total ítems:4

Son: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS Con 46 CTS M/L
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

Resolución facturación No. 18764068143159 del 2024/04/01 al 2025/04/01, consecutivos autorizados del DIOS353 al DIOS1000
Favor consignar a nuestra cuenta de ahorros del banco Davivienda Nro. 1560 0073 4954

Firma y Sello del Cliente: _____ Fecha Recibido: _____



Cufe: 919e05cb3dd723b96495f3a3f581fc55196ea2401d8dba3924d55c34c6c96063bad1f47a8e95abb1eec2db9e3da7179a

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 Fecha hora validación: 2024-05-10 09:54

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5 Fecha hora generación:2024/05/10 09:57 Elaborado por: ESR



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MANA

Nit: 901312550-7

CORR DE SAN FRANCISCO DEL RAYO Montelíbano - Córdoba

3016744991 - asociacionagropecuariamana@gmail.com



Fecha

29/12/2023

REMISION

224

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA Montería - Córdoba

Teléfono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	34	\$ 3.999.159,66	\$ 135.971.428,44
Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	52	\$ 199.941,18	\$ 10.396.941,36
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	25	\$ 243.243,70	\$ 6.081.092,50
Codos PVC de 1.1/2	498	\$ 8.067,22	\$ 4.017.475,56
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS	79	\$ 794.714,29	\$ 62.782.428,91
Silleta goma 16 Milímetros	8	\$ 384,30	\$ 3.074,40
Conector 16 Milímetros	905	\$ 453,78	\$ 410.670,90
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	623	\$ 638,70	\$ 397.910,10
Codo PVC de 1.1/2 45°	13	\$ 9.244,00	\$ 120.172,00
Tanque para mezcla de 250 Litros	150	\$ 158.131,09	\$ 23.719.663,50
Tanque de Almacenamiento de 2000 litros	150	\$ 1.029.411,76	\$ 154.411.764,00
Plásticos Mulch Plata Negra	150	\$ 928.571,43	\$ 139.285.714,50
Bandejas de Semilleros (semillero melon y berenjena)	5400	\$ 5.504,20	\$ 29.722.680,00
Collarín Derivación 2X1	325	\$ 11.428,57	\$ 3.714.285,25
Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	620	\$ 15.117,65	\$ 9.372.943,00
Silleta goma 16 Milímetros	57	\$ 386,55	\$ 22.033,35

Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignación-Transferencias

Base \$ 580.430.277,77

\$ 110.281.752,80

TOTAL \$ 690.712.030,57



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

FUNDACION MANANTIAL DE VIDA

Nit: 900206500-1

Carrera 4 # 26-28 Barrio Centro Monteria

7810091 - gerencia@funmavi.org



Fecha

29/12/2023

REMISION

223

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Direccion: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA IV

Telefono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
SILLETA GOMA 16 MILIMETROS	1992	\$ 386	\$ 769.868,16
TAPON ROSCADO PVC DE 1.1/2 PULGADAS	40	\$ 5.546,98	\$ 221.879,20
CONECTOR 16 MILIMETROS	95	\$ 453,79	\$ 43.110,05
MANGUERA DE SUCCION CORRUGADA 2X3 METROS	125	\$ 129.370,69	\$ 16.171.336,25
Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignacion- Transferencias		Base	\$ 17.206.193,66
		IVA	\$ 3.269.176,80
		TOTAL	\$ 20.475.370,46



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

MULTISERVICIOS CANAAN

Nit:50980427-7

Calle 36A # 40A-12 Montería - Córdoba

3024624990 - sextatirado@gmail.com



Fecha

29/12/2023

REMISION

225

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA Montería - Córdoba

Teléfono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	50	\$ 243.243,70	\$ 12.162.185,00
Inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	50	\$ 83.504,20	\$ 4.175.210,00
Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	200	\$ 9.411,76	\$ 1.882.352,00
Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	325	\$ 2.352,92	\$ 764.699,00
Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	90	\$ 32.008,40	\$ 2.880.756,00
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	10	\$ 3.999.159,66	\$ 39.991.596,60
Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	23	\$ 199.941,28	\$ 4.598.649,44
Valvula de aire de 1 Pulgada	275	\$ 49.226,89	\$ 13.537.394,75
Valvula de paso de 2 Pulgadas	200	\$ 26.042,02	\$ 5.208.404,00
TEE PVC de 2 Pulgadas	400	\$ 17.638,66	\$ 7.055.464,00
Granada de succión aluminio 2"	100	\$ 47.042,02	\$ 4.704.202,00
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS	140	\$ 794.714,29	\$ 111.260.000,60
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	608	\$ 638,66	\$ 388.305,28
Codo PVC de 1 Pulgada de 90	500	\$ 2.352,94	\$ 1.176.470,00
Valvula de Paso de 1,1/2 Pulgadas	500	\$ 16.798,33	\$ 8.399.165,00
Adaptador hembra PVC 2"	91	\$ 11.764,70	\$ 1.070.587,70
Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	250	\$ 98.789,90	\$ 24.697.475,00
Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	125	\$ 100.831,93	\$ 12.603.991,25

Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignación-Transferencias

Base \$ 256.556.907,62

\$ 48.745.812,49

TOTAL \$ 305.302.720,11



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ALMACEN PUNTO FERRETERO AYAPEL / SANDRA PAOLA ARCOB MARTINEZ
NIT 50.995.156-1
CRA 7 25 17 BRR OSPINA PEREZ AVENIDA BOLIVAR
Tel: (604) 3205428
Ayapel - Colombia
Puntoferreteroayapel@gmail.com

Remisión
No. 1-1

Señores: CONSORCIO CAMPO VERDE
NIT: 901.762.098-9
Dirección: cr 11A 55 21 B la castellana
Teléfono: (604) 0000000 - Ext. 000
Ciudad: Montería - Colombia

Fecha
Elaboración: 29/12/2023

Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	F1	20.00	95,180,008.00
2	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	1901	50.00	11,896,490.00
3	Tanque de mezcla Azul de 200 litros	1904	50.00	14,473,018.00
4	Codos PVC de 1.1/2	1917	1,002.00	9,618,929.00
5	Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Gateross A 20 por 2000 MTS	1926	156.00	147,530,707.00
6	Sileta goma 16 Milímetros	1922	12,943.00	5,954,479.00
7	inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	1932	75.00	7,452,732.00
8	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	1933	300.00	3,360,084.00
9	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	1931	300.00	840,021.00
10	Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	1928	35.00	1,333,133.00
11	Valvula de aire de 1 Pulgada	1914	100.00	5,858,013.00
12	Valvula de paso de 2 Pulgadas	1908	50.00	1,549,499.00
13	TEE PVC de 2 Pulgadas	1910	100.00	2,099,041.00
14	Granada de succión aluminio 2	1900	25.00	1,399,500.00
15	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	1925	13,769.00	10,464,351.00
16	Adaptador hembra PVC 2	1906	34.00	476,012.00
17	Tapon roscado PVC de 1.1/2 Pulgadas	1921	460.00	3,035,880.00
18	Conector 16 Milímetros	1923	14,000.00	7,560,141.00
19	Codo PVC de 1.1/2 45	1919	487.00	5,357,175.00
20	Pieza en F Importado de 2 pulgadas	1902	250.00	6,297,480.00
21	Pieza tipo D	1903	250.00	9,847,548.00
22	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	1907	605.00	9,085,162.00
23	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°	1909	600.00	8,995,210.00
24	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas	1911	125.00	1,050,026.00
25	Tapon roscado PVC de 2 pulgadas	1912	125.00	1,375,045.00
26	Collarin Derivación 2X1	1913	50.00	680,026.00
27	Adaptador Macho PVC de 1 Pulgada	1915	375.00	862,601.00
28	Buje PVC 2X1.1/2	1916	600.00	3,800,265.00
29	Adaptador Macho PVC de 1.1/2	1920	600.00	2,800,070.00
30	Buje de reducción PVC 2X1	1927	250.00	700,018.00
31	Valvula de paso PVC de 1 Pulgada	1930	250.00	1,900,133.00
32	Tanque para mezcla de 250 Litros	F3	1.00	223,929.00
33	Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	F4	7.00	8,575,002.00



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Observaciones:

Total Bruto	329,102,292.00
IVA 19%	62,529,436.00
Total a Pagar	391,631,728.00

Entregado por: _____ Recibido por: _____



Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.e.p.

Razón Social: ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MANA
Identificación: 901312550-7
Teléfono: 3016744991
Dirección: CORR DE SAN FRANCISCO DEL RAYO, Montelibano, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: DIOS-7
Fecha: 10/05/2024 10:58
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA, .
Municipio: Montería, Cordoba, Colombia.
NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Muni. Dest.: Montería

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS		34.00	Und	19%	3,999,159.66	0.00	135,971,428.44
2	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros		52.00	Und	19%	199,941.18	0.00	10,396,941.36
3	Tanque de mezcla Azul de 200 litros		25.00	Und	19%	243,243.70	0.00	6,081,092.50
4	Codos PVC de 1.1/2		498.00	Und	19%	8,067.22	0.00	4,017,475.56
5	Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS		79.00	Und	19%	794,714.29	0.00	62,782,428.91
6	Silleta goma 16 Milímetros		8.00	Und	19%	384.30	0.00	3,074.40
7	Conector 16 Milímetros		905.00	Und	19%	453.78	0.00	410,670.90
8	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros		623.00	Und	19%	638.70	0.00	397,910.10
9	Codo PVC de 1.1/2 45°		13.00	Und	19%	9,244.00	0.00	120,172.00
10	Tanque para mezcla de 250 Litros		150.00	Und	19%	158,131.09	0.00	23,719,663.50
11	Tanque de Almacenamiento de 2000 litros		150.00	Und	19%	1,029,411.76	0.00	154,411,764.00
12	Plásticos Mulch Plata Negra		150.00	Und	19%	928,571.43	0.00	139,285,714.50
13	Bandejas de Semilleros (semillero melon y berenjena)		5,400.00	Und	19%	5,504.20	0.00	29,722,680.00
14	Collarin Derivación 2X1		325.00	Und	19%	11,428.57	0.00	3,714,285.25
15	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°		620.00	Und	19%	15,117.65	0.00	9,372,943.00
16	Silleta goma 16 Milímetros		57.00	Und	19%	386.55	0.00	22,033.35

Total de líneas: 16



HECHO EN
XUBIO.com
Pagina 1 / 2



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

MULTISERVICIOS CANAAN

Nit:50980427-7

Calle 36A # 40A-12 Montería - Córdoba

3024624990 - sextatirado@gmail.com



Fecha

29/12/2023

REMISION

225

Cliente

CONSORCIO CAMPO VERDE

NIT: 901,762,098 -9

Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA Montería - Córdoba

Teléfono: 3002824880

Producto/Servicio	Cant	Vr unt	Vr total
Tanque de mezcla Azul de 200 litros	50	\$ 243.243,70	\$ 12.162.185,00
Inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	50	\$ 83.504,20	\$ 4.175.210,00
Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	200	\$ 9.411,76	\$ 1.882.352,00
Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	325	\$ 2.352,92	\$ 764.699,00
Tubería RDE21 DE 1Pulgada	90	\$ 32.008,40	\$ 2.880.756,00
Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	10	\$ 3.999.159,66	\$ 39.991.596,60
Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	23	\$ 199.941,28	\$ 4.598.649,44
Valvula de aire de 1 Pulgada	275	\$ 49.226,89	\$ 13.537.394,75
Valvula de paso de 2 Pulgadas	200	\$ 26.042,02	\$ 5.208.404,00
TEE PVC de 2 Pulgadas	400	\$ 17.638,66	\$ 7.055.464,00
Granada de succión aluminio 2"	100	\$ 47.042,02	\$ 4.704.202,00
Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS	140	\$ 794.714,29	\$ 111.260.000,60
Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	608	\$ 638,66	\$ 388.305,28
Codo PVC de 1 Pulgada de 90	500	\$ 2.352,94	\$ 1.176.470,00
Valvula de Paso de 1,1/2 Pulgadas	500	\$ 16.798,33	\$ 8.399.165,00
Adaptador hembra PVC 2"	91	\$ 11.764,70	\$ 1.070.587,70
Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	250	\$ 98.789,90	\$ 24.697.475,00
Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	125	\$ 100.831,93	\$ 12.603.991,25

Observaciones / Instrucciones de pago: Efectivo - consignación-Transferencias

Base \$ 256.556.907,62

\$ 48.745.812,49

TOTAL \$ 305.302.720,11



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras
asociaciones n.e.p

Razón Social: ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA MANA
Identificación: 901312550-7
Teléfono: 3018744991
Dirección: CORR DE SAN FRANCISCO
DEL RAYO, Montelibano,
Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
**Responsabilidad
fiscal:** No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: DIOS-7
Fecha: 10/05/2024 10:58
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CR 11 A 55 21 BRR LA CASTELLANA, .
Municipio: Montería, Cordoba, Colombia.
Muni. Dest.: Montería

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	580,430,277.77
Descuento:	0.00
Total Bruto:	580,430,277.77
IVA 19%:	110,281,752.80

Fecha y hora de validación: 10/05/2024 11:21

CUFE: eb8f4e92861b5cb638d096a71bce35e9a8e8ff4345872c1a283a3bd88b8d2df855a1e3be79c8ab2d3eb9e63b584cff72

Firma Digital:
T0e11HYQUjR3dfsF5LlAqZ9AauRR9TB/wP+iFdqg8UzzbPmZVMsY2X5oFWlykA
APuYkHFQZxMM3V8FWbXrlofrdrLttQZKwUMXpP4Crk1EWvPSwox72sfFrqVO8+ow
Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764054292385 del 2023-08-23 al 2024-08-23. Rango: DIOS-1 al DIOS-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93063

Valor a Pagar: 690,712,030.57



HECHO EN
XUBIO.com

Página 2 / 2



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



MULTISERVICIOS CANAAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Razón Social: SIXTA TULIA TIRADO HOYOS
Identificación: 50980427-7
Teléfono: 3024624990
Dirección: Calle 36A # 40A-12, Montería, Córdoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: MSC-183
Fecha: 10/05/2024 10:30
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CONSORCIO CAMPO VERDE, .
Municipio: Montería, Córdoba, Colombia.

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Muni. Dest.: Montería

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	Tanque de mezcla Azul de 200 litros		50.00	Und	19%	243,243.70	0.00	12,162,185.00
2	Inyector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios		50.00	Und	19%	83,504.20	0.00	4,175,210.00
3	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas		200.00	Und	19%	9,411.76	0.00	1,882,352.00
4	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada		325.00	Und	19%	2,352.92	0.00	764,700.63
5	Tubería RDE21 DE 1 Pulgada		90.00	Und	19%	32,008.40	0.00	2,880,756.00
6	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS		10.00	Und	19%	3,999,159.66	0.00	39,991,596.60
7	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros		23.00	Und	19%	199,941.18	0.00	4,598,647.14
8	Valvula de aire de 1 Pulgada		275.00	Und	19%	49,226.89	0.00	13,537,394.75
9	Valvula de paso de 2 Pulgadas		200.00	Und	19%	26,042.02	0.00	5,208,404.00
10	TEE PVC de 2 Pulgadas		400.00	Und	19%	17,638.66	0.00	7,055,464.00
11	Granada de succión aluminio 2"		100.00	Und	19%	47,042.02	0.00	4,704,202.00
12	Rollo de cinta de riego CAL BMIL con Goteross A 20 por 2000 MTS		140.00	Und	19%	794,714.29	0.00	111,260,000.60
13	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros		608.00	Und	19%	638.66	0.00	388,305.28
14	Codo PVC de 1 Pulgada de 90		500.00	Und	19%	2,352.94	0.00	1,176,470.00
15	Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas		500.00	Und	19%	16,798.32	0.00	8,399,160.00
16	Adaptador hembra PVC 2"		91.00	Und	19%	11,764.71	0.00	1,070,588.61
17	Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto		250.00	Und	19%	98,789.92	0.00	24,697,480.00



HECHO EN
XUBIO.com



Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



MULTISERVICIOS CANAAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Razón Social: SIXTA TULIA TIRADO HOYOS
Identificación: 50980427-7
Teléfono: 3024624990
Dirección: Calle 36A # 40A-12, Montería, Córdoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: MSC-183
Fecha: 10/05/2024 10:30
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO CAMPO VERDE
Dirección: CONSORCIO CAMPO VERDE, .
Municipio: Montería, Córdoba, Colombia.

NIT: 901762098-9
Tel: 3002824880

Muni. Dest.: Montería

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
18	Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS		125.00	Und	19%	100,831.93	0.00	12,603,991.25

Total de líneas: 18

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal: 256,556,907.86
Descuento: 0.00
Total Bruto: 256,556,907.86
IVA 19%: 48,745,812.49

Fecha y hora de validación: 10/05/2024 10:55

CUFE: 3dddf79c57edd431ddaea9887c6408af00123b028a992498e44e6ae79a6b2a02080c6a5328df473dad06d6eb621ab921

Firma Digital:
sFpuMA+klop0M34HkuxquYc3gz2GaMs2i5VEvHLwdUC2UsJC3c7t069N43uDEbsX
CWHhJC7fZD4O1agRcWPgsTcymzp3BmbgbrMWYOJd5ffxvdQsyhQubXxtGal/Q
Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764068207693 del 2024-04-01 al 2024-10-01. Rango: MSC-172 al MSC-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 305,302,720.35



HECHO EN
XUBIO.com

Página 2 / 2

Avances en el Municipio de Sucre - Sucre

A continuación, se mostrarán los avances del proyecto desde su inicio a la fecha en los tres municipios de la mojana como lo son Majagual, Guaranda y Sucre. Teniendo en cuenta cada uno de las etapas del proyecto con relación a cada beneficiario, teniendo en cuenta los beneficiarios que no podrán seguir con el proyecto por motivos de inundaciones en los predios.

Corregimiento Machetón

En este corregimiento detallaremos los avances hasta la fecha en el corregimiento de machetón, donde mostramos en detalle los avances en mecanización, semilleros, sistema de riego etc.

Semilleros Mecanización y montaje de Riego en el corregimiento de Machetón

Semilleros

En el corregimiento de Machetón se encuentran establecidos 70 de semilleros en el proceso de instalación, frente 26 terminados en su totalidad, esto debido a los fuertes vientos con lluvias en los que gran parte de estos semilleros en este corregimiento han sido afectados. Pero se le ha dado manejo a esto realizando modificaciones de inmediato como se mostrará a continuación en los diferentes registros fotográficos.

En este corregimiento de machetón contamos con varios beneficiarios, de los que se determinó realizar los semilleros algunos unidos en un mismo predio, o algunos individuales como se aprecia en los registros fotográficos. Cabe resaltar que en este predio las fuertes lluvias ocasionaron fuertes daños como rupturas de plásticos, desprendimientos de poli sombras, e incluso un árbol destruido por un rayo cayó sobre el semillero ocasionando algunos daños. Pero se le ha dado soluciones al mismo.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación y modificación de Semilleros en Sucre.





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.74450104°

Local 03:06:47 PM
GMT 08:06:47 PM

Longitude
-74.65283657°

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Sucre, Colombia

Latitude

8.74474878°

Local 05:41:44 PM

GMT 10:41:44 PM

Longitude

-74.65311719°

Altitude 20 meters

Tuesday, 25.06.2024



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 10 #2-21, Sucre, Colombia

Latitude
8.73463926°

Longitude
-74.62275598°

Local 05:08:10 PM
GMT 10:08:10 PM

Altitude 21 meters
Tuesday, 25.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



A continuación, se mostrarán algunas imágenes de beneficiarios en los que están armando nuevamente su semillero ya que por fuertes tempestades y vientos fueron destruidos, algunos han tocado modificarlos, reduciendo un poco más sus medidas laterales y frontales para darle un poco más de tensión al plástico mulch, elevando más los parales del medio para darle mayor inclinación logrando así que cuando llueva, el agua corra de mejor manera y no se estanque en el plástico. También se logró armar una sentadera o meza a este semillero para darle un poco más de fuerza. Cabe resaltar que cada beneficiario esta en una etapa diferente del proceso, pero ya existe un avance significativo.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.74473592°

Longitude
-74.65304246°

Local 03:11:11 PM
GMT 08:11:11 PM

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.74472927°

Longitude
-74.65309961°

Local 03:11:24 PM
GMT 08:11:24 PM

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Semilleros armados nuevamente con modificaciones





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



30 may 2024 9:31:14 a. m.
8.74700867N 74.66060476W
Altitud:-3.4m
Velocidad:1.8km/h



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Mecanización y montaje del sistema de riego.

Posterior a los semilleros pasamos a predios que ya han sido mecanizados en su totalidad y otros que les hace falta algún proceso en la mecanización como lo es el camelloneado o aporcado para seguir con la excavación y posterior montaje del sistema de riego. Cabe resaltar que los predios que ya tienen tuberías principales instaladas y aun no se ha instalado los demás complementos para el sistema de riego queden funcionando en su totalidad es por motivo de las lluvias o esperando algunos productos que el consorcio está enviando por medio de transporte marítimo, como lo apreciaremos a continuación en las diferentes fotos. Dando por conclusión un total de 67 predios en el proceso de mecanización frente a 23 predios con el proceso de mecanización terminados en su totalidad.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Mecanización de terrenos aporcado





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 10:39:32 a. m.
8.74735012N 74.65971174W

Sucre

Altitud: 6.1m

Velocidad: 0.0km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 10:38:04 a. m.
8.74729394N 74.65970332W
Sucre
Altitud: 10.5m
Velocidad: 0.0km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 7:57:37 a. m.

Sucre

Altitud: 24.8m

Velocidad: 1.8km/h



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



16 jul 2024 7:34:29 a. m.
Sucre
Altitud: 0.7m
Velocidad: 0.0km/h



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



14 jun 2024 12:12:04 p. m.
8°44'36,54"N-74°39'8,79"W
Hugo cure



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Sucre, Colombia

Latitude
8.749639°


Longitude
-74.6632288°

Local 11:20:45 AM
GMT 04:20:45 PM

Altitude 19 meters
Thursday, 27.06.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

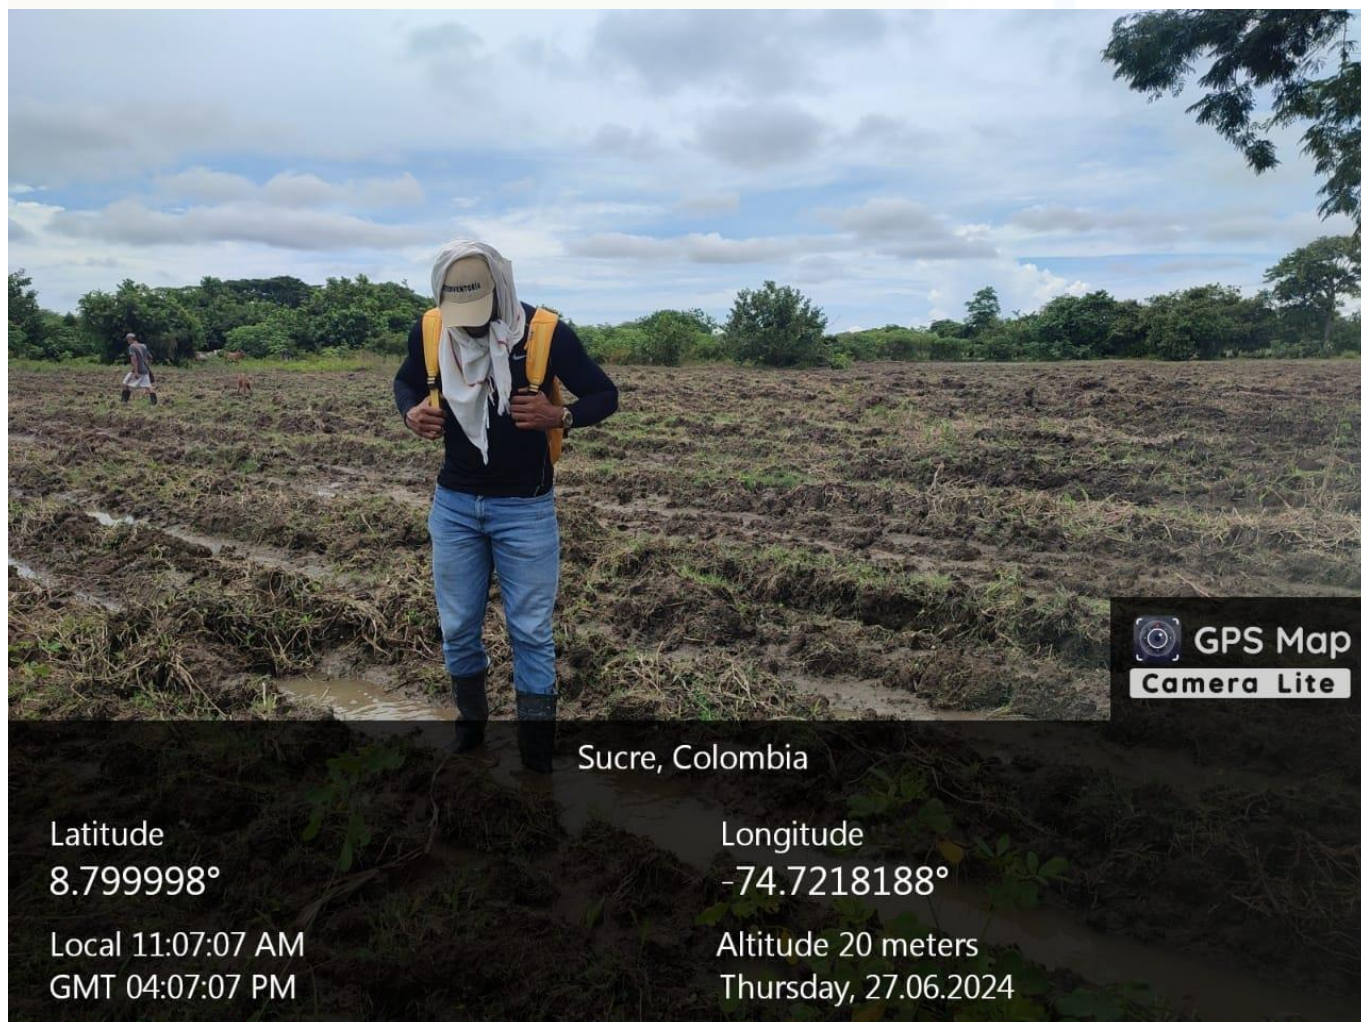

GPS Map
Camera Lite

Sucre, Colombia

Latitude
8.799998°

Longitude
-74.7218188°

Local 11:07:07 AM
GMT 04:07:07 PM

Altitude 20 meters
Thursday, 27.06.2024

A continuación, vamos a mostrar los avances y registros fotográficos de los montajes de sistema de riego en los diferentes predios donde se está trabajando, o donde se ha finalizado estos montajes en su totalidad en el municipio de Sucre - Sucre. Posterior al haber finalizado con la mecanización se ha llevado a cabo una excavación para introducir tubería principal en las cuales existen 52 hectáreas con excavaciones para su posterior montaje de riego. para los demás acoples como laterales y cintas de riego para el montaje. Cabe resaltar que a cada montaje tiene un plano diferente en cada predio lo cual hace que cada montaje de riego sea diferente. En la etapa del sistema de riego contamos con un proceso finalizado a la fecha de hoy de 17 predios instalados en su totalidad, es decir solo para conectar la motobomba, cabe resaltar que existen 17 predios en proceso de excavación para insertar la tubería de 2 pulgada principal del sistema de riego para continuar con los respectivos montajes.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación de sistema de riego





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



17 jul 2024 11:20:12 a. m.
8.74708369N 74.66052512W
Altitud:14.3m
Velocidad:1.1km/h



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cra. 30a #19-53, Sincelejo, Sucre, Colombia

Latitude

8.74375723°

Local 03:19:01 PM

GMT 08:19:01 PM

Longitude

-74.65249646°

Altitude 200 meters

Thursday, 11.07.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



 **GPS Map**
Camera Lite

Cra. 30a #19-53, Sincelejo, Sucre, Colombia

Latitude

8.74375951°

Local 03:18:57 PM

GMT 08:18:57 PM

Longitude

-74.65248692°

Altitude 200 meters

Thursday, 11.07.2024



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación Cintas de riegos



14 jun 2024 12:09:39 p. m.
8°44'38,826"N -74°39'8,052"W
Hugo cure



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



14 jun 2024 12:09:17 p. m.
8°44'38,898"N -74°39'7,932"W
Hugo cure



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



17 jul 2024 11:20:12 a. m.
8.74708369N 74.66052512W
Altitud:14.3m
Velocidad:1.1km/h



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

En este proceso mostraremos algunos registros fotográficos en relación a las capacitaciones a los beneficiarios donde se muestra de manera teórica y practica como realizar el cultivo de plátano, desde que manera hacer unos huecos con las medidas adecuadas dependiendo el grosor y tamaño de cada colino, también como aplicar el abono orgánico en la siembra y cuál es el manejo a darle a este cultivo en caso de plagas y controles de malezas etc. También se hace capacitación sobre el funcionamiento del manejo de la motobomba, como es su función como realizar la respectiva ceiba para su buen funcionamiento. De esta manera se coloca a prueba teniendo un éxito en su instalación y funcionamiento. Actualmente tenemos en predio diez mil semillas de plátano de los cuales se han sembrado

Capacitaciones siembra de colinos de plátano





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Capacitación y prueba del sistema de riego





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Entregas de abonos, colinos de plátano y accesorios del sistema de riego

A continuación, se mostrará las entregas de materiales para los beneficiarios del municipio de Sucre, donde se entregan semillas de plátano, accesorios para el montaje del sistema de riego como tuberías, acoples, codos, válvulas, uniones, motobombas, también abonos orgánicos, plástico donde se evidencia entrega de herbicidas para las tierras ya mecanizadas que están para su posterior siembra de los colinos de plátano.





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Avances en el municipio de Majagual Sucre

A continuación, encontramos en el municipio de Majagual Sucre avances en diferentes procesos del proyecto en cuanto a mecanizaciones con distintas etapas como lo son arado, aporcado, excavaciones para el montaje de los sistemas de riego e instalaciones de las tuberías principales y sus adicionales como laterales de riego acoples entre otros procesos. Posterior a esto algunos predios en los que se está realizando capacitaciones para la siembra de colinos de plátano y su adecuado manejo en este cultivo. También se muestra las entregas de algunos materiales como abonos orgánicos, tuberías para el sistema de riego, colinos de plátano entre otros. Posterior a esto se muestran los registros fotográficos de cada uno de las actividades realizadas.



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

ANEXOS FOTOGRAFICOS

- ENTREGAS DE INSUMOS, MATERIALES DE RIEGO Y COLINOS DE PLATANO EN LOS MUNICIPIOS DE GUARANDA, MAJAGUAL Y SUCRE

Entrega de materiales en majagual





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación de riego en majagual sucre





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!






Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

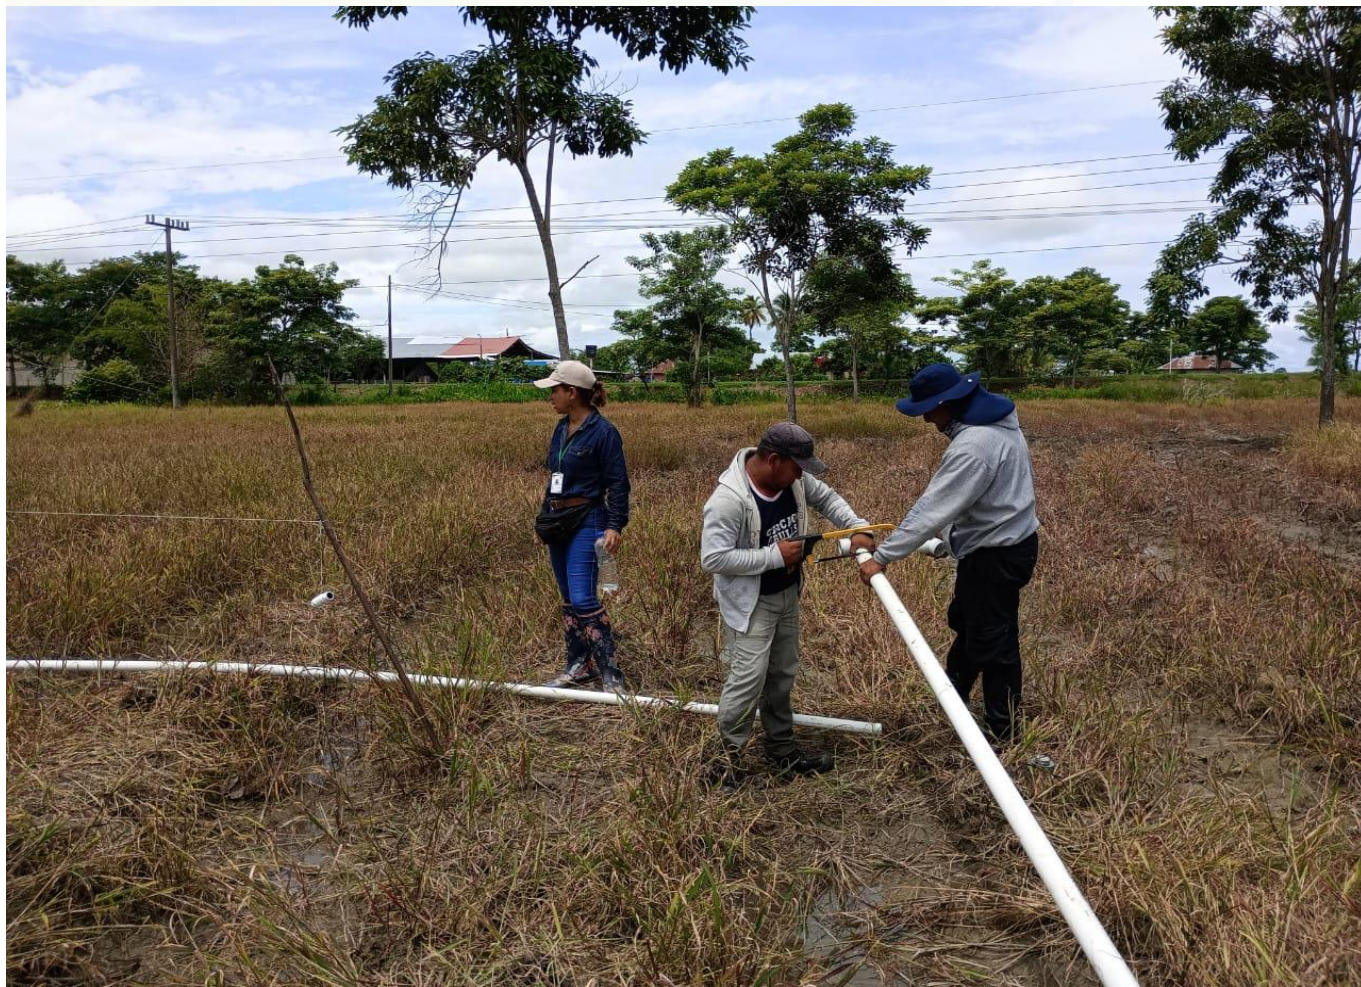



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Municipio de Guaranda Sucre

Descripción general

El avance en el proyecto es significativo y se evidencia que hasta la fecha se ha visto adelanto en algunas de sus etapas. En adelante se hace descripción general y parcial de dicho avance.

Semilleros. El proyecto se ha concentrado en el corregimiento Puerto López del municipio de Guaranda donde hay 73 beneficiarios distribuidos en 19 predios, de los cuales 13 de los 19 predios tienen semilleros establecidos es decir para un total de 42 beneficiarios. El resto 31 ya tienen los materiales para la construcción de los mismos a espera de la continuidad del proyecto.

Es importante tener en cuenta que algunos de estos semilleros presentan algún grado afectación por fenómenos naturales, como las fuertes lluvias y vientos que se presenta en estas zonas en los últimos meses.

Preparación de terrenos, los 73 beneficiarios ya cuenta con la totalidad de la tierra arada (preparada), importante tener presente que algunos de estos predios presentan cierta cantidad de maleza, las cuales han surgido por las intensidades de las lluvias que han favorecidos condiciones para la proliferación de las misma. Por otra parte, estos terrenos algunos eran utilizados anteriormente en cultivos de arroz, hecho que permite el forjamiento de maleza que son de desarrollo rápido.

Aporcado. Hasta la fecha van 15 predios con camellones para un total de 62 beneficiario y solo 4 predio correspondiente a 11 beneficiarios aún faltan por camellones. Importante tener presente que, en el predio de **ACAPULCO**, hubo una afectación en los camellones debido a las fuertes lluvias que hizo que bajara el nivel de los camellones y así perdiera la altura indicada.

Riego. Hasta el momento solo 8 predio de 19, para un total de 25 beneficiarios ha recibido algunos materiales de riego como tubería. El resto de predio 11. o sea 48 beneficiarios aún no han recibido material de riego.

Por otra parte, de los 25 beneficiarios que recibieron material de riego- 11 de estos beneficiarios ya cuenta con este material ubicado en las zanjas, los 14 restantes aún tienen el material están a la espera para su respectiva ubicación-



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Hasta la fecha en un solo predio denominado el recreo 2 vereda Puerto López. Es donde el sistema de riego lleva más adelante en un 60% donde se evidencia ya la instalación de muñecos, elevadores cintas, en l predio

Siembra de colinos de plátano. 22 beneficiarios de los 73 han recibido semillas de plátanos, de los cuales 15 beneficiarios ya han plantado.

Semilleros en Guaranda Sucre

Predio Europa. 1 beneficiario: Leonel Sambrano Martínez. Vereda Puerto López.



Tiempo: 11:23

Nota: predio tranquilidad vereda Puerto López GUARANDA B

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Tranquilandía veredas puerto López GUARANDA



Tiempo: 11:54

Nota: predio La conveccion 2 vereda Puerto López GUARANDA 14

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio La convección 2 beneficiarios Oscar David Martinez y Eduan Manuel Hernandez. Vereda Puerto López. GUARANDA

Este semillero aun no lo han armado, manifiestan los beneficiarios que por efectos de las fuertes lluvias y vientos lo han construidos. Pero, dicen que ya tiene todos los materiales para su finalidad y que tan pronto se vaya a iniciar la siembran- lo organizan.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Las Paolas: Filiberto Manuel Galvis, Gloria Elvira Mendoza, Robinson Antonio Hernandez. Vereda Puerto López.



Tiempo: 12:13

Nota: predio Villa hermosa vereda Puerto López GUARANDA 18

Powered by Wondershare



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Villa Hermosa: Etelvira Maria Zambrano Zambrano, Lucila María Zambrano Zambrano, Johana Padilla Zambrano, Esteban Zmbrano Caro, Sol Angel Zambrano Zambrano.

Estos semilleros fueron contruidos al iniciar el proyecto, pero han presentado un grado de afectación por efectos de las fuertes lluvias y vientos que se presentaron en la zona- los beneficiario0s manifiestan que al momento del inicio de la germinación de las señillas, nuevamente lo organizan-.



Tiempo: 12:44

Nota: predio Villa katy vereda Puerto López GUARANDA 24

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Villa Katy: Bartolo Galvis Díaz, Orlando Manuel Martínez Zambrano, Rubí Isabel Olivero Hernández, Helmer Enrique Olivera Hernández.

Este semillero no está terminado en su totalidad, manifiestan los beneficiarios, tener todos los materiales y que por fuertes vientos y lluvias no lo han terminado.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio El Recreo 2: Wilmer Enrique Rodelo Aguas, Anuar Enrique Rodelo Aguas. Vereda Puerto López GUARANA.

Este semillero se ve afectado por las fuertes lluvias y vientos presentes en la zona, manifiestan los beneficiarios que cuentan con todos los materiales para la reconstrucción del mismo.



Tiempo: 14:15

Nota: predio el recreo 1 vereda Puerto López GUARANDA 30

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Recreo 1. Felix Mejia Manjarrez, Neiver Duvan Zambrano y Enoe Mejia Arreola. Vereda Puerto López, GUARANDA-

Se puede apreciar que este semillero presenta afectaciones por el problema de las fuertes lluvias y vientos.



Tiempo: 12:03

Nota: predio La conveccion 2 vereda Puerto López GUARANDA 15

Powered by WotCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio convección 1: Deimer Jose Martinez Ordoñez, Eugenio Martinez Zambrano. Vereda Puerto López GUARANDA.



Tiempo: 14:22

Nota: predio vida tranquila vereda Puerto López GUARANDA 32

Powered by NoonCam

Manifiestan beneficiarios contar con todos los materiales para la terminación del semillero, que están esperando que pase las fuertes lluvias y vientos para que no les deteriore el trabajo.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio vida tranquila: Jrge Martinez Medina, Elmer Enrique Baldovino Amaris. Vereda puerto López GUARANDA.

El semillero presenta afectación por las fuertes lluvias. Los beneficiarios cuentan con todos los materiales para la culminación.



Tiempo: 14:49

Nota: predio Acapulco vereda Puerto López GUARANDA 40

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Acapulco: Enilso Cortez Pérez, Anis Sandris Hernandez Galvis, Donaldo Enrique Zambrano, Luis Ángel Pabuena Benitez ,Eduardo Enrique Almanza Baldovino, Yoiner Enrique Almanza Martínez, Eleida Del Carmen Mejia Mejia, Nelfi De Carmen Pinto Zambrano.

Estos semilleros, presentan deterioro por las afectaciones de las fuertes lluvias y vientos que azotan a la zona.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Preparación de terrenos y camellones e instalación de tuberías principales de riego





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Monterrey: Milton Zambrano Moreno, Jarlinson Manuel Zambrano, Rigoberto Zambrano Zambrano. Vereda Puerto López

Este predio ya se encuentra arado y con los respectivos camellones, listo para la instalación de riego.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Berlín: Hugo Enrique Martínez, Cesar Julio Martínez Acebedo. Vereda Puerto López. GUARANDA

Este predio ya se encuentra preparado y acamellonado.



Tiempo: 12:12

Nota: predio Villa hermosa vereda Puerto Lopez GUARANDA T7

Planned by Wondershare PDFElement



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Las Paolas: Filiberto Manuel Galvis, Glora Elvira Mendoza Monterrosa, Robinson Antonio Hernández. Vereda Puerto Lopez. GUARANDA.

Terreno mecanizado y aporcado. Pero se observa mucha maleza que no se puede apreciar los camellones.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio El Paraíso: Yenis Paola Mejia Rua y Pedro Mejia Areola. Vereda



Tiempo: 14:09

Nota: predio Paraíso vereda Puerto López GUARANDA 28

Photo © by Noticia 3m



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Puerto López Guaranda

El predio presenta preparación de terreno con sus respectivos camellones, demás se evidencia avance en las zanjas e instalación de tubería principal.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Villa Hermosa; Etelvina María Zambrano Zambrano, Lucila María Zambrano, Johana Padilla Zambrano, Amaranto Zambrano Zambrano, Esteban Zambrano Caro, Sol Angel Zambrano Zambrano-

Este predio está preparado con arado, camellones y la tubería principal de riego, además se observa al fondo donde se fumigo para la siembra del plátano es de notar que este predio se observa muchas malezas por la afectación de las lluvias y la demora en la siembra.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Tiempo: 11:18

Nota: predio tranquilandia vereda Puerto López GUARANDA 6

Powered by Norelma



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Tanquilandia: beneficiarios. Soleida Zambrano Martinez, Elkin Jose Zambrano Zambrano, Jorge Luis Zambrano Zambrano, Jhan Carlos Vanegas Baldovino, Adelfa Ribon De Hoyos, Rosi Antonio Pérez Soto, Miladis Agamez Villamizar, Gerquin Zambrano Martínez, Ramiro Rafael Suarez Zambrano, Martha Patricia Zambrano, Walter Zambranao Zambrano, Luis Alberto Zambrano Guzmán, Merly López Díaz, Fidel Segundo Zambrano Zambrano, Yorledia Zambrano Baldovino, Betty Mará Correas Laros.

Estos predios están divididos en varios sectores, pero en la misma finca. Ya están arado y acamellonados a espera de instalación de riego.

En algunos ya se evidencia la siembra de plátano



Tiempo: 14:48

Nota: predio Acapulco vereda Puerto Lopez GUARANDA 39

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio la sonrisa: Arnol Antonio Molina Arreola, Nubia Martínez, Nidia María Martínez López, Eusebio José Navarro

Predio arado y camellones, y también tiene el trazado para la excavación para la instalación del sistema de riego.



Latitud: 8°24'17"
Longitud: -74°36'42"
Altitud: 27.2±16 m
Precisión: 16.8 m
Tiempo: 09:30

Nota: corregimiento Puerto López predio burro 3 ha.

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Dios es Amor: Jesús David Ballesteros Zambrano, Luis Fernando Ballesteros Mendoza, Amabis Zambrano Álvarez.

Este predio ya está la tierra arada y camellones, se evidencia los canales para meter la tubería principal para el sistema de riego.



Tiempo: 11:47

Nota: predio Europa vereda

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio Conveccion 2: Puerto López GUARANDA: Freddy Antonio Matínez Zambrano, Omar Matínez López.

Este predio ya este mecanizado, pero aún no se ha podido aporcar por la intensidad de las lluvias.





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Tiempo: 12:08

Nota: predio Recreo 2, vereda Puerto López instalación de sistema riego

Powered by NovaCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio recreo 2: Puerto López GUARANDA: Wuilmer Enrique Rode3lo Aguas, Anuar Enrique Rodelo Aguas.

Este predio se encuentra mecanizado, aporcado y con sus respectivos canales; además ya está sembrado el plátano y se evidencia el sistema de riego avanzado en un 60%.



Tiempo: 16:41

Nota: Predio Vida tranquila 3 ha. inspección a instalacion sistema de riego. Vereda Puerto López. Gu

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Predio vida tranquila: Puerto López, GUARANDA: Jorge Martinez Medina, Elmer Enrique Amaris.

Terreno ya preparado y aporcado, también sus respectivas zanjas para la instalación del sistema de riego.



Tiempo: 16:32

Nota: predio La Envidia 2 ha. Inspección a instalación sistema de riego. Ver foto para



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Latitud: 8°25'1"

Longitud: -74°36'37"

Elevación: 32.76±100 m

Precisión: 7.6 m

Tiempo: 10:28

Nota: predio la envidia 2 ha Rafael A. Elkin A.

Powered by NoteCam



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Entrega de materiales y colinos de plátano en Guaranda





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

Instalación de riego en Guaranda





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Colinos de plátano municipio de Guaranda Sucre





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!









Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!





Fundación

Para Volver a Vivir

Servimos para asegurar progreso y bienestar!

