

DEPARTAMENTO DE SUCRE Y CONSORCIO CAMPO VERDE

Y

LA FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR

INFORME # 6

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE
AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE,
GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMPO VERDE

INTERVENTOR: FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR - REVIVIR

PERIODO DE EJECUCION:

01 AL 30 DE JUNIO 2024

Contenido

1.....	INTRODUCCIÓN	4
1.1.....	POLIZAS DE INTERVENTORIA.	5
Póliza del contrato de interventoría N°CM-012-2023		5
2.....	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	6
3.....	DOMICILIO DE INTERVENTORIA.	6
3.3.....	Ejecución y Seguimiento Financiero Contrato Interventoría.	6
3.3.1	Actas Legales Suscritas.	6
3.3.2	Relación del Avance Financiero del Contrato	7
4.....	CRONOGRAMA MES 5 DE INTERVENTORIA HORTIFUTICOLA.	8
.....		8
4.1.....	CRONOGRAMA DETALLADO DE INTERVENTORIA HORTIFUTICOLA.	9
4.2.....	AVANCE TECNICO DEL CONTRATO N°LP- Contrato No LP - 012- 2023	¡Error!
Marcador no definido.		
4.3.....	INFORMACION DEL PROYECTO.	11
4.3.1	DOMICILIO DEL PROYECTO.	11
4.4.....	AVANCE TECNICO DEL PROYECTO N° LP – 012 – 2023	12
4.4.1	Semillero	12
4.4.2	MECANIZADO.	16
4.5.....	TRANSPORTE DE MATERIAL.	22
4.6.....	ENTREGA DE MATERIAL A BENEFICIARIOS	26

INFORME DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	CM-012-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR – REVIVIR
VALOR:	QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$504.472.064) M/CTE. Amparado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 4923 del 22 de junio de 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de DOCE (12) MESES, previa suscripción del Acta de Inicio del contrato suscrito por las partes, en cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la ley. Para la suscripción del acta de inicio se requiere el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Para el perfeccionamiento se requiere la aprobación del contrato a través de la plataforma del SECOP II, aprobación de las garantías exigidas, expedición del registro presupuestal y el pago del porcentaje correspondiente de las estampillas que apliquen con ocasión al presente contrato.
FECHA DEL CONTRATO	La fecha de aprobación de las partes en el SECOP II
CORTE DE INFORME	01 al 30 DE junio del 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de interventoría comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, para el **Departamento de Sucre** ; presenta los resultados de análisis técnico, administrativo y financiero adelantado por la **FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR** para seguir con las actividades de interventoría a la ejecución de las actividades que tiene como objeto contratado el **"IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**.

Para tener una visión y comprensión sobre las actividades auditadas en la interventoría, resulta pertinente tener una caracterización clara y detallada de lo que corresponde al proyecto implementado, como objeto del contrato al que se le hará la interventoría; en este sentido la primera parte de este documento corresponde a las generalidades del proyecto productivo

1.1. POLIZAS DE INTERVENTORIA.

Póliza del contrato de interventoría N°CM-012-2023

Compañía aseguradora	SEGUROS MUNDIAL DE SEGUROS S.A			
Numero de póliza	CG- 1051036			
Fecha de Expedicion	VIGENCIA		Valor asegurado	Estado
	Inicial	Final		
Cumplimiento total del contrato	29- 12- 2023	30-06-2025	50.447.206.40	Cumple
Pagos de salarios, prestaciones sociales , legales e indemnizaciones laborales	29- 12- 2023	31-12-2027	25.223.603.20	Cumple
Calidad del servicio	29- 12- 2023	30-06-2025	50.447.206.40	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipo suministrado	29- 12- 2023	29- 12- 2023	50.447.206.40	Cumple

2 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se detallan a continuación los aspectos generales del contrato de interventoría.

Tabla. Generalidades del Contrato de Interventoría

Objeto del contrato:	“Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto “implementación de agronegocios hortofrutícolas intensivos con pequeños productores de los municipios de sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de sucre” ”.
Fecha Acta de Inicio:	10 de enero de 2024
Valor final del contrato:	QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$504.472.064) M/CTE.
Contratista:	Fundación para Volver a Vivir – Revivir
Contratante:	Departamento de Sucre

3 DOMICILIO DE INTERVENTORIA.

Fundación para volver a Vivir – Revivir, tiene como domicilio principal de correspondencia la Carrera 31 #19-61 Barrio Recreo Sincelejo - Sucre. Sin embargo, hace presencia permanente en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, para hacer seguimiento al No 008 de 2023, a través de los profesionales contratados en el marco del contrato de interventoría.

3.3 Ejecución y Seguimiento Financiero Contrato Interventoría.

3.3.1 Actas Legales Suscritas.

Se detallan a continuación el detalle de actas legales suscritas en el marco del contrato de interventoría No CM 012- 2023.

Tabla. Detalles Actas Legales Suscritas Contrato de Interventoría.

ACTA No.	FECHA	TIPO DE ACTA	OBSERVACIÓN
01	10/01/2024	Acta de Inicio de Obras	

3.3.2 Relación del Avance Financiero del Contrato

El valor a invertir en la Interventoría es de: El valor del contrato asciende a la suma de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$504.472.064) M/CTE. IVA INCLUIDO**

a) Un primer pago en calidad de anticipo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: **a)** Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. **b)** Que se haya expedido por **LA ENTIDAD CONTRATANTE** el correspondiente Registro presupuestal. **c)** Que se haya Constituido por parte de **EI CONTRATISTA**, la Garantía Única de Cumplimiento y la de responsabilidad civil extracontractual, y estas se hayan aprobado por parte de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**. **d)** Que se presente por parte de **EL CONTRATISTA** un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, una vez suscrito el Acta de Inicio.

b) el valor restante, es decir el 70% se cancelará mediante actas parciales de conformidad con el avance y entrega del proyecto. El último pago se hará efectivo con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el Contratista, el supervisor, quienes a su vez verificarán el cumplimiento de la prestación del servicio, para este fin y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) conforme a los requerimientos de ley, cuando haya lugar.

Su desembolso se dará previo trámite de solicitud de pago y el derecho a turno asignado para la respectiva cuenta legalizada, el Departamento de Sucre no se responsabilizará por la demora en el desembolso al contratista, cuando ella fuere provocada por

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas.

4 CRONOGRAMA MES 5 DE INTERVENTORIA HORTIFUTICOLA.

INTERVENTORIA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DEL PROYECTO					
No.	DESCRIPCIÓN	MES 5			
		Se m 1	Se m 2	Se m 3	Se m 4
1	Realizar Interventoría a activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.				
2	Interventoría a sistema de riego				
3	Seguimiento a ejecución fianciera (actas, facturas, contrato a proveedores, egresos)				
4	Interventoría Herramientas Cosecha y Postcosecha				
5	Interventoría Insumos Cultivo				
6	Interventoría Realización de Visitas técnicas x unidad de productiva.				
7	Interventoria Prestar Asistencia tecnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)				
8	Interventoría Realización talleres productivos ambientales				
9	Interventoría Realización Seminarios				
10	Interventoría Realización, Acompañamiento formalizacion de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.				
11	Interventoría realización Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo				
12	Interventoría Implementación Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.				
13	Compra de papelería				
14	Elaboración y presentación de informes				
15	Comites técnicos del proyecto				
NEDER CARLOS CASTRO CASTRO					
Cedula: 92.529.077					
Representante Legal: Fundación Para Volver a Vivir					
NIT: 823.002.076-4					
Celular: 3007353346					

4.1.1 CRONOGRAMA DETALLADO DE INTERVENTORIA HORTIFUTICOLA.

INTERVENTORIA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE																					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DEL PROYECTO																					
No.	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	Etapas pre-contractual																				
2	Reconocimiento de la zona y visita a predios																				
3	Realizar Interventoría a activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.																				
4	Interventoría a sistema de riego																				
5	Revisión contractual de la ejecución del proyecto																				
6	Seguimiento a ejecución financiera (actas, facturas, contrato a proveedores, egresos)																				
7	Interventoría Herramientas Cosecha y Postcosecha																				
8	Interventoría Insumos Cultivo																				
9	Interventoría Analisis de Suelos																				
10	Interventoría Realización de Visitas técnicas x unidad de productiva.																				
11	Interventoría Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)																				
12	Interventoría Realización talleres productivos ambientales																				
13	Interventoría Realización Seminarios																				
14	Interventoría Realización, Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.																				
15	Interventoría realización Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo																				
16	Interventoría Implementación Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.																				
17	Interventoría Realización una feria Campesina para impulsar la comercialización.																				
18	Compra de papelería																				
19	Elaboración y presentación de informes																				
20	Comités técnicos del proyecto																				
NEDER CARLOS CASTRO CASTRO																					
Cedula: 92.529.077																					
Representante Legal: Fundación Para Volver a Vivir																					
NIT: 823.002.076-4																					
Celular: 3007353346																					

4.2.1 Póliza de contrato N° LP – 012- 2023

Compañía aseguradora	BERKLY			
Numero de poliza	71484			
Fecha de Expedicion	VIGENCIA		Valor asegurado	Estado
	Inicial	Final		
Cumplimiento total del contrato	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple
Pagos de salarios, prestaciones sociales , legales e indemnizaciones laborales	12-X-2023	12- X -2027	1.401.740.068.70	Cumple
Calidad del servicio	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipo suministrado	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple

4.2 INFORMACION DEL PROYECTO.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato No.	CLAUSULADO CONTRATO No. LP- 012-2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual – Guaranda - Sucre
Departamento	Sucre
Contratante	Departamento de Sucre – Gobernación de Sucre
NIT	892 280 021-1
Contratista	Consortio Campo Verde
NIT	901 762 098-9.
Valor Contrato	Catorce Mil Diecisiete Millones Cuatrocientos Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos M/Cte (\$ 14.017.400.687,00),
Duración	Doce (12) meses
Número de Beneficiarios	300
Supervisor	Álvaro López Herrera
Objeto Supervisión	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."
Fecha de Inicio	Octubre 23 de 2023

4.2.1 DOMICILIO DEL PROYECTO.

El consorcio campo verde, tiene como domicilio principal de correspondencia en la carrera 11ª #55 – 21 Barrio la castellana – Montería Córdoba. Sin embargo, hace presencia permanente en la sub – región de la Mojana, en los Municipios de Majagual, Guaranda y Sucre en el departamento de sucre, desarrollando las actividades propias del proyecto y definidas en el contrato No LP-012-2023, a través de los profesionales contratados en el marco del contrato de interventoría.

4.2.2 AVANCE TECNICO DEL PROYECTO N° LP – 012 – 2023

En este punto vamos a reseñar los avances en el proceso de entrega de material y construcción de semilleros y sistemas de riego y a si mismo se hará una descripción de cada uno de estos elementos y la presentación de una encuesta por interventoría donde se describe las actividades realizadas en los previos de majagual, Guaranda y sucre.

4.2.3 SEMILLERO

Instalación de Semilleros

En el proceso de instalación de semilleros en los municipios de majagual, Guaranda y sucre el porcentaje general de instalación es de un 90% a nivel general.


Teniendo en cuenta que debido a las fuertes lluvias en la zona de la mojana, muchos de los semilleros ya instalados presentaron dificultades en la infraestructura por lo que le fue necesario a los técnicos realizar mantenimiento a más del 20% de los semilleros.

MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INSTALACION
MAJAGUAL	95%
GUARANDA	90%
SUCRE	85%

Anexo de evidencias fotográficas.





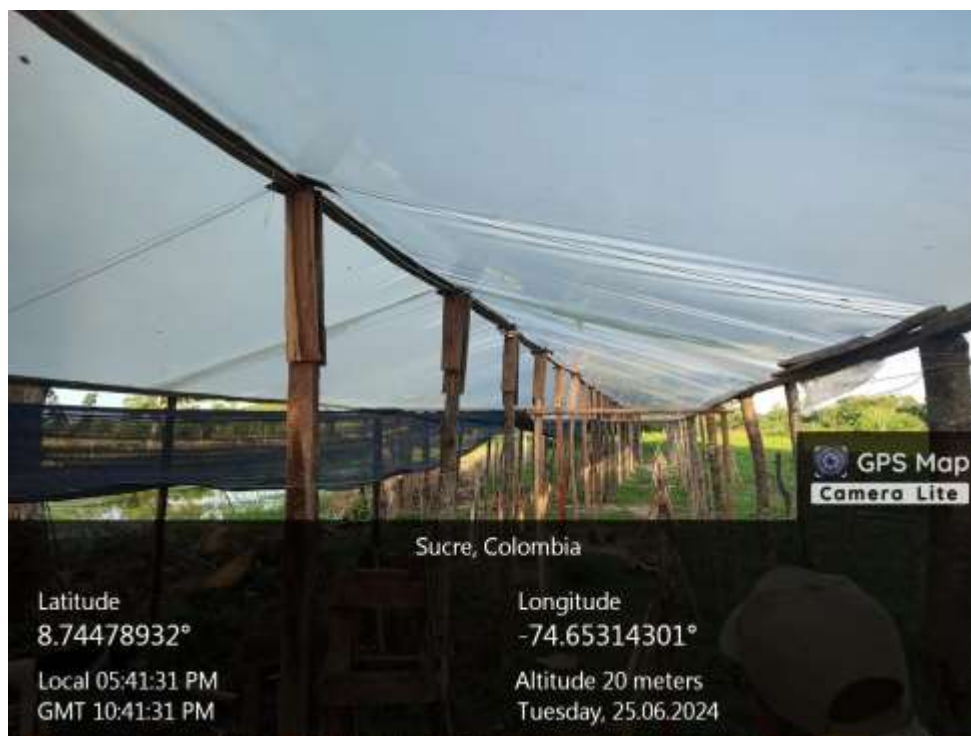

4.2.4 MECANIZADO.

La mecanización del proyecto que equivale a 300 hectáreas de tierra correspondiente a igual número de beneficiarios las cuales se asocian en forma indistintas en tamaño y lugar esto quiere decir que el número de beneficiarios se agrupan de acuerdo al tamaño de los lotes que las regiones puedan ofrecer.

La mecanización de los terrenos es una actividad que se desarrolla con diferentes características el arado de las tierras que se hace para toda el área, el aporcado y el caballoneado de la tierra para la elaboración de las Heras necesarias de acuerdo al tipo de cultivo como son la producción de berenjena, melón y patilla exceptuado el plátano que se hace en una forma diferente.

Es necesario aclarar que debido a las fuertes lluvias muchos de ellos previos en la zona de majagual, Guaranda y sucre se han visto afectados por lo que se ha dificultado realizar el mecanizado y polcado del terreno lo que ha atrasado las labores de instalación de riego.

MUNICIPIO	PORCENTAJE
Majagual	20%
Guaranda	32%
Sucre	14%



Tiempo: 09:45

Nota: predio el paraíso, presenta inundación por la intensidad de las lluvias

Powered by NoteCam



Latitud: 8°24'41"

Longitud: -74°36'47"

Elevación: 21.53±18 m

Precisión: 10.6 m

Tiempo: 09:47

Nota: corregimiento Puerto Amador, finca 3 ha. para cultivo de café

Powered by NoteCam



4.4.31 SISTEMA DE RIEGO.

En los municipios de majagual, Guaranda y sucre fue necesario para la instalación del sistema de riego que el terreno este arrado y acamellonado, para luego proceder con la realización de zanjas con unas medidas de 40 cm de profundidad x 20 cm de ancho, para el desagüe de la evacuación del agua en los previos requeridos, estas zanjas tienen una medida de 40cm de profundidad x 50 cm de ancho y se realizó la instalación de una tubería principal o línea principal esta es la que alimentará las líneas laterales más pequeñas que conducen a los aspersores o emisores de goteo.





Tiempo: 16:30

Nota: predio La Envidia. 2 h de inspección a instalación sistema de riego.

Powered by NoteCam



GPS Map
Camera Lite

Cl. 5 #3-28, Sucre, Colombia

Latitude
8.74490596°

Local 03:14:24 PM
GMT 08:14:24 PM

Longitude
-74.65355493°

Altitude 21 meters
Wednesday, 12.06.2024



4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de mayo del 2024 el contratista **CAMPO VERDE** realizó las siguientes actividades dentro del proceso de avance técnico se dio a través de la movilización de todo el material de insumos necesarios para el desarrollo de la instalación del sistema de riego en forma sucesiva.

El transporte de estos materiales se realizó desde la bodega ubicada en majagual sucre hasta Guaranda y el puerto para el cargue de Johnson (transporte aguatico de carga) para el municipio de sucre.

Es preciso aclarar que durante el trasporte en vía terrestre se han presentado atrasos en la entrega de estos materiales por cierres de vías causados por la comunidad.



Cierre de vía por la comunidad







4.4 ENTREGA DE MATERIAL A BENEFICIARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio el **CONSORCIO COMPO VERDE** realizó la entrega de material a beneficiarios en los municipios de majagual, Guaranda y sucre.

A continuación, se anexa actas de salida de bodega y actas de entrega a beneficiarios.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar ingresos y bienestar

FORMATO DE
ENTREGA EN
BODEGAS

ENTREGA DE MERCANCIAS No. _____		Fecha: 13-06-2024
Contrato No. _____	LP 012- 2023	

En el municipio de Majagual, se procede a hacer entrega de Material
correspondientes a la dotación a ser entregada a través del Contrato LP 012- 2023,
actuando como responsable de la entrega de artículos Ronald Jotelo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	
1	Tubería PVC 2"		Tubo x 6m	4500 5500	800✓
2	Tubería PVC 1 1/2"		Tubo x 6m	600 800	600✓
3	Silleta goma 16 Milímetros		Unidad	5850	✓
4	Conector 16 Milímetros		Unidad	5850	✓
5	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros		Unidad	5850	✓
6	Granada de succión aluminio 2"		Unidad	30	✓
7	Adaptador hembra PVC 2"		Unidad	30	✓
8	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°		Unidad	270	✓
9	Valvula de paso de 2 Pulgadas		Unidad	60	✓
10	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°		Unidad	120	✓
11	TEE PVC de 2 Pulgadas		Unidad	120	✓
12	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas		Unidad	30	✓
13	Tapon roscado PVC de 2 pulgadas		Unidad	30	✓
14	Buje PVC 2X1.1/2		Unidad	90	✓
15	Codos PVC de 1.1/2		Unidad	300	✓
16	Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas		Unidad	200	✓
17	Codo PVC de 1.1/2 de 45°		Unidad	100	✓
18	Adaptador Macho PVC de 1.1/2		Unidad	100	✓
19	Tapon roscado PVC de 1.1/2 Pulgadas		Unidad	100	✓

QUIEN ENTREGA:

QUIEN RECIBE:

Ronald Jotelo

Nota: Entrega Material para Guaranda, el profesor encargado
no quiso firmar la acta de entrega.



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar ingresos y bienestar



FORMATO DE
RECIBO EN
BODEGAS



REIBIDO DE MERCANCIAS No. _____		Fecha: 21-06-2024
Contrato No.	LP 012- 2023	

En el municipio de Majagual, se procede a hacer recibo de Materiales correspondientes a la dotación a ser entregada a través del Contrato LP 012- 2023, actuando como responsable del recibo de artículos Omar Ruano

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubería 2"		Tubo X 6m	5
2	Bolsa de Sustrato para Semillero		Bolsa	2
3	Rollo Plástico Mulch		Rollo	2
4	Bomba		und	1
5	Acoples pieza D y F		und	1
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Previo del Sr. Leiber Ricardo

QUIEN ENTREGA:

Omar Ricardo H.
92540 815 5170

QUIEN RECIBE:

Hector Marguez



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar procesos y honestidadFORMATO DE
ENTREGA EN
BODEGASGobernación
de Sucre

ENTREGA DE MERCANCIAS No. _____		Fecha: 20/06/2023
Contrato No.	LP 012- 2023	

En el municipio de Majagual, se procede a hacer entrega de _____,
correspondientes a la dotación a ser entregada a través del Contrato LP 012- 2023,
actuando como responsable de la entrega de artículos _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	TUBERÍA DE 2 PULGADAS		Tubo X 6m	1500 700 + 500
2	TUBERÍA DE 1 1/2 PULGADAS		Tubo X 6m	1100 300 + 620
3	Manguera de 16 mm		Elevadores X 50	420 21
4	Sileta goma 16 Milímetros		Unidad	3510
5	Conector 16 Milímetros		Unidad	3510
6	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros		Unidad	3510
7	Valvula de Paso de 1 1/2 Pulgadas		Unidad	60
8	Granada de succión aluminio 2"		Unidad	20
9	ELEMENTOS DE 2 PULGADAS			
10	Adaptador hembra PVC 2"		Unidad	50
11	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°		Unidad	200
12	Valvula de paso de 2 Pulgadas		Unidad	60
13	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°		Unidad	120
14	TEE PVC de 2 Pulgadas		Unidad	120
15	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas		Unidad	30
16	Tapon roscado PVC de 2 pulgadas		Unidad	30
17	ELEMENTOS DE 1 1/2 PULGADAS			
18	Buje PVC 2X1.1/2		Unidad	120
19	Codos PVC de 1.1/2		Unidad	300
20	Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas		Unidad	180
21	Codo PVC de 1.1/2 de 45°		Unidad	200



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar ingresos y bienestar

FORMATO DE
ENTREGA EN
BODEGAS

ENTREGA DE MERCANCIAS No. ____

Fecha: 21-06-24

Contrato No.

LP 012- 2023

En el municipio de Majagual, se procede a hacer entrega de Materiales correspondientes a la dotación a ser entregada a través del Contrato LP 012- 2023, actuando como responsable de la entrega de artículos Omar Ricardo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bolsa de Sustrato para Semillero		Bolsa	5
2	Rollo Plástico Mulch		Rollo	5
3	Rollo Manguera Corrugada de 6m		Rollo	2
4	Rollo Manguera de 16 mm		Rollo	2
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

OBSERVACIONES:

FINCA ARBENIA, VEREDA SAN ROQUE

QUIEN ENTREGA:

Omar Ricardo H.
92.540815 S110

QUIEN RECIBE:

Hector Marquet



**FORMATO DE
ENTREGA EN
BODEGAS**



ENTREGA DE MERCANCIAS No. _____		Fecha: 21-06-24
Contrato No.	LP 012- 2023	

En el municipio de Majagual, se procede a hacer entrega de Materiales, correspondientes a la dotación a ser entregada a través del Contrato LP 012- 2023, actuando como responsable de la entrega de artículos Omar Ricardo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bolsa de Sustrato para Semillero		Bolsa	3
2	Rollo Plástico Mulch		Rollo	3
3	Rollo Manguera Corrugada de 6m		Rollo	1
4	Rollo Manguera de 16 mm		Rollo	1
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

OBSERVACIONES: Finca La Mano de Dios, Vereda Ventanilla

QUIEN ENTREGA:

Omar Ricardo H.
92 540 815 5/10

QUIEN RECIBE:

Hector Marguez



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar ingresos y bienestar



FORMATO DE
ENTREGA EN
BODEGAS



ENTREGA DE MERCANCIAS No. ____		Fecha: 26-06-2024
Contrato No.	LP 012- 2023	

En el municipio de Majagual, se procede a hacer entrega de Material
correspondientes a la dotación a ser entregada a través del Contrato LP 012- 2023,
actuando como responsable de la entrega de artículos Ronald Jotelo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	PLASTICO MULCH		ROLLOS	2
2	SUSTRATO PARA SÉMILLEROS		BOLSAS	2
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

OBSERVACIONES:

Entrega Material Majagual, Vereda Las
Candelarias El Corozal.

QUIEN ENTREGA:

Ronald Jotelo

QUIEN RECIBE:

Filadelfo Cerna
92509237



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para asegurar progreso y bienestar

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	

Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	INSUMOS Y MATERIALES

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Rosiris Bolívar Manjarez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22.987.475 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fiorenzo Cerna identificado con cédula de ciudadanía No. 92.589.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TANQUE 2000 LT	UNIDAD	1
2	TANQUE 250 LT	UNIDAD	1
3	ABONO ORGÁNICO	BULTO	8

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

Fiorenzo Cerna
Fiorenzo Cerna

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:

Rosiris Bolívar Manjarez
R Bolívar M.

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 22.978.475

HUELLA





Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para asegurar progreso y bienestar

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunión en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Lucila Maria Zambrano, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 6474357 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Eugenio Rios, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 02 de 06 de 2024

Quien entrega:



Quien recibe:

Lucila Zambrano



Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar ingresos y bienestar

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	 Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. _____	
		Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunión en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Naider Zambrano Mejía, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.192.903.981 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Eugenio Dorote, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 03 de 06 de 2024

Quien entrega:



Quien recibe:





Fundación

Para Volver a Vivir

Servicios para mejorar ingresos y bienestar

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ____	
		Página: 1 de 1

Contrato N°	LP 012 DE 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega de Insumo y Herramienta

Se reunió en el municipio de Guaranda, departamento de sucre, el señor (a) Edgar Ferrayan Ruiz, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 8778333 de Soledad, vinculado al proyecto en calidad de delegado de la alcaldía municipal de Guaranda y el profesional Oscar Ruíz Esquivel, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Abono Orgánico	Bulto	8
2	Sustrato semillero	Paca	1
3	Tanque de 2000 lts	Unidad	1

En constancia se firma en el municipio de Guaranda, el día 26 de 06 de 2024

Quien entrega:

Oscar Ruíz Esquivel

Quien recibe:

Edgar

5.00 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO LP – 012-2023

A continuación, se detallará en la siguiente tabla el avance financiero de la ejecución del proyecto, donde se evidencian las diferentes sumas de dineros destinados en dichas actividades con respecto a lo descrito por la suma inicial asignada en las diferentes actividades que componen este proyecto.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
3.5.1 Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	\$	\$ 109.967.000,00							\$ 15.709.571,42	\$ 15.709.571,42	\$ 15.709.571,42				\$ 47.128.714,26
3.1.1 Interventoría del Proyecto	MES	12													\$ 230.196.693,35
3.4.1 Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	\$	\$ 28.891.000,00	\$ 4.748.500,00	\$ 4.748.500,00	\$ 9.497.000,00	\$ 9.497.000,00			\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.491.000,00
3.3.1 Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	\$	\$ 35.588.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.575,00	\$ 4.448.575,00	\$ 8.897.150,00	\$ 8.897.150,00	\$ 8.897.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 35.588.600,00
3.2.1 Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	\$	\$ 26.992.000,00							\$ 0,00	\$ 0,00					\$ -
1.2.1 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	\$	\$ 1.123.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.860.000,00	\$ 280.860.000,00	\$ 280.860.000,00	\$ 0,00	\$ 199.356.488,80	\$ 81.500.501,20	\$ -				\$ 1.123.440.000,00
1.2.2 Sistema de Riego	\$	\$ 5.039.786.000,00	\$ 0,00	\$ 577.621.000,00	\$ 577.621.000,00	\$ 1.942.262.000,00	\$ 647.420.666,67	\$ 0,00	\$ 647.420.666,67	\$ 258.966.266,66	\$ 388.452.400,00				\$ 5.039.786.000,00
1.2.3 Herramientas Cosecha y Postcosecha	\$	\$ 216.057.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.028.500,00	\$ 338.028.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 216.057.000,00
1.2.4 Insumos Cultivo	\$	\$ 4.723.293.810,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 472.320.381,00	\$ 472.320.381,00	\$ 944.640.762,00	\$ 472.320.381,00	\$ 1.416.961.141,00	\$ 377.856.304,80	\$ 236.160.191,00				\$ 4.382.579.543,80
1.2.5 Análisis de Suelos	\$	\$ 53.985.000,00	\$ 0,00	\$ 26.992.500,00	\$ 26.992.500,00					\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 53.985.000,00
1.2.6 Administración del Proyecto	\$	\$ 2.341.180.877,80	\$ 119.837.975,00	\$ 119.837.975,00	\$ 239.675.950,00	\$ 84.624.917,14	\$ 84.624.917,14	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84	\$ 211.562.292,84				\$ 1.484.850.005,64
1.3.1 Realizar jornadas de identificación y socialización	\$	\$ 30.393.600,00	\$ 13.196.800,00	\$ 15.196.800,00						\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 30.393.600,00
1.1.1 Realizar vistas de caracterización y sistematización de la información.	\$	\$ 26.994.000,00	\$ 6.748.500,00	\$ 6.748.500,00	\$ 13.497.000,00					\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 26.994.000,00
2.1.1 Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)	\$	\$ 47.976.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.996.000,00	\$ 7.996.000,00	\$ 15.992.000,00	\$ 0,00	\$ 15.992.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 47.976.000,00
2.2.1 Realizar Seminarios	\$	\$ 35.588.600,00								\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 35.588.600,00
2.1.1 Realizar talleres productivos ambientales	\$	\$ 42.808.000,00							\$ 0,00	\$ 8.577.600,00	\$ 8.577.600,00	\$ 8.577.600,00			\$ 25.732.800,00
2.4.1 Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	\$	\$ 134.970.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.640.714,29	\$ 9.640.714,29	\$ 19.281.428,57	\$ 19.281.428,57	\$ 21.268.571,00	\$ 19.281.428,57	\$ 19.281.428,57				\$ 117.816.713,80
		\$ 14.817.400.887,00	\$ 146.531.775,00	\$ 751.145.275,80	\$ 1.750.577.620,29	\$ 2.819.678.087,43	\$ 2.001.716.924,38	\$ 712.961.251,41	\$ 2.545.688.489,73	\$ 973.455.965,49	\$ 879.743.483,83				\$ 12.890.796.570,91


NOTA: El monto de ejecución financiera del proyecto con la interventoría es de 12.890.796.570,91

A continuación, se relaciona el avance financiero del contrato:

Tabla 7. Avance Financiero Ente Ejecutor

Ítem	Valores
Valor Inicial del Contrato	\$14.017.400.687
Valor Facturado mes 1	\$907.317.764
Valor Facturado mes 2	\$1.750.577.620
Valor Facturado mes 3	\$2.929.318.802
Valor Facturado mes 4	\$2.001.716.924
Valor Facturado mes 5	\$713.989.395
Valor Facturado mes 6	\$2.543.761.351
Valor Facturado mes 7	\$973.455.965
Valor Facturado mes 8	\$879.743.483
TOTAL MESES FACTURADOS	\$12.680.599.877

Figura 1. Contrato de Interventoría, Avance Financieros.

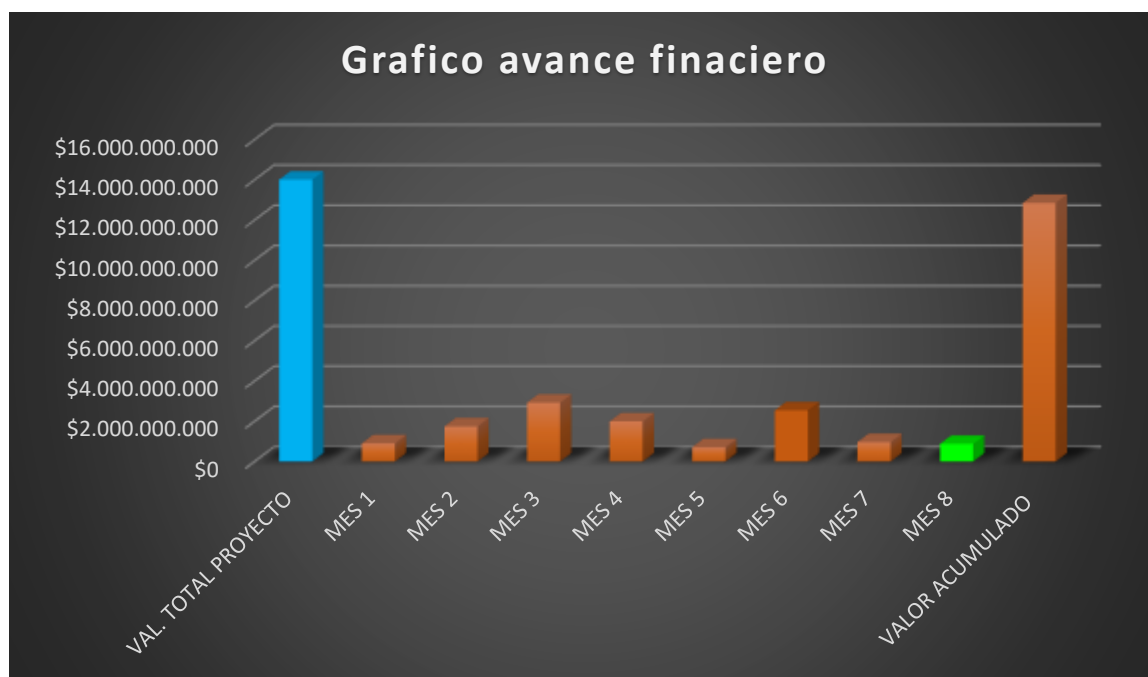

Como se muestra en el gráfico de barras anterior, sobre el valor total del proyecto por un valor total de \$14.017.400.687, tenemos ilustrado como ha avanzado la ejecución de este proyecto a la fecha, con un acumulado correspondiente a un rubro de \$12.680.599.877 el cual se ve reflejado en un porcentaje del 90.46% en el acumulado

de la ejecución financiera del proyecto, cabe resaltar que se le está dando seguimiento a todo el proyecto.

Tabla 8. Avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto

CONDICIONES INICIALES						MES N° 1			MES N° 2		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%
COMPONENTE PRODUCTIVO											
OBJETIVO 1: Implementar 300 unidades de producción hortofrutícola (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de											
1.1 Realizar jornadas de identificación y socialización.											
1.1.1	Contratación de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesión con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Horas	80	62.480	4.998.400	80	4.998.400	100%	-	-	0%
1.1.2	Contratación de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesión a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificación y socialización.	Horas	80	62.480	4.998.400	80	4.998.400	100%	-	-	0%
1.1.3	Contratación de 6 auxiliares de apoyo por día (Evento) para la toma de datos	Evento	10	359.890	3.598.900	10	3.598.900	100%	-	-	0%
1.1.4	Entrega de papelería a población	Personas	600	10.800	6.480.000	600	6.480.000	100%	-	-	0%
1.1.5	Alquiler de salones, video beam, sonido, computador por día	Jornadas	10	701.790	7.017.900	10	7.017.900	100%	-	-	0%
1.1.6	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	600	5.500	3.300.000	600	3.300.000	100%	-	-	0%
SUBTOTAL					30.393.600		30.393.600				
1.2 Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.											
1.2.1	Contratación de Diez (10) técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Visitas	600	44.990	26.994.000	300	13.497.000	50%	300	13.497.000	50%
SUBTOTAL					26.994.000		13.497.000			13.497.000	
1.3 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros											
1.3.1	Invernadero agrícola portátil 600 x 300 x 200 CM	unidad	300	955.070	286.521.000	-	-	0%	75	71.630.250	25%
1.3.2	Tanque para mezcla de 250 Litros	Unidad	300	223.930	67.179.000	-	-	0%	75	16.744.750	25%
1.3.3	Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	Unidad	300	1.225.000	367.500.000	-	-	0%	75	91.875.000	25%
1.3.4	Plástico Mulch plata negra	Rollo	300	1.105.000	331.500.000	-	-	0%	75	82.875.000	25%
1.3.5	Bandejas de Semilleros (Semillero Melón y Berenjena)	unidad	10.800	6.550	70.740.000	-	-	0%	2700	17.685.000	25%
SUBTOTAL					1.123.440.000		-			280.860.000	
1.4 Sistema de Riego											
SUBTOTAL					1.123.440.000		-			280.860.000	
1.4	Sistema de Riego										
1.4.1	Bomba Diesel de 7.0 HP 2, 4LPS	Unidad	300	4.759.000	1.427.700.000	34	163.632.496	11%	34	163.632.496	11%
1.4.2	Granada de succión aluminio 2"	Unidad	300	55.980	16.794.000	34	1.924.805	11%	34	1.924.805	11%
1.4.3	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	Unidad	300	237.930	71.379.000	34	8.180.937	11%	34	8.180.937	11%
1.4.4	Pieza en F importado de 2 Pulgadas	Unidad	600	25.190	15.114.000	69	1.732.256	11%	69	1.732.256	11%
1.4.5	Pieza tipo D	Unidad	600	39.390	23.634.000	69	2.706.756	11%	69	2.706.756	11%
1.4.6	Tanque de mezcla Agua de 200 litros	Unidad	300	289.480	86.838.000	34	9.952.734	11%	34	9.952.734	11%
1.4.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	Unidad	300	153.950	46.185.000	34	5.293.386	11%	34	5.293.386	11%
1.4.8	Adaptador hembra PVC 2"	Unidad	300	14.000	4.200.000	34	481.373	11%	34	481.373	11%
1.4.9	Tubería PVC RDE 41 de 2 Pulgadas	Unidad	15.000	79.580	1.193.700.000	1719	129.636.378	11%	1719	129.636.378	11%
1.4.10	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	Unidad	2.700	17.990	48.573.000	309	5.567.081	11%	309	5.567.081	11%
1.4.11	Valvula de paso de 2 Pulgadas	Unidad	600	30.990	18.594.000	69	2.131.108	11%	69	2.131.108	11%
1.4.12	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°	Unidad	1.200	17.990	21.588.000	138	2.474.258	11%	138	2.474.258	11%
1.4.13	TEE PVC de 2 Pulgadas	Unidad	1.200	20.990	25.188.000	138	2.886.864	11%	138	2.886.864	11%
1.4.14	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas	Unidad	300	8.400	2.520.000	34	288.824	11%	34	288.824	11%
1.4.15	Tapon roscado PVC de 2 pulgadas	Unidad	300	11.000	3.300.000	34	378.222	11%	34	378.222	11%
1.4.16	Collares Destricción 2X1	Unidad	900	13.600	12.240.000	103	1.402.859	11%	103	1.402.859	11%
1.4.17	Valvula de aire de 1 Pulgada	Unidad	900	98.980	95.222.000	103	6.042.609	11%	103	6.042.609	11%
1.4.18	Adaptador Macho PVC de 1 Pulgada	Unidad	900	2.300	2.070.000	103	237.248	11%	103	237.248	11%
1.4.19	Tubería PVC RDE 32.5 DE 1.1/2 Pulgada	Unidad	10.800	97.980	636.184.000	1238	71.768.616	11%	1238	71.768.616	11%
1.4.20	Buje PVC 2X1 1/2	Unidad	1.200	7.600	9.120.000	138	1.045.267	11%	138	1.045.267	11%
1.4.21	Codos PVC de 1.1/2	Unidad	3.600	9.600	34.560.000	413	3.961.014	11%	413	3.961.014	11%
1.4.22	Valvula de Paso de 1.1/2 Pulgadas	Unidad	1.200	19.990	23.988.000	138	2.749.329	11%	138	2.749.329	11%
1.4.23	Codo PVC de 1.1/2 45°	Unidad	1.200	11.000	13.200.000	138	1.512.887	11%	138	1.512.887	11%
1.4.24	Adaptador Macho PVC de 1.1/2	Unidad	1.200	5.600	6.720.000	138	770.187	11%	138	770.187	11%
1.4.25	Tapon roscado PVC de 1.1/2 Pulgadas	Unidad	1.200	8.600	7.920.000	138	907.732	11%	138	907.732	11%
1.4.26	Sileta goma 16 Milímetros	Unidad	36.000	480	16.960.000	4126	1.897.986	11%	4126	1.897.986	11%
1.4.27	Conector 16 Milímetros	Unidad	36.000	540	19.440.000	4126	2.228.070	11%	4126	2.228.070	11%
1.4.28	Rollo Manguera 16 Milímetros por 200MTS	Unidad	300	119.980	35.994.000	34	4.124.681	11%	34	4.124.681	11%
1.4.29	Conector Cinta a Manguera de 16 Milímetros	Unidad	36.000	780	27.360.000	4126	3.138.802	11%	4126	3.138.802	11%
1.4.30	Rolo de cinta de riego CAL BML con Otereros A 20 por 2000 MTS	Unidad	900	945.710	851.139.000	103	97.551.307	11%	103	97.551.307	11%
1.4.31	Buje de reducción PVC 2X1	Unidad	600	2.800	1.680.000	69	192.549	11%	69	192.549	11%
1.4.32	Tubería RDE21 DE 1 Pulgada	Unidad	300	38.090	11.427.000	34	1.309.679	11%	34	1.309.679	11%
1.4.33	Codo PVC de 1 Pulgada de 90	Unidad	1.200	2.800	3.360.000	138	385.099	11%	138	385.099	11%
1.4.34	Valvula de paso PVC de 1 Pulgada	Unidad	600	7.600	4.560.000	69	522.634	11%	69	522.634	11%
1.4.35	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	Unidad	1.500	2.800	4.200.000	172	481.373	11%	172	481.373	11%
1.4.36	Injector Venturi de 1 Pulgada con Accesorios	Unidad	300	86.370	25.911.000	34	3.416.718	11%	34	3.416.718	11%
1.4.37	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	Unidad	1.200	11.200	13.440.000	138	1.540.384	11%	138	1.540.384	11%
1.4.38	Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuero Corto	Unidad	600	117.980	70.788.000	69	8.084.319	11%	69	8.084.319	11%
1.4.39	Instalación por HA o Beneficiario	Unidad	300	720.780	216.234.000	34	24.783.154	11%	34	24.783.154	11%
SUBTOTAL					5.029.766.000		577.621.000			577.621.000	23%
1.5 Herramientas Cosecha y Postcosecha											

Tabla 9. Avance consolidado mes 1 y 2 del proyecto

Herramientas Cosecha y Postcosecha											
1.5.1	Quintas para cosecha	Unidad	1,300	9,100	10,920,000	-	0%	600	5,460,000	50%	
1.5.2	Tijeras	Unidad	600	63,980	38,388,000	-	0%	300	19,194,000	50%	
1.5.3	Rula	Unidad	600	34,990	20,994,000	-	0%	300	10,497,000	50%	
1.5.4	Lima	Unidad	600	7,000	4,200,000	-	0%	300	2,100,000	50%	
1.5.5	Pala con cabo	Unidad	600	61,980	37,188,000	-	0%	300	18,594,000	50%	
1.5.6	Fumigadora Agrícola Plástica 20 lt	Unidad	300	223,930	67,179,000	-	0%	150	33,589,500	50%	
1.5.7	Regadera Plástica de 8 Lt	Unidad	600	61,980	37,188,000	-	0%	300	18,594,000	50%	
SUBTOTAL					216,057,000	-	0%		108,028,500		
Insumos Cultivo											
1.6.1	Fertilización Cultivo de Plátano - Materia Orgánica	Bultos	2,400	39,890	95,736,000	0	-	240	9,573,600	10%	
1.6.2	Fertilización Cultivo Plátano Fosfato Diamónico 18-46-0	Bultos	300	447,860	134,358,000	0	-	30	13,435,800	10%	
1.6.3	Fertilización Cultivo Plátano Elementos secundarios 21-11-7.5 (N-CA-MG)	Bultos	300	363,890	108,167,000	0	-	30	10,916,700	10%	
1.6.4	Fertilización Cultivo Plátano Compuesto Elementos mayores 15-15-23-4 (N-P-K-MG)	Bultos	300	370,890	111,267,000	0	-	30	11,126,700	10%	
1.6.5	Fertilización Cultivo Plátano Elementos menores 15-15-23-4 (N-P-K-MG)	Bultos	300	363,890	108,167,000	0	-	30	10,916,700	10%	
1.6.6	Fungicida plátano Azoxystrobin Vectol 325 SC	Litros	30	118,300	3,549,000	0	-	3	354,900	10%	
1.6.7	Fungicida plátano Tiltol 250 CE propiconazol	Litros	30	96,400	2,893,800	0	-	3	289,380	10%	
1.6.8	Fungicida plátano Tiltol NT mancozeb	Litros	30	34,990	1,049,700	0	-	3	104,970	10%	
1.6.9	Fertilización Patilla (MELAZA)	Kilogramo	600	3,640	2,184,000	0	-	60	218,400	10%	
1.6.10	Fertilización Patilla (DAP)	Bultos	30	447,860	13,435,800	0	-	3	1,343,580	10%	
1.6.11	Fertilización Patilla (SOLU NKP)	Bultos	300	609,940	182,982,000	0	-	30	18,298,200	10%	
1.6.12	Fertilización Patilla (NITROCAL)	Bultos	300	398,180	119,454,000	0	-	30	11,945,400	10%	
1.6.13	Fertilización Patilla (BORGLUC)	Litros	300	39,890	11,967,000	0	-	30	1,196,700	10%	
1.6.14	Sustrato Sustrato Podstrup Plus Orange Semillero cultivo de melon	Unidades	360	417,770	151,157,130	0	-	37	15,415,713	10%	
1.6.15	Fertilización Melon (MELAZA)	Kilogramo	600	3,640	2,184,000	0	-	60	218,400	10%	
1.6.16	Fertilización Melon (DAP)	Bultos	30	447,860	13,435,800	0	-	3	1,343,580	10%	
1.6.17	Fertilización Melon (Sulfato de magnesio)	Bultos	264	208,400	55,017,600	0	-	26	5,501,760	10%	
1.6.18	Fertilización Melon (Sulfato de potasio)	Bultos	300	174,950	52,485,000	0	-	30	5,248,500	10%	
1.6.19	Fertilización Melon (Sulfato de potasio)	Bultos	300	609,940	182,982,000	0	-	30	18,298,200	10%	
1.6.20	Fertilización Melon (KCI Estándar)	Bultos	150	398,880	59,832,000	0	-	15	5,983,200	10%	
1.6.21	Fertilización Melon (Microelementos)	Bultos	75	233,450	17,508,750	0	-	8	1,750,875	10%	
1.6.22	Fertilización Melon (Nitrato)	Bultos	628	398,180	250,239,040	0	-	53	21,023,904	10%	
1.6.23	Fertilización Melon (BORAX TECNICO)	Bultos	6	342,000	2,052,000	0	-	1	205,740	10%	
1.6.24	Fertilización Melon (Sulfato de potasio)	Bultos	288	511,970	147,447,360	0	-	29	14,744,736	10%	
1.6.25	Sustrato Sustrato Podstrup Plus Orange Semillero cultivo de berenjena	Bultos	276	417,770	115,304,520	0	-	28	11,530,452	10%	
1.6.26	Fertilización Berenjena (MELAZA)	Kilogramo	600	3,640	2,184,000	0	-	60	218,400	10%	
1.6.27	Fertilización Berenjena (DAP)	Bultos	30	447,860	13,435,800	0	-	3	1,343,580	10%	
1.6.28	Fertilización Berenjena (Sulfato)	Bultos	180	208,400	37,512,000	0	-	18	3,751,200	10%	
1.6.29	Fertilización Berenjena (Solu NKP)	Bultos	900	609,940	548,946,000	0	-	90	54,894,600	10%	
1.6.30	Acetamiprid Control de Plagas Berenjena	Sobres	120	258,920	31,070,400	0	-	12	3,107,040	10%	
1.6.31	Delta metrina + thiacloprid Control de Plagas Berenjena	Litros	105	244,930	25,717,650	0	-	11	2,571,765	10%	
1.6.32	Thiametoxam 3-(2-cloro-1,3,4-diazol-5-yl)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ildeno-Nitroamina Control de Plagas Berenjena	Frasco	24	335,900	8,061,600	0	-	2	806,160	10%	
1.6.33	Fipronil 4 SC Control de Plagas Berenjena	Litros	105	202,940	21,308,700	0	-	11	2,130,870	10%	
1.6.34	4 EC Chlorpyrifos Control de Plagas Berenjena	Litros	105	58,780	6,171,900	0	-	11	617,190	10%	
1.6.35	Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de Plagas Berenjena	Unidad	300	90,970	27,291,000	0	-	30	2,729,100	10%	
1.6.36	Emamectina benzoato control de Plagas Berenjena	Kilos	18	538,840	9,699,120	0	-	2	969,912	10%	
1.6.37	Azoxystrobin+125 Difenoconazol control de enfermedades Berenjena	Litros	105	293,910	30,860,550	0	-	11	3,086,055	10%	
1.6.38	Carbendazim control de enfermedades Berenjena	Litros	105	90,970	9,551,850	0	-	11	955,185	10%	
1.6.39	Complejo Yodo Polietoxo-Polipropoxi Polietoxo Etanol 32 g/l Ácido Yodhídrico control de enfermedades Berenjena	Litros	90	118,960	10,706,400	0	-	9	1,070,640	10%	
1.6.40	Acetamiprid Control de Plagas Melon	Sobres	120	258,920	31,070,400	0	-	12	3,107,040	10%	
1.6.41	Delta metrina + thiacloprid Control de Plagas Melon	Litros	105	244,930	25,717,650	0	-	11	2,571,765	10%	
1.6.42	Thiametoxam 3-(2-cloro-1,3,4-diazol-5-yl)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ildeno-Nitroamina Control de Plagas Melon	Frasco	24	335,900	8,061,600	0	-	2	806,160	10%	
1.6.43	Fipronil 4 SC Control de Plagas Melon	Litros	105	202,940	21,308,700	0	-	11	2,130,870	10%	
1.6.44	4 EC Chlorpyrifos Control de Plagas Melon	Litros	105	58,780	6,171,900	0	-	11	617,190	10%	
1.6.45	Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de Plagas Melon	Unidad	300	90,970	27,291,000	0	-	30	2,729,100	10%	
1.6.46	Emamectina benzoato Control de plagas Melon	Kilos	18	538,840	9,699,120	0	-	2	969,912	10%	
1.6.47	Azoxystrobin+125 Difenoconazol control de enfermedades Melon	Litros	105	293,910	30,860,550	0	-	11	3,086,055	10%	
1.6.48	Carbendazim control de enfermedades Melon	Litros	105	90,970	9,551,850	0	-	11	955,185	10%	
1.6.49	Complejo Yodo Polietoxo-Polipropoxi Polietoxo Etanol 32 g/l Ácido Yodhídrico control de enfermedades Melon	Litros	90	118,960	10,706,400	0	-	9	1,070,640	10%	
1.6.50	Acetamiprid Control de plagas Patilla	Sobres	120	258,920	31,070,400	0	-	12	3,107,040	10%	
1.6.51	Delta metrina + thiacloprid Control de plagas Patilla	Litros	105	244,930	25,717,650	0	-	11	2,571,765	10%	
1.6.52	Thiametoxam 3-(2-cloro-1,3,4-diazol-5-yl)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ildeno-Nitroamina Control de plagas Patilla	Frasco	24	335,900	8,061,600	0	-	2	806,160	10%	
1.6.53	Fipronil 4 SC Control de plagas Patilla	Litros	105	202,940	21,308,700	0	-	11	2,130,870	10%	
1.6.54	4 EC Chlorpyrifos Control de plagas Patilla	Litros	105	58,780	6,247,500	0	-	11	624,750	10%	
1.6.55	Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Control de plagas Patilla	Unidad	300	90,970	27,291,000	0	-	30	2,729,100	10%	
1.6.56	Emamectina benzoato Control de plagas Patilla	Kilos	18	538,840	9,699,120	0	-	2	969,912	10%	
1.6.57	Azoxystrobin+125 Difenoconazol control de enfermedades Patilla	Litros	105	293,910	30,860,550	0	-	11	3,086,055	10%	
1.6.58	Carbendazim control de enfermedades Patilla	Litros	105	90,970	9,551,850	0	-	11	955,185	10%	
1.6.59	Complejo Yodo Polietoxo-Polipropoxi Polietoxo Etanol 32 g/l Ácido Yodhídrico control de enfermedades Patilla	Litros	90	118,960	10,706,400	0	-	9	1,070,640	10%	
1.6.60	Colmos de Plátano	Colmos	132,000	3,890	512,680,000	0	-	13,200	52,868,000	10%	
1.6.61	Semilla de Melon	Sobre	360	1,099,000	395,700,000	0	-	30	32,970,000	10%	
1.6.62	Semilla de Berenjena	Sobre	4,500	157,450	708,525,000	0	-	450	70,852,500	10%	
1.6.63	Semilla de Patilla	Sobre	300	349,890	104,967,000	0	-	30	10,496,700	10%	
SUBTOTAL					4,723,203,810	-	0%		472,320,381		
Análisis de suelos											
1.7.1	Análisis de suelos completo intercambiable	Unidad	300	179,950	53,985,000	150	26,992,500	50%	150	26,992,500	100%
SUBTOTAL					53,985,000		26,992,500		26,992,500		
SUBTOTAL OBJETIVO 1						11,213,839,410	648,904,100	5.78%		1,478,319,381	13.19%



OBJETIVO 2: Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.												
2.1 Realizar Visitas técnicas a unidad productiva.												
2.1.1	Contratación de (Dici) 10 técnicos agropecuarios a profesión a fin a todo costo a visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Visitas	3,000	44,990	134,970,000	214	9,640,714	7%	214	9,640,714.2900	7%	
SUBTOTAL					134,970,000		9,640,714			9,640,714		
2.2 Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)												
2.2.1	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	Horas	2,400	19,990	47,976,000	0	-	0%	400	7,996,000	17%	
SUBTOTAL					47,976,000		-			7,996,000		
2.3 Realizar talleres productivos ambientales												
2.2	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los talleres productivos ambientales.	Horas	240	49,980	11,995,200	0	-	0%	0	-	0%	
2.3	Contratación de 4 auxiliares de apoyo por día (Jornada) para la toma de datos	Jornadas	80	239,900	14,395,800	0	-	0%	0	-	0%	
2.4	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21,990	6,597,000	0	-	0%	0	-	0%	
2.5	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1800	5,500	9,900,000	0	-	0%	0	-	0%	
SUBTOTAL					42,888,000		-	0%		-	0.00%	
2.4 Realizar Seminarios												
2.4.1	Contratación de Dos (2) Administradores agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los seminarios	Horas	320	49,980	15,993,600	0	-	0%	0	-	0%	
	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x seminario)	Jornadas	40	159,950	6,398,000	0	-	0%	0	-	0%	
	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21,990	6,597,000	0	-	0%	0	-	0%	
	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1200	5,500	6,600,000	0	-	0%	0	-	0%	
SUBTOTAL					35,588,600		-	0%		-	0.00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 2						SUBTOTAL CAP. 2	201,422,600	9,640,714	3.68%	17,636,714	6.75%	
OBJETIVO 3: Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.												
3.1 Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.												
3.1	Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización	Unidad	300	94,970	\$ 28,491,000	100	9,497,000	33%	100	9,497,000	33%	
SUBTOTAL					\$ 28,491,000		9,497,000	33%		9,497,000	33.33%	
3.2 Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.												
3.2.1	Contratación de Dos (2) Administradores de empresas o área a fin para el desarrollo de los talleres	Horas	320	49,980	\$ 15,993,600	0	-	0%	40	1,999,200	13%	
3.2.2	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller)	Jornadas	40	159,950	\$ 6,398,000	0	-	0%	5	799,750	13%	
3.2.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21,990	\$ 6,597,000	0	-	0%	38	824,625	13%	
3.2.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1,200	5,500	\$ 6,600,000	0	-	0%	150	825,000	13%	
SUBTOTAL					\$ 35,588,600		-	0%		4,448,575	12.50%	
3.3 Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.												
3.3.1	Consultoría para el desarrollo de la actividad	Unidad	1	109,967,000	\$ 109,967,000	0	-	0%	0	-	0%	
SUBTOTAL					\$ 109,967,000		-	0%		-	0.00%	
3.4 Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.												
3.3.2	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización	Unidad	1	26,992,000	\$ 26,992,000	0	-	0%	0	-	0%	
SUBTOTAL					\$ 26,992,000.00		-	0%		-	0.00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 3						SUBTOTAL CAP. 3	201,038,600	9,497,000	4.72%	13,945,575	6.94%	
4 ADMINISTRACIÓN (PLIGENCIA)												
4.1	ADMINISTRACIÓN FORMULARIO 1.1	(PLIGENCIA)	Global	1	2,341,100,077	2,341,100,077	0,1024	239,675,950	0,1024	0,1024	239,675,950	10.238%
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:					14,017,400,687	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	907,317,764	6.47%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	1,750,577,620	12.48%	
VALOR DEL CONTRATO OBRA					14,017,400,687	TOTAL EJECUTADO	907,317,764	6.47%	TOTAL EJECUTADO	1,750,577,620	12.48%	
BALANCE PRESUPUESTAL OBRA												
V/R INICIAL CONTRATO:				14,017,400,687	V/R ANTICIPO:				0.00			
V/R ADICIONES:				0.00	% ANTICIPO:				0%			
V/R ACTUAL CONTRATO:				14,017,400,687								
VALOR ACUMULADO EJECUTADO O AVANCE FISICO				10,846,881,856.81	77.38%							
3 170,718,830												

428.57	19.281.429	14%	428.57	19.281.429	14%	471.43	21.209.571	18%	428.57	19.281.429	14%
	19.281.429			19.281.429			21.209.571			19.281.429	
400	7.996.000	17%	800	15.992.000	33%		-		800	15.992.000	33%
	7.996.000			15.992.000						15.992.000	
							-		48	2.399.040	
							-		12	2.879.180	
							-		60	1.319.400	
							-		360	1.980.000	
							-			8.577.600	
										-	
										-	0%
										-	0%
										-	0%
										-	0%
	27.277.429			35.273.429			21.209.571			43.851.029	
100	8.497.000	33%									
	8.497.000										
40	1.999.200	17%	80	3.998.400	25%	80	3.998.400	25%	80	3.998.400	25.00%
5	799.750	13%	10	1.599.500	25%	10	1.599.500	25%	10	1.599.500	25.00%
37.5	824.625	13%	75	1.649.250	25%	75	1.649.250	25%	75	1.649.250	25.00%
150	825.000	13%	300	1.650.000	25%	300	1.650.000	25%	300	1.650.000	25.00%
	4.448.575			8.897.150			8.897.150			8.897.150	
							-	0.00%	0.142957143	\$ 15.709.571.42	14.29%
							-		\$ 15.709.571.42		
	13.945.375			8.897.150			8.897.150			24.606.721	
0.036147501	84.624.917	3.61%	0.0361475	84.624.917	3.61%	0.000389	211.562.293	9.04%	0.000386752	211.562.293	9.04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	125.847.921	0.898%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.001.716.924	14.280%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	713.989.395	5.094%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.543.781.351	18.147%
TOTAL EJECUTADO	125.847.921	0.90%	TOTAL EJECUTADO	2.001.716.924	14.28%	TOTAL EJECUTADO	713.989.395	5.09%	TOTAL EJECUTADO	2.543.781.351	18.15%

Tabla 12. Avance consolidado mes 3,4 y 5 del proyecto

MES N° 7			MES N° 8			JUNIO 2024 ACUMULADO		
CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANT	VALOR TOTAL	%
						80	4.998.400	100%
						80	4.998.400	100%
						10	3.588.900	100%
						800	8.480.000	100%
						10	7.017.900	100%
						800	3.300.000	100%
							30.383.800	100%
						800	26.994.000	100%
							26.994.000	100%
22	25.795.805	7%	-	-	0%	350	286.521.000	100%
22	4.873.533	7%	-	-	0%	350	87.179.000	100%
22	26.693.490	7%	-	-	0%	350	367.590.000	100%
22	24.048.620	7%	-	-	0%	350	321.990.000	100%
763	5.131.888	7%	-	-	0%	10800	70.740.000	100%
	81.500.501,20			-	0%		1.133.440.000	100%
15	73.382.334	9%	23	110.043.500	8%	350	1.427.700.000	100%
15	882.959	9%	23	1.294.439	8%	350	16.794.000	100%
15	3.667.808	9%	23	5.501.713	8%	350	71.179.000	100%
21	770.633	9%	46	1.984.949	8%	850	15.114.000	100%
21	1.214.432	9%	46	1.821.649	8%	850	23.634.000	100%
18	4.462.169	9%	23	6.993.253	8%	350	86.838.000	100%
18	2.373.215	9%	23	3.339.823	8%	350	48.185.000	100%
18	2.15.817	9%	23	323.725	8%	350	4.200.000	100%
771	58.235.190	9%	1158	87.382.725	8%	19000	1.133.700.000	100%
130	2.485.923	9%	208	3.743.884	8%	2700	48.573.000	100%
31	955.452	9%	48	1.433.178	8%	800	18.594.000	100%
82	1.108.299	9%	82	1.063.948	8%	1200	21.588.000	100%
82	1.294.205	9%	82	1.941.427	8%	1200	25.188.000	100%
15	129.490	9%	23	194.235	8%	350	2.520.000	100%
15	189.810	9%	23	254.396	8%	350	3.300.000	100%
48	628.952	9%	88	943.428	8%	950	12.340.000	100%
48	3.709.119	9%	88	4.983.878	8%	950	52.722.000	100%
48	108.397	9%	88	158.550	8%	950	2.070.000	100%
350	32.178.491	9%	632	48.294.677	8%	10800	828.184.000	100%
82	488.631	9%	82	702.947	8%	1200	8.320.000	100%
100	1.775.865	9%	377	2.663.797	8%	3600	34.590.000	100%
82	1.232.623	9%	82	1.848.934	8%	1200	23.988.000	100%
82	678.282	9%	82	1.017.423	8%	1200	13.200.000	100%
82	345.307	9%	82	517.961	8%	1200	8.720.000	100%
82	406.969	9%	82	610.454	8%	1200	7.600.000	100%
1830	850.935	9%	2775	1.276.403	8%	36000	16.960.000	100%
1830	998.924	9%	2775	1.498.395	8%	36000	19.440.000	100%
15	1.848.243	9%	23	2.773.854	8%	350	35.988.000	100%
1830	1.405.893	9%	2775	2.108.840	8%	36000	27.360.000	100%
48	43.735.799	9%	88	65.833.636	8%	800	881.136.000	100%
31	88.527	9%	48	129.490	8%	850	1.880.000	100%
15	287.178	9%	23	380.784	8%	350	11.427.000	100%
82	172.854	9%	82	258.980	8%	1200	3.360.000	100%
31	234.319	9%	46	351.473	8%	850	4.560.000	100%
27	215.817	9%	116	323.725	8%	1500	4.200.000	100%
18	1.531.838	9%	23	2.287.756	8%	350	28.811.000	100%
82	693.814	9%	82	1.035.821	8%	1200	13.440.000	100%
31	3.624.691	9%	48	5.436.736	8%	800	70.636.000	100%
18	11.111.179	9%	23	18.698.769	8%	350	218.234.000	100%
	258.969.268,06			388.452.490,03			5.838.796.000	100%
						1200	16.920.000	100%
						800	38.388.000	100%
						850	20.994.000	100%
						850	4.200.000	100%
						850	37.188.000	100%
						350	87.179.000	100%
						800	37.188.000	100%
							218.057.000	100%

2232	89 034 480	87%
278	124 852 640	87%
278	101 525 310	82%
278	102 478 310	82%
278	101 525 310	82%
28	3 300 670	82%
28	2 891 234	82%
28	878 221	82%
158	2 031 120	82%
28	12 485 294	82%
278	170 173 280	82%
278	111 062 220	82%
278	11 126 310	82%
143	143 398 131	83%
158	2 031 120	82%
28	12 485 294	82%
248	51 386 388	82%
278	48 811 050	82%
278	170 173 280	82%
140	55 843 790	83%
70	16 283 138	82%
491	186 522 307	82%
4	8 13 282	82%
288	137 128 045	82%
257	107 233 204	82%
158	2 031 120	82%
28	12 485 294	82%
167	54 886 160	82%
837	8 10 310 780	82%
112	28 895 472	82%
98	23 817 415	82%
22	7 497 288	83%
98	16 817 091	82%
98	5 738 867	82%
278	25 380 630	82%
17	8 020 182	83%
98	26 700 312	82%
98	8 883 221	82%
84	8 956 952	82%
112	28 895 472	82%
98	23 817 415	82%
22	7 497 288	83%
98	16 817 091	82%
98	5 738 867	82%
278	25 380 630	82%
17	8 020 182	83%
98	26 700 312	82%
98	8 883 221	82%
84	8 956 952	82%
112	28 895 472	82%
98	23 817 415	82%
22	7 497 288	83%
98	16 817 091	82%
98	5 810 175	82%
278	25 380 630	82%
17	8 020 182	83%
98	26 700 312	82%
98	8 883 221	82%
84	8 956 952	82%
122790	489 812 400	83%
278	356 621 000	82%
4195	656 928 250	82%
278	97 619 310	82%
	4.382.579.543	82%
396	53 985 000	100%
	83.985.000	100%
	10.883.215.143	97,05%



428.57	19.281.429	14%	428.57	19.281.429	14%	2614	117.818.714	87%
	19.281.429			19.281.429			117.818.714	87%
	-			-		2400	47.978.000	100%
	-			-			47.978.000	100%
48	2.399.040	20%	48	2.399.040	20%	144	7.187.120	60%
12	2.875.190	20%	12	2.875.190	20%	36	8.837.480	60%
80	1.319.400	20%	80	1.319.400	20%	180	3.958.200	60%
360	1.980.000	20%	360	1.980.000	20%	1080	5.940.000	60%
	8.577.600			8.577.600			25.732.800	60%
						0	0	0%
						0	0	0%
						0	0	0%
						0	0	0%
						0	0	0%
	27.859.029			27.859.029			191.323.514	73,19%
						200	18.994.000	100%
							28.491.000	100%
						320	15.983.000	100%
						40	6.398.000	100%
						300	6.597.000	100%
						1200	6.800.000	100%
							35.588.600	100%
0.142857143	\$ 15.709.571,42	14%	0.142857143	\$ 15.709.571,42	14%	0.4286	47.128.714	43%
	\$ 15.788.571,42			\$ 15.788.571,42			47.128.714	43%
						0	0	0%
						0	0	0%
	15.709.571			15.709.571			111.208.314	55%
						0.8385	1.484.850.008	83,85%
0.000388752	211.982.293	9,04%	0.000388752	211.982.293	9,04%		12.680.599.877	90,48%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	973.455.965	6,94%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	879.743.483	6,276%			
TOTAL EJECUTADO	973.455.965	6,94%	TOTAL EJECUTADO	879.743.483	6,28%		\$ 12.680.599.877	90,48%

A continuación, vamos a describir en cada uno de los objetivos del desarrollo de las actividades que estén por debajo del 100% de ejecución de este proyecto, explicando el porcentaje de avance en cuanto a la ejecución a la fecha y las condiciones de ejecución de la misma.

Esta tabla describe la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, mostrando el avance en cada una de ellas. Seguidamente haremos descripción de los procesos de ejecución de las subactividades como se describen a continuación:

Tabla 15. Ejecución de cada una de las actividades del proyecto

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO HORTIFRUTICOLA MOJANA							
No.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	VALOR T POR ACTIVIDAD	JUNIO	% AVANCE JUNIO	ACUMULADO	% ACUMULADO
1	Fomentar el establecimiento de cultivos hortifrutícolas (Plátano, Melón, Berenjena y Patilla) con sistemas de riego localizado por goteo de alta eficiencia.	60 días	\$ 57.387.600	\$ -	100%	\$ 57.387.600	100%
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización	30 días	\$ 30.393.600	\$ -	100%	\$ 30.393.600	100%
1.2	Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información	60 días	\$ 26.994.000	\$ -	100%	\$ 26.994.000	100%
1.3	Realizar inversiones requeridas para el establecimiento de los cultivos	150 días	\$ 11.156.451.810	\$ 624.612.590,00	6%	\$ 10.825.827.544	97%
1.3.1	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	60 días	\$ 1.123.440.000	\$ -	0%	\$ 1.123.440.000	100%
1.3.2	Sistema de Riego	90 días	\$ 5.039.766.000	\$ 388.452.400,00	8%	\$ 5.039.766.000	100%
1.3.3	Herramientas Cosecha y Postcosecha	30 días	\$ 216.057.000	\$ -	0%	\$ 216.057.000	100%
1.3.4	Insumos Cultivo	150 días	\$ 4.723.203.810	\$ 238.166.191,00	5%	\$ 4.392.579.544	93%
1.3.5	Análisis de Suelos	30 días	\$ 53.985.000	\$ -	0%	\$ 53.985.000	100%
2	Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de las 300 unidades productivas a atender.	240 días	\$ 261.422.600	\$ 27.889.038,57	11%	\$ 191.326.513	73%
2.1	Realizar Visitas técnicas a unidad de productiva.	210 días	\$ 134.970.000	\$ 19.261.428,57	14%	\$ 117.616.713	87%
2.2	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas)	240 días	\$ 47.976.000	\$ -	0%	\$ 47.976.000	100%
2.3	Realizar talleres productivos ambientales	150 días	\$ 42.888.000	\$ 8.577.600,00	20%	\$ 25.732.800	60%
2.4	Realizar Seminarios	60 días	\$ 35.588.600	\$ -	0%	\$ -	0%
3.	Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productor hortifrutícolas.	210 días	\$ 201.038.800	\$ 15.709.571,42	8%	\$ 111.208.314	55%
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	90 días	\$ 28.491.000	\$ -	0%	\$ 28.491.000	100%
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	120 días	\$ 35.588.600	\$ -	0%	\$ 35.588.600	100%
3.3	Implementar Marketing territorial Hortifrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización	210 días	\$ 109.967.000	\$ 19.709.571,42	14%	\$ 47.128.714,20	43%
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	30 días	\$ 26.992.000	\$ -	0%	\$ -	0%
4	ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	360 días	\$ 2.341.100.077	\$ 211.502.083,84	9%	\$ 1.404.850.905,64	64%
	COSTO TOTAL		\$ 14.017.400.687	\$ 879.743.483,83	6%	\$ 12.680.586.877	90%

TABLA 16. REALIZAR INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CULTIVOS (ADQUISICIÓN ACTIVOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO AL MODELO DE INVERSIÓN)

Detalle Actividad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023 10	2023 11	2023 12	2024 1	2024 2	2024 3	2024 4	2024 5
1.2.1 Activos Productivos, Infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	1.127.379.284	1	1.127.379.284			280.860.000	280.860.000	280.860.000	284.799.284		
	842.580.000	1	842.580.000			280.860.000	280.860.000	280.860.000		199.359.499	185.439.785
1.2.2 Sistema de Riego	5.039.766.000	1	5.039.766.000		577.621.000	577.621.000	1.942.262.000	647.420.666,67	647.420.666,67	647.420.666,67	
	3.744.924.866,67	1	3.744.924.866,67		577.621.000	577.621.000	1.942.262.000	647.420.666,67		647.420.666,67	256.388.287
1.2.3 Herramientas Cosecha y Postcosecha	216.057.000	1	216.057.000			108.028.500	108.028.500				
	216.057.000	1	216.057.000			108.028.500	108.028.500				
1.2.4 Insumos Cultivo	4.723.203.810	1	4.723.203.810			472.320.381	472.320.381	944.640.762	944.640.762	944.640.762	944.640.762
	2.361.603.905	1	2.361.603.905			472.320.381	472.320.381	944.640.762	472.320.381	1.416.961.141	177.856.305
1.2.5 Análisis de Suelos	53.985.000	1	53.985.000		26.992.500	26.992.500					
	53.985.000	1	53.985.000		26.992.500	26.992.500					
1.2.6 Administración del Proyecto	2.341.100.077	1	2.341.100.077	119.837.975	119.837.975	239.675.950	84.624.917,14	84.624.917,14	211.562.292,84	211.562.292,84	211.562.292,84
	860.184.027,12	1	860.184.027,12	119.837.975	119.837.975	239.675.950	84.624.917,14	84.624.917,14	211.562.292,84	211.562.292,84	211.562.292,84

Para esta actividad se anotan los siguientes avances:

Avance financiero actividad: 97,05%

Avance físico actividad: 97,05%

5.01 Objetivos 2.

Realizar visitas técnicas por unidad productivas: frente al 100% de total de la ejecución para esta actividad, se ha realizado un 87% de ejecución hasta el mes de mayo, lo cual indica que el 13% faltante de la ejecución se debe a que por cada mes se están realizando estas visitas técnicas hasta la finalización del proyecto, lo cual incurre en unos gastos parciales por cada mes como rubro financiero, tal cual como se describe en el cuadro financiero.

Detalle Actividad		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023 10	2023 11	2023 12	2024 1	2024 2	2024 3	2024 4	2024 5	2024 6
2.4.1 Realizar Visitas técnicas a unidad de productiva.	Inicial												
	Prog	134.970.000	1	134.970.000		9.640.714,28	9.640.714,29	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,57	19.281.428,58
	Eje	79.053.856,72	1	79.053.856,72		9.640.714,29	9.640.714,29	19.281.428,57	19.281.428,57	21.209.571	19.281.428,57	19.281.428,57	

Avance financiero actividad 5: 87%

Avance físico actividad 5: 87%

Realizar Talleres Productivos Ambientales: Con respecto a esta actividad se realiza un avance más del 20% para el mes de mayo, para un total de un 60% de la ejecución, frente a un 60% por ejecutar a lo largo de los meses faltantes del proyecto con sus rubros asignados para cada mes por el consorcio campo verde como se muestra en el cuadro anterior.

Detalle Actividad		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1 Realizar talleres productivos ambientales	Inicial														
	Prog	42.888.000	1	42.888.000						4.288.800	4.288.800	8.577.600	8.577.600	8.577.600	8.577.600
	Eje	0	0	0							8.577.600	8.577.600			

Avance financiero actividad 5: 60%

Avance físico actividad 5: 60%

Realizar Seminarios: Se evidencia 0% de avance en la ejecución de esta actividad, la cual se empezará ejecutar a partir del mes de julio hasta el mes de septiembre según el cronograma de ejecución del consorcio campo verde para cumplir con el 100%.

5.02 Objetivo 3.

Implementar Marketing Territorial hortofrutícola, Una Alternativa para la Promoción del departamento y Competitividad y Asociación: en esta actividad nos encontramos con una ejecución para este mes de mayo de un 14% más, para un total de un 28.57% de avance total. con todo lo que concierne a la consultoría del desarrollo de las actividades del proyecto, todo esto se ira desarrollando a lo largo de los meses que faltan para cumplir con un 71,43% del proyecto por parte de los ejecutores tal cual como se muestra en detalle en el cuadro financiero.

Detalle Actividad		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5.3 Implementar Marketing territorial hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la	Inicial															
	Prog	399.967.000	1	399.967.000						7.894.785,71	7.894.785,71	15.789.571,43	15.789.571,43	15.789.571,43	15.789.571,43	15.789.571,43
	Eje	0	0	0							15.789.571	15.789.571,43				

Avance financiero actividad 5: 43%

Avance físico actividad 5: 43%

Realizar una Feria Campesina Para Impulsar la Comercialización: Resaltamos que esta actividad se encuentra en un 0%, puesto que esta actividad está programada al final del proyecto, teniendo en cuenta que se generaran iniciativas de comercialización, captación de nuevos clientes.

Seguimiento de los hallazgos financieros encontrados anterior mente.

Resaltando los hallazgos encontrados por interventoría anteriormente, se identificaron hallazgos en la supervisión financiera realizada por el equipo de interventoría, las cuales fueron presentadas al consorcio campo verde con la finalidad de corregir dichas inconsistencias, en el cual se muestra en detalle a continuación con los soportes relacionados.

Tabla 17. Seguimiento de los hallazgos financieros encontrados anteriormente.

ITEM	DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMO	CANT U PROY	VALOR UNIT PROD	UND T RECIBIDAS	VALOR TOT FACT	CANT APR GOB	DIF CANT GOB	SIN FACTURAR GOB	CANT TOT FALT	VALOR TOT FALT PROY
1.03	Plastico Mulch plata negra	300	\$ 1.105.000	301	\$ 331.500.000	300	-	\$ -	1,00	
1.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	300	\$ 153.950	283	\$ 46.185.000	175	8		117,00	\$ 18.012.150,00
1.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1 1/2 Pulgada	10.800	\$ 57.980	15300	\$ 626.184.000	6.300	-	\$ -	4.500,00	\$ 260.910.000,00
1.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1 1/2 Pulgada	10.800	\$ 57.980	15300	\$ 626.184.000	6.300	-	\$ -	4.500,00	\$ 260.910.000,00

Descripción Productos Nota Crédito

-Plástico mulch plata negra: se compra (1) una unidad de más, frente a las

-(300) unidades asignadas por el proyecto.

Maguera de succión corrugada 2"x 3 metros: se compraron 8 unidades de más, frente a las 175 unidades aprobadas por gobernación.

-Tubería PVC RDE 32,5 de 1. ½ pulgadas: según acta aprobada por gobernación se debieron comprar 6300 unidades, de las cuales evidencian la compra por 9000 unidades de más.



NEDER CARLOS CASTRO CASTRO

Representante Legal: Fundación Para Volver a Vivir

NIT: 823.002.076-4
